

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF)
Dirección Administrativa (DIAD)

PROYECTO: K001 INEC - Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Líder del Proyecto:	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria (Elizabeth_Tandazo@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Titular:	Sandoval Atapuma, Jorge Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380427	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	436,304.48
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	31/10/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2016

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: Mediante la ejecución del proyecto se dotará a los servidores públicos del INEC- Planta Central de una infraestructura civil adecuada, para un ambiente propicio en el desarrollo de sus actividades diarias.
 Línea Base: El INEC, a través de la historia, ha sido y es la entidad referente de la producción estadística; sin embargo, en sus 40 años de vida al servicio del país y la comunidad, no ha tenido un edificio de su propiedad, por lo que sigue siendo arrendatario de tres pisos de un edificio caduco de la Curia ubicado en la calle Av. 10 de Agosto y pasaje Carlos Ibarra; y, también arrienda un pequeño edificio en Ñaquito A partir del año 1994 se hace acreedor de un espacio de 4 pisos, en el edificio del antiguo INHERI, ubicado en las calles Juan Larrea y José Riofrío.

El edificio que ocupa el INEC Planta Central 8.126 m2, tiene más de cinco décadas de vida, razón por la cual constituye un espacio con áreas obsoletas, otras en desuso, y espacios de alto riesgo para los funcionarios que en el laboran. En el séptimo piso se observan diariamente desprendimientos de pedazos de loseta; cubierta totalmente agujereada; así como en todo el edificio pisos y techos levantados y desprendidos.

Bajo este antecedente se tiene en arrendamiento los dos espacios antes citados- un pequeño edificio en Ñaquito y tres pisos en el Edif. San Luis en el centro de la ciudad, entre otros inmuebles lo que determina un costo de, aproximadamente, USD 115.271,22 por año, a precios actuales.

Existen espacios de 2.550 m2, en el edificio INEC -Planta Central, no utilizados por el deterioro en el que se encuentran, donde podría integrarse el personal del INEC - Quito que actualmente se encuentra en el edificio San Luis y el edificio de Ñaquito, lo que constituirá un ahorro en los recursos financieros y físicos.

El total del personal del INEC-Quito que suma 458 está distribuido así: 349 personas en Planta Central; 48 personas en Ñaquito; y, 61 personas en el Edif. San Luis.

Objetivo General: Dotar de un espacio físico seguro para los servidores y servidoras mediante la adecuación y equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado, lo que permitirá garantizar la salud y seguridad del personal, unificación del talento humano y un mayor nivel de eficiencia en la gestión del INEC - Planta Central.

Objetivos Específicos:

1. Conferir de espacios de trabajos seguros, ordenados y adecuados, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del INEC, según los estándares fijados por normas internacionales.
2. Dotar a los servidores del INEC - Planta Central de 8.126 m2 de espacio físico, con una infraestructura civil que disponga del equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado.

Producto Final del Proyecto:

1. 1248 m2 adecuados del 7mo piso y el 70% 5to piso las áreas de circulación del Edificio Matriz INEC y el 9º piso del Edificio Benalcázar Mil.


DATOS GENERALES

Descripción
2. 323,63 m2 de construcción y equipamiento del sistema hidrosanitario y contra incendios. 3. 9 servidores públicos contratados en el año 2016 (5 de enero a febrero y 4 de enero a diciembre)
Beneficios Cualitativos
1. Unificar a los servidores del INEC en un solo edificio, y de esta manera evitar el pago de arriendos lo cual permitirá optimizar recursos financieros. 2. Una infraestructura civil equipada permite dotar de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado para el Edificio Matriz INEC.
Tipo de Beneficiario
Para los componentes de Infraestructura y equipamiento la población objetivo beneficiaria, de este proyecto, son las 438 personas entre servidores permanentes y temporales del Instituto Nacional de Estadística y Censos-Planta Central, los servidores temporales se contratan para las diferentes encuestas, por espacios de tiempo de 1 a 3 meses rotativos en cada año.
Restricciones
Tiempo: 12 meses (01/01/2016 al 31/12/2016) Alcance: Debido al Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, se debe solicitar aval al Ministerio de Finanzas para la ejecución del gasto. De ser negado el aval por el Ministerio de Finanzas, no se podrá ejecutar lo planificado. Recursos: Financieros y logísticos. Costo: \$500.000,00 presupuestado para los doce meses.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.97 %
Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	19 %	26 %	30 %	34 %	46 %	52 %	57 %	62 %	72 %	82 %	87 %	100 %
	Avance real acumulado											
	19 %	26 %	30 %	30 %	30 %	52 %	57 %	62 %	72 %	82 %		
Estado												
	●	●	●	▼	⊘	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>2.- Se elaboró y firmó el acta entrega recepción de otras adecuaciones realizadas al Edificio INEC-Matriz, entre el contratista y la Administradora del Contrato, detallándose los rubros específicos: Piso porcelanato 110 m2, mampostería gypsum 10.36m2, pintura latex en paredes 20.72 m2 y mampara 4.83m2, trabajos que fueron realizados en el hall de acceso de la Planta Baja y en el subsuelo .1 (HITO CUMPLIDO 15)</p> <p>1.- Se elaboró y socializó con fecha 14 de octubre de 2016, el acta entrega recepción de las adecuaciones realizadas en el 5° y 7° piso del edificio INEC-Matriz, en la que se detalla las adecuaciones realizadas: cambio de cielo falso, instalación del sistema eléctrico, instalación de</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	31/10/2016 - 04:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
red de voz y datos, colocación de cerámica en el piso, pintura de paredes 371,15 m2, vestido de rack y certificación de enlace de fibra óptica. (HITO CUMPLIDO 14)		
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>2.- Se elaboró y suscribió con fecha 22 de septiembre de 2016, el acta entrega recepción de las adecuaciones realizadas en el 9° piso del edificio Benalcázar Mil, en la que se detalla las adecuaciones realizadas: cambio de cielo falso, instalación del sistema eléctrico, instalación de red de voz y datos, colocación de cerámica en el piso, pintura de 240m2 y creación del cuarto frío. (HITO CUMPLIDO 13)</p> <p>1.- Se realizó el trabajo de instalación de 110 m2 de porcelanato en el hall de acceso, instalación de 10.36 m2 de mampostería de gypsum e instalación de una mampara de 4.83 m2 y 20.72m2 de pintura latex en paredes del subsuelo del Edificio Matriz. (HITO CUMPLIDO 12)</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	18/10/2016 - 10:13 AM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1.- Se realizó el trabajo de pintura de 27 M2, en las paredes del 7° piso y 344,15 M2 en las paredes del 70% del 5° piso del Edificio Matriz. (HITO CUMPLIDO 11)</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	15/09/2016 - 03:29 PM
<p>JULIO 2016</p> <p>5.- Se realizó el trabajo de pintura de 240M2, en las paredes del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil. (HITO CUMPLIDO 10)</p> <p>4.- Con memorando INEC-DIREJ-2016-0443-M, de fecha 17 de agosto de 2016, el Señor Patrocinador Ejecutivo del Proyecto, autoriza y dispone el trámite respectivo; y se coordinó con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, para la reestructura en el sistema GPR.</p> <p>3.- Con memorando INEC-CGAF-DIAD-2016-1081-M, de fecha 05 de agosto de 2016, se remite a la Coordinación General Administrativa Financiera, el expediente para la reestructuración de hitos en el cual constan los siguientes documentos: Ficha Informativa del Proyecto, Justificación Técnica y memorandos respectivos de solicitud y aprobación</p> <p>2.- Una vez que se obtenga la aprobación del Patrocinador Ejecutivo sobre la reestructuración de hitos, se coordinará con la USEP-DIPLA la reestructura de hitos en el sistema GPR.</p> <p>1.- Se elaboró la justificación técnica para reestructurar los hitos del Proyecto "Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos", a partir del Hito N° 10 al 25.</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	31/08/2016 - 04:26 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>8.- Se realizó el arreglo del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 9 Cumplido)</p> <p>7.- Se realizaron arreglos de los pisos 5° y 7° del Edificio Matriz INEC, por tal motivo se adjunta el informe respectivo. (Hito 8 Cumplido)</p> <p>6.- Se realizaron adecuaciones sobre la red eléctrica, red de datos y cielo raso de los pisos del Edificio Matriz INEC, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 7 Cumplido)</p> <p>5.- Se realizaron adecuaciones sobre: red eléctrica, red de datos y cielo raso del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil, por lo cual se adjunta el informe respectivo. (Hito 6 Cumplido)</p> <p>4.- Conforme a lo que antecede, se puede comprobar que el proceso de Contratación Pública se encuentra adjudicado para iniciar la ejecución del proyecto, con respecto a las adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil (Hito 5 Cumplido)</p> <p>3.- Se procedió a cerrar el problema: "NO SE CULMINÓ CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PORQUE FUE DECLARADO DESIERTO" y colocar la fecha completada del plan de acción del mismo.</p> <p>2.- Se adjunta impresión de pantalla de la página www.compraspublicas.gob.ec (Sistema Oficial de Contratación Pública - Descripción del Proceso de Contratación) en la cual se pudo evidenciar el estado del proceso: adjudicado - registro de contratos.</p> <p>1.- Mediante Resolución No. 128-COMPRAS-DIREJ-2016, de fecha 16 de junio de 2016 se Resuelve: Adjudicar el proceso de Subasta Inversa Electrónica con el código SIE-INEC-008-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	02/08/2016 - 08:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto Mejoramiento Institucional, al oferente Rodrigo Patricio Molina Cruz, por el valor de USD \$ 128.042,17 más IVA, por ser la oferta que cumple con las especificaciones técnicas y legales establecidas en los pliegos de Subasta Inversa Electrónica N° SIE-INEC-008-2016, amparado en lo que establecen el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 24 y 48 reformado del Reglamento General de la LOSNCP.		
<p>MAYO 2016</p> <p>4.- Una vez culminado el proceso de contratación pública, se iniciará con la ejecución de las actividades planificadas en el proyecto. (Hito 6 y 7 por Cumplirse)</p> <p>3.-Mediante Resolución N° 120-COMPRAS-DIREJ.2016, del 30 de mayo de 2016, se resuelve en el Art. 1.- Aprobar el pliego del proceso de subasta inversa electrónica con el código SIE-INEC-008-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, así como el cronograma establecido en el mismo.</p> <p>2.- Mediante Resolución N° 119-COMPRAS-DIREJ.2016, del 26 de mayo de 2016, se resuelve en el Art. 1.- Aprobar el inicio del proceso de contratación pública, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos - Oficina Matriz.</p> <p>1. Mediante Resolución N° 117-COMPRAS-DIREJ-2016, de fecha 24 de mayo de 2016, se resuelve en el Art.1. Declarar desierto el procedimiento de subasta inversa electrónica N° SIE-INEC-007-2016, para la contratación del servicio de adecuaciones del séptimo piso, 70% del quinto piso, otras adecuaciones del Edificio INEC Matriz y noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, necesarias para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, en razón de que la única oferta presentada no cumple con los requisitos y especificaciones técnicas solicitados por el INEC, de conformidad con el literal b) del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que se declarará desierto el procedimiento Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley.</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	22/06/2016 - 08:43 AM
<p>ABRIL 2016</p> <p>2. El 02 de mayo de 2016 la Dirección de Administración inicia con el proceso de contratación para las adecuaciones del 7mo piso y el 70% del 5to piso y otras adecuaciones del Edificio San Luis y el 9no piso del Edificio Benalcázar Mil. (Hito 5 por Cumplirse).</p> <p>1. Se creó un problema: Ampliación del proceso de adjudicación ya que el 27 de abril de 2016 recién aprobó el aval de contrataciones el Ministerio de Finanzas, se adjunta el comprobante de aval remitido por el MINFIN.</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	18/05/2016 - 08:28 AM
<p>MARZO 2016</p> <p>1. Mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0765-M, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera requirió autorización al señor Director Ejecutivo, para la solicitud de emisión del aval que se va solicitar al Ministerio de Finanzas sobre las Adecuaciones del 7° piso, el 70% del 5° piso, otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC y adecuaciones del 9° piso del Edificio Benalcázar Mil del Proyecto Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Hito Cumplido 4)</p>	Romero Calderón, Angélica María	07/04/2016 - 09:50 AM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. Se realizaron varias reuniones entre la Dirección de Planificación y la líder del proyecto para solventar todas las observaciones emitidas en el documento final del Proyecto Mejoramiento Institucional, con la finalidad de iniciar con el trámite respectivo para la postulación a SENPLADES. HITO 3 CUMPLIDO.</p>	Romero Calderón, Angélica María	04/04/2016 - 08:56 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>1. Se realizó un análisis entre la líder del Proyecto y el Director Administrativo, para identificar las necesidades de mejora sobre infraestructura del Edificio Matriz INEC, con la finalidad de obtener el detalle de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional a ejecutarse en el año 2016. HITO 1 CUMPLIDO.</p>	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	04/03/2016 - 02:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Una vez detalladas las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, se realizó el diseño preliminar del proyecto formulado, HITO 2 CUMPLIDO.		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. * General. Incumplimiento de los contratistas en la ejecución de la obra CAUSARÍA un retraso en la programación establecida.	18/10/2016	Elizabeth Victoria Tandazo Cando	10 %	90	9	1/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Diagnóstico de identificación de necesidades de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada.	4-Inicio de Trabajo	06/01/2016		06/01/2016		Sí	9.0
2	DEFINICIÓN: Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	4-Inicio de Trabajo	22/01/2016		22/01/2016		Sí	10.0
3	PLANEACIÓN: Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	5-Entregables Intermedios	10/02/2016		10/02/2016		Sí	7.0
4	PLANEACIÓN: Solicitud de aval según Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, revisada.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2016		29/03/2016		Sí	4.0
5	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación, revisada y comprobada.	3-Adjudicación	29/04/2016		16/06/2016		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos, cielo raso) del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		30/06/2016		Sí	6.0
7	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos y cielo raso) de los pisos del Edificio Matriz INEC, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		30/06/2016		Sí	6.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo de los pisos (quinto y séptimo) Edificio Matriz INEC elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo del piso, Edificio Benalcázar Mil, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Informe final del servicio trabajo de pintura de las paredes del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		22/07/2016		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Informe final sobre el servicio de pintura de las paredes de interiores del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Informe final sobre otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2016		15/09/2016		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Acta final de entrega recepción de las adecuaciones del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/09/2016		23/09/2016		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de las adecuaciones del quinto, séptimo piso del Edificio Matriz INEC, socializada.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2016		31/10/2016		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Informe final de la obra, albañilería, cielo falso y tratamiento de pintura sobre la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del Edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2016	30/11/2016			No	5.0
17	EJECUCIÓN: Informe final de la reconstrucción del sistema hidrosanitario y remodelación de las baterías sanitarias del edificio Larrea del INEC, elaborado y entregado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2016	21/12/2016			No	5.0
18	CIERRE: Informe de gestión final de cumplimiento de actividades 2016 del proyecto, aprobado.	9-Entregables Formales	26/12/2016	26/12/2016			No	8.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de servidores públicos contratados, en el año 2016		100.00 %	0	0	01/01/2016	Jul-Sep
2	Número de metros cuadrados adecuados		162.78 %	1,248	2,031.47	01/07/2016	Jul-Sep
3	Número de metros cuadrados de construcción y equipamiento del sistema hidrosanitario y contra incendios		-	-	-	03/10/2016	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	436,304.48 **
Costo Total:	500,000.00
Total Devengado:	159,191.63
% Costo Total Devengado:	31.84 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 31.84 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Ppto. Codificado	0.00	436,304.48	0.00	436,304.48
Ppto. Comprometido	0.00	434,321.72	0.00	434,321.72
Planeado - Codificado (2016)		63,695.52		
Programado a Devengar	0.00	436,304.48	0.00	436,304.48
Ppto. Devengado	0.00	159,191.63	0.00	159,191.63
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	436,304.48	0.00	436,304.48
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	36.49 %	0.00 %	36.49 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

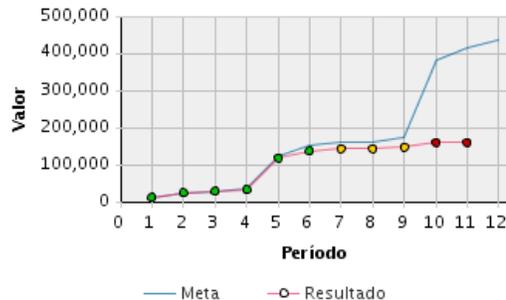

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	10,752.08	11,402.32	10,752.08	11,402.32	106.05 %	●	2.61 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	11,566.58	11,566.58	22,318.66	22,968.90	102.91 %		5.26 %
Mar	6,826.11	5,386.90	29,144.77	28,355.80	97.29 %		6.50 %
Abr	4,919.77	4,919.76	34,064.54	33,275.56	97.68 %		7.63 %
May	87,394.79	84,746.28	121,459.33	118,021.84	97.17 %		27.05 %
Jun	30,405.68	19,318.52	151,865.01	137,340.36	90.44 %		31.48 %
Jul	7,625.11	4,919.76	159,490.12	142,260.12	89.20 %		32.61 %
Ago	347.36	716.04	159,837.48	142,976.16	89.45 %		32.77 %
Sep	12,941.52	4,034.19	172,779.00	147,010.35	85.09 %		33.69 %
Oct	210,416.34	12,181.28	383,195.34	159,191.63	41.54 %		36.49 %
Nov	31,832.48	0.00	415,027.82	159,191.63	38.36 %		36.49 %
Dic	21,276.66		436,304.48				
Total	436,304.48	159,191.63					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la efectividad de la gestión de la Dirección Administrativa MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos administrativos, implementación de herramientas normativas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATOS N° 12 - MINFIN	COMPROBANTE_DE_AVALES_A_CONTRATOS_N°_12_-_MINFIN.pdf	02/05/2016
2	Expediente sobre la Reestructuración de hitos del Proyecto, periodo Julio - Diciembre 2016.	Expediente_proyecto_Mejoramiento_Institucional_completo.pdf	23/09/2016
3	HITO 1.- Diagnóstico de identificación necesidades de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada	A.1.rar	22/02/2016
4	HITO 2.- Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	A.2.rar	22/02/2016
5	HITO 3.- Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	A.3.rar	07/03/2016
6	HITO 4.- Solicitud de aval según Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, revisada.	A.4..pdf	04/04/2016
7	HITO 5.- Acta de adjudicación, revisada y comprobada.	A.5..pdf	22/06/2016
8	HITO 6.- Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos, cielo raso) del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborados y entregados.	A.6..pdf	06/07/2016
9	HITO 7.- Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos y cielo raso) de los pisos del Edificio Matriz INEC, elaborados y entregados.	A.7..pdf	06/07/2016
10	HITO 8.- Informe final sobre el arreglo de los pisos (quinto y séptimo) Edificio Matriz INEC elaborado y entregado.	A.8..pdf	06/07/2016
11	HITO 9.- Informe final sobre el arreglo del piso, Edificio Benalcázar Mil, elaborado y entregado.	A.9..pdf	06/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	HITO CUMPLIDO 10: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborado y aprobado	B.1..pdf	26/08/2016
13	HITO CUMPLIDO 11: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz-INEC, elaborado y aprobado	B.2..pdf	31/08/2016
14	HITO CUMPLIDO 12: Informe final sobre otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	B.3..pdf	15/09/2016
15	HITO CUMPLIDO 13: Acta final de entrega recepción de las adecuaciones del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada.	B.4..pdf	23/09/2016
16	HITO CUMPLIDO 14.- Acta de entrega recepción de las adecuaciones del quinto, séptimo piso del Edificio Matriz INEC, socializada.	B.5..pdf	18/10/2016
17	HITO CUMPLIDO 15: Acta de entrega recepción de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, firmada.	B.6..pdf	31/10/2016
18	PROJECT CHÁRTER PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	#PROJECT_CHARTER_PROYECTO_MEJORAMIENTO_INSTITUCIONAL#.pdf	07/03/2016
19	RESOLUCIÓN N° 117 - PROCESO DE CONTRATACIÓN DECLARADO DESIERTO	RESOLUCIÓN_PROCESO_DE_CONTRATACIÓN_(DESIERTO).pdf	11/05/2016
20	RESOLUCIÓN N° 119 - APROBAR INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	RESOLUCIÓN_APROBAR_INICIO_DEL_PROCESO_DE_CONTRATACIÓN_PÚBLICA.pdf	17/05/2016
21	RESOLUCIÓN N°120 - APROBAR EL PLIEGO DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	RESOLUCIÓN_APROBAR_EL_PLIEGO_DEL_PROCESO_DE_SUBASTA_INVERSA_ELECTRÓNICA.pdf	11/05/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Romero Calderón, Angélica María	Miembro de equipo	Miembro de equipo	AngelicaMaria_Romero@inec.gob.ec	
