

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)

Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida (DEPCV)

PROYECTO: K001 INEC - Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas

Líder del Proyecto:	Gutiérrez, Paola Alexandra (paola_gutierrez@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Titular:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.377625	TIR:	143.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	200,127.73
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	377,591.79
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/10/2014 - 30/06/2016
Fecha de última actualización:	05/05/2015	Fecha de Fin Base:	30/06/2016
Modificado por:	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	15/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto de formulación de métricas nuevas plantea la generación de un nuevo paradigma de métrica del Buen Vivir que permita la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república.

El presente proyecto no cuenta con una línea base como tal; pero sin con ejercicios preliminares que han tratado de expandir la visión tradicional hacia una más integral pero que todavía no conjugan el real significado de la nueva orientación política hacia el Buen Vivir.

Al finalizar del proyecto, esto es dos años, se contará con nuevas métricas del Buen Vivir a disposición de los actores que deseen investigar y tomar decisiones de política pública bajo un nuevo paradigma.

Como principal objetivo el Proyecto busca establecer un conjunto métricas nuevas y alternativas, asociadas al buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, que rompan con los paradigmas tradicionales de información usada para el diseño, monitoreo y evaluación de política pública en sus distintos ámbitos. Entre sus objetivos específicos se encuentran:

- .Establecer la definición de un nuevo paradigma de bienestar, Sumak Kawsay que guíe la construcción de las métricas nuevas y alternativas.
- .Establecer una agenda de desarrollo del conjunto de indicadores de nuevas métricas.
- .Definir el conjunto de indicadores que se basen en un nuevo paradigma de bienestar (incluye esquemas de participación ciudadana: documentos analíticos y metodológicos).
- .Construir los indicadores propuestos en la agenda de desarrollo de las nuevas métricas para del buen vivir.
- .Publicar y difundir los resultados de los nuevos indicadores del buen vivir definidos en los elementos multicriterio que componen el nuevo paradigma de desarrollo.

Beneficios Cualitativos

La generación de un nuevo paradigma de métrica del buen vivir, permitirá la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república.

El presente proyecto es una herramienta que permite el mantenimiento e incremento del capital social en el país, ya que constituye un conjunto de indicadores que dan cuenta de la gestión pública y de cómo ésta apunta a la concreción de una nueva orientación política y de vida: el buen vivir.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo para el presente proyecto corresponde a un subconjunto de la población que debido a sus características, serán los principales demandantes de las nuevas métricas que se desarrollen a partir del proyecto en mención. Entre las principales

Tipo de Beneficiario

características de este grupo se encuentran el hecho de contar con un nivel de instrucción superior o más, que les permitiría estar vinculados a diversas instituciones o realizar actividades de forma independiente, que consideran como insumo fundamental para la toma de decisiones las métricas desarrolladas.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 años.

COSTO: El proyecto demanda de una inversión total de US\$ 722.500,00 a ser financiada con recursos fiscales, durante el período 2014 - 2016.

ALCANCE: Metodologías innovadoras con análisis multicriterio así como generación de nueva producción estadística.

RECURSOS: El proyecto cuenta con 2 personas como parte del equipo técnico.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 34.12 %

Fecha de Inicio: 01/10/2014

Fecha de Fin: 30/06/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	22 %	27 %	31 %	34 %	43 %	46 %	55 %	57 %	59 %	66 %	79 %	81 %
	Avance real acumulado											
	22 %	27 %	31 %	34 %								
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2015 El 13 de abril se concreta la contratación de la experta en técnicas de medición cualitativas (asociado al hito 12), para la formulación del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir. En el marco de la realización de evento internacional de nueva métricas "El Buen Vivir: Mediciones alternativas del buen vivir y el bien - estar", se continuó realizando invitaciones para ponencias, dando como resultado al finalizar la actividad, contar con la confirmación de participación de 11 ponentes internacionales. En este sentido además el 29 de abril se realiza una reunión con el equipo de la Secretaría del Buen Vivir, a fin de coordinar la participación de Bolivia en el evento. En cuanto a la contratación de la empresa para la organización y realización del evento internacional, se solicita a la Dirección de Comunicación a través de Memorando No. INEC-CTIMA-2015-0069-M, la asignación de una mayor cantidad de recursos, en virtud de que se considera oportunamente la incorporación de nuevos temas a discutir dentro del evento, lo cual implica por lo tanto la ampliación del público objetivo, y aumentar el número de ejemplares de	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	05/05/2015 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la publicación "Compendio de experiencias de nuevas medidas del bienestar". La Dirección de Comunicación recibe la aprobación de aumento de recursos a través del Memorando No. INEC-DIPLA-2015-0333 el 30 de abril. Al momento se espera que la Dirección de Comunicación solicite autorización a la Dirección Ejecutiva.		
MARZO 2015 Solicitud de creación de la Comisión Especial emitida por la CTIMA a la CTPES mediante memorando INEC-CTIMA-2015-0033-M del 27 de febrero de 2015. La CTPES remite la solicitud al departamento jurídico el 25 de marzo de 2015 con memorando INEC-CTPES-2015-0059-M. Se espera respuesta de jurídico. (Asociado al hito 10). Solicitud de contratación de profesional cualitativo. Se recibe la autorización de contratación de profesional cualitativo para el diseño de estudios en campo por parte del Director Ejecutivo mediante memorando INEC-DIREJ-2015-0104-M del 13 de marzo de 2015. El 16 de marzo de 2015 se realiza la solicitud de contratación a Coordinación Administrativa con Memorando Nro. INEC-CTIMA-2015-0048-M. El 26 de marzo de 2015 se realiza un alcance a la solicitud ajustando la contratación a la escala de 20 grados del Ministerio de Relaciones Laborales. (Asociado al hito 12). Reunión virtual con Sabina Alkire, economista británica, creadora del índice de pobreza multidimensional para recibir retroalimentación de los avances realizados en el INEC en lo relacionado con la medición de la pobreza multidimensional. (Asociado al hito 11). Invitaciones a participar en el evento internacional de nuevas métricas realizadas a los ponentes internacionales. Se enviaron 12 invitaciones, se recibieron 6 respuestas, de las cuales 4 fueron afirmativas. El 1 de abril de 2015 se recibe la aprobación de lineamientos de comunicación por parte del Director Ejecutivo con memorando INEC-DIREJ-2015-0130-M, lo que faculta a la Dirección de Comunicación a realizar la contratación de una empresa para la organización y realización del evento internacional. CTIMA envía a Comunicación los términos de referencia técnicos para la contratación de dicha empresa. (Asociado al hito 15). Elaboración hoja de ruta para firma de convenio específico con la Universidad de Cuenca. Considerando la experticia de PYDLOS, instituto de investigación de la Universidad de Cuenca, se decide realizar los estudios cualitativos en territorio con PYDLOS. Para ello se realiza la solicitud de firma de convenio específico a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2015-0052-M del 25 de marzo de 2015. (Asociado al hito 13)	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	05/05/2015 - 02:38 PM
FEBRERO de 2015 1. En el marco de la conformación de la Red Académica sobre métricas y estudios del Buen Vivir se realizaron las siguientes actividades: a. Se suscribieron los convenios inter-institucionales con la Universidad San Gregorio de Manabí y la Universidad de Cuenca en el Azuay. En el marco de estos convenios se establecen las alianzas para la generación de red académica. (Hito cumplido 9) b. Se realizó un encuentro en Cuenca con el Centro de Investigaciones PYDLOS, de la Universidad de Cuenca a fin de conocer las investigaciones que se desarrollan sobre métricas del bienestar, Buen Vivir y aplicabilidad de estudios a nivel territorial. Adicionalmente, se estableció una agenda de trabajo en la que se considera al centro PYDLOS como principal aliado en la Zona Sur para estudios cualitativos y cuantitativos en nuevas métricas del Bienestar. (Hito cumplido 9) c. Como parte del fortalecimiento de redes y espacios académicos se vinculó al los diálogos estadísticos dos ponentes relevantes para nuevas métricas como fue Pablo Dávalos y Mauricio León, en lo referente al Buen Vivir y su definición. Este proceso permite socializar y generar espacio de discusión entre los hacedores de métricas de la Institución. 2. Inicio de la definición contractual del profesional especializado en metodologías cualitativas (Hito asociado 8). 3. Definición del Plan de actividades para la conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir y requerimiento enviado a las autoridades para aprobación. (Hito asociado 10) El experto del Proyecto de Nuevas Métricas presentó el documento analítico sobre las corrientes de pensamiento existentes en el país sobre el Buen Vivir. (Hito asociado 13) ENERO de 2015 1. Análisis de las experiencias nacionales a partir de los resultados obtenidos en el taller nacional de nuevas métricas. Se analizaron los enfoques neomarxistas, post modernistas e indigenistas para conceptualizar el Buen Vivir y sus posibles dimensiones. (HITO CUMPLIDO N.6)	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	06/04/2015 - 09:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Elaboración de la lista de expertos internacionales sobre nuevas métricas de Bienestar, identificando los ejes de aplicación para el análisis de bienestar, los enfoques asumidos. (HITO CUMPLIDO N.7) 3. Preparación de la hoja de ruta y actividades de cooperación inter-institucional en el marco de convenios con instituciones académicas (Hito asociado 9) 4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar.		
DICIEMBRE de 2014 1. Realización del Taller Nacional de Nuevas Métricas el 2 y 3 de Diciembre. En este Taller se contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales quienes presentaron, desde diferentes enfoques el nuevo paradigma del Buen Vivir y sus diferentes formas de medirlo. Así mismo se contó con la participación de mas de cien personas entre académicos, analistas técnicos de instituciones públicas, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil. (HITO CUMPLIDO N. 5) 2. Finalización del proceso contractual con la empresa que se encargó del desarrollo logístico del evento. Esta fase comprendió la suscripción de actas entrega recepción finales, entrega de productos y proceso administrativo para ejecución del pago respectivo. (HITO CUMPLIDO N. 5) 3. Preparación de los documentos requeridos para la suscripción de convenios con instituciones académicas así como el diseño de objetivos y plan de trabajo para conformar la Comisión Estadística Especial para la Construcción de Nuevas Métricas del Buen Vivir. (documentos preparatorios para cumplir con el HITO 9) 4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar. NOVIEMBRE de 2014 1. Incorporación de un nuevo miembro al equipo de Nuevas Métricas. Con esta actividad queda conformado el equipo de trabajo con un experto y dos analistas. (HITO CUMPLIDO N. 3) 2. Coordinación logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas del Buen Vivir a desarrollarse el 2 y 3 de diciembre. Esta actividad comprende el proceso de contratación para el desarrollo del evento de nuevas métricas, coordinar con los ponentes para que las presentaciones respondan a los objetivos planificados. (HITO CUMPLIDO N. 4) 3. Incorporación del Experto en operativización para la medición del Buen Vivir (HITO CUMPLIDO N. 2). 4. Elaboración y planificación de actividades 2014 y 2015 para ejecución del Proyecto. OCTUBRE de 2014: 1. Inicia la planificación del Taller Nacional "El Buen Vivir, construyendo métricas" con el diseño de la agenda del taller y elaboración de términos de referencia para iniciar la contratación respectiva. En esta actividad se estableció como prioritario integrar en la agenda a los principales exponentes del ámbito académico que trabajan el Buen Vivir en sus espacios de investigación y político que han logrado posicionar en la agenda pública el paradigma del Buen Vivir. (HITO CUMPLIDO N. 1). 2. Preparación de los términos de referencia e inicio del proceso de contratación del experto en Operativización para la medición del Buen Vivir. (guarda relación con el HITO 2) 3. Se realizó la gestión para la contratación de otro miembro de equipo para iniciar la ejecución del Proyecto de Nuevas Métricas (guarda relación con el HITO 3). AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2014: 1. El proyecto "Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas" fue priorizado por SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0806-OF del 12 de agosto de 2014. 2. Se aprobaron los lineamientos del proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva. Allí se explicita la partida presupuestaria para uso de los recursos. 3. El 22 de septiembre se realiza la contratación del primer miembro del equipo para ejecución del Proyecto.	Grijalva Tarapuez, Juan Francisco	05/02/2015 - 12:41 PM

[Problemas cerrados: 1](#)

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. * General. El retraso en los procesos contractuales CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto.	21/04/2015	Paola Alexandra Gutiérrez	10 %	30	3	0/1
2	4- ORGANIZACIONAL. Social / Laboral. La falta de interés en la comunidad académica por las nuevas métricas CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	17/04/2015	Paola Alexandra Gutiérrez	10 %	10	1	0/1
3	5- PROYECTO. Alcance. la falta de data disponible para el cálculo de nuevas métricas CAUSARÍA retrasos en la ejecución del proyecto.	21/04/2015	Paola Alexandra Gutiérrez	20 %	10	2	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas elaborada.	4-Inicio de Trabajo	17/10/2014		17/10/2014		Sí	3.0
2	EJECUCIÓN: Gestión para conformación del equipo técnico y experto en nuevas métricas realizada.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2014		31/10/2014		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Equipo de trabajo consolidado	4-Inicio de Trabajo	04/11/2014		04/11/2014		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Coordinación logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas implementada	4-Inicio de Trabajo	29/11/2014		29/11/2014		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado	4-Inicio de Trabajo	03/12/2014		03/12/2014		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre la conceptualización del Buen Vivir y experiencias nacionales en métricas alternativas elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/01/2015		09/01/2015		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Referentes nacionales e internacionales relacionados con métricas alternativas del bienestar identificados.	5-Entregables Intermedios	29/01/2015		29/01/2015		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Proceso contractual de experto en técnicas de medición cualitativas iniciado	2-Publicación de Pliegos	17/02/2015		17/02/2015		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Red Académica para la construcción de nuevas métricas conformada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Solicitud de conformación de Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas enviada	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Videoconferencia con expertos internacionales realizada	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Estudio de la definición de dimensiones del Buen Vivir para la construcción de nuevas métricas iniciado.	4-Inicio de Trabajo	15/05/2015	15/05/2015			No	3.0
14	EJECUCIÓN: Taller de trabajo con la red académica para la construcción de nuevas métricas realizado.	5-Entregables Intermedios	16/05/2015	16/05/2015			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Propuesta del sistema de indicadores del Buen Vivir elaborada	5-Entregables Intermedios	30/05/2015	30/05/2015			No	4.0
16	EJECUCIÓN: Organización logística y técnica del Taller Internacional de Nuevas Métricas elaborada.	4-Inicio de Trabajo	01/06/2015	01/06/2015			No	3.0
17	EJECUCIÓN: Taller Internacional de Nuevas Métricas realizado	5-Entregables Intermedios	03/07/2015	03/07/2015			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	4.0
19	EJECUCIÓN: Proceso contractual de experto en técnicas de medición cuantitativas iniciado - 1	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	31/08/2015			No	2.0
20	EJECUCIÓN: Proceso contractual de experto en técnicas de medición cuantitativas iniciado - 2	4-Inicio de Trabajo	28/09/2015	28/09/2015			No	2.0
21	EJECUCIÓN: Presentación de las dimensiones preliminares del Buen Vivir a partir de estudios cualitativos	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	3.0
22	EJECUCIÓN: Socialización de las dimensiones con la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas y con la Red de estudios del Buen Vivir realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Metodología de indicadores para las dimensiones elaborada.	5-Entregables Intermedios	02/11/2015	02/11/2015			No	2.0
24	EJECUCIÓN: Informe técnico sobre la información disponible para la generación de indicadores elaborado	5-Entregables Intermedios	06/11/2015	06/11/2015			No	3.0
25	EJECUCIÓN: Equipo técnico en nuevas métricas capacitado.	5-Entregables Intermedios	11/11/2015	11/11/2015			No	3.0
26	EJECUCIÓN: Propuesta metodológica de indicadores en la Comisión estadística para validación, socializada	5-Entregables Intermedios	23/11/2015	23/11/2015			No	5.0
27	EJECUCIÓN: Taller de trabajo con la red académica para la validación de la propuesta de indicadores realizado.	5-Entregables Intermedios	02/12/2015	02/12/2015			No	2.0
28	EJECUCIÓN: Propuesta de indicadores con información disponible calculados	5-Entregables Intermedios	02/01/2016	02/01/2016			No	4.0
29	EJECUCIÓN: Documento técnico metodológico de los indicadores que requieren nueva data elaborado.	5-Entregables Intermedios	05/02/2016	05/02/2016			No	2.0
30	EJECUCIÓN: Documento técnicos y metodológico de nuevas métricas revisados y aprobados para validación y difusión	5-Entregables Intermedios	06/06/2016	06/06/2016			No	5.0
31	CIERRE: Nuevas métricas del Buen Vivir publicadas.	9-Entregables Formales	30/06/2016	30/06/2016			No	3.0
32	EJECUCIÓN: Nuevas métricas del Buen vivir difundidas.	9-Entregables Formales	30/06/2016	30/06/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en el diseño de construcción de nuevas métricas del buen vivir		100.00 %	0.444	0.444	01/10/2014	Ene-Mar
2	Porcentaje de incremento en el diseño de metodologías para la construcción las nuevas métricas del buen vivir.		0.00 %	0.2727	0	01/10/2014	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	377,591.79 **
Costo Total:	722,500.00
Total Devengado:	93,744.57
% Costo Total Devengado:	12.98 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 12.98 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
Ppto. Codificado	63,431.69	314,160.10	0.00	377,591.79
Ppto. Comprometido	63,431.69	30,312.88	0.00	93,744.57
Planeado - Codificado (2015)		125,839.90		
Programado a Devengar	63,431.69	314,160.10	0.00	377,591.79
Ppto. Devengado	63,431.69	30,312.88	0.00	93,744.57
Estimado a fin de año	* 63,431.69	0.00	0.00	63,431.69
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	314,160.10	0.00	314,160.10
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	9.65 %	0.00 %	24.83 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

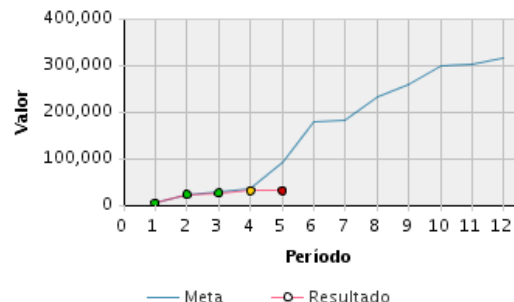

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	3,675.47	3,675.46	3,675.47	3,675.46	100.00 %		1.17 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	19,441.09	19,251.86	23,116.56	22,927.32	99.18 %		7.30 %
Mar	3,954.69	3,345.41	27,071.25	26,272.73	97.05 %		8.36 %
Abr	6,671.94	4,040.15	33,743.19	30,312.88	89.83 %		9.65 %
May	59,258.29	0.00	93,001.48	30,312.88	32.59 %		9.65 %
Jun	85,875.01		178,876.49				
Jul	3,954.69		182,831.18				
Ago	47,225.36		230,056.54				
Sep	29,767.62		259,824.16				
Oct	38,000.51		297,824.67				
Nov	5,397.53		303,222.20				
Dic	10,937.90		314,160.10				
Total	314,160.10	30,312.88					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar la operatividad en la generación de métricas para el Buen Vivir MEDIANTE conformación de grupos de trabajo, alianzas estratégicas, y generación de espacios de difusión

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de constitución del Proyecto	B1.pdf	28/04/2015
2	Acta de reunión de la videoconferencia realizada con expertos. (Asociada al hito 11)	B7.pdf	28/04/2015
3	Agenda del taller Buen Vivir, asociado al hito 1 (Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas)	A1.pdf	28/04/2015
4	Conformación del Equipo técnico. Contratación experto en nuevas métricas. (Asociado al hito 2)	A2.pdf	28/04/2015
5	Consolidación del Equipo Técnico. Contrataciones. (Asociado al hito 3)	A3.rar	28/04/2015
6	Contrato para la Coordinación Logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas. (Asociado al hito 4)	A4.pdf	28/04/2015
7	Documento de priorización del Proyecto de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas	B2.pdf	28/04/2015
8	Documento del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir_Preliminar. (Asociado al hito 12)	B9.pdf	05/05/2015
9	Fortalecimiento de la Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad de Cuenca. (Asociado al hito 9)	A9.pdf	28/04/2015
10	Fortalecimiento Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí. (Asociado al hito 9)	B5.pdf	28/04/2015
11	Informe de gestión TDR's profesional especializado en metodología cualitativa. (Asociado al hito 8)	A8.pdf	28/04/2015
12	Listado de expertos y referentes internacionales de métricas alternativas de Bienestar. (Asociado al hito 7)	A7.pdf	28/04/2015
13	Proyecto aprobado por SENPLADES	B3.pdf	28/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	Registro de asistencia al Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado. (Asociado al hito 5)	A5.rar	28/04/2015
15	Riesgo 2, acción 1. Contratación.	B4.pdf	28/04/2015
16	Sistematización Evento Nuevas Métricas, Experiencias Nacionales (Asociado al hito 6)	A6.pdf	28/04/2015
17	Solicitud de conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir. (Asociado al hito 10)	B6.pdf	28/04/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Guayasamin Albuja, Diana Carolina	Miembro de equipo
Gutiérrez, Paola Alexandra	Analista de Proyecto
