

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Cartografía Estadística (DICA)

PROYECTO: K004 INEC- Proyecto de Actualización de la información Cartográfica Estadística 2010 del INEC

Líder del Proyecto:	Meza Moreno, Aldana geomara (aldana_meza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA 2010 DEL INEC
Titular:	Valle Piñuela, Rosa Catalina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.374240	TIR:	7.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	5,285,849.11
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,855,641.22
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/01/2014 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	06/07/2015	Fecha de Fin Base:	27/02/2015
Modificado por:	Meza Moreno, Aldana geomara	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: El contar con la Cartografía Digital mejorada (coberturas censales), tendrá beneficio para el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares del Sistema Estadístico Nacional y para las Instituciones públicas , privadas y educativas usuarias de la Información Cartográfica Estadística del INEC.

PRODUCTO: Cartografía Digital Actualizada

LINEA BASE:

- . Información Cartográfica Estadística del Censo de Población y Vivienda 2010
- . Información base del IGM escala 1:50.000 y 1:5.000
- . Información de Orto-fotografías del SIGTIERRAS

OBJETIVO GENERAL :

Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- . Fortalecer la Estructura Base Tecnológica que permite la realización de operativos de actualización cartográfica y de listados de viviendas y jefes de hogar en línea y mediante acceso WEB.
- . Concluir con la actualización de las coberturas digitales de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC (zonas, sectores, manzanas censales) a través del ajuste de las mismas a la Ortofotografía entregada por SIGTIERRAS y Cartografía Base 1:5.000 elaborada por el IGM, y generar nuevas coberturas digitales de información referente a los edificios del área amanzanada.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a la actualización de la Información Cartográfica Estadística del INEC y ponerla a disposición de los usuarios tanto internos como externos.

Tipo de Beneficiario

Interno y Externo

Restricciones

ALCANCE: El no contar con todas las ortofotos (fotografía aérea rectificadas y georeferenciadas) del país para realizar el ajuste de los sectores.

Restricciones

TIEMPO: El tiempo del proyecto es de dos años, hasta finales del año 2015

COSTO: \$900.000

RECURSOS: Personal técnico contratado y personal operativo contratado

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 75.55 %

Fecha de Inicio: 03/01/2014

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

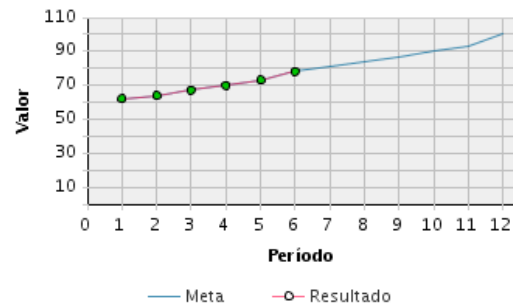

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	62 %	64 %	67 %	70 %	73 %	78 %	81 %	84 %	87 %	90 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	62 %	64 %	67 %	70 %	73 %	78 %						
2015	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2015: 1.- Se realizó la actualización de 72 sectores que se encuentran programados para este período (Hito 21) 2.-Supervisión de la Actualización en campo y Digitalización Cartográfica en Zonales 3.-Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 4.-Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5.-Solventar inconvenientes que se presentan al momento de descargar la información tanto a las Tablets como al servidor. 6.-Elaboración de indicadores de avance de operativo de campo y digitalización	Meza Moreno, Aldana geomara	06/07/2015 - 10:25 AM
MAYO 2015: 1.- Se realizó la actualización de 70 sectores que se encuentran programados para este período (Hito 20) 2.-Supervisión de la Actualización en campo y Digitalización Cartográfica en Zonales 3.-Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 4.-Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5.-Solventar inconvenientes que se presentan al momento de descargar la información tanto a las Tablets como al servidor. 6.-Al momento de verificar la información en el servidor se detecta que sube información considerada como basura por lo que DIRAD genera un scripts que borra esa información en la base.	Meza Moreno, Aldana geomara	05/06/2015 - 10:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7. Revisión del módulo de cartografía en las jornadas 8 y 9 con las Coordinaciones Zonales para determinar observaciones y mejoras del mismo. 8.-Elaboración de indicadores de avance de operativo de campo y digitalización		
FEBRERO 2015: 1. Se consolidó la información de la geodatabase zonales en un sola geodatabase nacional. 2. Se revisó la codificación de las capas censales que conforman la geodatabase nacional.. 3. Se realizó una reunión con las Coordinaciones Zonales para la consolidación de las memorias técnicas del proyecto. 4. Se realizó la recopilación de información anexa para las memorias técnicas. MARZO 2015: 1.-Supervisión de la Actualización Cartográfica en campo en Zonales 2.-Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 3.-Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 4.-Seguimiento de mejoras al Módulo de Edición Cartográfica del Sistema de Marco Maestro 5.-Prueba de gabinete del Módulo de Edición Cartográfica del Sistema de Marco Maestro 6.-Elaboración de indicadores de avance de operativo de campo y digitalización ABRIL 2015: 1.- Se realizo la actualización de 84 sectores que se encuentran programados para este período (Hito 19) 2.-Supervisión de la Actualización Cartográfica en campo en Zonales 3.-Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 4.-Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5.-Seguimiento de mejoras al Módulo de Edición Cartográfica del Sistema de Marco Maestro 6.-Prueba de gabinete del Módulo de Edición Cartográfica del Sistema de Marco Maestro 7.-Elaboración de indicadores de avance de operativo de campo y digitalización	Meza Moreno, Aldana geomara	05/05/2015 - 11:22 AM
ENERO 2015: 1. Se revisó las geodatabases zonales para su posterior unificación en la geodatabase nacional. 2. Se realizó el informe preliminar de las memorias técnicas del proyecto. DICIEMBRE 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 14) 2. Se realizó el informe de cierre del lineamiento del presente año 3. Se consolidó la Geodatabase Zonal en cada una de las Coordinaciones Zonales 4. Se envió a Administración Central las Geodatabases Zonales 5. Se realizó la prueba del sistema para verificar las funcionalidades del módulo de edición cartográfica.	Meza Moreno, Aldana geomara	05/02/2015 - 08:36 AM
NOVIEMBRE 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 13) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Se remitió el informe con los cambios necesarios a ser incorporados en el sistema de edición cartográfica al equipo de desarrollo de la Zonal Centro, el cual analizó las observaciones enviadas por DICA y estableció los factibles y permitidas por la herramienta procediendo a trabajar sobre los mismos, para la realización de la prueba de funcionalidades del sistema se estableció que cada una de las zonales remita un sector amanzanado y uno disperso, los cuales se cargaron en el sistema.	Meza Moreno, Aldana geomara	05/12/2014 - 01:57 PM
OCTUBRE 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 11) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Prueba piloto en el Sistema de Marco Maestro, en Santo Domingo, en conjunto con las 4 zonales, el equipo de administración central y el personal encargado del desarrollo del sistema, en el cual se comprobó el funcionamiento del módulo cartográfico y los requerimientos solicitados	Meza Moreno, Aldana geomara	04/11/2014 - 02:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
inicialmente, encontrando observaciones al mismo en cuanto al funcionamiento por lo que se emitieron ciertas recomendaciones con el fin de mejorarlo, las cuales serán incorporados y remitidas hasta el 25 de Noviembre junto con los manuales respectivos a Administración Central para su respectiva verificación y pruebas.		
SEPTIEMBRE 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 11) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Se revisaron los avances realizados en el módulo de edición cartográfica, conjuntamente con el equipo de desarrollo de la Coordinación Centro, DIRAD y DICA, logrando establecer que se encuentran cumplidos en su mayoría 75%, y se remitieron las novedades encontradas para que sean revisadas antes de la prueba piloto del sistema completo con la finalidad de obtener los mejores resultados. 6. Capacitación en Zonales	Meza Moreno, Aldana geomara	06/10/2014 - 09:49 AM
AGOSTO 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 10) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Se desarrollaron los cambios solicitados e incorporaciones nuevas de la Fase 2 y 3 del Sistema Ingreso de Datos, los cuales se encuentra en la fase de pruebas y revisión, conjuntamente entre el equipo de la Dirección de Registros Administrativos y el de desarrollo de la Zonal Centro, una vez que se encuentren correctos se aprobaran para la incorporación en el sistema de producción. 6. Se siguen programando el Módulo de cartografía de acuerdo a los requerimientos remitidos por la Dirección, se ah verificado el avance mediante revisiones conjuntamente el equipo de cartografía y el de desarrollo, en una máquina de pruebas.	Meza Moreno, Aldana geomara	02/10/2014 - 02:47 PM
JULIO 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 9) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Se realizó una reunión para establecer los inconvenientes presentados en las primeras jornadas de actualización cartográfica con el uso del sistema con tablets, en la cual se estableció que aún existen varios inconvenientes con el mismo, para lo cual se definieron 4 fases para la incorporación de observaciones y requerimientos a los sistemas. 6. Verificación y corrección de viviendas y correspondencias duplicadas con Zonales. 7. Validación de sectores con viviendas cero (sin viviendas).	Meza Moreno, Aldana geomara	06/08/2014 - 11:23 AM
JUNIO 2014: 1. Se realizo el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 7) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Coordinación con zonales de las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización 5. Elaboración del Adendum 4 6. Se realizó el informe de la prueba piloto (Hito8) 7. Se inició con la configuración e instalación del aplicativo en los dispositivos tablets y portátiles del personal de actualización cartográfica de campo, en las respectivas coordinaciones zonales. 8. Se solicitó el acceso al Sistema de Seguimiento y los reportes necesarios para poder revisar el avance del proceso en las diferentes etapas, lo cual aún no ha sido solventado, pero el sistema para levantamiento de información alfanumérica en campo se encuentra casi concluido debido a las novedades que se puedan ir presentando en el operativo y a que no pudo ser probado antes de ser puesto en producción.	Meza Moreno, Aldana geomara	04/08/2014 - 10:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
9. El sistema de Actualización Cartográfica en dispositivos móviles ha presentado problemas en algunas funcionalidades ya en el operativo real de campo, lo cual se ha ido intentando solventar en conjunto con el equipo de desarrollo y se han ido remitiendo actualizaciones del aplicativo.		
MAYO 2014: 1. Se realizó el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 6) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. 4. Verificación y corrección de correspondencia de viviendas de seguimiento. 5. Se realizó la coordinación requerida entre el personal de DITIC y la Zonal Centro para las asignación de un servidor virtual dentro de la red INEC, en el cual se procedió a instalar y configurar el sistema de Marco Maestro el mismo que sería utilizado en el operativo cartográfico de junio. 6. Se remitieron las funcionalidades analizadas al coordinador técnico de la zonal centro, para que se establezca un cronograma de desarrollo y fecha de entrega. 7. Se realizó la revisión del sistema de seguimiento en conjunto con el equipo zonal de cartografía y se establecieron las observaciones al mismo, adicionalmente no se pudieron probar las novedades al sistema de ingreso de datos requeridas.	Meza Moreno, Aldana geomara	06/06/2014 - 08:32 AM
ABRIL 2014: 1. Se realizó el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito 5) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 4. Se realizó la Prueba Pilo en el cantón Baños del 14 al 17 de abril. 5. Se revisó las novedades remitidas por las unidades de cartografía estadística de las diferentes zonales, y se estableció cuales son factibles de realizar e incorporar en el sistema.	Meza Moreno, Aldana geomara	06/05/2014 - 09:55 AM
MARZO 2014: 1. Se realizó el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito cumplido 4) 2. Supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Direcciones Zonales 3. Verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales 4. Elaboración de manuales para el manejo de tablet para la captura de información en campo 5. Se realizó un flujo de procesos para los perfiles de ENCUESTADOR, SUPERVISOR Y REVISOR, para ser incluidos en el sistema. 6. Se estableció el flujo de comunicaciones más adecuado para la prueba tomando las recomendaciones del Director de la Zonal Centro	Meza Moreno, Aldana geomara	04/04/2014 - 02:08 PM
FEBRERO 2014: - Se realizó el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período (Hito cumplido 2) - Se realizó el listado de requerimientos para el sistema de Actualización Cartográfica (Hito cumplido 3) - Se efectuaron supervisiones a las cuatro Direcciones Zonales para revisar y evaluar el producto que se está obteniendo.	Meza Moreno, Aldana geomara	07/03/2014 - 03:03 PM
ENERO 2014: - Se realizó la contratación del personal de campo y de gabinete que se necesita para la ejecución del Proyecto. - Se realizó una reinstrucción para la generación del producto digital - se consolidó la nómina de personal de Actualización Cartográfica de las 4 Direcciones Zonales (Hito 1)	Meza Moreno, Aldana geomara	06/03/2014 - 09:04 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Recursos. No contar con los recursos adecuados para el desarrollo del Proyecto CAUSARÍA un atraso en el cumplimiento de las metas planificadas.	23/06/2015	Rosa Catalina Valle Piñuela	20 %	50	10	0/1

[Riesgos cerrados: 1](#)

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Personal preseleccionado, capacitado y contratado	4-Inicio de Trabajo	24/01/2014		24/01/2014		Sí	6.0
2	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1941 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	4.0
3	EJECUCIÓN: Levantamiento de requerimientos de mejoras para el Sistema de Actualización Cartográfica para DMC levantados	4-Inicio de Trabajo	28/02/2014		28/02/2014		Sí	4.0
4	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1941 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Prueba Piloto del Sistema de Actualización Cartográfica para DMC realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	4.0
12	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Capas geográficas correspondientes a 1940 sectores ajustados	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		19/12/2014		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: (48) Sectores actualizados	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Memoria Técnica Elaborada Proyecto 2013-2014	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	4.0
17	EJECUCIÓN: (96) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		27/02/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN: (96) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: (84) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	29/05/2015		29/05/2015		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN: Informe elaborado de reuniones de trabajo para conformación de Base Cartográfica Estadística Única	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	3.0
24	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	31/08/2015			No	3.0
25	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	3.0
26	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	3.0
27	EJECUCIÓN: (72) Sectores actualizados	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	3.0
28	.CIERRE: Informe final del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	2.0
29	EJECUCIÓN: (36) Sectores actualizados	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015	31/12/2015			No	3.0
30	EJECUCIÓN: Informe elaborado de la incorporación de capas a Base Cartográfica Estadística Única	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de sectores censales actualizados en campo		101.22 %	4,424	4,478	03/01/2014	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,855,641.22 **
Costo Total:	5,341,251.89
Total Devengado:	4,460,257.03
% Costo Total Devengado:	83.51 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 83.51 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,553,111.06	900,000.00	0.00	5,453,111.06
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,762,961.05	900,000.00	0.00	5,662,961.05
Ppto. Codificado	4,162,555.07	693,129.44	0.00	4,855,684.51
Ppto. Comprometido	4,162,551.78	297,886.25	0.00	4,460,438.03
Planeado - Codificado (2015)		206,870.56		
Programado a Devengar	4,162,551.78	693,129.44	0.00	4,855,681.22
Ppto. Devengado	4,162,511.78	297,745.25	0.00	4,460,257.03
Estimado a fin de año	* 4,162,511.78	0.00	0.00	4,162,511.78
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	40.00	693,129.44	0.00	693,169.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	42.96 %	0.00 %	91.86 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

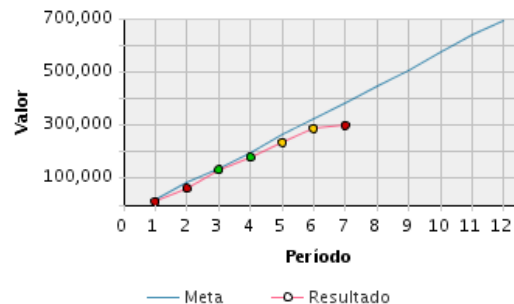

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	19,381.18	12,020.26	19,381.18	12,020.26	62.02 %		1.73 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	62,908.34	51,294.85	82,289.52	63,315.11	76.94 %		9.13 %
Mar	56,167.25	68,451.15	138,456.77	131,766.26	95.17 %		19.01 %
Abr	56,224.40	47,957.33	194,681.17	179,723.59	92.32 %		25.93 %
May	69,290.21	55,916.79	263,971.38	235,640.38	89.27 %		34.00 %
Jun	59,900.41	50,202.68	323,871.79	285,843.06	88.26 %		41.24 %
Jul	59,917.51	11,902.19	383,789.30	297,745.25	77.58 %		42.96 %
Ago	64,168.63		447,957.93				
Sep	57,710.69		505,668.62				
Oct	67,260.29		572,928.91				
Nov	63,160.81		636,089.72				
Dic	57,039.72		693,129.44				
Total	693,129.44	297,745.25					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la calidad en la generación y difusión de la información cartográfica estadística MEDIANTE la actualización y almacenamiento permanente de la información cartográfica del INEC, así como la innovación en mecanismos e instrumentos para su actualización y difusión

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN	A8.pdf	04/06/2014
2	ASOCIACION HITO 1.- NOMINA DE PERSONAL DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A1.pdf	11/02/2014
3	ASOCIACION HITO 10.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B4.pdf	04/09/2014
4	ASOCIACION HITO 11.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B5.pdf	02/10/2014
5	ASOCIACION HITO 12.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B6.pdf	04/11/2014
6	ASOCIACION HITO 13.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B7.pdf	19/12/2014
7	ASOCIACION HITO 14.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B8.pdf	19/12/2014
8	ASOCIACION HITO 15.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B9.pdf	15/04/2015
9	ASOCIACION HITO 16.- MEMORIA TÉCNICA 2013-2014	C1.pdf	15/04/2015
10	ASOCIACION HITO 17.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	C2.pdf	15/04/2015
11	ASOCIACION HITO 18.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	C3.pdf	15/04/2015
12	ASOCIACION HITO 19.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	C4.pdf	11/05/2015
13	ASOCIACION HITO 2.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	A2.pdf	06/03/2014
14	ASOCIACION HITO 20.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	C5.pdf	05/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	ASOCIACION HITO 21.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	C6.pdf	06/07/2015
16	ASOCIACION HITO 22.- INFORME DEL REUNIONES MANTENIDAS Y ACTA DE ENTREGA DE INFORMACION	C7.pdf	06/07/2015
17	ASOCIACION HITO 3.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA	A3.pdf	17/03/2014
18	ASOCIACION HITO 4.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	A6.pdf	03/04/2014
19	ASOCIACION HITO 5.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	A7.pdf	08/05/2014
20	ASOCIACION HITO 6.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	A9.pdf	04/06/2014
21	ASOCIACION HITO 7.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B2.pdf	04/07/2014
22	ASOCIACION HITO 8.- INFORME DE LA PRUEBA PILOTO REALIZADA	B1.pdf	04/07/2014
23	ASOCIACION HITO 9.- INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO	B3.pdf	04/08/2014
24	DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES 2015	C5.pdf	23/06/2015
25	DICTAMEN DE PRIORIZACIÓN DE SENPLADES	A4.pdf	20/03/2014
26	INDICADOR 1.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE SECTORES AJUSTADOS	K004_INEC- _Proyecto_de_Actualización_de_la_información_Cartográfica_Estadística_2010_del_INEC- (ENE-MAR_2014)- INFORME_DE_SEGUIMIENTO_DE_SECTORES_AJUSTADOS.pdf	04/04/2014
27	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE RE ESTRUCTURA DE HITOS Y AMPLIACION DE FECHA 2015	C.6.pdf	12/05/2015
28	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 2010 DEL INEC	A5.pdf	20/03/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Cordova, Jaime Rodrigo	Miembro de Equipo
Guaygua Fonseca, Alexandra Elizabeth	Miembro de Equipo
Meza Moreno, Aldana geomara	Lider del Proyecto
Noguera Trujillo, Milton Rodrigo	Responsable del Proyecto
Ocaña Ocaña, Ninfa Narcisa	Responsable del Proyecto
Valle Piñuela, Rosa Catalina	Directora DICE
