

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K001 INEC - Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - 2013-2014

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (patricio_rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.373353	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,648,298.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	26/12/2011 - 31/03/2015
Fecha de última actualización:	07/04/2015	Fecha de Fin Base:	31/03/2015
Modificado por:	Rivas Villalba, Edwin Patricio	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

De acuerdo a los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Ecuador cuenta con 14'483.499 personas, con 49,6% hombres y 50,4% mujeres.

El 63,2% de la población pertenece al área urbana, con una densidad de 56 habitantes por Km2. El 71,9% de la población se autodefinió como 'mestizo', el 7% como 'indígena', el 7,2% como 'afroecuatoriano, negro, mulato', el 7,4 'montubios' y el 6,1% 'blancos'.

La población que participará en la encuesta será toda la población del país, inmersa en una muestra de 29.052 viviendas que corresponden a 2.421 sectores en los que se investiga 16 viviendas por sector, 12 viviendas originales y 4 de reemplazo. La muestra es probabilística trietápica.

PRODUCTO:

Indicadores
Bases de Datos
Estudio de Pobreza

LÍNEA BASE

La Línea de Base del Proyecto se establece en la información de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV que permite hacer la evaluación y seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los hogares ecuatorianos, así como también investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

OBJETIVO GENERAL:

El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.

Beneficios Cualitativos

Medir el impacto de las medidas de ajuste macroeconómico y las de compensación social que han tenido sobre el nivel de vida de los hogares y de la población ecuatoriana mediante la línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

La distribución y rendimiento de los activos sociales, económicos, políticos e infraestructura están relacionados con la pobreza, por lo que ésta depende del desarrollo y crecimiento económico del País para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. La reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida están influenciadas en la mayoría por los efectos de las medidas que se apliquen.

Tipo de Beneficiario

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.


Restricciones

COSTO
Asignaciones presupuestarias fuera de la planificación o incompletas.
Capacidad de producción operativa nacional y regional en los tiempos solicitados.
TIEMPO
Se deberá concluir hasta marzo 2015.
ALCANCE
Se obtendrá resultados con una desagregación Nacional urbano y rural, incluyendo las Islas Galápagos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 26/12/2011 Fecha de Fin: 31/03/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

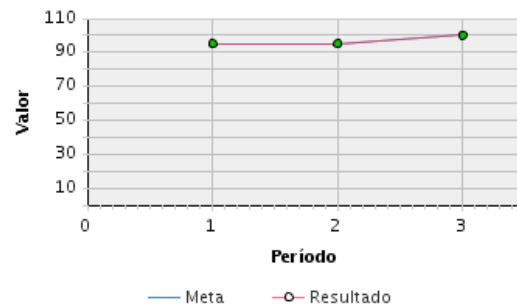

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	100 %	0 %								
	Avance real acumulado											
	95 %	95 %	100 %									
	Estado											
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2015 Hito Cumplido 41. 1. En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECV - Sexta Ronda, una vez concluida la encuesta el equipo técnico de las Coordinaciones Zonales elaboraron la memorias técnicas de cada una, siendo los encargados de recopilar toda esta información los funcionarios del Equipo Técnico ECV de la Administración Central.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/04/2015 - 03:58 PM
FEBRERO 2015 En el mes de febrero de 2015 en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECV - Sexta Ronda, se definio los indicadores de las secciones que conforman la ECV para la publicación de resultados.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/03/2015 - 09:23 AM
ENERO 2015	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/02/2015 - 01:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de enero de 2015 en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECV - Sexta Ronda, se realizaron procesos de validación final de la información en Administración Central. Así también se realizó el procesamiento de tabulados.</p> <p>DICIEMBRE 2014</p> <p>En el mes de diciembre de 2014 en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECV - Sexta Ronda, se realizaron procesos de validación final de la información a nivel de las Coordinaciones Zonales y Administración Central. Así también se realizó el procesamiento de indicadores.</p> <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>En el mes de noviembre de 2014 en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECV - Sexta Ronda, se realizaron procesos de validación final de la información a nivel de las Coordinaciones Zonales para el efecto el equipo técnico de la Encuesta, de Administración Central, se movilizó a las Coordinaciones Zonales.</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>En el mes de octubre de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 12. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 2.425 sectores; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los doce períodos de ejecución del Proyecto.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/11/2014 - 10:43 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>En el mes de septiembre de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 11. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 2.224 sectores; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los once períodos de ejecución del Proyecto.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/10/2014 - 09:05 AM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>En el mes de agosto de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 10. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 2020 sectores; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los diez períodos de ejecución del Proyecto.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/09/2014 - 03:54 PM
<p>JULIO 2014</p> <p>En el mes de julio de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 9. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1819; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los ocho períodos de ejecución del Proyecto.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/08/2014 - 11:56 AM
<p>JUNIO 2014</p> <p>En el mes de junio de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 8. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1616; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los ocho períodos de ejecución del Proyecto.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/07/2014 - 08:18 AM
<p>MAYO 2014</p> <p>En el mes de abril de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 7. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1412 que corresponden</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/06/2014 - 12:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>a 2405 viviendas; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los siete periodos de ejecución del Proyecto.</p> <p>ABRIL 2014</p> <p>En el mes de abril de 2014, en la ECV, se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al periodo 6. El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1227 que corresponden a 14358 viviendas; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los seis periodos de ejecución del Proyecto.</p>		
<p>ABRIL 2014</p> <p>Se levanta la información en campo, se cumplió la fase de crítica - codificación y digitación, correspondiente al periodo 6. (Hito 28)</p>	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/05/2014 - 05:47 PM
<p>MARZO 2014</p> <p>Se elaboró el Plan de Indicadores de la ECV - Sexta Ronda (Preliminar) (Hito 26) Se levanta la información en campo, se cumplió la fase de crítica - codificación y digitación, correspondiente al periodo 5. (Hito 27)</p> <p>FEBRERO 2014</p> <p>Se realizó el proceso de validación de la información correspondiente al primer trimestre de ejecución del proyecto Se levanta la información en campo, se cumplió la fase de crítica - codificación y digitación, correspondiente al periodo 4. (Hito 25)</p> <p>ENERO 2014</p> <p>Se inicia la elaboración del plan de tabulados de la ECV Nacional. Se levanta la información correspondiente al periodo 3.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	07/04/2014 - 02:25 PM
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>Se inicia el levantamiento de la información del periodo 2 a nivel nacional. Procesamiento de la información ECV YACHAY, se realizan los tabulados principales.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	30/01/2014 - 01:42 PM
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>Se inicia el levantamiento, crítica-codificación-digitación de la información. Este proceso estaba planificado iniciarse el 4 de noviembre, sin embargo debido al retraso en el levantamiento de información en YACHAY, genera que se de el 7 de noviembre. Se ejecuta la supervisión nacional en Ambato, Cuenca y Guayaquil para determinar las falencias que tienen los equipos al inicio del operativo.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	23/12/2013 - 12:15 PM
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>Se ejecuta la transmisión de conocimientos a las personas que trabajaran como crítico-codificadores en las Direcciones Zonales. Prueba experimental de la ECV inicia al realizar el levantamiento de la información en Yachay. La impresión de los formularios se retraso debido a cambios que se ejecutaron en el formulario hasta la semana de transmisión de conocimientos, además el proceso de compras públicas es una causa de retraso.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/12/2013 - 11:38 AM
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>Se ejecuta la transmisión de conocimientos al personal preseleccionado como Encuestador 1 y Encuestador 2 en cada una de las Direcciones Zonales Se realiza la capacitación de crítica codificación para los Responsables Zonales.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	31/10/2013 - 02:40 PM
<p>AGOSTO 2013</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/10/2013 - 08:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se envió los formularios y manuales a cada una de las Direcciones Zonales para que prosigan con la reproducción de los mismos. Se ejecuta la capacitación de ECV - Yachay, la misma que es base para la ECV Nacional. Se cuenta con el aplicativo para ingreso de información.		
JULIO 2013 Reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura y Banco Central para definir la sección de Actividades Agropecuarias. Reunión con Banco Mundial para definir la sección de Bienestar Psicosocial. Se ejecutó el taller de socialización de la Encuesta de Condiciones de Vida para homologar criterios y metodología con la que se trabajará. En relación a la prueba piloto ejecutada la última semana de Junio 2013, se realizó en la ciudades de Santo Domingo, Puyo e Ibarra.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/09/2013 - 03:37 PM
JUNIO 2013 Los lineamientos se aprobaron por parte de la Dirección Ejecutiva el 11 de junio del año en curso. Se realizó la prueba piloto de la Encuesta de Condiciones de Vida durante la semana del 24 al 30 de junio. Ajuste del formulario de la ECV.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/07/2013 - 10:58 AM
MAYO 2013 Se mantuvo reunión con el Ministerio de Salud para determinar situaciones de la Sección 3 del Formulario. Reunión SENPLADES y MIDUVI para socializar el formulario del proyecto ECV. Reunión con el Banco Mundial para analizar inclusión de preguntas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/06/2013 - 09:14 AM
ABRIL 2013 Se mantuvieron reuniones con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Senescyt y Senplades. Se elaboraron los lineamientos del proyecto ECV. Se diseño el formulario preliminar para la ECV 2013 - 2015.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	15/05/2013 - 11:41 AM
MARZO 2013 Se mantuvieron reuniones interinstitucionales con el BCE, MCDS, MSP, Ministerio de Coordinación de la Política Económica MCPEC para actualizar las preguntas y variables del formulario. FEBRERO 2013 Se elaboraron las secciones del formulario. Concertaciones con usuarios externos. Inicio de la elaboración de los lineamientos. Investigación de la metodología internacional que se aplica en las ECV ENERO 2013 Se reinician las actividades con un nuevo equipo de trabajo DICIEMBRE 2012 Las actividades se postergan para el 2013 La Dirección de Estadísticas Sociodemográficas mantuvo una reunión con el señor Director Ejecutivo del INEC para definir una sesión exclusiva y tratar el tema de ECV-sexta ronda. Cambio de Autoridades en el INEC. NOVIEMBRE 2012 Por la complejidad de la investigación es necesario reformular los hitos. La Dirección de Metodología DINME no ha diseñado aún la muestra con la que debe contar la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas para la continuación de las demás actividades. Entre las Direcciones involucradas se realizaron algunas reuniones semanalmente con el fin de elaborar una presentación para socializar el proyecto a SENPLADES y luego a las demás Instituciones del Estado. El 1° de noviembre se realizó en DINME la reunión de trabajo con las Diferentes Direcciones del INEC y se acordó elaborar una presentación del proyecto actual para SENPLADES con el nuevo cronograma. OCTUBRE 2012 El miércoles 24 de octubre DINME realizó una reunión de trabajo para definir el criterio como Institución y elaborar la muestra, consta en actas, la misma que entregarían una preliminar para mediados de noviembre y se replantearía el cronograma de actividades.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	18/04/2013 - 02:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En la Unidad de estadísticas de Hogares se elaboró el Lineamiento borrador del proyecto sin el la implementación de la muestra, insumo principal para la elaboración del nuevo presupuesto.</p> <p>Se solicitó a DINME el 9 de octubre se conforme la comisión interinstitucional con el fin de analizar los nuevos parámetros que tendría la ECV 2013-2014</p> <p>SEPTIEMBRE 2012</p> <p>Se solicitó a la Dirección de Normativas y Metodologías se elabore la muestra definitiva de la ECV-Sexta Ronda y que se nos proporcione los parámetros metodológicos, muestrales y alcance que tendrá la ECV.</p> <p>Se realizó una reunión con DINME para la definición de los parámetros de la ECV.</p> <p>Se comenzó a elaborar un primer borrador de lineamiento del proyecto, primera fase.</p> <p>AGOSTO 2012</p> <p>Proyecto y presupuesto definido con SENPLADES</p> <p>JULIO 2012</p> <p>JUNIO 2012</p> <p>Definición del alcance y los objetivos para enmarcarse en el calendario estadístico nacional.</p> <p>Se elaboró el proyecto de la ECV para ser enviado a DIPLA.</p>		

Problemas cerrados: 3

Riesgos cerrados: 3

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Alcance definido	1-Solicitud de Información	22/06/2012		22/06/2012		Sí	1.0
2	ANTEPROYECTO: Objetivos definidos	1-Solicitud de Información	25/06/2012		25/06/2012		Sí	1.0
3	ANTEPROYECTO: Cronograma de actividades definido	1-Solicitud de Información	26/06/2012		26/06/2012		Sí	2.0
4	ANTEPROYECTO: Proyecto enviado a DIPLA	1-Solicitud de Información	29/06/2012		29/06/2012		Sí	3.0
5	ANTEPROYECTO: Recursos definidos	1-Solicitud de Información	15/08/2012		15/08/2012		Sí	2.0
6	DEFINICIÓN: Actividades de prelevantamiento iniciadas	1-Solicitud de Información	02/01/2013		02/01/2013		Sí	2.0
7	DEFINICIÓN: Tamaño muestral presentado por DINME	1-Solicitud de Información	29/03/2013		08/04/2013		Sí	2.0
8	DEFINICIÓN: Lineamientos elaborados	1-Solicitud de Información	15/04/2013		23/04/2013		Sí	3.0
9	DEFINICIÓN: Formulario elaborado	1-Solicitud de Información	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
10	DEFINICIÓN: Proyecto ECV socializado	1-Solicitud de Información	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
11	DEFINICIÓN: Plan de validación diseñado	1-Solicitud de Información	14/05/2013		14/05/2013		Sí	3.0
12	DEFINICIÓN: Manuales elaborados	1-Solicitud de Información	17/05/2013		17/05/2013		Sí	3.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	PLANIFICACIÓN: Lineamientos aprobados por Dirección Ejecutiva	1-Solicitud de Información	15/06/2013		11/06/2013		Sí	3.0
14	PLANIFICACIÓN: Prueba piloto ejecutada	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
15	PLANIFICACIÓN: Distribución Espacial y temporal de la muestra entregada	1-Solicitud de Información	26/07/2013		05/08/2013		Sí	3.0
16	PLANIFICACIÓN: Instrumentos de investigación reproducidos	1-Solicitud de Información	30/08/2013		01/11/2013		Sí	3.0
17	PLANIFICACIÓN: Materiales y bienes adquiridos	1-Solicitud de Información	14/10/2013		14/10/2013		Sí	5.0
18	PLANIFICACIÓN: Entrega de M y C iniciado	1-Solicitud de Información	15/10/2013		25/10/2013		Sí	2.0
19	PLANIFICACIÓN: Capacitación y selección de personal para la encuesta ejecutado	1-Solicitud de Información	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Crítica - Codificación - Digitación de la información iniciado	1-Solicitud de Información	04/11/2013		07/11/2013		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Levantamiento de la información encuesta nacional iniciada	1-Solicitud de Información	04/11/2013		07/11/2013		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Validación de la información mensual iniciada	1-Solicitud de Información	02/12/2013		02/12/2013		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Elaboración de Plan de tabulados iniciado	1-Solicitud de Información	03/01/2014		04/01/2014		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 3 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 4 ejecutada	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN Elaboración de Plan de indicadores iniciado	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 5 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	3.0
28	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 6 ejecutada	1-Solicitud de Información	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 7 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/05/2014		31/05/2014		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN Elaboración de agregados ejecutado	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN Procesamiento de la información para entrega de resultados preliminar semestral iniciada	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 8 ejecutada	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 9 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 10 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/08/2014		31/08/2014		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 11 ejecutada	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: levantamiento, crítica - codificación de la información periodo 12 ejecutada	1-Solicitud de Información	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Elaboración de Plan de tabulados finalizado	1-Solicitud de Información	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.0
38	CIERRE: Base de Datos Entregada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN Validación de la información final iniciada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
40	CIERRE: Procesamiento de la información para la publicación general Iniciada	1-Solicitud de Información	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0
41	CIERRE: Informes y memorias ECV entregados	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de la Encuesta de Condiciones de Vida		-	-	-	01/01/2014	-
2	Porcentaje de construcción para la línea de base de pobreza		100.00 %	1	1	01/01/2014	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,648,298.00 **
Costo Total:	6,132,025.54
Total Devengado:	7,648,298.00
% Costo Total Devengado:	124.73 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 124.73 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,473,527.74	0.00	0.00	6,473,527.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	5,740,042.63	0.00	0.00	5,740,042.63
Ppto. Codificado	7,860,304.69	0.00	0.00	7,860,304.69
Ppto. Comprometido	5,552,176.03	0.00	0.00	5,552,176.03
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	7,716,547.43	0.00	0.00	7,716,547.43
Ppto. Devengado	7,648,298.00	0.00	0.00	7,648,298.00
Estimado a fin de año	* 7,648,298.00	0.00	0.00	7,648,298.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	68,249.43	0.00	0.00	68,249.43
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.12 %	0.00 %	0.00 %	99.12 %
Ppto. Codificado 998	181,183.69	0.00	0.00	181,183.69
Ppto. Devengado 998	181,183.69	0.00	0.00	181,183.69

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE elaboración de metodologías, la automatización de los procesos, diseño e implementación de proyectos de investigación sociodemográficos.
----	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN	Acta_de_constitución.pdf	10/01/2014
2	ASOCIACION RESUMEN EJECUTIVO: INDICADORES PARA PUBLICACIÓN	C.2_INDICADORES_PARA_PUBLICACIÓN.pdf	05/03/2015
3	ASOCIACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD	A.7.pdf	08/05/2014
4	ASOCIACIÓN HITO 10: Proyecto ECV socializado	INEC-DIREJ-2013-0259-M(7).pdf	02/05/2013
5	ASOCIACIÓN HITO 11: Plan de Validación preliminar	Plan_de_Inconsistencias_ECV-13_preliminar.pdf	31/05/2013
6	ASOCIACIÓN HITO 12: Manual elaborado preliminar	Manual_ECV_Sexta_Ronda_preliminar.pdf	31/05/2013
7	ASOCIACIÓN HITO 13: Lineamientos aprobados por Dirección Ejecutiva	INEC-DIREJ-2013-0455-M.pdf	01/07/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	ASOCIACIÓN HITO 14: Prueba piloto ejecutada	INEC-DIPLA-2013-0353-M.pdf	01/07/2013
9	ASOCIACIÓN HITO 15: Distribución espacial y temporal de la muestra entregada	INEC-DINME-2013-0314-M.pdf	06/08/2013
10	ASOCIACIÓN HITO 15: Distribución espacial y temporal de la muestra entregada	Solicitud_de_información.pdf	06/08/2013
11	ASOCIACIÓN HITO 17.- Materiales y bienes adquiridos	oficina.pdf	05/11/2013
12	ASOCIACIÓN HITO 18: Entrega de M y C iniciado	myc.pdf	31/10/2013
13	ASOCIACIÓN HITO 19: Capacitación y selección de personal para la encuesta ejecutado	Personal_litoral.pdf	05/11/2013
14	ASOCIACIÓN HITO 1: Alcance definido	3_Marco_Lógico_-_ECV-2013_Stalin_1c.xls	06/08/2013
15	ASOCIACIÓN HITO 22: Plan de validación mensual	PLAN_DE_VALIDACIÓN_MENSUAL.pdf	24/03/2014
16	ASOCIACIÓN HITO 23: Propuesta del Plan de tabulados (preliminar)	A.1.pdf	25/03/2014
17	ASOCIACIÓN HITO 24: Ejecución de la ECV hasta período 3	A.2.pdf	25/03/2014
18	ASOCIACIÓN HITO 25: Ejecución de la ECV hasta período 4	A.3.pdf	25/03/2014
19	ASOCIACIÓN HITO 26: Indicadores ECV - Sexta Ronda (Preliminar)	A.4.pdf	07/04/2014
20	ASOCIACIÓN HITO 27: Ejecución de la ECV hasta período 5	A.5.pdf	07/04/2014
21	ASOCIACIÓN HITO 28: Ejecución de la ECV hasta período 6	A.6.pdf	09/05/2014
22	ASOCIACIÓN HITO 29: Ejecución de la ECV hasta período 7	A.8.pdf	06/06/2014
23	ASOCIACIÓN HITO 2: Objetivos definidos	3_Marco_Lógico_-_ECV-2013_Stalin_1c.xls	06/08/2013
24	ASOCIACIÓN HITO 30: Elaboración del Agregado	A.9.pdf	07/07/2014
25	ASOCIACIÓN HITO 31: RESULTADOS PRELIMINARES -INDICADORES PRIMER SEMESTRE-	B.1.pdf	08/07/2014
26	ASOCIACIÓN HITO 32: Ejecución de la ECV hasta período 8	B.2..pdf	08/07/2014
27	ASOCIACIÓN HITO 33: Ejecución de la ECV hasta período 9	B.3..pdf	06/08/2014
28	ASOCIACIÓN HITO 34: Ejecución de la ECV hasta período 10	B.4..pdf	04/09/2014
29	ASOCIACIÓN HITO 35: Ejecución de la ECV hasta período 11	B.5..pdf	06/10/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 36: Ejecución de la ECV hasta período 12	B.6..pdf	05/11/2014
31	ASOCIACIÓN HITO 37: Plan de tabulados ECV (preliminar)	B.7..pdf	08/12/2014
32	ASOCIACIÓN HITO 38: Acta de entrega - recepción de la base de datos ECV	B.8..pdf	06/01/2015
33	ASOCIACIÓN HITO 39: Plan de Inconsistencias - validación de datos final iniciada	B.9.pdf	06/01/2015
34	ASOCIACIÓN HITO 3: Cronograma de actividades definido	1_CRONOGRAMA_DE_ACTIVIDADES_ECV_2012-13-14_ano06082013	06/08/2013
35	ASOCIACIÓN HITO 40: Listado de Indicadores - procesamiento	C.1..pdf	06/01/2015
36	ASOCIACIÓN HITO 41: Memorias técnicas Coordinaciones Zonales ECV	C.3.rar	07/04/2015
37	ASOCIACIÓN HITO 4: Proyecto enviado a DIPLA	2_FORMATO_SENPLADES.doc	06/08/2013
38	ASOCIACIÓN HITO 5: Recursos definidos	Costo_por_actividad.docx	06/08/2013
39	ASOCIACIÓN HITO 6: Actividades de prelevantamiento iniciadas	Reunión_ECV_18_01_2013.docx	06/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	ASOCIACIÓN HITO 7: Entrega de tamaño muestral preliminar por DINME	Muestra_preliminar.pdf	09/04/2013
41	ASOCIACIÓN HITO 8: Lineamientos elaborados	LINEAMIENTOS_ECV.pdf	02/05/2013
42	ASOCIACIÓN HITO 9: Formulario elaborado	FORMULARIO_ECV_2012-2013.rar	02/05/2013
43	hito 28: Ejecución de la ECV hasta el período 6.	Ejecución_de_la_ECV_periodo_6.xlsx	06/05/2014
44	Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-1345-OF	Encuesta_de_Condiciones_de_Vida.pdf	16/07/2013
45	PROYECTO SENPLADES	Proyecto_ECV_2012-2014_formato_SENPLADES.doc	18/07/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Armijos Solis, JuliaElizabeth	Miembro del Equipo Técnico ECV
Artieda Espinosa, Carmita Elizabeth	Miembro del Equipo Técnico ECV
Moya Guerra, Lizabeth Vanessa	Miembro del Equipo Técnico ECV
Ramos Alvarado, José Stalin	Técnico en Estadísticas de Hogares
Rivadeneira Chica, Damian Alberto	Miembro del Equipo Técnico ECV
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Jefe del proyecto
