

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

PROYECTO: K006 INEC - Cambio de Año Base IPP - IPI

Líder del Proyecto:	Andino Alvarez, Rocío Jhanet (Rocio_andino@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI
Titular:	Naranjo Orozco, María Lorena	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.374344	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,190,891.68
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	05/06/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto Cambio de Base IPI-IPP, permite disponer de indicadores que reflejen el comportamiento productivo de los sectores Agropecuario; Pesquero; Minero; y Manufacturero, en base a los precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.

*PRODUCTO / SERVICIO: La ejecución del Proyecto Cambio de Base IPI-IPP mejorará la representatividad de los índices calculados e incorporará al proceso investigativo innovaciones y metodologías para la mejor recolección de datos y mayor cobertura de tomas de datos, así como para el cálculo de los índices; ello con el uso de muestras representativas y eficientes, fórmulas de cálculo y algoritmos informáticos probados, así como con una organización técnico-administrativa nacional y regional productiva y eficaz.

*LINEA BASE: Los indicadores de la producción: Índice de Precios al Productor (IPP) e Índices de la Producción Industrial (IPI) forman parte de los indicadores económicos del INEC y son mediciones continuas de los cambios registrados en los precios y volúmenes producidos de bienes y servicios, así como en la oferta de plazas de trabajo, remuneraciones y horas trabajadas.

*OBJETIVO GENERAL.-Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sinteticen y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.

*Objetivos Específicos.- Se realizará Cambio de base de los indicadores Índice de Precios al Productor (IPP); Índice de la Producción Industrial (IPI), los cuales contendrán las siguientes consecuciones:

- Desarrollar metodologías actualizadas para aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo del IPP e IPI, bajo una concepción de índices armonizados e integrados.
- Establecer nuevas bases fijas de comparación de precios, cantidades y valores, para el cálculo de índices sustentados en metodologías probadas para el IPP e IPI.
- Construir canastas de investigación para el IPP e IPI, cuyo tamaño y composición garanticen el alcance, cobertura y representatividad sectorial y productiva, que se requieren.
- Señalar las normas operativas, vinculantes al nivel operativo nacional y zonal, para la investigación de precios, cantidades y valores, bajo el esquema riguroso de especificaciones rigurosas y ponderaciones fijas de los elementos que conformen las canastas investigativas. entre otros.

Beneficios Cualitativos

Al ser un proyecto de inversión pública, y considerando la misión del INEC de producir, analizar y difundir información estadística oficial, los productos entregables coadyuvarán a la sustentación del análisis económico, la fundamentación de la estadística macroeconómica y la planificación industrial.

Tipo de Beneficiario

Las entidades públicas y privadas del país y entidades internacionales.

Restricciones

*Tiempo: 3 años

*Costo: \$ 1.202.682,48

*Alcance:

El cambio de base del IPI-IPP se sustentan en:

- La teoría estadística de los Números Índices y sus estándares internacionales de aplicabilidad.
- Innovaciones metodológicas y procesos investigativos normalizados; cobertura de precios, cantidades y valores para los elementos de las canastas investigativas;
- especificaciones exhaustivas de atributos y homogeneidad.
- Tecnologías últimas de información y comunicación para las operaciones de acopio de datos, procesamiento y el cálculo de índices.


El marco integrado de indicadores sobre la producción: IPP e IPI (IVI + IER) debe asumir una modalidad de ejecución compatible con:

- Los estándares, procedimientos y objetivos institucionales del INEC.
- El alcance temático y programático previsto en los estándares internacionales de este tipo de indicadores.
- Las actividades industriales sujetas a investigación por su importancia en la matriz productiva del país, caracterizada según actividades y productos, descritas en las clasificaciones internacionales vigentes: CCP 2 y CIU 4, entre otros.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 81.10 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

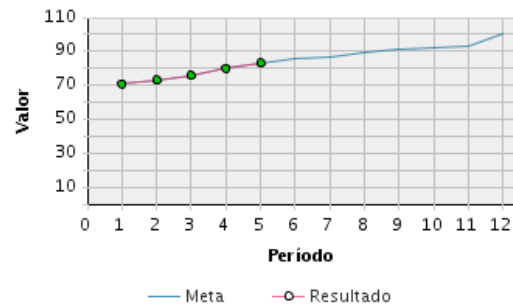

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	71 %	73 %	76 %	80 %	83 %	86 %	87 %	89 %	91 %	92 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	71 %	73 %	76 %	80 %	83 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2015:	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	05/06/2015 - 12:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Como parte de la evaluación de la tecnología de captura y transmisión electrónica de datos; DIRAD procedió a capacitar, en cada una de las zonales sobre el uso del "Sistema WEB del CAB IPP-IP", con lo cual fue posible que el equipo de trabajo pueda realizar pruebas y recopilar sugerencias que deberán ser implementadas a fin de facilitar y mejorar el control y seguimiento de la toma de información en campo. En esta etapa desarrollo y pruebas se ha podido obtener el "Producto", módulo de reportes. (Hito cumplido 62).		
ABRIL 2015: 1.- Los indicadores IPP-IP se componen de etapas previas de cumplimiento, mismas que influyen en su cálculo definitivo; siendo las principales: la definición de los componentes de la estructura de ponderadores y la investigación o recopilación de información (precios, especificaciones y volúmenes de producción). Para llevar a cabo estas actividades el equipo técnico del proyecto CAB IPP-IP y el asesoramiento de la CEPAL, se encuentra elaborando la nueva metodología definitiva a seguir, misma que se estructuran en función de estándares internacionales y nacionales. (Hito cumplido 60). Con la recolección mensual de precios, especificaciones y volúmenes de producción, ha sido posible obtener el avance de cálculo de índices que representen la actual estructura económica del país. (Hito cumplido 61).	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	08/05/2015 - 08:37 AM
MARZO 2015: 1. Para concluir con la revisión de la canasta de investigación que está elaborada en base a las actividades y productos (CIU_4 y CCP 2), que constituyen la actual estructura del país, análisis necesario para definir las actividades más representativas dentro de la producción nacional. Se cuenta con la presencia del Consultor Nacional, previsto por la CEPAL, consultor que se encuentra desarrollando el producto "Revisión de las Fuentes de Información", tema que permitirá obtener las canastas definitivas para el IPP-IP. (Hito cumplido 59) 2. Todavía no se ha podido cubrir la vacante del SP5, que se tenía previsto contar a partir del mes de marzo.	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	02/04/2015 - 04:46 PM
FEBRERO 2015: 1. Con la visita de Ernestina Pérez funcionaria de la CEPAL y encargada de brindar asistencia técnica al proyecto se ha revisado la estructura de la canasta investigativa IPP-IP, obteniendo como avance, el diagnóstico para la conformación de la Estructura de Ponderadores, con los cuales se conformará la canasta investigativa. (Hito cumplido 58). 2. Se encontraba en trámite la actualización de los Hitos del proyecto, gestión que permitió evidenciar adecuadamente las actividades contempladas en el CAB IPP-IP para el año 2015; aprobación y autorización que se solicitó al Patrocinador Ejecutivo mediante INEC-CGTPE-DECON-2015-0057, aprobado mediante memorando INEC-SUGEN-2015-0066-M por el Patrocinador Ejecutivo una vez se contó con el autorizado INEC-DIREJ-2014-0233-M de la Dirección ejecutiva sobre la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto CAB IPI-IPP hasta el año 2015. ENERO 2015: 1. Se procede a pasar el proyecto a la fase de congelado, debido a que el plazo de finalización fue el 31 de Diciembre del 2014. Sin embargo se ha contemplado la ampliación de plazo hasta el año 2015, por lo que actualmente nos encontramos a la espera del Dictamen de Prioridad que emitirá SENPLADES con lo cual posteriormente será posible realizar la reestructuración correspondiente en el sistema GPR. 2. Uno de los principales objetivos de este proyecto es contar con una verdadera integración conceptual, metodológica y procedimental entre el IPI y el IPP; estos índices en sus estructuras deberán incluir una lista de bienes y servicios que sean representativos de la medición de los diferentes sectores de la actividad económica, enmarcadas en la actual estructura productiva del país; bajo este contexto y con la asesoría técnica de la CEPAL, como contraparte técnica; se a creído conveniente elaborar un documento, el cual se estructura, tomando en cuenta: En primer lugar un análisis del actual marco de los índices de estudio; luego los aspectos a ser considerados en el CAB IPP-IP y finalmente, las etapas a ser cumplidas por el equipo técnico nacional del proyecto. (Hito cumplido 57). DICIEMBRE 2014: 1. Se continúa con la revisión de la información de la canasta preliminar, de acuerdo a las especificaciones establecidas y conforme a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP. (Hito cumplido 53). 2 Se cuenta con la canasta preliminar de productos a investigarse; sin embargo para consolidar la investigación definitiva se conto con la visita de funcionarios de la CEPAL, quien realizarón el	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	25/03/2015 - 10:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
análisis respectivo del catastro de fuentes de información con lo cual se construirán los vectores de ponderación conjuntamente con el equipo técnico central. (Hito cumplido 54) 3. Conjuntamente con la CEPAL, se elaborará el documento Técnico del proyecto: Definición de la cobertura y representatividad y fuentes de información. NOVIEMBRE 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción con la información de la canasta investigativa a la presente fecha considerando la representatividad de los productos en la Tabla Oferta Utilización del BCE. (Hito cumplido 51) 2. Se revisa la información de la canasta investigativa preliminar constituida de acuerdo a la estructura de la Tabla Oferta Utilización (TOU) del Banco Central; el resultado de los productos investigados se compone por 290 en intersección con la TOU y 8 del CAB IPP-IPI, todo ello de acuerdo a sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 55, 56) 3. Se inicia la investigación del Sector Agropecuario con la Prueba Piloto, para lo cual se ha capacitado a los equipos investigadores en cada una de las Coordinaciones Zonales.		
OCTUBRE 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción con la información recolectada a la presente fecha. (Hito cumplido 49) 2. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar, los productos investigados (1925 a nivel de subclase y 2426 a nivel de producto específico) en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 50)	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	02/12/2014 - 04:39 PM
SEPTIEMBRE 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción con la información recolectada a la fecha. (Hito cumplido 47) 2. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar, los productos investigados (1855 a nivel de subclase y 2406 a nivel de producto específico) en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 48)	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	08/10/2014 - 03:13 PM
AGOSTO 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción con la información recolectada a la fecha. (Hito cumplido 45) 2. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar, los productos investigados (1764 a nivel de subclase y 2396 a nivel de producto específico) en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 46)	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	11/09/2014 - 08:14 AM
JULIO 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción con la información recolectada a la fecha. (Hito cumplido 43) 2. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar, los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 44)	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	05/08/2014 - 04:47 PM
JUNIO 2014: 1. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción. (Hito cumplido 41) 2. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y la codificación de acuerdo a las nomenclaturas internacionales, actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIU Rev.4.0; y la Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 42)	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	07/07/2014 - 09:00 AM
MAYO 2014:	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	04/06/2014 - 12:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Se realiza la capacitación del equipo de trabajo integrado por el Coordinador, Digitador e Investigadores en cada Dirección Zonal para fortalecer sus conocimientos sobre la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIIU Rev.4.0; y la Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 38) 2. Se procede con el cálculo de prueba de los indicadores de producción. (Hito cumplido 39) 3. Se revisa la información de acuerdo al avance de la investigación y se analiza en base a la canasta preliminar los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y las codificaciones de acuerdo a las nomenclaturas internacionales, actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIIU Rev.4.0; y la Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0. (Hito cumplido 40)		
ABRIL 2014: 1. Se revisan las bases de datos remitidas por las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro y Sur), esta información comprende los formularios cuya información completa ha sido codificada y criticada para ingreso en el aplicativo diseñado para tal efecto. Adicionalmente se revisan los informes y matrices de novedades remitidos por los Coordinadores Zonales (Hito cumplido 36). 2. Se revisa y analiza en base a la canasta preliminar los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, conjuntamente con sus especificaciones y las codificaciones de acuerdo a las nomenclaturas internacionales, actualizadas: Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Revisión 4.0 -CIIU Rev.4.0; y la Clasificación Nacional de Productos CCP Ver. 2.0 (Hito cumplido 37).	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	04/06/2014 - 12:01 PM
MARZO 2014: 1. La Prueba Piloto contempla actividades consideradas paradigmáticas para orientar el planteamiento metodológico y procedimental del Proyecto CAB IPI-IPP. Mediante la Coordinación del Equipo Técnico de Planta Central, se llevó a cabo la Capacitación en las Direcciones Zonales Norte y Litoral. Actividad en la cual los integrantes de los equipos de investigación recibieron las principales directrices sobre la metodología y normas procedimentales del operativo de campo de la prueba piloto y se realizó una prueba práctica para evaluar la aplicación de los conceptos metodológicos impartidos. (Hito 32 cumplido). 2. Para efectuar la revisión del Directorio de Empresas -que se viene investigando en la Prueba Piloto-, se asignó la primera carga de trabajo a las Direcciones Zonales Norte y Litoral, con un total de 50 empresas para cada Dirección (Hito 33 cumplido). 3. Se revisan actualmente las especificaciones de los productos que integrarán la canasta preliminar de empresas, misma que formará parte de la canasta definitiva conforme avance el proceso de investigación de la Prueba Piloto "Cambio de Año Base IPI-IPP" y se consensue con la asistencia técnica internacional (Hito 34 cumplido).	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	04/04/2014 - 03:27 PM
FEBRERO 2014: 1. Mediante la revisión de la Base de Datos de la Encuesta Exhaustiva fase 2 del Censo Nacional Económico 2010, se determinó el Directorio Preliminar de Empresas Informantes cuya distribución se realizó a las Direcciones Zonales que formarán parte del proceso investigativo (Hito cumplido 30). 2. Uno de los principales objetivos de este proyecto es contar con una verdadera integración conceptual, metodológica y procedimental entre el IPI y el IPP; se ha procedido a elaborar el documento preliminar metodológico, mismo que recoge la experiencia lograda en la generación de las series estadísticas actuales: IPI (Base año 2003); e IPP (Base año 1995); y, se incluyen aspectos a tomar en cuenta en la Metodología definitiva que se elaborará con asistencia técnica internacional, como son: mayor tamaño de la muestra, ampliación de la cobertura temática, redefinición o incremento de nuevas variables de investigación, aplicación eficiente y eficaz de un plan de muestreo, armonización estadística y sinergia operacional; además de otros factores que emergerán de la prueba piloto que se iniciará en breve (Hito cumplido 31). 3. Se revisa y aprueba los instrumentos de investigación (manual operativo, formulario, agendas de capacitación), mismos que respaldarán el operativo piloto.	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	06/03/2014 - 10:50 AM
ENERO 2014: 1. Los lineamientos para el año 2014, fueron aprobados. Se remite las Resoluciones para las adquisiciones en el Plan Anual de Compras. 2. Se solicitó la autorización para la contratación de la Consultoría Nacional y Asistencia Técnica Internacional, que respaldarán las metodologías, diseños y planes investigativos (Hito cumplido 28). 3. Se realiza la revisión preliminar de la estructura de las Canastas Investigativas (Actividades Económicas). 4. Se revisa los instrumentos de la investigación (Hito cumplido 29).	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	05/02/2014 - 09:22 AM
NOVIEMBRE 2013:		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Se recibió la base preliminar del del CENEC, con lo cual se seleccionó el grupo de población que cumple con las condiciones de: empresas que produjeron y vendieron sus productos o servicios en el año 2011. 2. Se elabora informe de actividades cumplidas a diciembre 2013 (Hito cumplido 26). NOVIEMBRE 2013: Con la finalización del proyecto CENEC Exhaustiva y la entrega de las bases de datos preliminares se procedió a la exploración de la misma, continuando con el desarrollo de las actividades. Pero con el retraso en la entrega de la base de datos del CENEC se aplazan los HITOS No. 19,21 y 22, que posiblemente se inicien a mediados de diciembre 2013.		
OCTUBRE: Es este mes se procede a la exploración de la base de datos exhaustiva, con la cual se construirá la canasta preliminar de productos a investigar y su posterior ejecución de los ponderadores los mismos que formaran la canasta definitiva de investigación del cambio de año base IPI-IPP. Por lo tanto el Hito N° 18 se desarrollará a mediados de noviembre. SEPTIEMBRE: Se procede a dar paso a la autorización concedida por el señor Director Ejecutivo del INEC, en la cual se solicita que: Para una adecuada gestión técnica, logística, presupuestaria, de seguimiento y ejecución de los proyectos en el sistema GPR, es necesario integrar en un solo proyecto a los proyectos: K006: Cambio de Año Base de los Índices de Producción Industrial-IPI (IVI e IER) y K007: Cambio de Año Base Índice de Precios al Productor (IPP). En consecuencia el Proyecto K007 pasa a un estado "Cancelado" y al mismo tiempo es absorbido por el proyecto K006 que se denominará: "Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP)".	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	20/11/2013 - 12:30 PM
AGOSTO: El proyecto se encuentra en espera de la base de datos del CENEC; para continuar con las actividades. En relación a lo comentado se está elaborando un estudio de factibilidad el cual contiene un plan de contingencia para trabajar con una base de datos alterna. Se elaboró oficio para enviar a SENPLADES, solicitando la autorización de fusión de los proyectos K006 y K007 en coordinación con UCEMP-DIPLA.	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	06/09/2013 - 11:56 AM
JULIO Con la aprobación de los Lineamientos, se inició la contratación del equipo central de apoyo y se espera en el transcurso del mes de agosto contar con las resoluciones aprobadas para la adquisición de materiales. Se dio inicio a las actividades de revisión de la metodología con la cual se calcula el IPI actualmente. Se realizó las respectivas gestiones con la unidad del Directorio de Empresas, para que se nos facilite el marco muestral de empresas y establecimientos, el cual nos servirá de apoyo para obtener una muestra preliminar de establecimientos manufactureros, hasta contar con el marco muestral definitivo de establecimientos económicos del CENEC y mientras este marco no sea facilitado por la unidad indicada, la contratación de la asesoría nacional se posterga hasta la obtención de dicha información. Con lo cual también se posterga el desarrollo de los Hitos: N°. 9 Metodología preliminar del IPI actualizada y 10 Metodología preliminar del IPI ajustada. JUNIO 2013 Durante este mes se revisaron los lineamientos por el grupo experto para su posterior aprobación del área ejecutiva y así dar inicio a las diferentes actividades; la ejecución de los Hitos: No. 6 Personal del equipo central de apoyo contratado se iniciará en día 15 de Julio 2013, esto en razón de que se realizaron algunos ajustes en los Lineamientos por parte de Planificación. Hito No. 7 TDR, borrador elaborado y en revisión.	Andino Alvarez, Rocío Jhanet	05/08/2013 - 02:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2013 Se presentaron los lineamientos elaborados a DIPLA, para su posterior aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente. ABRIL 2013 Se están elaborando los lineamientos para la ejecución del proyecto, en el que consta a detalle el alcance del mismo, duración, equipo de trabajo y presupuesto requerido para la ejecución del mismo. MARZO 2013 Se están revisando posibles asesores Nacionales e Internacionales para el proyecto y trámites a seguir para su posterior contratación. FEBRERO 2013 Se ha revisado las metodologías instauradas del Índice Precios al Productor en otros países. ENERO 2013 Se ha avanzado en la elaboración de la hoja de ruta del proyecto, con el detalle y estimación de la duración de las fases.		

Problemas cerrados: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos financieros CAUSARÍA un retraso en la conformación de las canastas investigativas del proyecto	08/05/2015	Rocío Jhanet Andino Alvarez	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 5

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Metodología del IPI de otros países revisada.	4-Inicio de Trabajo	29/01/2013		29/01/2013		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Información de asesores a nivel nacional e internacional analizada	5-Entregables Intermedios	27/02/2013		27/02/2013		Sí	1.0
3	DEFINICIÓN: Lineamientos a seguir para tramites de contratación de asesores, analizados.	5-Entregables Intermedios	28/03/2013		28/03/2013		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Lineamiento preliminar elaborado.	5-Entregables Intermedios	26/04/2013		26/04/2013		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Lineamiento preliminar ajustado	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Personal del equipo central de apoyo, contratado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN: TDR para la contratación de consultor nacional e internacional, elaborado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	28/06/2013		28/06/2013		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Metodología actual de IPI analizada.	5-Entregables Intermedios	29/07/2013		29/07/2013		Sí	1.67
9	PLANEACIÓN: Documento de requerimientos de información provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales.	5-Entregables Intermedios	28/08/2013		30/08/2013		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Benchmarking de los indicadores de producción (IPI-IPP), presentado	5-Entregables Intermedios	29/08/2013		30/08/2013		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Exploración de base de datos DICE, CENEC 2010 y Estadística Industriales, depuradas.	5-Entregables Intermedios	29/08/2013		30/08/2013		Sí	1.33
12	EJECUCIÓN: Resoluciones PAC (IPI-IPP), realizadas.	5-Entregables Intermedios	28/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Elaboración de Directorio de establecimientos (IPI-IPP) a investigar sectorizados en base a la cartografía del CPV2010.	5-Entregables Intermedios	29/09/2013		29/09/2013		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Ajustes a la canasta de investigación del (IPI-IPP). Ajustada	5-Entregables Intermedios	29/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Construcción nueva canasta preliminar de productos (IPI-IPP).	5-Entregables Intermedios	29/10/2013		29/10/2013		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Recepción y depuración de la base de datos Exhaustiva (CENEC fase 2), depurada	5-Entregables Intermedios	29/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Compra de materiales para el (IPI-IPP). adquiridos	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN: Nuevos ponderadores (IPI-IPP) estructurados.	5-Entregables Intermedios	22/11/2013		22/11/2013		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Sistema informático del (IPI-IPP)", desarrollado y en operación.	5-Entregables Intermedios	28/11/2013		28/11/2013		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Documento "Cambio de Año Base (IPI-IPP)": Revisión, factibilidad y evaluación inicial del proyecto.	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Requerimientos para la contratación de consultorias: Nacional e Internacional, solicitados.	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Pruebas preliminares en el sistema informático (IPI-IPP)".	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Requerimiento del Sistema informático del	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	"Cambio de Año Base (IPI-IPP)".							
24	PLANEACIÓN: Planificación para la recopilación de la información del proyecto Fase 2.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Ajustes metodológicos al Documento "Cambio de Año Base (IPI-IPP), elaborado	9-Entregables Formales	30/12/2013		30/12/2013		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Informe anual del avance del Proyecto "Cambio de Año Base (IPI-IPP), elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Sistema informático del IPI-IPP, revisado y ajustado(IPI-IPP)	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Planteamiento de propuesta metodológica IPI-IPP, efectuada.	5-Entregables Intermedios	28/01/2014		28/01/2014		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Revisión de los instrumentos de la investigación efectuada.	5-Entregables Intermedios	28/01/2014		28/01/2014		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Distribución de Directorio de informantes a Zonales, efectuada.	5-Entregables Intermedios	26/02/2014		26/02/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Metodología de cálculo del IPI(IVIIR) IPP, determinación de los procedimientos realizados, efectuada.	5-Entregables Intermedios	26/02/2014		06/03/2014		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Capacitaciones Zonales (L-N) realizadas.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Distribución de establecimientos zonales, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos definitivas, efectuada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Revisión de la información Zonales, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Capacitaciones Zonales (C-S) realizadas.	5-Entregables Intermedios	28/05/2014		28/05/2014		Sí	0.5
39	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
42	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizada.	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Entrega del informe de Calculo de Indices, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Entrega de informe de cálculo de índices, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Entrega de informe de cálculo de índices, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Entrega de informe de cálculo de índices, realizada.	5-Entregables Intermedios	29/12/2014		29/12/2014		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Revisión de canastas de productos investigadas, realizada.	5-Entregables Intermedios	29/12/2014		29/12/2014		Sí	1.0
55	CIERRE: Informe del avance del proyecto previa a la entrega final del proyecto, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		30/12/2014		Sí	1.0
56	CIERRE: Informes finales de asesoramiento del proyecto, entregados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2014		30/12/2014		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Documento técnico del proyecto; definición de la cobertura y representatividad del CAB IPP-IPI, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	3.0
58	EJECUCIÓN: Información de asesoría Técnica Internacional, analizada	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		27/02/2015		Sí	2.0
59	EJECUCIÓN: Cobertura sectorial en términos de la nomenclatura internacional: CIU 4 y por clases de productos de la CCP 2, analizada	5-Entregables Intermedios	28/03/2015		28/03/2015		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	EJECUCIÓN: Investigación de canastas y cálculo de índices del primer trimestre 2015, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Determinación de los componentes de la estructura de ponderadores IPI-IPP y su posterior cálculo, analizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	3.0
62	EJECUCIÓN: Modelo de datos y evaluación de la tecnología de captura y transmisión electrónica de datos, revisado.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	3.0
63	EJECUCIÓN: Metodología de cálculo propuesta según los niveles de índices elementales y agregados, revisada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	3.0
64	EJECUCIÓN: Investigación de canastas y cálculo de índices del segundo trimestre 2015, realizada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	1.0
65	EJECUCIÓN: Empalme de series preliminar, realizados	5-Entregables Intermedios	30/08/2015	30/08/2015			No	2.0
66	EJECUCIÓN: Estabilización de series de índices de los nuevos indicadores IPP-IPI, analizados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	2.0
67	EJECUCIÓN: Investigación de canastas y cálculo de índices del tercer trimestre 2015, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	1.0
68	EJECUCIÓN: Lineamientos del plan de ejecución para la difusión de resultados , realizadas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	1.0
69	CIERRE: Informe de cierre gestión 2015 del CAB IPP-IPI, elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	3.0
70	CIERRE: Informes de asesoramiento Internacional del CAB IPP-IPI, elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	3.0
71	EJECUCIÓN: Investigación de canastas y cálculo de índices del cuarto trimestre 2015, realizada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de construcción de la base de precios y volúmenes IPI IPP		100.00 %	0.48	0.48	01/01/2014	Ene-Mar
2	Porcentaje de empresas investigadas		98.08 %	0.8125	0.7969	01/01/2014	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,190,891.68 **
Costo Total:	1,202,682.48
Total Devengado:	952,100.72
% Costo Total Devengado:	79.16 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 79.16 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,071,382.47	420,000.00	0.00	1,491,382.47
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,196,866.49	420,000.00	0.00	1,616,866.49
Ppto. Codificado	830,287.32	377,999.90	0.00	1,208,287.22
Ppto. Comprometido	564,937.21	139,208.94	0.00	704,146.15
Planeado - Codificado (2015)		42,000.10		
Programado a Devengar	830,287.32	377,999.90	0.00	1,208,287.22
Ppto. Devengado	812,891.78	139,208.94	0.00	952,100.72
Estimado a fin de año	* 812,891.78	0.00	0.00	812,891.78
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	17,395.54	377,999.90	0.00	395,395.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 97.90 %	36.83 %	0.00 %	78.80 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

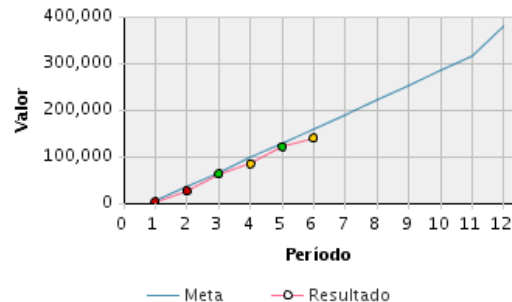

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	3,739.07	2,410.11	3,739.07	2,410.11	64.46 %		0.64 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	31,549.67	23,673.24	35,288.74	26,083.35	73.91 %		6.90 %
Mar	30,381.60	36,599.69	65,670.34	62,683.04	95.45 %		16.58 %
Abr	31,538.48	20,867.56	97,208.82	83,550.60	85.95 %		22.10 %
May	30,381.60	37,868.60	127,590.42	121,419.20	95.16 %		32.12 %
Jun	31,420.60	17,789.74	159,011.02	139,208.94	87.55 %		36.83 %
Jul	30,381.60		189,392.62				
Ago	33,247.19		222,639.81				
Sep	30,381.60		253,021.41				
Oct	31,420.60		284,442.01				
Nov	30,381.60		314,823.61				
Dic	63,176.29		377,999.90				
Total	377,999.90	139,208.94					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los procesos de las estadísticas económicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Constitución "Cambio de Año Base IPI-IPP"	A.9.pdf	23/12/2013
2	ASOCIACION HITO 2.- Sondeo de asesores Nacional e internacional.	Análisis_selección_de_asesores_a_nivel_Nacional_e_Internacional.doc	05/06/2013
3	ASOCIACIÓN HITO 8: Metodología actual del IPI analizada.	Metodología_IPI.rar	01/08/2013
4	ASOCIACIÓN HITO 1, Opciones y disponibilidad de información de Índices de Producción Industrial (IPI) varios países.	IPI_opciones_y_disponibilidad_de_información_otros_países.doc	05/06/2013
5	ASOCIACIÓN HITO 3.- Tramites a seguir para la contrataciones de asesores Nacional e Internacional.	resolucion_incop_no_054-2011(1).pdf	05/06/2013
6	ASOCIACIÓN HITO 34: Revisión de canastas de productos definitivas,efectuada	B.9.pdf	10/04/2014
7	ASOCIACIÓN HITO 4.- Lineamiento preliminar para el cambio de base IPI	01_formulario_lineamientos_15052013.doc	05/06/2013
8	ASOCIACIÓN HITO 5 Lineamiento Preliminar ajustado	A.2.pdf	28/11/2013
9	ASOCIACIÓN HITO 57: Documento técnico del proyecto; definición de la cobertura y representatividad del CAB IPP-IPI.	D_1.pdf	13/02/2015
10	ASOCIACIÓN HITO 58: Información de asesoría Técnica Internacional, analizada	D_2.pdf	25/03/2015
11	ASOCIACIÓN HITO 6: Personal de equipo central de apoyo	INEC-DIREJ-2013-0566-M.pdf	01/08/2013
12	ASOCIACIÓN HITO 7 :TDR preliminar TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTOR NACIONAL IPI	Preliminar_TERMINOS_DE_REFERENCIA_CONSULTOR_NACIONAL_IPI.doc	05/07/2013
13	ASOCIACIÓN HITO No. 60: Determinación de los componentes de la estructura de ponderadores IPI-IPP y su posterior cálculo, analizados	D_4.pdf	04/05/2015
14	ASOCIACIÓN HITO No. 61: Investigación de canastas y cálculo de índices del primer trimestre 2015, realizada.	D_5.pdf	04/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	ASOCIACIÓN HITO N° 25.- Ajustes metodológicos al Documento "Cambio de Año Base (IPI-IPP), elaborado.	B.2.pdf	03/01/2014
16	ASOCIACIÓN HITO N° 26.- INFORME ANUAL DEL AVANCE DEL PROYECTO "CAMBIO DE AÑO BASE (IPI-IPP)".	B.1.pdf	03/01/2014
17	ASOCIACIÓN HITO N° 14,15 y 16	A.5.pdf	28/11/2013
18	ASOCIACIÓN HITO N° 18 Ponderadores estructurados	A.8.pdf	04/12/2013
19	ASOCIACIÓN HITO N° 23 Requerimiento Sistema informático	A.7.pdf	04/12/2013
20	ASOCIACIÓN HITO N° 24 Planeación de la investigación	A.6.pdf	03/12/2013
21	ASOCIACIÓN HITO N° 32 Capacitación Zonales (L-N) realizadas.	B.7.pdf	10/04/2014
22	ASOCIACIÓN HITO N° 33 Distribución de establecimientos zonales, realizada.	B.8.pdf	10/04/2014
23	ASOCIACIÓN HITO N° 35: Entrega del informe de Cálculo de Índices ASOCIACIÓN HITO N° 36: Revisión de la información Zonales ASOCIACIÓN HITO N° 37 Revisión de canastas de productos investigadas	C.1.pdf	06/05/2014
24	ASOCIACIÓN HITO N° 38: Capacitaciones Zonales (C-S), realizadas.	C.2.pdf	04/06/2014
25	ASOCIACIÓN HITO N° 39: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 40: Revisión de canastas de productos investigadas.	C.3.pdf	05/06/2014
26	ASOCIACIÓN HITO N° 41: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 42: Revisión de canastas de productos investigadas.	C.4.pdf	09/07/2014
27	ASOCIACIÓN HITO N° 43: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 44: Revisión de canastas de productos investigadas.	C.5.pdf	05/08/2014
28	ASOCIACIÓN HITO N° 45: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 46: Revisión de canastas de productos investigadas.	C.6.pdf	10/09/2014
29	ASOCIACIÓN HITO N° 47: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 48: Revisión de canastas de productos investigadas	C.7.pdf	03/10/2014
30	ASOCIACIÓN HITO N° 49: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 50: Revisión de canastas de productos investigadas	C.8.pdf	04/11/2014
31	ASOCIACIÓN HITO N° 51: Entrega del informe de Cálculo de Índices. ASOCIACIÓN HITO N° 52: Revisión de canastas de productos investigadas	C.9.pdf	05/12/2014
32	ASOCIACIÓN HITO N° 9 CN	A.3.pdf	28/11/2013
33	ASOCIACIÓN Hito N°. 10: Benchmarking de los indicadores de producción (IPI-IPP), presentado.	Copia_de_IPP_Metodologias_a_comparar_con_otros_paises	08/10/2013
34	ASOCIACIÓN Hito N°. 11: Exploración de base de datos DICE, CENEC 2010 y Estadística Industriales, depuradas.	Cambio_de_Base_IPI-IPP1.pptx	03/10/2013
35	ASOCIACIÓN Hito N°. 12: Resoluciones	A.4.pdf	28/11/2013
36	ASOCIACIÓN HITO N°28.- Planteamiento de propuesta metodológica.	B.4.pdf	05/02/2014
37	ASOCIACIÓN HITO N°29.- Revisión de los instrumentos de la investigación.	B.3.pdf	05/02/2014
38	ASOCIACIÓN HITO N°30.- Distribución de Directorio de Informantes a Zonales.	B.5.pdf	05/03/2014
39	ASOCIACIÓN HITO N°31.- Metodología de cálculo del IPI(IVIER) IPP, determinación de los procedimientos realizados.	B.6.pdf	06/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	ASOCIACIÓN: HITO N°: 17 materiales para el (IPI-IPP). adquiridos	Memorando_Nro._INEC-DIEC-2013-0844-M_Materiales.pdf	01/11/2013
41	Autorización para la administración de los proyectos de inversión: K006 y K007	INEC-DIREJ-2013-0673-M-2.pdf	03/10/2013
42	EJECUCIÓN Hito N°. 59: Cobertura sectorial en términos de la nomenclatura internacional: CIU 4 y por clases de productos de la CCP 2, analizada	D.3.pdf	07/04/2015
43	EJECUCIÓN Hito N°. 62: Modelo de datos y evaluación de la tecnología de captura y transmisión electrónica de datos, revisado.	D.6.pdf	05/06/2015
44	EXPEDIENTE REESTRUCTURACIÓN DE HITOS DEL PROYECTO 2015	D.2.rar	24/03/2015
45	Ficha SENPLADES	A.1.pdf	28/11/2013
46	Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0138-OF	SENPLADES-SGPBV-2013-0138-OF_Prioridad_SIP-C_-_IPP-IPI_CostoTotal.pdf	05/07/2013
47	Respuesta por SENPLADES a solicitud de cambios en la herramienta GPR	INEC-DIREJ-2013-0342-E-1.pdf	09/10/2013
48	Solicitud para actualizar la información en GPR, autorizada	Memorando_Nro._INEC-CGT-2013-0109-M.pdf	05/06/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Andino Alvarez, Rocío Jhanet	Responsable del Proyecto
