

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**

**Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)**

**Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías (DINME)**

**PROYECTO: K001** INEC - Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas

|                                |                                                                  |                                 |                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Guayasamin Albuja, Diana Carolina (diana_guayasamin@inec.gob.ec) |                                 |                                                                                                               |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Rosero Moncayo, José Alejandro                                   | Programas Relacionados:         | FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS |
| Titular:                       | Castillo Añazco, Oscar Roberto                                   | Prioridad:                      | 0                                                                                                             |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                         | Retorno Económico:              | 0.00                                                                                                          |
| CUP:                           | 31210000.0000.377625                                             | TIR:                            | 143.00 %                                                                                                      |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                                | VAN:                            | 200,127.73                                                                                                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                            | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 583,648.88                                                                                                    |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3     |                                 |                                                                                                               |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                                  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/08/2014 - 31/12/2016                                                                                       |
| Fecha de última actualización: | 05/05/2016                                                       | Fecha de Fin Base:              | 30/06/2016                                                                                                    |
| Modificado por:                | Guayasamin Albuja, Diana Carolina                                | Fecha del siguiente hito:       | 24/03/2016                                                                                                    |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto de formulación de métricas nuevas plantea la generación de un nuevo paradigma de métrica del Buen Vivir que permita la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república. El presente proyecto no cuenta con una línea base como tal; pero sin con ejercicios preliminares que han tratado de expandir la visión tradicional hacia una más integral pero que todavía no conjugan el real significado de la nueva orientación política hacia el Buen Vivir. Al finalizar del proyecto, esto es dos años, se contará con nuevas métricas del Buen Vivir a disposición de los actores que deseen investigar y tomar decisiones de política pública bajo un nuevo paradigma. Como principal objetivo el Proyecto busca establecer un conjunto métricas nuevas y alternativas, asociadas al buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, que rompan con los paradigmas tradicionales de información usada para el diseño, monitoreo y evaluación de política pública en sus distintos ámbitos. Entre sus objetivos específicos se encuentran: .Establecer la definición de un nuevo paradigma de bienestar, Sumak Kawsay que guíe la construcción de las métricas nuevas y alternativas. .Establecer una agenda de desarrollo del conjunto de indicadores de nuevas métricas. .Definir el conjunto de indicadores que se basen en un nuevo paradigma de bienestar (incluye esquemas de participación ciudadana: documentos analíticos y metodológicos). .Construir los indicadores propuestos en la agenda de desarrollo de las nuevas métricas para el buen vivir. .Publicar y difundir los resultados de los nuevos indicadores del buen vivir definidos en los elementos multicriterio que componen el nuevo paradigma de desarrollo.

**Beneficios Cualitativos**

La generación de un nuevo paradigma de métrica del buen vivir, permitirá la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república. El presente proyecto es una herramienta que permite el mantenimiento e incremento del capital social en el país, ya que constituye un conjunto de indicadores que dan cuenta de la gestión pública y de cómo ésta apunta a la concreción de una nueva orientación política y de vida: el buen vivir.

**Tipo de Beneficiario**

La población objetivo para el presente proyecto corresponde a un subconjunto de la población que debido a sus características, serán los principales demandantes de las nuevas métricas que se desarrollen a partir del proyecto en mención. Entre las principales características de este grupo se encuentran el hecho de contar con un nivel de instrucción superior o más, que les permitiría estar vinculados a diversas instituciones o realizar actividades de forma independiente, que consideran como insumo fundamental para la toma de decisiones las métricas desarrolladas.


**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 años.  
COSTO: El proyecto demanda de una inversión total de US\$ 785.739,32 a ser financiada con recursos fiscales, durante el período 2014 - 2016.  
ALCANCE: Metodologías innovadoras con análisis multicriterio así como generación de nueva producción estadística.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 73.19 %

Fecha de Inicio: 01/08/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

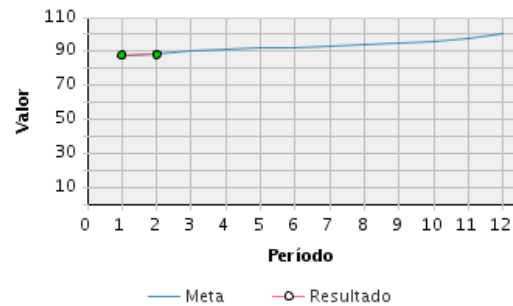

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2016                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 88 %                        | 88 % | 90 % | 92 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 96 % | 98 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 88 %                        | 88 % |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 2016                 | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2016</p> <p>1. El 13 de abril en la reunión de seguimiento físico y presupuestaria al proyecto, se comunica a DIPLA sobre las dificultades que se han presentado en la ejecución del proyecto, debido al retraso en la emisión de avales por parte de MIFIN para las contrataciones previstas, lo cual ha incidido tanto a nivel técnico como presupuestario. Por ello se plantea esperar una respuesta por parte del MIFIN hasta finales de abril y así con un panorama más claro sobre las fechas de contratación, realizar una reestructuración de hitos.</p> <p>2. El 18 de abril mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0059-M, se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera, la contratación del servicio de impresión de publicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto.</p> <p>2. El 26 de abril la Dirección Financiera notifica a CTIMA a través de Memorando Nro. INEC-CGAF-DIFI-2016-0572-M y Memorando No. INEC-CGAF-DIFI-2016-0573, acerca de la emisión de avales por parte del Ministerio de Finanzas para las consultorías "investigación y análisis del Buen Vivir" y "Gestión para estudios científicos externos al INEC" respectivamente, lo cual permite iniciar estos procesos de contratación.</p> <p>3. El día miércoles 27 de abril se comunica mediante videoconferencia a PYDLOS de la Universidad de Cuenca acerca del segundo pago del convenio, mismo que no ha podido a pesar de todas las gestiones institucionales realizadas, debido a la falta de liquidez en la caja fiscal.</p> | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina | 05/05/2016 -<br>02:51 PM      |
| <p>MARZO 2016</p> <p>Las actividades de mayor relevancia realizadas durante este mes son:</p> <p>1. El 1 de marzo mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0014-M se solicita a DIPLA la autorización para la modificación de la partida 780301 por la partida 730601 destinada a Gestión de estudios científicos externos al INEC, necesaria para el servicio de consultoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina | 25/04/2016 -<br>02:50 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2. Se realizan las gestiones para enviar el 3 de marzo el memorando Nro. INEC-DIPLA-2016-0002-O, en alcance al Oficio Nro. INEC-DIPLA-2016-0001-O mediante el cual se suspende el convenio con la U. de Cuenca PYDLOS, debido al cambio de rector.</p> <p>3. Envío de solicitud de autorización y pedido de aval al Ministerio de Finanzas para proceder con la contratación de la consultoría "Gestión de estudios científicos externos al Inec" enviada a través de memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0045-M el 15 de marzo, en el cual se incluyen los TDRs trabajados conjuntamente con la Dirección Administrativa</p> <p>4. El 18 de marzo se realiza el segundo adendum al proyecto, en atención al Memorando INEC-DIPLA-2016-0207-M mediante el cual se solicita la re estructuración en la planificación del proyecto debido al recorte presupuestario informado a través de memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0470-M.</p> <p>5. Los hitos 27 y 28 planificados para este mes no han podido ser cumplidos y se encuentran asociados a problemas en el campo correspondiente, donde se detallan sus razones y acciones de prevención.</p> <p>6. Se realiza el reporte de los indicadores registrados para el proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |
| <p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>Las actividades más relevantes ejecutadas durante este mes son:</p> <p>1. El 11 de febrero con memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0007-M se envía a DIPLA los documentos en formatos SENPLADES, solicitando actualización de actividades del proyecto.</p> <p>2. El día 12 de febrero se realiza una reunión con la Coordinadora General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, los directores del área jurídica y financiera del INEC y el director de PYDLOS para abordar la situación del convenio específico de cooperación técnica con la Universidad de Cuenca, tras lo cual se decide entre las partes suspender al mismo. Este particular es notificado formalmente a la Universidad de Cuenca a través de Oficio Nro. INEC-DIPLA-2016-0001-O el 18 de febrero.</p> <p>3. Envío de solicitud de autorización y pedido de aval al Ministerio de Finanzas para proceder con la contratación de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" enviada a través de memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0025-M el 13 de febrero, en el cual se incluyen los TDRs trabajados conjuntamente con la Dirección Administrativa.</p> <p>4. Elaboración de hitos para el año 2016.</p> <p>5. Cierre de lineamientos del Proyecto 2015.</p> <p>6. Realización del Informe sobre el estado de los resultados previos del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado. (Cumplimiento Hito 26)</p> | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina | 30/03/2016 -<br>03:56 PM      |
| <p><b>ENERO 2016</b></p> <p>Las actividades más representativas para el desarrollo del proyecto en este mes son:</p> <p>1. Reuniones con la SNGP como alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador (Hito cumplido 25).</p> <p>2. Elaboración de documentos en coordinación con DIPLA para la actualización de hitos en GPR para el año 2016.</p> <p>3. Elaboración de TDR's para la contratación de la consultoría de Investigación y Análisis de acuerdo a las observaciones emitidas por la Dirección de Compras Públicas.</p> <p>4. Comunicaciones con el equipo de PYDLOS- Universidad de Cuenca, en el marco del adendum previsto para el convenio específico en curso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina | 19/02/2016 -<br>10:24 AM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2015</b></p> <p>Las actividades más importantes realizadas durante este mes como parte del proyecto son:</p> <p>1. Recepción de Informes Analíticos por grupo de discusión entregados por el equipo del PYDLOS en el marco del estudio cualitativo en ejecución. (Hito cumplido 24)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina | 11/01/2016 -<br>03:37 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2. Supervisión y acompañamiento a los grupos de discusión #12, #13 y #15 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuados por el equipo PYDLOS, en las Provincias de Guayas y Galápagos respectivamente.</p> <p>3. Formulación y entrega a DIPLA de los lineamientos del Proyecto para el 2016.</p> <p>4. Formulación de los TDR's para la contratación del experto a cargo de la Consultoría "Análisis e investigación del Buen Vivir".</p> <p>5. Envío de oficio al Subsecretario de Pueblos e Interculturalidad del Secretaría Nacional de Gestión de la Política solicitando una reunión que permita obtener datos previos en el marco del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador pensado para el 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015</b></p> <p>Las actividades más relevantes ejecutadas durante este mes como parte del proyecto son:</p> <p>1. Recepción del Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado (Hito cumplido 22) realizado por el equipo del PYDLOS en el marco del estudio cualitativo en ejecución.</p> <p>2. Realización del Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado (Hito cumplido 23).</p> <p>3. Supervisión y acompañamiento a los grupos de discusión #3, #10 y #11 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuado por el equipo PYDLOS, en las Provincias de Manabí, El Oro y Pichincha respectivamente.</p> <p>4. Se recibe el Producto 5 por parte del experto Ec. Mauricio León, correspondiente al documento con el cálculo y análisis de los indicadores del Buen Vivir disponibles y con las recomendaciones de nuevos indicadores y fuentes de información. Este documento estuvo acompañando de un Informe Final que recoge el trabajo realizado en la Consultoría para la "Operativización de la medición del Buen Vivir para el desarrollo de las actividades del proyecto Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas" como parte de su culminación.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión con representantes del CODEMPE y CODEPMOC como parte del trabajo previo al mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador.</p> | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina   | 08/12/2015 -<br>02:18 PM      |
| <p><b>OCTUBRE 2015</b></p> <p>En este mes las actividades más relevantes ejecutadas dentro del proyecto son:</p> <p>1. Recepción del documento que contiene el Informe de la capacitación en metodología cualitativa, entregado por la experta Ana Martínez (Hito cumplido 19.)</p> <p>2. Se concluye con la elaboración de los contenidos para la página web de la Red académica de estudios del Buen Vivir, mismo que se encuentran actualmente en revisión, antes de ser enviados en su versión final a DICOS (Hito cumplido 20).</p> <p>3. Se cuenta con el acta de la reunión de la sub comisión de naturaleza, donde se evaluaron los avances en torno a la construcción de indicadores para este componente.</p> <p>4. Se realiza la supervisión y acompañamiento al grupo de discusión #2 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuado por el equipo PYDLOS, en la Provincia del Azuay el 22 de octubre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Guayasamin<br>Albuja, Diana<br>Carolina   | 03/12/2015 -<br>05:42 PM      |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2015</b></p> <p>Las actividades más relevantes para el proyecto durante este mes son:</p> <p>1. Entrega del documento para el compendio del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", para diagramación y publicación digital, en coordinación con FAO-ONU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gutiérrez<br>Cárdenas, Paola<br>Alexandra | 07/10/2015 -<br>02:23 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2. En el marco de la comisión estadística del buen vivir, se realiza la primera reunión de la sub comisión de naturaleza para evaluar los avances en torno a la construcción de indicadores para este componente e iniciar con la definición y elaboración de indicadores ambientales.</p> <p>3. Se da inicio al estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", a través de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de la prueba piloto correspondiente al grupo de discusión número 1, realizada el 25 de septiembre. (Hito cumplido 18)</li> <li>- Capacitación metodológica en grupos de discusión a la que asistió personal de INEC y PYDLOS - Universidad de Cuenca, llevada a cabo en la oficinas de INEC- Iñaquito, los días 26 y 26 de septiembre. (Hito cumplido 19).</li> </ul> <p>4. Se realiza en coordinación con el equipo DIPLA la reestructuración de hitos del proyecto, aprobada mediante Memorando Nro. INEC. DIREJ-2015-0526-M.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                               |
| <p><b>AGOSTO 2015</b></p> <p>Durante este mes se han realizado las siguientes actividades relevantes para el proyecto:</p> <p>1. Compilación, revisión y corrección de estilo a los documentos entregados por los ponentes en el marco del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", para su publicación.</p> <p>2. Se realiza la segunda reunión de la comisión estadística del buen vivir en la cual se presenta la propuesta del concepto del Buen Vivir, sus dimensiones e indicadores, tras lo cual se decide que la metodología de trabajo de la comisión sera a través de sub comisiones que trabajarán las distintas temáticas (personas, comunidades y naturaleza). En este sentido las instituciones que intervienen han procedido a revisar el documento y enviar sus comentarios, mismos que están siendo evaluados para su incorporación.</p> <p>3.. Se realizaron 2 reuniones - videoconferencias con OPHI, con la finalidad de definir las actividades para el proyecto "Asesoría para la formulación de métricas nuevas y alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en Ecuador", a desarrollarse en conjunto con esta institución, tras lo cual INEC envía la propuesta y recibe una contra propuesta a conformidad. Se espera coordinar a través de DIPLA la obtención de fondos para este proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gutiérrez<br>Cárdenas, Paola<br>Alexandra | 08/09/2015 -<br>11:45 AM      |
| <p><b>JULIO 2015</b></p> <p>1. Tras la realización del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", el equipo del proyecto realiza las sistematización de las mesas de discusión en el ámbito conceptual, metodológico e institucional, obteniendo el documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional (Hito cumplido 18).</p> <p>2. El 27 de julio del año en curso se realiza la firma del Convenio con PYDLOS - Universidad de Cuenca, lo cual permite iniciar el proceso para la transferencia de fondos. Se estima que una vez realizada dicha transferencia se de inicio a los estudios cualitativos (Hito asociado 14).</p> <p>3. El 24 de julio se realiza la reunión de asesoramiento para la elaboración de la página web de la Red Académica de estudios del buen vivir (Hito asociado 13) con las Direcciones de: Comunicación Social, Tecnologías de la Información y Comunicación, Registros Administrativos, Talento Humano y Jurídico, tras lo cual se ve la necesidad de modificar la figura de contratación y realizar ajustes técnicos al requerimiento. En este sentido se realiza además una reunión con la Dirección de Comunicación Social, el 31 de julio, en la cual se establece la posibilidad de solventar la necesidad de la elaboración de la página web desde la misma.</p> <p>Los hitos 13 y 14 se mantienen retrasados en su cumplimiento, pero se estima que el mes siguiente se los pueda dar cumplimiento, sin embargo se reitera que el cumplimiento de dichos hitos se vinculan a procesos administrativos que salen de la ejecución del proyecto.</p> | Gutiérrez<br>Cárdenas, Paola<br>Alexandra | 06/08/2015 -<br>11:08 AM      |
| <p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>El trabajo coordinado y oportuno por parte del equipo del Proyecto de Nuevas Métricas, a nivel inter institucional tanto a nivel nacional como internacional, permitió la realización del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas alternativas del buen vivir y el bien - estar", que contó con la participación de 16 ponentes que brindaron interesantes reflexiones sobre a la construcción del Buen Vivir en el Ecuador y el mundo, y más de 200 asistentes. (Hito cumplido 17)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gutiérrez<br>Cárdenas, Paola<br>Alexandra | 04/07/2015 -<br>01:11 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                                     | Fecha de última actualización    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Tras la aprobación de la re programación solicitada a la Dirección de Planificación, mediante Memorando Nro. INEC- CTIMA-2015-0074-M, de fecha 6 de mayo de 2015, se procede a solicitar a la Universidad e Cuenca (PYDLOS), la firma del Convenio que permite la transferencia de fondos para iniciar los estudios cualitativos sobre el Buen Vivir, al cual como contra parte desde PYDLOS, se solicitan modificaciones antes de la suscripción, mismas que han sido incluidas y al momento se espera la respuesta por parte de PYDLOS. Esto sigue generando un retraso en el cumplimiento del hito asociado 14.</p> <p>La aprobación de la re programación, a su vez permite planificar el inicio del proceso de contratación del servicio de diseño y elaboración de una pagina web que consolide la Red Académica de Estudios (hitos asociados 13), para lo cual se prevé contar con el asesoramiento de las Direcciones institucionales involucradas ( Dirección de Talento Humano, Dirección de Comunicación, Dirección de Tecnologías y Dirección Administrativa Financiera).</p> <p>Se espera en lo siguientes meses dar cumplimiento a estos hitos retrasados, pero cabe indicar que los mismos se verán atados a procesos administrativos inherentes a la institución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                  |
| <p>MAYO 2015</p> <p>Con fecha 6 de mayo se emite el Memorando Nro. INEC- CTIMA-2015-0074-M, mismo que solicita la aprobación para la re programación de valores que permiten la firma del Convenio con la Universidad de Cuenca (PYDLOS) para la realización de estudios cualitativos sobre el Buen Vivir, así como la contratación del servicio de diseño y elaboración de una pagina web que consolide la Red Académica de Estudios. Debido a que dicho Adendum ha sido enviado mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2015-0447-M a la Sub Dirección General y al momento se espera su aprobación, algunos hitos no han podido ser cumplidos de acuerdo a lo programado (Hitos asociados 13 y 14).</p> <p>Se recibe el documento que contiene una primera propuesta de indicadores para el Buen Vivir por parte del experto consultor contratado para este fin (Hito cumplido 15).</p> <p>Los procesos realizados desde el Proyecto de Nuevas Métricas, a nivel institucional con la Dirección de Comunicación y a nivel Interinstitucional con la Secretaría Nacional del Buen Vivir, han permitido coordinar a nivel logístico y técnico la realización del evento internacional "El Buen Vivir: Mediciones alternativas del buen vivir y el bien - estar" (Hito cumplido 16).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Gutiérrez<br/>Cárdenas, Paola<br/>Alexandra</p> | <p>04/06/2015 -<br/>04:16 PM</p> |
| <p>ABRIL 2015</p> <p>El 13 de abril se concreta la contratación de la experta en técnicas de medición cualitativas (asociado al hito 12), para la formulación del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir.</p> <p>En el marco de la realización de evento internacional de nueva métricas "El Buen Vivir: Mediciones alternativas del buen vivir y el bien - estar", se continuó realizando invitaciones para ponencias, dando como resultado al finalizar la actividad, contar con la confirmación de participación de 11 ponentes internacionales. En este sentido además el 29 de abril se realiza una reunión con el equipo de la Secretaría del Buen Vivir, a fin de coordinar la participación de Bolivia en el evento.</p> <p>En cuanto a la contratación de la empresa para la organización y realización del evento internacional, se solicita a la Dirección de Comunicación a través de Memorando No. INEC-CTIMA-2015-0069-M, la asignación de una mayor cantidad de recursos, en virtud de que se considera oportunamente la incorporación de nuevos temas a discutir dentro del evento, lo cual implica por lo tanto la ampliación del público objetivo, y aumentar el número de ejemplares de la publicación "Compendio de experiencias de nuevas medidas del bienestar". La Dirección de Comunicación recibe la aprobación de aumento de recursos a través del Memorando No. INEC-DIPLA-2015-0333 el 30 de abril. Al momento se espera que la Dirección de Comunicación solicite autorización a la Dirección Ejecutiva.</p> | <p>Gutiérrez<br/>Cárdenas, Paola<br/>Alexandra</p> | <p>05/05/2015 -<br/>03:29 PM</p> |
| <p>MARZO 2015</p> <p>Solicitud de creación de la Comisión Especial emitida por la CTIMA a la CTPES mediante memorando INEC-CTIMA-2015-0033-M del 27 de febrero de 2015. La CTPES remite la solicitud al departamento jurídico el 25 de marzo de 2015 con memorando INEC-CTPES-2015-0059-M. Se espera respuesta de jurídico. (Asociado al hito 10).</p> <p>Solicitud de contratación de profesional cualitativo. Se recibe la autorización de contratación de profesional cualitativo para el diseño de estudios en campo por parte del Director Ejecutivo mediante memorando INEC-DIREJ-2015-0104-M del 13 de marzo de 2015. El 16 de marzo de 2015 se realiza la solicitud de contratación a Coordinación Administrativa con Memorando Nro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Gutiérrez<br/>Cárdenas, Paola<br/>Alexandra</p> | <p>05/05/2015 -<br/>02:38 PM</p> |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                                     | Fecha de última actualización    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>INEC-CTIMA-2015-0048-M. El 26 de marzo de 2015 se realiza un alcance a la solicitud ajustando la contratación a la escala de 20 grados del Ministerio de Relaciones Laborales. (Asociado al hito 12).</p> <p>Reunión virtual con Sabina Alkire, economista británica, creadora del índice de pobreza multidimensional para recibir retroalimentación de los avances realizados en el INEC en lo relacionado con la medición de la pobreza multidimensional. (Asociado al hito 11).</p> <p>Invitaciones a participar en el evento internacional de nuevas métricas realizadas a los ponentes internacionales. Se enviaron 12 invitaciones, se recibieron 6 respuestas, de las cuales 4 fueron afirmativas. El 1 de abril de 2015 se recibe la aprobación de lineamientos de comunicación por parte del Director Ejecutivo con memorando INEC-DIREJ-2015-0130-M, lo que faculta a la Dirección de Comunicación a realizar la contratación de una empresa para la organización y realización del evento internacional. CTIMA envía a Comunicación los términos de referencia técnicos para la contratación de dicha empresa. (Asociado al hito 15).</p> <p>Elaboración hoja de ruta para firma de convenio específico con la Universidad de Cuenca. Considerando la experticia de PYDLOS, instituto de investigación de la Universidad de Cuenca, se decide realizar los estudios cualitativos en territorio con PYDLOS. Para ello se realiza la solicitud de firma de convenio específico a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2015-0052-M del 25 de marzo de 2015. (Asociado al hito 13)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                  |
| <p><b>FEBRERO de 2015</b></p> <p>1. En el marco de la conformación de la Red Académica sobre métricas y estudios del Buen Vivir se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>a. Se suscribieron los convenios inter-institucionales con la Universidad San Gregorio de Manabí y la Universidad de Cuenca en el Azuay. En el marco de estos convenios se establecen las alianzas para la generación de red académica. (Hito cumplido 9)</p> <p>b. Se realizó un encuentro en Cuenca con el Centro de Investigaciones PYDLOS, de la Universidad de Cuenca a fin de conocer las investigaciones que se desarrollan sobre métricas del bienestar, Buen Vivir y aplicabilidad de estudios a nivel territorial. Adicionalmente, se estableció una agenda de trabajo en la que se considera al centro PYDLOS como principal aliado en la Zona Sur para estudios cualitativos y cuantitativos en nuevas métricas del Bienestar. (Hito cumplido 9)</p> <p>c. Como parte del fortalecimiento de redes y espacios académicos se vinculó al los diálogos estadísticos dos ponentes relevantes para nuevas métricas como fue Pablo Dávalos y Mauricio León, en lo referente al Buen Vivir y su definición. Este proceso permite socializar y generar espacio de discusión entre los hacedores de métricas de la Institución.</p> <p>2. Inicio de la definición contractual del profesional especializado en metodologías cualitativas (Hito asociado 8).</p> <p>3. Definición del Plan de actividades para la conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir y requerimiento enviado a las autoridades para aprobación. (Hito asociado 10)</p> <p>El experto del Proyecto de Nuevas Métricas presentó el documento analítico sobre las corrientes de pensamiento existentes en el país sobre el Buen Vivir. (Hito asociado 13)</p> <p><b>ENERO de 2015</b></p> <p>1. Análisis de las experiencias nacionales a partir de los resultados obtenidos en el taller nacional de nuevas métricas. Se analizaron los enfoques neomarxistas, post modernistas e indigenistas para conceptualizar el Buen Vivir y sus posibles dimensiones. (HITO CUMPLIDO N.6)</p> <p>2. Elaboración de la lista de expertos internacionales sobre nuevas métricas de Bienestar, identificando los ejes de aplicación para el análisis de bienestar, los enfoques asumidos. (HITO CUMPLIDO N.7)</p> <p>3. Preparación de la hoja de ruta y actividades de cooperación inter-institucional en el marco de convenios con instituciones académicas (Hito asociado 9)</p> <p>4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar.</p> | <p>Gutiérrez<br/>Cárdenas, Paola<br/>Alexandra</p> | <p>06/04/2015 -<br/>09:49 AM</p> |
| <p><b>DICIEMBRE de 2014</b></p> <p>1. Realización del Taller Nacional de Nuevas Métricas el 2 y 3 de Diciembre. En este Taller se contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales quienes presentaron, desde diferentes enfoques el nuevo paradigma del Buen Vivir y sus diferentes formas de medirlo. Así mismo se contó con la participación de mas de cien personas entre académicos, analistas técnicos de instituciones públicas, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil. (HITO CUMPLIDO N. 5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Grijalva<br/>Tarapuez, Juan<br/>Francisco</p>   | <p>05/02/2015 -<br/>12:41 PM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <p>2. Finalización del proceso contractual con la empresa que se encargó del desarrollo logístico del evento. Esta fase comprendió la suscripción de actas entrega recepción finales, entrega de productos y proceso administrativo para ejecución del pago respectivo. (HITO CUMPLIDO N. 5)</p> <p>3. Preparación de los documentos requeridos para la suscripción de convenios con instituciones académicas así como el diseño de objetivos y plan de trabajo para conformar la Comisión Estadística Especial para la Construcción de Nuevas Métricas del Buen Vivir. (documentos preparatorios para cumplir con el HITO 9)</p> <p>4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar.</p> <p>NOVIEMBRE de 2014</p> <p>1. Incorporación de un nuevo miembro al equipo de Nuevas Métricas. Con esta actividad queda conformado el equipo de trabajo con un experto y dos analistas. (HITO CUMPLIDO N. 3)</p> <p>2. Coordinación logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas del Buen Vivir a desarrollarse el 2 y 3 de diciembre. Esta actividad comprende el proceso de contratación para el desarrollo del evento de nuevas métricas, coordinar con los ponentes para que las presentaciones respondan a los objetivos planificados. (HITO CUMPLIDO N. 4)</p> <p>3. Incorporación del Experto en operativización para la medición del Buen Vivir (HITO CUMPLIDO N. 2).</p> <p>4. Elaboración y planificación de actividades 2014 y 2015 para ejecución del Proyecto.</p> <p>OCTUBRE de 2014:</p> <p>1. Inicia la planificación del Taller Nacional "El Buen Vivir, construyendo métricas" con el diseño de la agenda del taller y elaboración de términos de referencia para iniciar la contratación respectiva. En esta actividad se estableció como prioritario integrar en la agenda a los principales exponentes del ámbito académico que trabajan el Buen Vivir en sus espacios de investigación y político que han logrado posicionar en la agenda pública el paradigma del Buen Vivir. (HITO CUMPLIDO N. 1).</p> <p>2. Preparación de los términos de referencia e inicio del proceso de contratación del experto en Operativización para la medición del Buen Vivir. (guarda relación con el HITO 2)</p> <p>3. Se realizó la gestión para la contratación de otro miembro de equipo para iniciar la ejecución del Proyecto de Nuevas Métricas (guarda relación con el HITO 3).</p> <p>AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2014:</p> <p>1. El proyecto "Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas" fue priorizado por SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0806-OF del 12 de agosto de 2014.</p> <p>2. Se aprobaron los lineamientos del proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva. Allí se explicita la partida presupuestaria para uso de los recursos.</p> <p>3. El 22 de septiembre se realiza la contratación del primer miembro del equipo para ejecución del Proyecto.</p> |                |                               |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                                                                                                                                                                  | Fecha de última actualización | Responsable                      | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| El retraso en la obtención del aval por parte del MIFIN para la contratación de la consultoría Investigación y Análisis del Buen Vivir CAUSARIA un aplazamiento en la entrega de los productos esperados. | 05/05/2016                    | Diana Carolina Guayasamin Albuja | 50       | 70      | 35           | 1/2                         |
| El retraso en la realización de transferencias a la Universidad de Cuenca CAUSARIA un aplazamiento en la entrega del Informe final del estudio cualitativo.                                               | 05/05/2016                    | Oscar Roberto Castillo Añazco    | 50       | 70      | 35           | 4/5                         |

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 2



## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de última actualización | Responsable                      | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>4- ORGANIZACIONAL. * General.</b><br>La falta de participación a nivel interinstitucional para enviar la retroalimentación oportuna de las discusiones generadas en la Comisión Estadística, CAUSARIA retraso en la formulación de la propuesta de indicadores del Buen Vivir. | 19/02/2016                    | Diana Carolina Guayasamin Albuja | 50 %         | 50      | 25           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | EJECUCIÓN: Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas elaborada.                                                  | 4-Inicio de Trabajo       | 17/10/2014         |                | 17/10/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Gestión para conformación del equipo técnico y experto en nuevas métricas realizada.                                                | 4-Inicio de Trabajo       | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 3  | EJECUCIÓN: Equipo de trabajo consolidado                                                                                                       | 4-Inicio de Trabajo       | 04/11/2014         |                | 04/11/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Coordinación logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas implementada                                                          | 4-Inicio de Trabajo       | 29/11/2014         |                | 29/11/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 5  | EJECUCIÓN: Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado                                                                                        | 4-Inicio de Trabajo       | 03/12/2014         |                | 03/12/2014 |          | Sí            | 5.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre la conceptualización del Buen Vivir y experiencias nacionales en métricas alternativas elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 09/01/2015         |                | 09/01/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Referentes nacionales e internacionales relacionados con métricas alternativas del bienestar identificados.                         | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2015         |                | 29/01/2015 |          | Sí            | 2.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Proceso contractual de experto en técnicas de medición cualitativas iniciado                                                        | 2-Publicación de Pliegos  | 17/02/2015         |                | 17/02/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Red Académica para la construcción de nuevas métricas conformada.                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |          | Sí            | 2.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Solicitud de conformación de Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas enviada                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |          | Sí            | 2.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                        | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11 | EJECUCIÓN: Videoconferencia con expertos internacionales realizada                                                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir elaborado.                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 3.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Propuesta del sistema de indicadores del Buen Vivir elaborada                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015         |                | 30/05/2015 |    | Sí            | 4.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Organización logística y técnica del Taller Internacional de Nuevas Métricas elaborada.                                                                                                          | 4-Inicio de Trabajo       | 01/06/2015         |                | 01/06/2015 |    | Sí            | 3.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Taller Internacional de Nuevas Métricas realizado                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 03/07/2015         |                | 03/07/2015 |    | Sí            | 5.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional elaborado.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015         |                | 31/07/2015 |    | Sí            | 4.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Hoja de ruta del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador elaborada | 5-Entregables Intermedios | 27/08/2015         |                | 27/08/2015 |    | Sí            | 6.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la prueba piloto de grupo de discusión para estudio cualitativo elaborado                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 4.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Informe de la capacitación en metodología cualitativa elaborado                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 06/10/2015         |                | 06/10/2015 |  | Sí            | 4.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Contenidos para la página web de la red académica elaborados                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2015         |                | 15/10/2015 |  | Sí            | 5.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Acta de reunión de las subcomisiones sobre avances en la definición de indicadores del buen vivir elaborada                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 16/10/2015         |                | 16/10/2015 |  | Sí            | 4.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2015         |                | 06/11/2015 |  | Sí            | 5.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 23/11/2015         |                | 23/11/2015 |  | Sí            | 4.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informes analíticos por grupos de discusión entregados                                                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 5.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 25 | EJECUCIÓN: Alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizadas.                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2016         |                | 29/01/2016 |    | Sí            | 0.65          |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe previo de resultados del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de ecuador realizado.    | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.52          |
| 27 | EJECUCIÓN: Plan de Proyecto de Investigación y Análisis del Buen Vivir elaborado.                                                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 24/03/2016         | 24/03/2016     |            |    | No            | 1.17          |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe final del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de ecuador realizado.                   | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2016         | 30/03/2016     |            |    | No            | 0.52          |
| 29 | EJECUCIÓN: Evento de difusión de publicaciones #1 realizado.                                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 05/04/2016         | 05/04/2016     |            |    | No            | 0.52          |
| 30 | EJECUCIÓN: Marco Conceptual para la definición de las unidades de análisis: pueblos, comunidades y nacionalidades, así como la caracterización de estas unidades acorde a la información estadística disponible elaborado       | 5-Entregables Intermedios | 27/04/2016         | 27/04/2016     |            |  | No            | 1.17          |
| 31 | EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #1 realizado.                                                                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2016         | 05/05/2016     |            |  | No            | 0.39          |
| 32 | EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #2 realizado.                                                                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         | 30/06/2016     |            |  | No            | 0.39          |
| 33 | EJECUCIÓN: Definición teórica y operativa de los indicadores del subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del Sistema Estadístico Nacional elaborado.                                  | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2016         | 08/07/2016     |            |  | No            | 1.17          |
| 34 | EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #3 realizado.                                                                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2016         | 29/08/2016     |            |  | No            | 0.39          |
| 35 | EJECUCIÓN: Justificación de la fijación de las líneas de pobreza, de suficiencia y de riqueza del subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del Sistema Estadístico Nacional elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 07/09/2016         | 07/09/2016     |            |  | No            | 1.17          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de resultados del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizado.                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         | 31/10/2016     |            |    | No            | 0.65          |
| 37 | EJECUCIÓN: Acta de la reunión para la propuesta de indicadores del BV por parte de la Comisión Estadística para personas, comunidades y ambiente realizada.                                     | 5-Entregables Intermedios | 04/11/2016         | 04/11/2016     |            |    | No            | 0.65          |
| 38 | EJECUCIÓN: Plan integral de mejoras a la producción estadística del SEN acorde a las necesidades de información que demande el nuevo sistema integrado de indicadores del Buen Vivir elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 07/11/2016         | 07/11/2016     |            |    | No            | 1.17          |
| 39 | EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #4 realizado.                                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 23/11/2016         | 23/11/2016     |            |    | No            | 0.39          |
| 40 | EJECUCIÓN: Documento de la asistencia metodológica y verificación técnica de la validez de los índices compuestos realizado.                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 05/12/2016         | 05/12/2016     |            |    | No            | 1.04          |
| 41 | EJECUCIÓN: Evento de difusión de publicaciones #2 realizado.                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 05/12/2016         | 05/12/2016     |            |   | No            | 0.52          |
| 42 | CIERRE: Informe de actividades ejecutadas en el proyecto elaborado.                                                                                                                             | 9-Entregables Formales    | 28/12/2016         | 28/12/2016     |            |  | No            | 0.52          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                      | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta   | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de avance en el diseño de construcción de nuevas métricas del buen vivir                            |  | 0.00 %            | 0.8335 | 0                     | 01/10/2014      | Ene-Mar                    |
| 2 | Porcentaje de incremento en el diseño de metodologías para la construcción las nuevas métricas del buen vivir. |  | 100.00 %          | 0      | 0                     | 01/10/2014      | Ene-Mar                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00          |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 583,648.88 ** |
| Costo Total:                  | 757,508.00    |
| Total Devengado:              | 337,020.36    |
| % Costo Total Devengado:      | 44.49 %       |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 44.49 %

## Perfil Económico 2016

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total      |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| Ppto. Planeado                                          | 440,000.00   | 282,307.84        | 0.00         | 722,307.84 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 440,000.00   | 282,307.84        | 0.00         | 722,307.84 |
| Ppto. Codificado                                        | 364,282.66   | 277,380.55        | 0.00         | 641,663.21 |
| Ppto. Comprometido                                      | 308,118.33   | 30,752.03         | 0.00         | 338,870.36 |
| Planeado - Codificado (2016)                            |              | 4,927.29          |              |            |
| Programado a Devengar                                   | 364,282.66   | 277,380.55        | 0.00         | 641,663.21 |
| Ppto. Devengado                                         | 306,268.33   | 30,752.03         | 0.00         | 337,020.36 |
| Estimado a fin de año                                   | * 306,268.33 | 0.00              | 0.00         | 306,268.33 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 58,014.33    | 277,380.55        | 0.00         | 335,394.88 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 84.07 %    | 11.09 %           | 0.00 %       | 52.52 %    |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

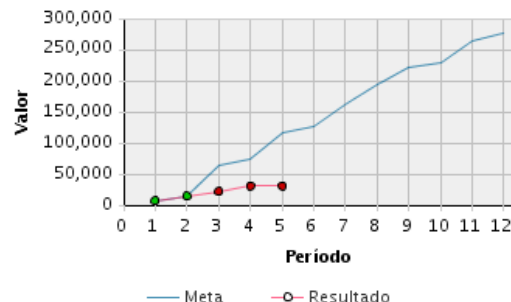

## Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 6,981.42                   | 7,049.48            | 6,981.42                     | 7,049.48              | 100.97 %         |        | 2.54 %       |

| Presupuesto Mensual 2016 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 7,511.79                   | 7,290.05            | 14,493.21                    | 14,339.53             | 98.94 %          |  | 5.17 %       |
| Mar                      | 48,408.48                  | 7,290.05            | 62,901.69                    | 21,629.58             | 34.39 %          |  | 7.80 %       |
| Abr                      | 11,144.81                  | 9,122.45            | 74,046.50                    | 30,752.03             | 41.53 %          |  | 11.09 %      |
| May                      | 42,972.57                  | 0.00                | 117,019.07                   | 30,752.03             | 26.28 %          |  | 11.09 %      |
| Jun                      | 8,644.81                   |                     | 125,663.88                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Jul                      | 35,148.01                  |                     | 160,811.89                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Ago                      | 31,835.20                  |                     | 192,647.09                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Sep                      | 28,005.88                  |                     | 220,652.97                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Oct                      | 7,511.79                   |                     | 228,164.76                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 34,976.32                  |                     | 263,141.08                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 14,239.47                  |                     | 277,380.55                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>277,380.55</b>          | <b>30,752.03</b>    |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                   | Incrementar el desarrollo de investigaciones científicas en función de la producción del SEN, MEDIANTE la elaboración de estudios y documentos analíticos, de tipo periódico o especializado en la temática de nuevas métricas y metodologías      |
| 14                   | Incrementar el posicionamiento institucional en la innovación de métricas y metodologías en el ámbito público y privado MEDIANTE la participación en espacios interinstitucionales, elaboración de documentos de análisis y alianzas estratégicas. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                    | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | ASOCIACIÓN HITO 16.- Documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional elaborado.                                                                                              | C5.pdf  | 10/12/2015    |
| 2  | Acta de constitución del Proyecto                                                                                                                                                                                         | B1.pdf  | 28/04/2015    |
| 3  | Acta de Constitución Proyecto 2016                                                                                                                                                                                        | D8.pdf  | 19/02/2016    |
| 4  | Acta de reunión de la videoconferencia realizada con expertos. (Asociada al hito 11)                                                                                                                                      | B7.pdf  | 28/04/2015    |
| 5  | Agenda del taller Buen Vivir, asociado al hito 1 (Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas)                                                                                                | A1.pdf  | 28/04/2015    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 12.- Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir elaborado_final.                                                                                 | C1.pdf  | 04/06/2015    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 13.- Documento de la Propuesta de Indicadores del Buen Vivir.                                                                                                                                             | C2.pdf  | 04/06/2015    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 14.- Agenda del Evento Internacional de Nuevas Métricas_versiónfinal                                                                                                                                      | C3.pdf  | 10/12/2015    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 15.- Taller Internacional de Nuevas Métricas realizado                                                                                                                                                    | C4.pdf  | 10/12/2015    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 17.- Hoja de ruta del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares en el Ecuador elaborada. | C6.pdf  | 10/12/2015    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 18.- Informe de ejecución de la prueba piloto de grupo de discusión para estudio cualitativo elaborado.                                                                                                   | C7.pdf  | 10/12/2015    |



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                 | Archivo | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 19.- Informe de la capacitación metodológica en grupos de discusión elaborado.                                                                                                                                         | D1.pdf  | 06/10/2015    |
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 20.- Documento con contenidos para la página web de la red académica elaborados_ versión final.                                                                                                                        | D2.pdf  | 10/12/2015    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 21.- Acta de reunión de las subcomisiones sobre avances en la definición de indicadores del buen vivir elaborada.                                                                                                      | D3.pdf  | 19/10/2015    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 22.- Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado_Versión Final                                                                       | D4.pdf  | 10/12/2015    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO 23.-Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado.                                                                                                  | D5.pdf  | 10/12/2015    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 24.- Informes Analíticos por grupo de discusión entregados.                                                                                                                                                            | D6.pdf  | 31/12/2015    |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO 25.- Alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizadas.                                                                         | D7.pdf  | 19/02/2016    |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO 26.- Informe previo de resultados del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado. | D9.pdf  | 04/03/2016    |
| 20 | Conformación del Equipo técnico. Contratación experto en nuevas métricas. (Asociado al hito 2)                                                                                                                                         | A2.pdf  | 28/04/2015    |
| 21 | Consolidación del Equipo Técnico. Contrataciones. (Asociado al hito 3)                                                                                                                                                                 | A3.rar  | 28/04/2015    |
| 22 | Contrato para la Coordinación Logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas. (Asociado al hito 4)                                                                                                                                   | A4.pdf  | 28/04/2015    |
| 23 | Documento de priorización del Proyecto de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas                                                                                              | B2.pdf  | 28/04/2015    |
| 24 | Documento del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir_Preliminar. (Asociado al hito 12)                                                                                    | B9.pdf  | 08/05/2015    |
| 25 | Fortalecimiento de la Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad de Cuenca. (Asociado al hito 9)                                                                                                                           | A9.pdf  | 28/04/2015    |
| 26 | Fortalecimiento Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí. (Asociado al hito 9)                                                                                                        | B5.pdf  | 28/04/2015    |
| 27 | Informe de gestión TDR's profesional especializado en metodología cualitativa. (Asociado al hito 8)                                                                                                                                    | A8.pdf  | 28/04/2015    |
| 28 | Listado de expertos y referentes internacionales de métricas alternativas de Bienestar. (Asociado al hito 7)                                                                                                                           | A7.pdf  | 28/04/2015    |
| 29 | Project Charter 2016                                                                                                                                                                                                                   | E1.pdf  | 04/04/2016    |
| 30 | Proyecto aprobado por SENPLADES                                                                                                                                                                                                        | B3.pdf  | 28/04/2015    |
| 31 | Reestructuración de Hitos 1                                                                                                                                                                                                            | C8.pdf  | 10/12/2015    |
| 32 | Reestructuración de Hitos 2- Septiembre 2015                                                                                                                                                                                           | C9.rar  | 05/10/2015    |
| 33 | Registro de asistencia al Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado. (Asociado al hito 5)                                                                                                                                           | A5.rar  | 28/04/2015    |
| 34 | Riesgo 2, acción 1. Contratación.                                                                                                                                                                                                      | B4.pdf  | 28/04/2015    |
| 35 | Sistematización Evento Nuevas Métricas, Experiencias Nacionales (Asociado al hito 6)                                                                                                                                                   | A6.pdf  | 28/04/2015    |
| 36 | Solicitud de conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir. (Asociado al hito 10)                                                                                                     | B6.pdf  | 28/04/2015    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                            | Rol                  | Puesto            | Correo Electrónico           | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| Guayasamin Albuja, Diana Carolina | Analista de Proyecto | Lider de proyecto | diana_guayasamin@inec.gob.ec |             |
| Serrano Mera, Juan Carlos         | Miembro de equipo    | Analista          | juan_serrano@inec.gob.ec     | 2448871     |
