

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**

**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**

**Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)**

**PROYECTO: K003 INEC - Actualización Cartografía y Mejora de la Información de Direcciones**

|                                |                                                              |                                 |                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Meza Moreno, Aldana Geomara (aldana_meza@inec.gob.ec)        |                                 |                                                                     |
| Patrocinador Ejecutivo:        | García Guerrero, Jorge Eduardo                               | Programas Relacionados:         | ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y MEJORA DE LA INFORMACION DE DIRECCIONES |
| Titular:                       | Meza Moreno, Aldana Geomara                                  | Prioridad:                      | 0                                                                   |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                                                                |
| CUP:                           | 31210000.0000.380431                                         | TIR:                            | 0.00 %                                                              |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                                                                |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 259,925.81                                                          |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                                                                     |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2016 - 31/12/2016                                             |
| Fecha de última actualización: | 05/12/2016                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2016                                                          |
| Modificado por:                | Meza Moreno, Aldana Geomara                                  | Fecha del siguiente Hito:       | 16/12/2016                                                          |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: Actualmente el Marco Muestral de Empresas dispone alrededor de 25.900 empresas con datos de zonificación, 11.800 son microempresas y 14.100 empresas son pequeñas, medianas y grandes. En el presente proyecto se tiene planificado realizar la zonificación de Empresas nuevas o que han cambiado su ubicación; a través de indagaciones de información de ubicación mediante verificaciones de campo y de gabinete (oficina)

PRODUCTO: Base de establecimientos económicos con su respectiva zonificación y ubicación.

LINEA BASE: Directorio de empresas y establecimientos sin dato de zonificación

OBJETIVO GENERAL : Contar con una base geográfica y alfanumérica actualizada del marco muestral del Directorio de empresas y establecimientos DICE.

OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar y zonificar la información de direcciones de las empresas del DICE mediante el levantamiento en campo y en gabinete (Oficina).

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir a la actualización del directorio de empresas económicas del INEC y ponerla a disposición de los usuarios tanto internos. Alrededor de 24108 empresas del DICE zonificadas y geo-referenciadas.

**Tipo de Beneficiario**

Instituciones del Sistema Estadístico Nacional

**Restricciones**

ALCANCE: El no contar con el directorio de empresas para poder realizar la actualización de direcciones y la zonificación de las empresas.

TIEMPO: El tiempo del proyecto es de un año, hasta finales del año 2016

COSTO: \$286.941,42


RECURSOS: Personal técnico y de apoyo contratado

**Fase Actual:**

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 93.44 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016

Fecha de Fin: 31/12/2016

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

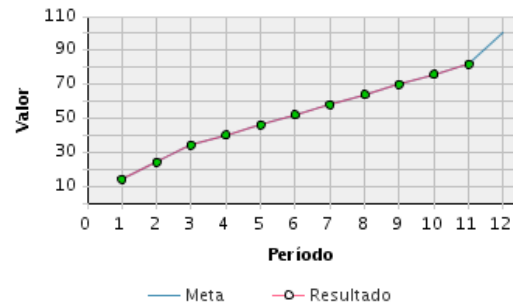

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2016                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 14 %                        | 24 % | 34 % | 40 % | 46 % | 52 % | 58 % | 64 % | 70 % | 76 % | 82 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 14 %                        | 24 % | 34 % | 40 % | 46 % | 52 % | 58 % | 64 % | 70 % | 76 % | 82 % |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |       |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>NOVIEMBRE 2016:</b><br>1.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.<br>2.- Se revisa y valida la información levantada en gabinete (CallCenter).<br>3.-Se realizó el informe de Establecimientos Económicos actualizados en gabinete a nivel nacional. (Hito 11 cumplido).                                                                                                                                                                                                  | Meza Moreno, Aldana Geomara | 02/12/2016 - 08:54 AM         |
| <b>OCTUBRE 2016:</b><br>1.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.<br>2.- Se revisa y valida la información levantada en gabinete (CallCenter).<br>3.-Se realizó el informe de Establecimientos Económicos actualizados en gabinete a nivel nacional. (Hito 10 cumplido).                                                                                                                                                                                                    | Meza Moreno, Aldana Geomara | 29/11/2016 - 10:57 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2016:</b><br>1.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)<br>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.<br>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).<br>4.-Se realizó el informe detallado de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete a nivel nacional. (Hito 9 cumplido). | Meza Moreno, Aldana Geomara | 07/11/2016 - 09:08 AM         |
| <b>AGOSTO 2016:</b><br>1.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)<br>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.<br>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).<br>4.-Se realizó el informe detallado de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete a nivel nacional. (Hito 8 cumplido).     | Meza Moreno, Aldana Geomara | 21/09/2016 - 10:07 AM         |
| <b>JULIO 2016:</b><br>1.- Se realizó la re-programación de los hitos del Proyecto ya que se cuenta con la autorización por parte del Patrocinador Ejecutivo mediante memoranod No. INEC-SUGEN-2016-0140-M.<br>2.-Se actualizaron los hitos 4,5 y 6 con sus respectivos medios de verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meza Moreno, Aldana Geomara | 31/08/2016 - 02:21 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>3.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)</p> <p>4.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>5.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>6.-Se realizó el informe de avance del operativo de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional. (Hito 7 cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <p><b>JUNIO 2016:</b></p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato).</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Se está realizando los trámites respectivos para la re-programación de los hitos del Proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | Meza Moreno, Aldana Geomara | 12/07/2016 - 10:42 AM         |
| <p><b>MAYO 2016:</b></p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato), sin embargo después del terremoto las actividades no fueron regulares por los operativos que se realizaron en este mes por parte de la Institución.</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Cabe mencionar que todas las actividades del proyecto en este mes no fueron regulares, por la emergencia que esta viviendo el país y los operativos que realizó la Institución.</p> | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/07/2016 - 08:28 AM         |
| <p><b>ABRIL 2016:</b></p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato), hasta mediados del mes sin ningún inconveniente, sin embargo después del terremoto las actividades no fueron regulares.</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Cabe mencionar que todas las actividades del proyecto a partir de mediados del mes no fueron regulares, por la emergencia que esta viviendo el país.</p>                                                       | Meza Moreno, Aldana Geomara | 03/06/2016 - 11:19 AM         |
| <p><b>MARZO 2016:</b></p> <p>1.- Se reviso el sistema para el levantamiento en Gabinete (CallCenter) de Establecimientos Económicos. (Hito 3 cumplido) .</p> <p>2.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato).</p> <p>3.- Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>4.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter)</p>                                                                                                                                                                                                           | Meza Moreno, Aldana Geomara | 03/05/2016 - 08:46 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <p>1.- Se reviso el sistema para el levantamiento en campo de Establecimientos Económicos. (Hito 2 cumplido)</p> <p>2.- Capacitación por parte de técnicos de DIRAD y DIEE, en el uso del sistema de levantamiento en campo de Establecimientos Económicos y en el llenado de formulario de novedades de Establecimientos Económicos al personal técnico de Cartografía de Administración Central y las Coordinaciones Zonales por videoconferencia.</p> <p>3.- Se inició el operativo de campo de actualización y zonificación de Establecimientos Económicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meza Moreno, Aldana Geomara | 29/03/2016 - 09:10 AM         |
| <p><b>ENERO 2016:</b></p> <p>1.- Se realizo la contratación del personal para el proyecto de Actualización Cartográfica tanto en Administración Central como en Coordinaciones Zonales. (Hito 1 cumplido)</p> <p>2.- Se revisó la base de establecimientos económicos que se van actualizar en campo.</p> <p>3.- Se realizó las cargas de trabajo para el levantamiento de campo tanto de Administración Central como para Coordinaciones Zonales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                           | Fecha de última actualización | Responsable                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>2- NACIONAL. * General.</b><br>No cumplir con la carga diaria estimada por persona CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de las actividades y metas propuestas. | 07/11/2016                    | Aldana Geomara Meza Moreno | 50 %         | 50      | 25           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|   | Hito                                                                                                                                                              | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | PLANIFICACIÓN: Personal preseleccionado, y contratado                                                                                                             | 4-Inicio de Trabajo       | 22/01/2016         |                | 22/01/2016 |    | Sí            | 14.0          |
| 2 | EJECUCIÓN: Requerimientos y revisión del sistema para el levantamiento en campo de Establecimientos Económicos levantados                                         | 4-Inicio de Trabajo       | 26/02/2016         |                | 26/02/2016 |    | Sí            | 10.0          |
| 3 | EJECUCIÓN: Requerimientos y revisión del sistema para el levantamiento en Callcenter de Establecimientos Económicos levantados.                                   | 4-Inicio de Trabajo       | 18/03/2016         |                | 18/03/2016 |   | Sí            | 10.0          |
| 4 | EJECUCIÓN: Informe de (1565) Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional ejecutado.                            | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 5 | EJECUCIÓN: Información de avance del proceso de actualización sobre Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional levantados. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 6 | EJECUCIÓN: Informe técnico de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional actualizados                                      | 9-Entregables Formales    | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 7 | EJECUCIÓN: Avance del operativo de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional elaborado                                    | 9-Entregables Formales    | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 8 | EJECUCIÓN: Información detallada de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete                                                     | 9-Entregables Formales    | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 9 | EJECUCIÓN: Análisis técnico mensual de Establecimientos Económicos en campo y en                                                                                  | 9-Entregables Formales    | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 6.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                     | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                            | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | gabinete (Call- Center) a nivel nacional levantados.                                                                                                                     |                        |                    |                |            |                                                                                     |               |               |
| 10 | EJECUCIÓN: Información de ubicación geográfica del marco muestral de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional mensual, levantada | 9-Entregables Formales | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe de zonificación de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional, verificada                          | 9-Entregables Formales | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Base de establecimientos económicos con su respectiva zonificación y ubicación actualizados en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional.             | 9-Entregables Formales | 16/12/2016         | 16/12/2016     |            |  | No            | 6.0           |
| 13 | CIERRE: Informe final de gestión del levantamiento en campo y en gabinete, ejecutado.                                                                                    | 9-Entregables Formales | 30/12/2016         | 30/12/2016     |            |  | No            | 12.0          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta   | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de empresas zonificadas y actualizadas del Directorio de empresas |  | 109.16 %          | 16,876 | 18,421                | 01/01/2016      | Jul-Sep                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00          |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 259,925.81 ** |
| Costo Total:                  | 179,618.95    |
| Total Devengado:              | 219,722.58    |
| % Costo Total Devengado:      | 122.33 %      |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 122.33 %

## Perfil Económico 2016

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total      |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 179,618.95        | 0.00         | 179,618.95 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 810,040.72        | 0.00         | 810,040.72 |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 259,925.81        | 0.00         | 259,925.81 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 219,722.58        | 0.00         | 219,722.58 |
| Planeado - Codificado (2016)                            |              | -80,306.86        |              |            |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 259,925.81        | 0.00         | 259,925.81 |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 219,722.58        | 0.00         | 219,722.58 |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 259,925.81        | 0.00         | 259,925.81 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 84.53 %           | 0.00 %       | 84.53 %    |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

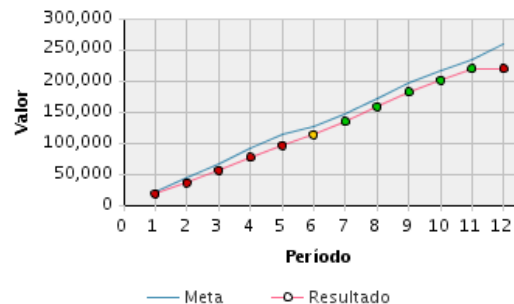

## Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 21,042.93                  | 17,555.07           | 21,042.93                    | 17,555.07             | 83.43 %          |        | 6.75 %       |

| Presupuesto Mensual 2016 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 22,641.53                  | 18,463.30           | 43,684.46                    | 36,018.37             | 82.45 %          |        | 13.86 %      |
| Mar                      | 23,538.97                  | 19,358.14           | 67,223.43                    | 55,376.51             | 82.38 %          |        | 21.30 %      |
| Abr                      | 23,558.71                  | 20,970.91           | 90,782.14                    | 76,347.42             | 84.10 %          |        | 29.37 %      |
| May                      | 22,591.80                  | 19,744.21           | 113,373.94                   | 96,091.63             | 84.76 %          |        | 36.97 %      |
| Jun                      | 13,953.02                  | 17,221.47           | 127,326.96                   | 113,313.10            | 88.99 %          |        | 43.59 %      |
| Jul                      | 20,121.72                  | 20,792.57           | 147,448.68                   | 134,105.67            | 90.95 %          |        | 51.59 %      |
| Ago                      | 24,415.47                  | 23,471.62           | 171,864.15                   | 157,577.29            | 91.69 %          |        | 60.62 %      |
| Sep                      | 23,563.10                  | 24,017.20           | 195,427.25                   | 181,594.49            | 92.92 %          |        | 69.86 %      |
| Oct                      | 19,781.72                  | 18,634.77           | 215,208.97                   | 200,229.26            | 93.04 %          |        | 77.03 %      |
| Nov                      | 19,781.72                  | 19,230.34           | 234,990.69                   | 219,459.60            | 93.39 %          |        | 84.43 %      |
| Dic                      | 24,935.12                  | 262.98              | 259,925.81                   | 219,722.58            | 84.53 %          |        | 84.53 %      |
| <b>Total</b>             | <b>259,925.81</b>          | <b>219,722.58</b>   |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                   | Incrementar la calidad en la generación y difusión de la información cartográfica estadística MEDIANTE la actualización y almacenamiento permanente de la información cartográfica del INEC, así como la innovación en mecanismos e instrumentos para su actualización y difusión |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                | Archivo                   | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | ASOCIACION HITO 1.- CONTRATOS DEL PERSONAL                                                                            | A1.pdf                    | 04/03/2016    |
| 2  | ASOCIACION HITO 10.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                           | B3.pdf                    | 07/11/2016    |
| 3  | ASOCIACION HITO 11.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                           | B4.pdf                    | 05/12/2016    |
| 4  | ASOCIACION HITO 2.- INFORME DEL SISTEMA DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS PARA EL LEVANTAMIENTO EN CAMPO                 | A2.pdf                    | 04/03/2016    |
| 5  | ASOCIACION HITO 3.- INFORME DEL SISTEMA DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS PARA EL LEVANTAMIENTO EN GABINETE (CALLCENTER) | A3.pdf                    | 04/04/2016    |
| 6  | ASOCIACION HITO 4.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | A5.pdf                    | 18/07/2016    |
| 7  | ASOCIACION HITO 5.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | A6.pdf                    | 18/07/2016    |
| 8  | ASOCIACION HITO 6.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | A7.pdf                    | 18/07/2016    |
| 9  | ASOCIACION HITO 7.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | A9.pdf                    | 04/08/2016    |
| 10 | ASOCIACION HITO 8.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | B1.pdf                    | 05/09/2016    |
| 11 | ASOCIACION HITO 9.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS                                                            | B2.pdf                    | 04/10/2016    |
| 12 | DICTAMEN_PRIORIDAD                                                                                                    | Dictamen_de_Prioridad.PDF | 14/07/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                 | Archivo | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------|---------|---------------|
| 13 | EXPEDIENTE DE RE-PROGRAMACIÓN DE HITOS | A8.pdf  | 18/07/2016    |
| 14 | PROJECT CHARTER                        | A4.pdf  | 06/04/2016    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                           | Rol                | Puesto                                | Correo Electrónico             | Teléfono(s) |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Meza Moreno, Aldana Geomara      | Lider del Proyecto | Analista de Cartografía Estadística 3 | aldana_meza@inec.gob.ec        |             |
| Noguera Trujillo, Milton Rodrigo | Jefe de Unidad     | Jefe de Gestión                       | milton_noguera@inec.gob.ec     |             |
| Rodriguez, Patricio              | Miembro de Equipo  | Jefe de Unidad                        | patricio_rodriguez@inec.gob.ec |             |
| Valle Piñuela, Rosa Catalina     | Directora DICA     | Directora                             | catalina_valle@inec.gob.ec     |             |
