

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)

PROYECTO: K003 INEC - Actualización Cartografía y Mejora de la Información de Direcciones

Líder del Proyecto:	Meza Moreno, Aldana Geomara (aldana_meza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	ACTUALIZACION CARTOGRAFIA Y MEJORA DE LA INFORMACION DE DIRECCIONES
Titular:	Valle Piñuela, Rosa Catalina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380431	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,195,477.32
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/09/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Meza Moreno, Aldana Geomara	Fecha del siguiente Hito:	29/09/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Con el presente proyecto se pretende actualizar los sectores prioritarios para refrescamiento de la muestra para la Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y Subempleo-ENEMDU, a través de operativos de campo que permitan determinar cambios en la condición de ocupación de las viviendas, información fundamental para el operativo de la encuesta en mención.

PRODUCTO:

2016: Se va a contar con dos bases de establecimientos económicos, una base que se va a levantar en campo con establecimientos económicos medianos y grandes; y otra base que se realizará por medio de CallCenter en la cual están los establecimientos económicos mediados y pequeños.

2017: 1320 sectores censales amanzanados y dispersos actualizados, supervisados y digitalizados y; listados de viviendas y jefes de hogar.

LINEA BASE:

2016: Directorio de empresas y establecimientos sin dato de zonificación

2017: Para el año 2017 se dispone de la cartografía actualizada entre los años 2013 a 2015, así como la cartografía base proporcionada por el Instituto Geográfico Militar, insumos que serán utilizados como base para el presente proyecto.

Adicionalmente a través de los Proyectos de Actualización Cartográfica 2014 y 2015 se procuró actualizar los sectores de la muestra maestra, con lo cual la muestra para la ENEMDU ha logrado sostenerse hasta el año 2016.

OBJETIVO GENERAL : Actualizar sectores censales y elaborar listado de viviendas y jefes de hogar, que se requieren para el refrescamiento de la muestra de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el año 2017.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Zonificar y mejorar la información de direcciones de las empresas del marco muestral de empresas mediante el levantamiento en campo y callcenter.

Contar con una base geográfica (1320 sectores actualizados) del marco muestral de ENEMDU.

Contar con base alfanumérica actualizada (listados de viviendas y jefes de hogar) de 1320 sectores del marco muestral de ENEMDU
 Ajustar los límites de las coberturas censales (GEO_ZON, GEO_SEC y GEO_SECDIS) a los límites oficiales emitidos por el Comité Nacional de Límites Internos-CONALI.

Beneficios Cualitativos

2016:

Alrededor de 24108 empresas del DICEE zonificadas y geo-referenciadas.

2017:

Contar con sectores actualizados para la muestra de ENEMDU mejorara la calidad y cobertura de la mencionada investigación.

Tipo de Beneficiario

Instituciones del Sistema Estadístico Nacional
 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Alrededor de 248 Instituciones públicas, privadas, universidades, entre otras.

Restricciones

ALCANCE: No se cumpliría con la actualización de toda la muestra seleccionada, en el caso que existan sectores de difícil acceso.

TIEMPO: El no contar con todo el personal para las jornadas de trabajo ocasionaría un retraso en el tiempo planificado.


COSTO: El no contar con el presupuesto para el presente proyecto, causaría retrasos en la ejecución del mismo.

RECURSOS: Personal técnico y de apoyo contratado

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 83.86 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	34 %	41 %	46 %	51 %	56 %	61 %	66 %	71 %	76 %	80 %	85 %	100 %
	Avance real acumulado											
	34 %	41 %	46 %	51 %	56 %	61 %	66 %	71 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2017: 1. Planificación de jornadas 12 y 13. 2. Preparación de material para campo jornada_12 Y Jornada_13 3. Actualización cartográfica, listado de viviendas y jefes de hogar. 4. Revisión y codificación a formularios actualizados. 5. Digitación de los formularios en el Marco Maestro. 6. Digitalización de la información cartográfica. 7. Supervisión del operativo de campo y digitalización, con el objetivo de realizar control de calidad y cobertura en las Coordinaciones Zonales. 8. Reunión para evaluar la ejecución técnica y administrativa del proyecto. 9. Coordinación del proyecto con las Coordinaciones Zonales 10. Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de agosto (Hito 21 cumplido)	Meza Moreno, Aldana Geomara	04/09/2017 - 10:32 AM
JULIO 2017: 1. Planificación de jornadas 10 y 11. 2. Preparación de material para campo jornada_10 Pichincha y Sucumbíos, Jornada_11 Esmeraldas. 3. Actualización cartográfica, listado de viviendas y jefes de hogar Jornadas_9 y 10.	Meza Moreno, Aldana Geomara	30/08/2017 - 07:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Revisión y codificación a formularios actualizados. 5. Digitación de los formularios en el Marco Maestro. 6. Digitalización de la información cartográfica. 7. Actualización de los planos 2010 con la actualización cartográfica 2017 a nivel de manzana. 8. Supervisión del operativo de campo, con el objetivo de realizar control de calidad y cobertura en las Coordinaciones Zonales. 9. Reunión para evaluar la ejecución técnica y administrativa del proyecto. 10. Coordinación del proyecto con las Coordinaciones Zonales 11. Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de abril (Hito 20 cumplido)</p>		
<p>JUNIO 2017: 1.-Supervisión del operativo de campo, con el objetivo de realizar control de calidad y cobertura en las Coordinaciones Zonales. 2.-Preparación de material para operativo de campo 5.-Revisión y digitación de la información levantada en campo 6.-Digitalización de los sectores actualizados 7.-Elaboración de indicadores de acuerdo a la matriz de avance del proyecto 8.-Coordinación del proyecto con las Coordinaciones Zonales 9.- Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de abril (Hito 19 cumplido)</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	02/08/2017 - 09:02 AM
<p>MAYO 2017: 1.-Supervisión del operativo de campo y de digitalización cartográfica, con el objetivo de realizar control de calidad y cobertura en las Coordinaciones Zonales. 2.-Preparación de material para operativo de campo 5.-Revisión y digitación de la información levantada en campo 6.-Digitalización de los sectores actualizados 7.-Elaboración de indicadores de acuerdo a la matriz de avance del proyecto 8.-Coordinación del proyecto con las Coordinaciones Zonales 9.- Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de abril (Hito 18 cumplido)</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	28/06/2017 - 09:49 AM
<p>ABRIL 2017: 1.-Supervisión del operativo de campo con el objetivo de realizar control de calidad y cobertura 2.-Preparación de material para operativo de campo 5.-Revisión y digitación de la información levantada en campo 6.-Digitalización de los sectores actualizados 7.-Elaboración de indicadores de acuerdo a la matriz de avance del proyecto 8.-Coordinación del proyecto con las Coordinaciones Zonales 9.- Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de abril (Hito 17 cumplido)</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	31/05/2017 - 08:41 AM
<p>MARZO 2017: 1.- Se empezó el operativo de campo en las Coordinaciones Zonales y en Administración Central. 2.- Se realizó la supervisión de Digitalización Cartográfica y del Operativo de campo en las Coordinaciones Zonales y en Administración Central. 3.- Se realizó el Informe de seguimiento de los sectores actualizados del mes de marzo (Hito 16 cumplido) 4.- Impresión de formularios de Ca-04 (ANEXO), Ca-06 (ANEXO) y Cartas de presentación 5.- Preparación de material para operativo de campo 6.- Revisión y digitación de la información levantada en campo</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	02/05/2017 - 09:01 AM
<p>FEBRERO 2017: 1.- Se realizó el manual de digitalización cartográfica 2.-Se actualizaron los formularios para Actualización Cartográfica en Campo (Ca-04, Ca-06 y Anexos). (Hito 15 cumplido) 3.- Revisión de muestra a nivel de manzana 4.-Generación de instructivo para la elaboración de cargas de trabajo por manzana. 5.- Elaboración cargas de trabajo para la primera y segunda jornada. 6.- Preparación de material de campo para la primera jornada de trabajo.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	31/03/2017 - 10:33 AM
<p>ENERO 2017: 1.- Se realizó el manual de preparación de material para el levantamiento de campo. (Hito 14 cumplido). 2.-Se realizó el adendum del proyecto de Cartografía para modificar las fechas de inicio del operativo de campo. 3.-Generación de manuales para el levantamiento de campo: Actualización Cartográfica, Supervisor y de Control de Calidad.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	03/03/2017 - 08:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>1.- Se validó la información del proceso en Gabinete (CallCenter) de las Coordinaciones Zonales y de Administración Central para la entrega de la base definitiva (Hito 12 cumplido).</p> <p>2.-Se revisa y valida la información levantada en gabinete (CallCenter).</p> <p>3.-Se realizó el informe final de Establecimientos Económicos actualizados en gabinete y en campo a nivel nacional. (Hito 13 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	23/02/2017 - 09:16 AM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>1.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>2.- Se revisa y valida la información levantada en gabinete (CallCenter).</p> <p>3.-Se realizó el informe de Establecimientos Económicos actualizados en gabinete a nivel nacional. (Hito 11 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	23/12/2016 - 09:41 AM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>2.- Se revisa y valida la información levantada en gabinete (CallCenter).</p> <p>3.-Se realizó el informe de Establecimientos Económicos actualizados en gabinete a nivel nacional. (Hito 10 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	29/11/2016 - 10:57 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Se realizó el informe detallado de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete a nivel nacional. (Hito 9 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	07/11/2016 - 09:08 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>1.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Se realizó el informe detallado de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete a nivel nacional. (Hito 8 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	21/09/2016 - 10:07 AM
<p>JULIO 2016:</p> <p>1.- Se realizó la re-programación de los hitos del Proyecto ya que se cuenta con la autorización por parte del Patrocinador Ejecutivo mediante memorando No. INEC-SUGEN-2016-0140-M.</p> <p>2.-Se actualizaron los hitos 4,5 y 6 con sus respectivos medios de verificación.</p> <p>3.-Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil)</p> <p>4.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>5.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>6.-Se realizó el informe de avance del operativo de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional. (Hito 7 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	31/08/2016 - 02:21 PM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato).</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Se está realizando los trámites respectivos para la re-programación de los hitos del Proyecto.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	12/07/2016 - 10:42 AM
<p>MAYO 2016:</p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato), sin embargo después del terremoto las actividades no fueron regulares por los operativos que se realizaron en este mes por parte de la Institución.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	04/07/2016 - 08:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Cabe mencionar que todas las actividades del proyecto en este mes no fueron regulares, por la emergencia que esta viviendo el país y los operativos que realizó la Institución.</p>		
<p>ABRIL 2016:</p> <p>1.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato), hasta mediados del mes sin ningún inconveniente, sin embargo después del terremoto las actividades no fueron regulares.</p> <p>2.-Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>3.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter).</p> <p>4.-Cabe mencionar que todas las actividades del proyecto a partir de mediados del mes no fueron regulares, por la emergencia que esta viviendo el país.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	03/06/2016 - 11:19 AM
<p>MARZO 2016:</p> <p>1.- Se reviso el sistema para el levantamiento en Gabinete (CallCenter) de Establecimientos Económicos. (Hito 3 cumplido) .</p> <p>2.- Se están levantando información de establecimientos económicos en campo en las ciudades sede de cada una de las Coordinaciones Zonales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato).</p> <p>3.- Se está realizando el proceso en Gabinete (CallCenter) para el levantamiento de información de establecimientos económicos en cada una de las Coordinaciones Zonales en las Unidades de Cartografía.</p> <p>4.- Se revisa la información levantada en campo y en gabinete (CallCenter)</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	03/05/2016 - 08:46 AM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1.- Se reviso el sistema para el levantamiento en campo de Establecimientos Económicos. (Hito 2 cumplido)</p> <p>2.- Capacitación por parte de técnicos de DIRAD y DIEE, en el uso del sistema de levantamiento en campo de Establecimientos Económicos y en el llenado de formulario de novedades de Establecimientos Económicos al personal técnico de Cartografía de Administración Central y las Coordinaciones Zonales por videoconferencia.</p> <p>3.- Se inició el operativo de campo de actualización y zonificación de Establecimientos Económicos.</p> <p>ENERO 2016:</p> <p>1.- Se realizo la contratación del personal para el proyecto de Actualización Cartográfica tanto en Administración Central como en Coordinaciones Zonales. (Hito 1 cumplido)</p> <p>2.- Se revisó la base de establecimientos económicos que se van actualizar en campo.</p> <p>3.- Se realizó las cargas de trabajo para el levantamiento de campo tanto de Adminsitración Central como para Coordinaciones Zonales.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	29/03/2016 - 09:10 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Alcance. No contar con la información necesaria en campo (condición de ocupación de la vivienda y nombres de jefe de hogar) CAUSARÍA un retraso en la carga programada y por ende un incumplimiento de las actividades y metas propuestas</p>	31/05/2017	Aldana Geomara Meza Moreno	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Personal preseleccionado, y contratado	4-Inicio de Trabajo	22/01/2016		22/01/2016		Sí	4.2
2	EJECUCIÓN: Requerimientos y revisión del sistema para el levantamiento en campo de Establecimientos Económicos levantados	4-Inicio de Trabajo	26/02/2016		26/02/2016		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Requerimientos y revisión del sistema para el levantamiento en Callcenter de Establecimientos Económicos levantados.	4-Inicio de Trabajo	18/03/2016		18/03/2016		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Informe de (1565) Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	1.8
5	EJECUCIÓN: Información de avance del proceso de actualización sobre Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional levantados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.8
6	EJECUCIÓN: Informe técnico de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional actualizados	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.8
7	EJECUCIÓN: Avance del operativo de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call Center) a nivel nacional elaborado	9-Entregables Formales	29/07/2016		29/07/2016		Sí	1.8
8	EJECUCIÓN: Información detallada de estado de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.8
9	EJECUCIÓN: Análisis técnico mensual de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (Call- Center) a nivel nacional levantados.	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.8
10	EJECUCIÓN: Información de ubicación geográfica del marco muestral de Establecimientos Económicos en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional mensual, levantada	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.8
11	EJECUCIÓN: Informe de zonificación de Establecimientos Económicos actualizados en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional, verificada	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.8
12	EJECUCIÓN: Base de establecimientos económicos con su respectiva zonificación	9-Entregables Formales	16/12/2016		16/12/2016		Sí	1.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y ubicación actualizados en campo y en gabinete (CallCenter) a nivel nacional.							
13	CIERRE: Informe final de gestión del levantamiento en campo y en gabinete, ejecutado.	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	3.6
14	PLANIFICACIÓN -Manual de preparación de material para salir a campo elaborado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2017		31/01/2017		Sí	4.2
15	PLANIFICACIÓN - Formularios para Actualización Cartográfica en Campo (Ca-04, Ca-06 y Anexos)	4-Inicio de Trabajo	24/02/2017		24/02/2017		Sí	7.0
16	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	4.9
17	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de abril	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	4.9
18	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	4.9
19	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	4.9
20	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	4.9
21	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	4.9
22	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de septiembre	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	4.9
23	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	4.9
24	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	4.9
25	CIERRE - Informe de Gestión del Proyecto	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	9.8
26	EJECUCIÓN - Informe del proceso de sectores actualizados en el mes de diciembre	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	4.9

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de sectores censales actualizados para ENEMDU		100.00 %	600	600	02/01/2017	Abr-Jun
2	Porcentaje de personal contratado		100.00 %	1	1	03/01/2017	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,195,477.32 **
Costo Total:	179,618.95
Total Devengado:	718,781.40
% Costo Total Devengado:	400.17 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 400.17 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	179,618.95	0.00	0.00	179,618.95
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	810,040.72	810,040.72	0.00	1,620,081.44
Ppto. Codificado	259,925.81	938,378.00	0.00	1,198,303.81
Ppto. Comprometido	257,099.32	483,715.88	0.00	740,815.20
Planeado - Codificado (2017)		-938,378.00		
Programado a Devengar	259,925.81	938,378.00	0.00	1,198,303.81
Ppto. Devengado	257,099.32	461,682.08	0.00	718,781.40
Estimado a fin de año	* 257,099.32	0.00	0.00	257,099.32
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,826.49	938,378.00	0.00	941,204.49
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.91 %	49.20 %	0.00 %	59.98 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

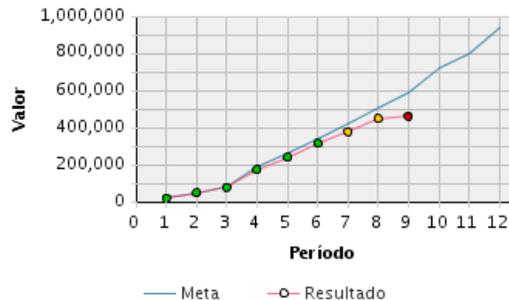

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	20,445.11	20,445.19	20,445.11	20,445.19	100.00 %	●	2.18 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	25,927.54	25,404.63	46,372.65	45,849.82	98.87 %		4.89 %
Mar	34,929.26	30,588.53	81,301.91	76,438.35	94.02 %		8.15 %
Abr	104,124.13	96,073.03	185,426.04	172,511.38	93.04 %		18.38 %
May	76,969.74	65,864.10	262,395.78	238,375.48	90.85 %		25.40 %
Jun	78,772.73	75,341.89	341,168.51	313,717.37	91.95 %		33.43 %
Jul	78,210.95	63,401.23	419,379.46	377,118.60	89.92 %		40.19 %
Ago	88,467.55	71,045.33	507,847.01	448,163.93	88.25 %		47.76 %
Sep	81,532.31	13,518.15	589,379.32	461,682.08	78.33 %		49.20 %
Oct	130,473.98		719,853.30				
Nov	77,517.46		797,370.76				
Dic	141,007.24		938,378.00				
Total	938,378.00	461,682.08					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la calidad en la generación y difusión de la información cartográfica estadística MEDIANTE la actualización y almacenamiento permanente de la información cartográfica del INEC, así como la innovación en mecanismos e instrumentos para su actualización y difusión

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1.- CONTRATOS DEL PERSONAL	A1.pdf	04/03/2016
2	ASOCIACION HITO 10.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B3.pdf	07/11/2016
3	ASOCIACION HITO 11.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B4.pdf	05/12/2016
4	ASOCIACION HITO 12.- BASE DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B5.pdf	05/01/2017
5	ASOCIACION HITO 13.- INFORME FINAL DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B6.pdf	06/01/2017
6	ASOCIACION HITO 14.- MANUAL DE PREPARACIÓN DE MATERIAL	B7.pdf	23/02/2017
7	ASOCIACION HITO 2.- INFORME DEL SISTEMA DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS PARA EL LEVANTAMIENTO EN CAMPO	A2.pdf	04/03/2016
8	ASOCIACION HITO 3.- INFORME DEL SISTEMA DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS PARA EL LEVANTAMIENTO EN GABINETE (CALLCENTER)	A3.pdf	04/04/2016
9	ASOCIACION HITO 4.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	A5.pdf	18/07/2016
10	ASOCIACION HITO 5.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	A6.pdf	18/07/2016
11	ASOCIACION HITO 6.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	A7.pdf	18/07/2016
12	ASOCIACION HITO 7.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	A9.pdf	04/08/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACION HITO 8.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B1.pdf	05/09/2016
14	ASOCIACION HITO 9.- INFORME DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS	B2.pdf	04/10/2016
15	ASOCIACIÓN HITO 15.- FORMULARIOS CA04 Y CA06	B8.pdf	23/03/2017
16	ASOCIACIÓN HITO 16.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE MARZO	C2.pdf	05/04/2017
17	ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE ABRIL	C3.PDF	05/05/2017
18	ASOCIACIÓN HITO 18.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE MAYO	C4.PDF	05/06/2017
19	ASOCIACIÓN HITO 19.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO	C5.PDF	04/07/2017
20	ASOCIACIÓN HITO 20.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE JULIO	C6.PDF	03/08/2017
21	ASOCIACIÓN HITO 21.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO	C7.pdf	04/09/2017
22	DICTAMEN_PRIORIDAD	Dictamen_de_Prioridad.PDF	14/07/2016
23	EXPEDIENTE DE RE-PROGRAMACIÓN DE HITOS	A8.pdf	18/07/2016
24	PROJECT CHARTER	A4.pdf	06/04/2016
25	PROJECT CHARTER-2017	C1.pdf	17/03/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aviles, Marco	Miembro de equipo	Miembro de Equipo	Marco_Aviles@inec.gob.ec	2544-326
Meza Moreno, Aldana Geomara	Lider del Proyecto	Analista de Cartografía Estadística 3	aldana_meza@inec.gob.ec	
Noguera Trujillo, Milton Rodrigo	Jefe de Unidad	Jefe de Gestión	milton_noguera@inec.gob.ec	
Ocaña, Ninfa	Miembro de equipo	Miembro de Equipo	Ninfa_Ocana@inec.gob.ec	2544-326
Tapia, Ivan	Miembro de equipo	Miembro de Equipo	Ivan_Tapia@inec.gob.ec	2544-326
