

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)

Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías (DINME)

PROYECTO: K001 INEC - Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas

Líder del Proyecto:	García Gamboa, Nataly Raquel (nataly_garcia@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO MONITOREO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Titular:	Moreno Enríquez, Lorena Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.377625	TIR:	143.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	200,127.73
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	644,527.59
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/07/2017	Fecha de Fin Base:	30/06/2016
Modificado por:	García Gamboa, Nataly Raquel	Fecha del siguiente hito:	31/05/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN 2017: Este proyecto busca generar un conjunto de indicadores nuevos y alternativos a los existentes, que estén acorde a la visión actual del Estado y que coadyuven al logro del buen vivir de los ciudadanos. Constituye un proyecto emblemático, que permitirá contar con nuevas herramientas para el adecuado, diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas ya implementadas y las que se implementarán.

Así, este proyecto se nutre de algunos elementos investigativos que permiten la operacionalización del concepto del buen vivir. Para ello, se ha realizado una revisión de la normativa nacional, particularmente la Constitución del 2008; los pensamientos teóricos ecuatorianos relacionados con el buen vivir o sumak kawsay, los cuales se sintetizan en tres corrientes: indigenista, socialista y ecologista; además, se complementó esta investigación documental con estudios cualitativos en campo, los cuales se realizaron a la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Se enmarca además en la construcción y propuesta oficial de un sistema de indicadores, basados en el debate institucional y nacional a nivel académico basándose en el discurso social de la población. De igual manera, se plantea la mejora y perfeccionamiento de los indicadores en función de las necesidades de las instituciones que hacen uso de las estadísticas para el diseño de la política pública. Finalmente, una vez construidas algunas medidas del Buen Vivir, el proyecto propone desarrollar un proceso de fortalecimiento del cálculo de estas métricas, así como la institucionalización de procesos en el INEC que permitan el cálculo en el mediano y largo plazo, de manera que se pueda hacer un monitoreo continuo de la política pública. Para ello se propone realizar análisis complementarios a los avances realizados en Ecuador en lo relacionado con el bienestar, a través del análisis de los nuevos indicadores del Buen Vivir.

En este marco, el proyecto debe realizar estudios e investigaciones específicas de los componentes identificados con sus respectivas unidades de análisis, así como de las dimensiones y subdimensiones.

2014-2016: El proyecto de formulación de métricas nuevas plantea la generación de un nuevo paradigma de métrica del Buen Vivir que permita la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república. El presente proyecto no cuenta con una línea base como tal; pero sí con ejercicios preliminares que han tratado de expandir la visión tradicional hacia una más integral pero que todavía no conjugan el real significado de la nueva orientación política hacia el Buen Vivir. Al finalizar del proyecto, esto es dos años, se contará con nuevas métricas del Buen Vivir a disposición de los actores que deseen investigar y tomar decisiones de política pública bajo un nuevo paradigma. Como principal objetivo el Proyecto busca establecer un conjunto métricas nuevas y alternativas, asociadas al buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, que rompan con los paradigmas tradicionales de información usada para el diseño, monitoreo y evaluación de política pública en sus distintos ámbitos. Entre sus OBJETIVOS ESPECÍFICOS se encuentran: Establecer la definición de un nuevo paradigma de bienestar, Sumak Kawsay que guíe la construcción de las métricas nuevas y alternativas. Establecer una agenda de desarrollo del conjunto de indicadores de nuevas métricas. Definir el conjunto de indicadores que se basen en un nuevo paradigma de bienestar (incluye esquemas de participación ciudadana: documentos analíticos y metodológicos). Construir los indicadores propuestos en la agenda de desarrollo de las nuevas métricas para el buen vivir. Publicar y difundir los resultados de los nuevos indicadores del buen vivir definidos en los elementos multicriterio que componen el nuevo paradigma de desarrollo.

Beneficios Cualitativos

La generación de un nuevo paradigma de métrica del buen vivir, permitirá la toma de decisiones de política pública adecuadas, alineadas a los principios y lineamientos del plan de desarrollo y la constitución de la república. El presente proyecto es una herramienta que permite el mantenimiento e incremento del capital social en el país, ya que constituye un conjunto de indicadores que dan cuenta de la gestión pública y de cómo ésta apunta a la concreción de una nueva orientación política y de vida: el buen vivir.

Tipo de Beneficiario

LOCALIDAD DE IMPACTO 2017: La cobertura del proyecto es a nivel Nacional (5.625.953 personas). El proyecto se ejecutará desde las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Planta Central ubicada en la ciudad de Quito. El impacto será a nivel nacional pues, la información, obtenida se convertirá en pública y de libre acceso respetando la confidencialidad y sigilo estadístico.

2014 - 2016: La población objetivo para el presente proyecto corresponde a un subconjunto de la población que debido a sus características, serán los principales demandantes de las nuevas métricas que se desarrollen a partir del proyecto en mención. Entre las principales características de este grupo se encuentran el hecho de contar con un nivel de instrucción superior o más, que les permitiría estar vinculados a diversas instituciones o realizar actividades de forma independiente, que consideran como insumo fundamental para la toma de decisiones las métricas desarrolladas.

Restricciones

DESCRIPCIÓN 2017:

TIEMPO: La duración del proyecto está planteada hasta el 31 de diciembre del 2017, sin embargo y debido a que el personal contratado para el proyecto se encuentra laborando en diferentes áreas es posible que los componentes del mismo no puedan ser cumplidos en el tiempo considerado.

ALCANCE: Debido a que el presente proyecto contempla un análisis multicriterio dentro de la generación de nueva producción estadística, y en virtud de que el equipo humano destinado para este fin es reducido en relación a la carga laboral que existe, es posible que no se puedan cumplir con el objetivo principal del proyecto a su finalización.

2014 - 2016:

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 años y 4 meses.

COSTO: El proyecto demanda de una inversión total de US\$ 644.527,59 a ser financiada con recursos fiscales, durante el período 2014 - 2017.

ALCANCE: Metodologías innovadoras con análisis multicriterio así como generación de nueva producción estadística.

RECURSOS: No aplica.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 85.51 %

Fecha de Inicio: 01/08/2014

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

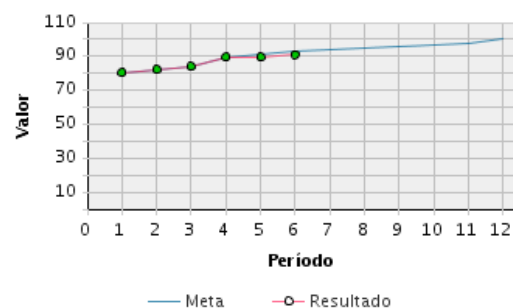

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	81 %	82 %	84 %	90 %	91 %	93 %	94 %	95 %	96 %	97 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	81 %	82 %	84 %	90 %	90 %	91 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2017 - Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0061-M se envía a DIPLA la matriz de seguimiento físico y el reporte GPR del proyecto correspondiente al mes de abril. - Mediante memorando INEC-CTIMA-2017-0069-M se solicita a DIPLA el cambio del patrocinador ejecutivo del proyecto. - Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0068-M, se solicita a DIPLA la reprogramación presupuestaria del mes de junio, misma que es aprobada mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2017-0640-M. - Se continúa con las gestiones internas para la contratación de la "Consultoría para la Gestión de Estudios Científicos Externos al INEC, 2017". Actualmente se espera la firma del contrato. - Elaboración de los documentos metodológicos de innovación en métricas para el bienestar en agua, saneamiento e higiene (Hito cumplido 58).- Se elaboró tres fichas metodológicas para la construcción de indicadores de saneamiento, higiene y agua.	García Gamboa, Nataly Raquel	03/07/2017 - 03:29 PM
MAYO 2017 - Se envía las convocatorias a las once instituciones que conforman la Comisión Estadística del Buen Vivir, para la conformación de un equipo transversal que permita iniciar la tercera y cuarta etapa de la construcción del Índice Multidimensional del Buen Vivir, correspondiente a la validación y aprobación de indicadores (Hito asociado 57). Sin embargo, la reunión convocada no se pudo concretar debido a que no se recibió la confirmación de participación de los delegados de SENESCYT, MINEDUC, MDT. La coyuntura de cambio de gobierno dificultó la tarea de reunir la Comisión. - Se continúa con las gestiones internas para la contratación de la Consultoría para la Gestión de Estudios Científicos Externos al INEC, 2017" en el marco del Proyecto de Nuevas Métricas. Actualmente, se espera de la Dirección Financiera el registro de la solicitud de aval en el sistema eSIGEF y la emisión de la certificación presupuestaria y económica. - Avance en la elaboración de los documentos metodológicos de innovación en métricas para el bienestar en agua, saneamiento e higiene (Hito asociado 58)	García Gamboa, Nataly Raquel	05/06/2017 - 10:36 AM
ABRIL 2017 - Mediante memorando No. INEC-CTIMA-2017-0048-M, se solicita a DIPLA la reprogramación presupuestaria del mes de abril, misma que es aprobada mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2017-0380-M. - Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0051-M, se solicita el inicio del proceso "Contratación de la Consultoría para la Gestión de Estudios Científicos Externos al INEC, 2017" en el marco del Proyecto de Nuevas Métricas, proceso que es necesario para el cumplimiento de los hitos del mes de junio. - Documento Final de la Sistematización del estudio cualitativo realizada. (Hito cumplido 53). Se elaboró un estudio cualitativo que, mediante un análisis de redes temáticas, sistematiza la información recabada acerca de la percepción que los sectores populares tienen sobre el Buen Vivir. - Indicadores en todas las dimensiones del Buen Vivir calculados (Hito cumplido 54). El cumplimiento de este hito se basa en identificación de las dimensiones que conforman el índice del Buen Vivir y el cálculo de sus principales indicadores - Informe de la segunda difusión de documentos de estudios científicos publicados en 2016 (Hito cumplido 55). El cumplimiento de este hito se basa en la realización del informe del evento de difusión de los estudios científicos publicados en 2016, específicamente de estudios publicados en las revistas Analitika vol. 11 y Analitika vol. 12 - Marco conceptual para la definición de las dimensiones e indicadores del índice del Buen Vivir realizado. (Hito cumplido 56).	García Gamboa, Nataly Raquel	04/05/2017 - 11:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El cumplimiento de este hito se basa en la elaboración de un documento en el que se explica la base conceptual de las dimensiones e indicadores del índice del Buen Vivir		
MARZO 2017 - Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0030-M se remite la matriz de reporte de seguimiento al Proyecto, así como el Reporte GPR correspondiente al mes de febrero. - Se trabaja en los documentos: Actualización proyectos, Matriz de marco lógico, Cronograma de contratación, Viabilidad económica e Informe ejecutivo, necesarios para la actualización del Banco de Proyectos de Inversión INEC en el "Sistema de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP". - Se reportan las razones de sobre y sub ejecución presupuestaria del Proyecto a DIPLA. - Como parte de la Comisión Estadística y la discusión en torno a los indicadores del Buen Vivir, se realizan reuniones el 24 de marzo de 2017 para la mesa de Agua y saneamiento; - En base al adendum autorizado el 24 de febrero, se realiza el primer ajuste presupuestario, debido al aumento en el valor establecido en la consultoría de estudios científicos; así como la actualización del POA DINME. - Se atiende el pedido de DIPLA sobre la regularización de la información presupuestaria en GPR, para enero 2017. - Agenda de investigación elaborada. (Hito cumplido 51). Se elaboró la agenda de investigación en base a las siguientes publicaciones : -Documento de resultado de cálculo de los indicadores de todas las dimensiones, acorde a la información disponible en el sistema estadístico nacional. -Elaboración de documento metodológico de innovación en métricas el bienestar en agua, saneamiento e higiene. -Marco conceptual para la definición de las dimensiones e indicadores del índice del Buen Vivir. -Mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador. -Análisis de agua, saneamiento e higiene en hogares con niños y adolescentes y su relación con el bienestar de los mismos. Enfoque de determinantes. -Documento cualitativo del BV. -Producto de la consultoría de estudios científicos -Libro del índice del Buen Vivir realizada. - Avance de la Sistematización del estudio cualitativo realizada (Hito cumplido 52). El cumplimiento de este hito se basa en la elaboración de un estudio cualitativo ya que con esta investigación se pretende acceder a la percepción social sobre el Buen Vivir (como proyecto institucional del gobierno central), a partir de discursos provenientes de los sectores populares de la población nacional	García Gamboa, Nataly Raquel	18/04/2017 - 11:32 AM
FEBRERO 2017 - El equipo DINME inicia las reuniones de discusión con las mesas de la Comisión Estadística para el Buen Vivir. En este sentido el 2 de febrero se realiza la reunión para la mesa de Hábitat y Vivienda, el 3 de febrero para la mesa de agua y saneamiento y el 7 de febrero para la mesa de Prácticas Ambientales. - El 7 de febrero mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2017-0015-M se remite a DIPLA el Cierre de "Planes de proyectos - INEC 2016". - Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0021-M, se solicita la autorización para la realización del Primer Adendum al Proyecto Nuevas Métricas, mismo que es autorizado por DIREJ a través de Memorando Nro. INEC-INEC-2017-0155-M, el 24 de febrero. - El 10 de febrero se remite mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2017-0022-M la Matriz de Reporte de seguimiento Proyecto Formulación de Nuevas Métricas y reporte enero 2017. (Hito cumplido 49).	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	27/03/2017 - 03:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5. En el marco de la Publicación de los estudios científicos en la Revista Analitika, se realiza el primer evento de difusión en la Universidad San Francisco de Quito, el 16 de febrero del año en curso. (Hito cumplido 48). 6 Se trabaja el documento correspondiente al Project Charter 2017. (Hito cumplido 50).		
ENERO 2017 1. Se recibe la notificación de parte de Talento Humano sobre la renovación de los contratos del equipo perteneciente al Proyecto para el periodo 2017 (Hito cumplido 47). 2. El equipo DINME trabaja en la elaboración de indicadores para la dimensión de empleo y para la dimensión de agua, saneamiento e higiene, mismos que serán compartidos en la reuniones de las mesas de Discusión de la Comisión Estadística, que se iniciarán a partir del 3 de febrero. 3. Se comunica a CGAF mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2017-0006-M sobre la deuda institucional que se mantiene con la U. de Cuenca - PYDLOS, a fin de que pueda ser registrada en la matriz respectiva y se establezca su prioridad para contar con recursos que permitan cancelarla. 4. Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2017-0005-M se envía la Matriz POA correspondiente a la Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías, en el cual se encuentra anclado el Proyecto "Formulación de Métricas NUEvas y ALternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas".	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	06/03/2017 - 10:44 AM
DICIEMBRE 2016 1. El 2 de diciembre, dentro del servicio de impresiones se recibe de parte de la empresa pública El Telégrafo la impresión 5 y 6, tras lo cual se procede a realizar los documentos habilitantes para solicitar el 13 de diciembre mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0071-M el pago correspondiente a la segunda entrega. 2. Se elaboran conjuntamente con DIPLA los lineamientos del Proyecto para el año 2017, mismos que nos aprobados el 30 de diciembre mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2016-0731-M. 3. Se asiste a la reunión de Seguimiento al proyecto de inversión: Formulación de Nuevas Métricas, tras lo cual se procede con la elaboración de la matriz de control y seguimiento a proyectos de inversión correspondiente a Noviembre del 2016, misma que es remitida a CTIMA a través de Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0081- para su envío a DIPLA. 4. Se elabora el Informe del Cálculo de indicadores del subsistema de armonía interna de las personas (Hito cumplido 43). 5. Realización del Informe final del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador (Hito cumplido 44). 6. Se realiza el Informe de actividades ejecutadas en el proyecto (Hito cumplido 45). 7. Elaboración del Informe de publicaciones impresas y su difusión (Hito cumplido 46). 8. En base a la solicitud de la Dirección de Talento Humano se trabaja y remite la matriz de planificación de Talento Humano para los proyectos de inversión.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	24/02/2017 - 11:04 AM
NOVIEMBRE 2016 1. En el marco de la Consultoría Gestión de estudios científicos externos al INEC, se generan los documentos habilitantes y se solicita el pago correspondiente al Producto 3 e Informe Final, con lo cual se da por terminado este contrato. 2. Como parte de la Consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" se realizan los documentos habilitantes y se solicita el pago correspondiente al producto 2 e Informe Final, con lo cual se da por finalizado este contrato. 3. En el marco del servicio de impresiones de El Telégrafo se realizan los documentos habilitantes para solicitar el pago correspondiente a la primera entrega. En este sentido se realiza además la coordinación para diagramación y revisión de artes para las impresiones previstas para la segunda entrega.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	05/01/2017 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. El 14 de noviembre se realiza el el Auditorio No. 2 del la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador el evento de socialización de las publicaciones: "Buen Vivir en el Ecuador. Del concepto a la medición" y "Buen Vivir en el Ecuador. Experiencias y metodologías internacionales de medición de bienestar", realizadas e impresas en el marco del Proyecto Nuevas Métricas. 5. El 23 de noviembre, en el marco del Convenio Específico de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Universidad de Cuenca, mediante Oficio Nro. 055-PYDLOS-2016, se reciben los documentos finales de los Productos 3 y 4 que contienen las observaciones emitidas por el INEC, mismos que son revisados previo a la solicitud de pago. 6. Se ingresa la información correspondiente a contrataciones de consultorías y servicios del proyecto en la matriz de control y seguimiento de procesos de contratación pública.		
OCTUBRE 2016 1. El 18 de octubre, en el marco de la Consultoría Gestión de estudios científicos externos al INEC, se recibe de parte del consultor Wilson Pérez, el Producto 3: Entrega de al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/o metodologías alternativas para medición del Bienestar que hayan aprobado las distintas fases del proceso para la revisión y aceptación de postulaciones, en versión digital, y con los insumos necesarios para la diagramación e impresión, mismo que se encuentra en proceso de revisión previo a la solicitud de pago (Asociado al Hito 38). 2. El 24 de octubre se recibe por parte de El Telégrafo el Informe del Producto 1 correspondiente a la impresión de: Libro Buen Vivir: Experiencias Internacionales; Revista Estadística y Metodologías Vol. 1; Revista Estadística y Metodologías Vol.3; y Revista Analítica 11, mismos que fueron entregados el 21 de octubre y aceptados por satisfacción por el INEC. 3. En el marco del Convenio Específico de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Universidad de Cuenca, se revisan los Producto 3: Informes Analíticos por grupos; y Producto 4: Informe Final comparativo supervisado por un experto cualitativo y un Informe detallado de los gastos, tras lo cual se emitieron las observaciones respectivas. 4. En el marco de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" el 31 de octubre se recibe de parte del consultor Ec. Mauricio León, el producto 2: Informe que contenga el marco conceptual para la definición de las unidades de análisis: pueblos, comunidades y nacionalidades, así como la caracterización de estas unidades acorde a la información estadística disponible. Este documento deberá incluir un apartado de recomendaciones en relación a la información necesaria que pueda servir para mejorar la producción estadística del SEN, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo DINME previo a su solicitud de pago. 5. En el marco de la Comisión Especial de Estadística para el Buen Vivir, se definen las preguntas a ser incluidas en la ENEMDU de diciembre 2016 para las diferentes temáticas (salud, educación, agua, saneamiento e higiene, hábitat y vivienda, trabajo y seguridad social, armonía interna y uso del tiempo) y se trabaja a nivel de DINME en los manuales de crítica y codificación. 6. El 25 de octubre se participa de la reunión de Seguimiento interinstitucional INEC-SENPLADES al proyecto: Formulación de Nuevas Métricas, tras lo cual se acogen en GPR todas las observaciones emitidas. 7. Se reportan los indicadores del proyecto correspondientes al tercer trimestre.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	23/11/2016 - 09:47 AM
SEPTIEMBRE 2016 1. El 1 de septiembre, mediante Oficio No.042 PYDLOS-2016 se recibe la solicitud de prórroga para la entrega de los productos 3 y 4 del Convenio Específico de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Universidad de Cuenca, misma que es aprobada por la DINME, estimando su fecha de entrega para el 21 de septiembre de 2016, fecha en la cual se recibe el Producto 3: Informes Analíticos por grupos y el Producto 4: Informe Final comparativo supervisado por un experto cualitativo y un Informe detallado de los gastos, los cuales se encuentran al momento siendo revisados para su aprobación, previo a la solicitud de pago. 2. En el marco de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" el 9 de septiembre se recibe de parte del experto a cargo, el Ec. Mauricio León, la solicitud de prórroga para la entrega del producto 4, misma que es aprobada por la DINME y tras lo cual el 30 de septiembre se recibe	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	07/11/2016 - 02:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el Producto 4: Un informe que contenga para cada indicador (detallado en el producto 3) la justificación de la fijación de las líneas de pobreza, de suficiencia y de riqueza del subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del Sistema Estadístico Nacional. Este documento deberá incluir un apartado de recomendaciones en relación a la información necesaria que pueda servir para mejorar la producción estadística del SEN, el cual se encuentra siendo revisado por el equipo DINME antes de ser aprobado para solicitar su pago. (Hito cumplido 37). 3. Se mantienen reuniones de trabajo de las mesas temáticas definidas en la Comisión Especial de Estadística para el Buen Vivir (salud, educación, agua, saneamiento e higiene, habitat y vivienda, trabajo y seguridad social, armonía interna y uso del tiempo) de las cuales se obtuvieron las preguntas a ser incluidas en la ENEMDU de diciembre 2016. 4. El 26 de septiembre se firma el contrato con la empresa pública El Telégrafo, lo cual permite dar paso a la impresión de publicaciones contempladas en el Proyecto.		
AGOSTO 2016 1. Se realiza el reporte de los indicadores del proyecto, correspondiente al periodo Abril - Junio. 2. Se regularizó el cumplimiento de los hitos con las fechas reales de ejecución, tras su reestructura. Esto se efectuó gracias a la apertura del sistema tras la solicitud realizada a Senplades y a través del campo "Control de cambios" del sistema. 3. Se revisa la programación del proyecto "Formulación de Métricas nuevas y alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas" en base a lo solicitado por DIPLA mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2016-0758-M. 4. El 11 de agosto se asiste a la reunión con la Unidad de Seguimiento y Evaluación; Planificación e Inversión a fin de presentar y sustentar documentadamente los requerimientos emitidos. 5. Tras la consolidación de los respectivos documentos habilitantes, se realiza la solicitud de pago a la Dirección Administrativa Financiera mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0041-M con fecha 17 de agosto de 2016, del producto 3 de la cosultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" a cargo del experto Ec. Mauricio León, correspondiente al documento: Informe que contenga la definición teórica y operativa de los indicadores para el subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del Sistema Estadística Nacional y los estudios culitativos sobre Buen Vivir del INEC, que incluye un apartado de recomendaciones en relación a la información necesaria que pueda servir para mejorar la producción estadística del SEN. 6. Se recepta por parte del MIFIN el aval correpondiente al Libro de Experiencia Internacionales del Buen Vivir, lo cual permite dar incio al proceso de contratación del servicio de impresiines previstas dentro del proyecto. 7. Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0105-M se envían los TDRs finales para la contratación del servicio de impresión de publicaciones, dando atención al Memorando Nro. INEC-CGAF-2016-2109-M de 11 de agosto de 2016, mediante el cual se solicita la revisión y ajuste de los TDR correspondientes a este proceso. 8. Se asiste a la reunión de seguimiento GPR instituciones adscritas - SENPLADES el 26 de agosto 2016. 9. Se mantienen reuniones de trabajo de las mesas temáticas definidas en la Comisión Especial de Estadística para el Buen Vivir.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	04/10/2016 - 04:14 PM
JULIO 2016 1. El 4 de julio se reciben los productos 1 y 2 la consultoría "Gestión de estudios científicos externos al INEC", correspondiente a: Al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/ o metodologías alternativas para medición de Bienestar que hayan aprobado las distintas fases del proceso para la revisión y aceptación de postulaciones, en versión digital y con los insumos necesarios para la diagramación e impresión presentados" (Hito cumplido 34). En este sentido cabe mencionar que tras la consolidación de los respectivos documentos habilitantes, se realiza la solicitud de pago a la Dirección Administrativa Financiera mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0037-M con fecha 19 de julio de 2016.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	05/09/2016 - 11:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. El día 6 de julio se lleva a cabo a través de videoconferencia la reunión planificada entre el INEC y PYDLOS, la cual contó con la presencia de representantes del DIPLA y DIFI, a fin de plantear acciones para la reactivación del convenio. 3. Mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2016-0365-M, el 11 de julio se obtiene la autorización para la reestructuración de hitos por parte del Patrocinador Ejecutivo, tras lo cual y en coordinación con DIPLA, se procede a la reestructuración respectiva en la herramienta GPR, para posterior a ello reportarlos como cumplidos, razón por la cual dentro de esta herramienta de evidencia un desfase entre la fecha estimada y la fecha real. 4. El 19 de julio tras la consolidación de los respectivos documentos habilitantes, mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0036-M, se solicita a la Dirección Administrativa Financiera el pago del producto 1 de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir". 5. Se trabaja conjuntamente con DIPLA en la matriz de indicadores para el proyecto, mismos que se registran posteriormente en la herramienta GPR. 6. Tras las gestiones respectivas en coordinación con DIPLA y la Universidad de Cuenca, con fecha 27 de julio a través del Oficio Nro. INEC-DIPLA-2016-0013-O, se reanuda el convenio específico, tras lo cual se obtiene además la firma del adendum que permite extenderlo hasta el mes de noviembre y define nuevas fechas en el plan de trabajo. 7. El 29 de julio, en el marco de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" se recibe el Producto 2 por parte del experto Ec. Mauricio León, correspondiente al documento: Informe que contenga la definición teórica y operativa de los indicadores para el subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del Sistema Estadística Nacional y los estudios cualitativos sobre Buen Vivir del INEC. Este documento deberá incluir un apartado de recomendaciones en relación a la información necesaria que pueda servir para mejorar la producción estadística del SEN. (Se reportará el 15 de agosto como hito cumplido).		
JUNIO 2016 1. Se realizan la firmas de los contratos de las consultorías "Investigación y Análisis del Buen Vivir" y "Gestión de estudios científicos externos al INEC". Lo cual permite iniciar con las actividades técnicas planificadas como parte del proyecto. 2. Se confirma la realización del segundo pago a PYDLOS - U. de Cuenca, de acuerdo a lo establecido en el convenio específico, tras lo cual se programa una reunión inmediata para el 6 de julio entre INEC y PYDLOS, a fin de plantear acciones para la reactivación del convenio. 3. Se recepta el aval por parte del MIFIN para publicaciones previstas dentro del proyecto, a excepción del Libro de Experiencia Internacionales del Buen Vivir, por lo cual la Dirección Financiera envía la justificación correspondiente para la obtención del aval que permita la impresión del mismo. 4. Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0081-M, el 29 de junio se envía el documento de la Justificación Técnica para la reestructuración de hitos, mismo que fue revisado por UPI - DIPLA y DIREJ, y solventado en sus observaciones por DINME previamente. Al momento se espera autorización por parte del Patrocinador Ejecutivo. 5. En base a la reunión mantenida el 23 de Junio con DIPLA y SENPLADES para el seguimiento al proyecto, se procede a dar respuesta a los compromisos adquiridos en la herramienta GPR. 6. En atención al memorando INEC-DIREJ-2016-0326-M, se envía a DIPLA la Matriz de atención a recomendaciones de proyectos - mayo 2016. 7. Se trabaja conjuntamente con DIPLA en la construcción indicadores y registro de resultados para los proyectos de inversión. 8. El 24 de junio se recepta el Primer producto de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir".	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	18/07/2016 - 05:32 PM
MAYO 2016 1. Se continúan las gestiones institucionales para las contrataciones de la consultorías "Investigación y Análisis del Buen Vivir" y "Gestión de estudios científicos externos al INEC", mismas que tuvieron complicaciones en su proceso dentro del portal del SERCOP. Una de ellas fue solventada y para la otra se espera aún las directrices sobre cómo proceder.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	06/07/2016 - 03:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se realizan reuniones con los consultores previstos afin de que puedan vincularse a los procesos de contratación. 3. Se receptan las cotizaciones finales para las publicaciones previstas dentro del proyecto por parte de la empresa pública El Telégrafo y se definen los TDRs para las mismas, tras lo cual se procede con la solicitud de su contratación a la Coordinación General Administrativa Financiera, mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0072-M. 4. En cuanto al convenio PYDLOS se valora con el Director Ejecutivo del INEC la posibilidad de poder continuarlo debido a la importancia de contar con insumos cualitativos para la formulación de métricas para el Buen Vivir. En este sentido se considera asumir la responsabilidad de no solamente lograr el pago pendiente sino solicitar el aval al MIFIN para poder realizar el tercer pago y a la par que se reactive el convenio. 5. El 18 de mayo se envía a DIPLA la propuesta del proyecto "Fortalecimiento de Metodologías de Bienestar Alternativo" para el 2017, a través de Memorando Nro. INEC-CTIMA-0073-M. 6. Debido al incumplimiento de varios de los hitos establecidos para el proyecto, se trabaja en la Justificación Técnica para la reestructuración de hitos, mismo que fue revisado por UPI - DIPLA y solventado en sus observaciones por DINME. Sin embargo este procedimiento fue suspendido debido a que varios de los procesos que rigen las actividades del Proyecto (contrataciones de consultorías) y por lo tanto la formulación de sus hitos, se vieron detenidos, con lo cual se debe volver a plantear nuevas fechas para su cumplimiento. De igual forma el cambio de responsable en la Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Metodologías que coincide con este proceso, permite replantear las actividades propuestas en beneficio del cumplimiento de los objetivos y componentes del proyecto. 7. Se comunica a DICOS acerca de los pagos pendientes relacionados al evento internacional desarrollado en año anterior, con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento a este compromiso.		
ABRIL 2016 1. El 13 de abril en la reunión de seguimiento físico y presupuestario al proyecto, se comunica a DIPLA sobre las dificultades que se han presentado en la ejecución del proyecto, debido al retraso en la emisión de avales por parte de MIFIN para las contrataciones previstas, lo cual ha incidido tanto a nivel técnico como presupuestario. Por ello se plantea esperar una respuesta por parte del MIFIN hasta finales de abril y así con un panorama más claro sobre las fechas de contratación, realizar una reestructuración de hitos. 2. El 18 de abril mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0059-M, se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera, la contratación del servicio de impresión de publicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto. 2. El 26 de abril la Dirección Financiera notifica a CTIMA a través de Memorando Nro. INEC-CGAF-DIFI-2016-0572-M y Memorando No. INEC-CGAF-DIFI-2016-0573, acerca de la emisión de avales por parte del Ministerio de Finanzas para las consultorías "investigación y análisis del Buen Vivir" y "Gestión para estudios científicos externos al INEC" respectivamente, lo cual permite iniciar estos procesos de contratación. 3. El día miércoles 27 de abril se comunica mediante videoconferencia a PYDLOS de la Universidad de Cuenca acerca del segundo pago del convenio, mismo que no ha podido a pesar de todas las gestiones institucionales realizadas, debido a la falta de liquidez en la caja fiscal.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	16/05/2016 - 09:37 AM
MARZO 2016 Las actividades de mayor relevancia realizadas durante este mes son: 1. El 1 de marzo mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0014-M se solicita a DIPLA la autorización para la modificación de la partida 780301 por la partida 730601 destinada a Gestión de estudios científicos externos al INEC, necesaria para el servicio de consultoría. 2. Se realizan las gestiones para enviar el 3 de marzo el memorando Nro. INEC-DIPLA-2016-0002-O, en alcance al Oficio Nro. INEC-DIPLA-2016-0001-O mediante el cual se suspende el convenio con la U. de Cuenca PYDLOS, debido al cambio de rector.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	25/04/2016 - 02:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Envío de solicitud de autorización y pedido de aval al Ministerio de Finanzas para proceder con la contratación de la consultoría "Gestión de estudios científicos externos al Inec" enviada a través de memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0045-M el 15 de marzo, en el cual se incluyen los TDRs trabajados conjuntamente con la Dirección Administrativa 4. El 18 de marzo se realiza el segundo adendum al proyecto, en atención al Memorando INEC-DIPLA-2016-0207-M mediante el cual se solicita la re estructuración en la planificación del proyecto debido al recorte presupuestario informado a través de memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0470-M. 5. Los hitos 27 y 28 planificados para este mes no han podido ser cumplidos y se encuentran asociados a problemas en el campo correspondiente, donde se detallan sus razones y acciones de prevención. 6. Se realiza el reporte de los indicadores registrados para el proyecto.		
FEBRERO 2016 Las actividades más relevantes ejecutadas durante este mes son: 1. El 11 de febrero con memorando Nro. INEC-CTIMA-DINME-2016-0007-M se envía a DIPLA los documentos en formatos SENPLADES, solicitando actualización de actividades del proyecto. 2. El día 12 de febrero se realiza una reunión con la Coordinadora General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, los directores del área jurídica y financiera del INEC y el director de PYDLOS para abordar la situación del convenio específico de cooperación técnica con la Universidad de Cuenca, tras lo cual se decide entre las partes suspender al mismo. Este particular es notificado formalmente a la Universidad de Cuenca a través de Oficio Nro. INEC-DIPLA-2016-0001-O el 18 de febrero. 3. Envío de solicitud de autorización y pedido de aval al Ministerio de Finanzas para proceder con la contratación de la consultoría "Investigación y Análisis del Buen Vivir" enviada a través de memorando Nro. INEC-CTIMA-2016-0025-M el 13 de febrero, en el cual se incluyen los TDRs trabajados conjuntamente con la Dirección Administrativa. 4. Elaboración de hitos para el año 2016. 5. Cierre de lineamientos del Proyecto 2015. 6. Realización del Informe sobre el estado de los resultados previos del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado. (Cumplimiento Hito 26)	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	30/03/2016 - 03:56 PM
ENERO 2016 Las actividades más representativas para el desarrollo del proyecto en este mes son: 1. Reuniones con la SNGP como alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador (Hito cumplido 25). 2. Elaboración de documentos en coordinación con DIPLA para la actualización de hitos en GPR para el año 2016. 3. Elaboración de TDR's para la contratación de la consultoría de Investigación y Análisis de acuerdo a las observaciones emitidas por la Dirección de Compras Públicas. 4. Comunicaciones con el equipo de PYDLOS- Universidad de Cuenca, en el marco del adendum previsto para el convenio específico en curso.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	19/02/2016 - 10:24 AM
DICIEMBRE 2015 Las actividades más importantes realizadas durante este mes como parte del proyecto son: 1. Recepción de Informes Analíticos por grupo de discusión entregados por el equipo del PYDLOS en el marco del estudio cualitativo en ejecución. (Hito cumplido 24) 2. Supervisión y acompañamiento a los grupos de discusión #12, #13 y #15 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	11/01/2016 - 03:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuados por el equipo PYDLOS, en las Provincias de Guayas y Galápagos respectivamente. 3. Formulación y entrega a DIPLA de los lineamientos del Proyecto para el 2016. 4. Formulación de los TDR's para la contratación del del experto a cargo de la Consultoría "Análisis e investigación del Buen Vivir". 5. Envío de oficio al Subsecretario de Pueblos e Interculturalidad del Secretaría Nacional de Gestión de la Política solicitando una reunión que permita obtener datos previos en el marco del mapeo de puebl.os, comunidades y nacionalidades del Ecuador pensado para el 2016.		
NOVIEMBRE 2015 Las actividades más relevantes ejecutadas durante este mes como parte del proyecto son: 1. Recepción del Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado (Hito cumplido 22) realizado por el equipo del PYDLOS en el marco del estudio cualitativo en ejecución. 2. Realización del Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado (Hito cumplido 23). 3. Supervisión y acompañamiento a los grupos de discusión #3, #10 y #11 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuado por el equipo PYDLOS, en las Provincias de Manabí, El Oro y Pichincha respectivamente. 4. Se recibe el Producto 5 por parte del experto Ec. Mauricio León, correspondiente al documento con el cálculo y análisis de los indicadores del Buen Vivir disponibles y con las recomendaciones de nuevos indicadores y fuentes de información. Este documento estuvo acompañando de un Informe Final que recoge el trabajo realizado en la Consultoría para la "Operativización de la medición del Buen Vivir para el desarrollo de las actividades del proyecto Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas" como parte de su culminación. 5. Se mantuvo una reunión con representantes del CODEMPE y CODEPMOC como parte del trabajo previo al mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	08/12/2015 - 02:18 PM
OCTUBRE 2015 En este mes las actividades más relevantes ejecutadas dentro del proyecto son: 1. Recepción del documento que contiene el Informe de la capacitación en metodología cualitativa, entregado por la experta Ana Martínez (Hito cumplido 19.) 2. Se concluye con la elaboración de los contenidos para la página web de la Red académica de estudios del Buen Vivir, mismo que se encuentran actualmente en revisión, antes de ser enviados en su versión final a DICOS (Hito cumplido 20). 3. Se cuenta con el acta de la reunión de la sub comisión de naturaleza, donde se evaluaron los avances en torno a la construcción de indicadores para este componente. 4. Se realiza la supervisión y acompañamiento al grupo de discusión #2 del estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", efectuado por el equipo PYDLOS, en la Provincia del Azuay el 22 de octubre.	Guayasamin Albuja, Diana Carolina	03/12/2015 - 05:42 PM
SEPTIEMBRE 2015 Las actividades más relevantes para el proyecto durante este mes son: 1. Entrega del documento para el compendio del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", para diagramación y publicación digital, en coordinación con FAO-ONU. 2. En el marco de la comisión estadística del buen vivir, se realiza la primera reunión de la sub comisión de naturaleza para evaluar los avances en torno a la construcción de indicadores para este componente e iniciar con la definición y elaboración de indicadores ambientales.	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	07/10/2015 - 02:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se da inicio al estudio cualitativo "Hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana/ los sectores populares", a través de las siguientes actividades: - Desarrollo de la prueba piloto correspondiente al grupo de discusión número 1, realizada el 25 de septiembre. (Hito cumplido 18) - Capacitación metodológica en grupos de discusión a la que asistió personal de INEC y PYDLOS - Universidad de Cuenca, llevada a cabo en la oficinas de INEC- Iñaquito, los días 26 y 27 de septiembre. (Hito cumplido 19). 4. Se realiza en coordinación con el equipo DIPLA la reestructuración de hitos del proyecto, aprobada mediante Memorando Nro. INEC. DIREJ-2015-0526-M.		
AGOSTO 2015 Durante este mes se han realizado las siguientes actividades relevantes para el proyecto: 1. Compilación, revisión y corrección de estilo a los documentos entregados por los ponentes en el marco del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", para su publicación. 2. Se realiza la segunda reunión de la comisión estadística del buen vivir en la cual se presenta la propuesta del concepto del Buen Vivir, sus dimensiones e indicadores, tras lo cual se decide que la metodología de trabajo de la comisión será a través de sub comisiones que trabajarán las distintas temáticas (personas, comunidades y naturaleza). En este sentido las instituciones que intervienen han procedido a revisar el documento y enviar sus comentarios, mismos que están siendo evaluados para su incorporación. 3.. Se realizaron 2 reuniones - videoconferencias con OPHI, con la finalidad de definir las actividades para el proyecto "Asesoría para la formulación de métricas nuevas y alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en Ecuador", a desarrollarse en conjunto con esta institución, tras lo cual INEC envía la propuesta y recibe una contra propuesta a conformidad. Se espera coordinar a través de DIPLA la obtención de fondos para este proyecto.	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	08/09/2015 - 11:45 AM
JULIO 2015 1. Tras la realización del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas Alternativas del buen vivir y bien-estar", el equipo del proyecto realiza la sistematización de las mesas de discusión en el ámbito conceptual, metodológico e institucional, obteniendo el documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional (Hito cumplido 18). 2. El 27 de julio del año en curso se realiza la firma del Convenio con PYDLOS - Universidad de Cuenca, lo cual permite iniciar el proceso para la transferencia de fondos. Se estima que una vez realizada dicha transferencia se de inicio a los estudios cualitativos (Hito asociado 14). 3. El 24 de julio se realiza la reunión de asesoramiento para la elaboración de la página web de la Red Académica de estudios del buen vivir (Hito asociado 13) con las Direcciones de: Comunicación Social, Tecnologías de la Información y Comunicación, Registros Administrativos, Talento Humano y Jurídico, tras lo cual se ve la necesidad de modificar la figura de contratación y realizar ajustes técnicos al requerimiento. En este sentido se realiza además una reunión con la Dirección de Comunicación Social, el 31 de julio, en la cual se establece la posibilidad de solventar la necesidad de la elaboración de la página web desde la misma. Los hitos 13 y 14 se mantienen retrasados en su cumplimiento, pero se estima que el mes siguiente se los pueda dar cumplimiento, sin embargo se reitera que el cumplimiento de dichos hitos se vinculan a procesos administrativos que salen de la ejecución del proyecto.	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	06/08/2015 - 11:08 AM
JUNIO 2015 El trabajo coordinado y oportuno por parte del equipo del Proyecto de Nuevas Métricas, a nivel inter institucional tanto a nivel nacional como internacional, permitió la realización del Evento: "Conferencia Internacional: Métricas alternativas del buen vivir y el bien - estar", que contó con la participación de 16 ponentes que brindaron interesantes reflexiones sobre a la construcción del Buen Vivir en el Ecuador y el mundo, y más de 200 asistentes. (Hito cumplido 17) Tras la aprobación de la re programación solicitada a la Dirección de Planificación, mediante Memorando Nro. INEC- CTIMA-2015-0074-M, de fecha 6 de mayo de 2015, se procede a solicitar a la Universidad de Cuenca (PYDLOS), la firma del Convenio que permite la transferencia de fondos para iniciar los estudios cualitativos sobre el Buen Vivir, al cual como contra parte desde	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	04/07/2015 - 01:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PYDLOS, se solicitan modificaciones antes de la suscripción, mismas que han sido incluidas y al momento se espera la respuesta por parte de PYDLOS. Esto sigue generando un retraso en el cumplimiento del hito asociado 14. La aprobación de la re programación, a su vez permite planificar el inicio del proceso de contratación del servicio de diseño y elaboración de una pagina web que consolide la Red Académica de Estudios (hitos asociados 13), para lo cual se prevé contar con el asesoramiento de las Direcciones institucionales involucradas (Dirección de Talento Humano, Dirección de Comunicación, Dirección de Tecnologías y Dirección Administrativa Financiera). Se espera en lo siguientes meses dar cumplimiento a estos hitos retrasados, pero cabe indicar que los mismos se verán atados a procesos administrativos inherentes a la institución.		
MAYO 2015 Con fecha 6 de mayo se emite el Memorando Nro. INEC- CTIMA-2015-0074-M, mismo que solicita la aprobación para la re programación de valores que permiten la firma del Convenio con la Universidad de Cuenca (PYDLOS) para la realización de estudios cualitativos sobre el Buen Vivir, así como la contratación del servicio de diseño y elaboración de una pagina web que consolide la Red Académica de Estudios. Debido a que dicho Adendum ha sido enviado mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2015-0447-M a la Sub Dirección General y al momento se espera su aprobación, algunos hitos no han podido ser cumplidos de acuerdo a lo programado (Hitos asociados 13 y 14). Se recibe el documento que contiene una primera propuesta de indicadores para el Buen Vivir por parte del experto consultor contratado para este fin (Hito cumplido 15). Los procesos realizados desde el Proyecto de Nuevas Métricas, a nivel institucional con la Dirección de Comunicación y a nivel Interinstitucional con la Secretaría Nacional del Buen Vivir, han permitido coordinar a nivel logístico y técnico la realización del evento internacional "El Buen Vivir: Mediciones alternativas del buen vivir y el bien - estar" (Hito cumplido 16).	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	04/06/2015 - 04:16 PM
ABRIL 2015 El 13 de abril se concreta la contratación de la experta en técnicas de medición cualitativas (asociado al hito 12), para la formulación del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir. En el marco de la realización de evento internacional de nueva métricas "El Buen Vivir: Mediciones alternativas del buen vivir y el bien - estar", se continuó realizando invitaciones para ponencias, dando como resultado al finalizar la actividad, contar con la confirmación de participación de 11 ponentes internacionales. En este sentido además el 29 de abril se realiza una reunión con el equipo de la Secretaría del Buen Vivir, a fin de coordinar la participación de Bolivia en el evento. En cuanto a la contratación de la empresa para la organización y realización del evento internacional, se solicita a la Dirección de Comunicación a través de Memorando No. INEC-CTIMA-2015-0069-M, la asignación de una mayor cantidad de recursos, en virtud de que se considera oportunamente la incorporación de nuevos temas a discutir dentro del evento, lo cual implica por lo tanto la ampliación del público objetivo, y aumentar el número de ejemplares de la publicación "Compendio de experiencias de nuevas medidas del bienestar". La Dirección de Comunicación recibe la aprobación de aumento de recursos a través del Memorando No. INEC-DIPLA-2015-0333 el 30 de abril. Al momento se espera que la Dirección de Comunicación solicite autorización a la Dirección Ejecutiva.	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	05/05/2015 - 03:29 PM
MARZO 2015 Solicitud de creación de la Comisión Especial emitida por la CTIMA a la CTPES mediante memorando INEC-CTIMA-2015-0033-M del 27 de febrero de 2015. La CTPES remite la solicitud al departamento jurídico el 25 de marzo de 2015 con memorando INEC-CTPES-2015-0059-M. Se espera respuesta de jurídico. (Asociado al hito 10). Solicitud de contratación de profesional cualitativo. Se recibe la autorización de contratación de profesional cualitativo para el diseño de estudios en campo por parte del Director Ejecutivo mediante memorando INEC-DIREJ-2015-0104-M del 13 de marzo de 2015. El 16 de marzo de 2015 se realiza la solicitud de contratación a Coordinación Administrativa con Memorando Nro. INEC-CTIMA-2015-0048-M. El 26 de marzo de 2015 se realiza un alcance a la solicitud ajustando la contratación a la escala de 20 grados del Ministerio de Relaciones Laborales. (Asociado al hito 12).	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	05/05/2015 - 02:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reunión virtual con Sabina Alkire, economista británica, creadora del índice de pobreza multidimensional para recibir retroalimentación de los avances realizados en el INEC en lo relacionado con la medición de la pobreza multidimensional. (Asociado al hito 11). Invitaciones a participar en el evento internacional de nuevas métricas realizadas a los ponentes internacionales. Se enviaron 12 invitaciones, se recibieron 6 respuestas, de las cuales 4 fueron afirmativas. El 1 de abril de 2015 se recibe la aprobación de lineamientos de comunicación por parte del Director Ejecutivo con memorando INEC-DIREJ-2015-0130-M, lo que faculta a la Dirección de Comunicación a realizar la contratación de una empresa para la organización y realización del evento internacional. CTIMA envía a Comunicación los términos de referencia técnicos para la contratación de dicha empresa. (Asociado al hito 15). Elaboración hoja de ruta para firma de convenio específico con la Universidad de Cuenca. Considerando la experticia de PYDLOS, instituto de investigación de la Universidad de Cuenca, se decide realizar los estudios cualitativos en territorio con PYDLOS. Para ello se realiza la solicitud de firma de convenio específico a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2015-0052-M del 25 de marzo de 2015. (Asociado al hito 13)		
FEBRERO de 2015 1. En el marco de la conformación de la Red Académica sobre métricas y estudios del Buen Vivir se realizaron las siguientes actividades: a. Se suscribieron los convenios inter-institucionales con la Universidad San Gregorio de Manabí y la Universidad de Cuenca en el Azuay. En el marco de estos convenios se establecen las alianzas para la generación de red académica. (Hito cumplido 9) b. Se realizó un encuentro en Cuenca con el Centro de Investigaciones PYDLOS, de la Universidad de Cuenca a fin de conocer las investigaciones que se desarrollan sobre métricas del bienestar, Buen Vivir y aplicabilidad de estudios a nivel territorial. Adicionalmente, se estableció una agenda de trabajo en la que se considera al centro PYDLOS como principal aliado en la Zona Sur para estudios cualitativos y cuantitativos en nuevas métricas del Bienestar. (Hito cumplido 9) c. Como parte del fortalecimiento de redes y espacios académicos se vinculó al los diálogos estadísticos dos ponentes relevantes para nuevas métricas como fue Pablo Dávalos y Mauricio León, en lo referente al Buen Vivir y su definición. Este proceso permite socializar y generar espacio de discusión entre los hacedores de métricas de la Institución. 2. Inicio de la definición contractual del profesional especializado en metodologías cualitativas (Hito asociado 8). 3. Definición del Plan de actividades para la conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir y requerimiento enviado a las autoridades para aprobación. (Hito asociado 10) El experto del Proyecto de Nuevas Métricas presentó el documento analítico sobre las corrientes de pensamiento existentes en el país sobre el Buen Vivir. (Hito asociado 13) ENERO de 2015 1. Análisis de las experiencias nacionales a partir de los resultados obtenidos en el taller nacional de nuevas métricas. Se analizaron los enfoques neomarxistas, post modernistas e indigenistas para conceptualizar el Buen Vivir y sus posibles dimensiones. (HITO CUMPLIDO N.6) 2. Elaboración de la lista de expertos internacionales sobre nuevas métricas de Bienestar, identificando los ejes de aplicación para el análisis de bienestar, los enfoques asumidos. (HITO CUMPLIDO N.7) 3. Preparación de la hoja de ruta y actividades de cooperación inter-institucional en el marco de convenios con instituciones académicas (Hito asociado 9) 4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar.	Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra	06/04/2015 - 09:49 AM
DICIEMBRE de 2014 1. Realización del Taller Nacional de Nuevas Métricas el 2 y 3 de Diciembre. En este Taller se contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales quienes presentaron, desde diferentes enfoques el nuevo paradigma del Buen Vivir y sus diferentes formas de medirlo. Así mismo se contó con la participación de mas de cien personas entre académicos, analistas técnicos de instituciones públicas, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil. (HITO CUMPLIDO N. 5) 2. Finalización del proceso contractual con la empresa que se encargó del desarrollo logístico del evento. Esta fase comprendió la suscripción de actas entrega recepción finales, entrega de productos y proceso administrativo para ejecución del pago respectivo. (HITO CUMPLIDO N. 5) 3. Preparación de los documentos requeridos para la suscripción de convenios con instituciones académicas así como el diseño de objetivos y plan de trabajo para conformar la Comisión	Grijalva Tarapuez, Juan Francisco	05/02/2015 - 12:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Estadística Especial para la Construcción de Nuevas Métricas del Buen Vivir. (documentos preparatorios para cumplir con el HITO 9) 4. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida particularmente los módulos 9 y 11 relacionados con mediciones subjetivas del bienestar. NOVIEMBRE de 2014 1. Incorporación de un nuevo miembro al equipo de Nuevas Métricas. Con esta actividad queda conformado el equipo de trabajo con un experto y dos analistas. (HITO CUMPLIDO N. 3) 2. Coordinación logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas del Buen Vivir a desarrollarse el 2 y 3 de diciembre. Esta actividad comprende el proceso de contratación para el desarrollo del evento de nuevas métricas, coordinar con los ponentes para que las presentaciones respondan a los objetivos planificados. (HITO CUMPLIDO N. 4) 3. Incorporación del Experto en operativización para la medición del Buen Vivir (HITO CUMPLIDO N. 2). 4. Elaboración y planificación de actividades 2014 y 2015 para ejecución del Proyecto. OCTUBRE de 2014: 1. Inicia la planificación del Taller Nacional "El Buen Vivir, construyendo métricas" con el diseño de la agenda del taller y elaboración de términos de referencia para iniciar la contratación respectiva. En esta actividad se estableció como prioritario integrar en la agenda a los principales exponentes del ámbito académico que trabajan el Buen Vivir en sus espacios de investigación y político que han logrado posicionar en la agenda pública el paradigma del Buen Vivir. (HITO CUMPLIDO N. 1). 2. Preparación de los términos de referencia e inicio del proceso de contratación del experto en Operativización para la medición del Buen Vivir. (guarda relación con el HITO 2) 3. Se realizó la gestión para la contratación de otro miembro de equipo para iniciar la ejecución del Proyecto de Nuevas Métricas (guarda relación con el HITO 3). AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2014: 1. El proyecto "Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas" fue priorizado por SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0806-OF del 12 de agosto de 2014. 2. Se aprobaron los lineamientos del proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva. Allí se explicita la partida presupuestaria para uso de los recursos. 3. El 22 de septiembre se realiza la contratación del primer miembro del equipo para ejecución del Proyecto.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La falta de consenso por parte de las instituciones que conforman la Comisión Estadística del Buen Vivir, respecto a la aprobación de indicadores de su Índice causa un retraso en su aprobación.	03/07/2017	Lorena Elizabeth Moreno Enríquez	60	50	30	0/2

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Alcance. Un retraso en el trámite de contratación de consultoría para la realización de Estudios Especializados externos al INEC CAUSARÍA un retraso en el publicación de los estudios científicos	22/06/2017	Nataly Raquel García Gamboa	40 %	30	12	0/1

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas elaborada.	4-Inicio de Trabajo	17/10/2014		17/10/2014		Sí	2.4
2	DEFINICIÓN: Gestión para conformación del equipo técnico y experto en nuevas métricas realizada.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.4
3	PLANEACIÓN: Equipo de trabajo consolidado.	4-Inicio de Trabajo	04/11/2014		04/11/2014		Sí	2.4
4	PLANEACIÓN: Coordinación logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas implementada.	4-Inicio de Trabajo	29/11/2014		29/11/2014		Sí	2.4
5	EJECUCIÓN: Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado.	4-Inicio de Trabajo	03/12/2014		03/12/2014		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre la conceptualización del Buen Vivir y experiencias nacionales en métricas alternativas elaborado.	5-Entregables Intermedios	09/01/2015		09/01/2015		Sí	2.4
7	EJECUCIÓN: Referentes nacionales e internacionales relacionados con métricas alternativas del bienestar identificados.	5-Entregables Intermedios	29/01/2015		29/01/2015		Sí	1.6
8	EJECUCIÓN: Proceso contractual de experto en técnicas de medición cualitativas iniciado.	2-Publicación de Pliegos	17/02/2015		17/02/2015		Sí	2.4
9	EJECUCIÓN: Red Académica para la construcción de nuevas métricas conformada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.6
10	EJECUCIÓN: Solicitud de conformación de Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas enviada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.6
11	EJECUCIÓN: Videoconferencia con expertos internacionales realizada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.6
12	EJECUCIÓN: Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.4
13	EJECUCIÓN: Propuesta del sistema de indicadores del Buen Vivir elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	3.2
14	EJECUCIÓN: Organización logística y técnica del Taller	4-Inicio de Trabajo	01/06/2015		01/06/2015		Sí	2.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Internacional de Nuevas Métricas elaborada.							
15	EJECUCIÓN: Taller Internacional de Nuevas Métricas realizado.	5-Entregables Intermedios	03/07/2015		03/07/2015		Sí	4.0
16	EJECUCIÓN: Documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	3.2
17	EJECUCIÓN: Hoja de ruta del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador elaborada.	5-Entregables Intermedios	27/08/2015		27/08/2015		Sí	4.8
18	EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la prueba piloto de grupo de discusión para estudio cualitativo elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	3.2
19	EJECUCIÓN: Informe de la capacitación en metodología cualitativa elaborado.	5-Entregables Intermedios	06/10/2015		06/10/2015		Sí	3.2
20	EJECUCIÓN: Contenidos para la pagina web de la red académica elaborados.	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	4.0
21	EJECUCIÓN: Acta de reunión de las subcomisiones sobre avances en la definición de indicadores del buen vivir elaborada.	5-Entregables Intermedios	16/10/2015		16/10/2015		Sí	3.2
22	EJECUCIÓN: Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado.	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		06/11/2015		Sí	4.0
23	EJECUCIÓN: Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado.	5-Entregables Intermedios	23/11/2015		23/11/2015		Sí	3.2
24	EJECUCIÓN: Informes analíticos por grupos de discusión entregados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	4.0
25	EJECUCIÓN: Alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizadas.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.52
26	EJECUCIÓN: Informe previo de resultados del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN: Informe del estado de contrataciones consideradas en el proyecto elaborado.	5-Entregables Intermedios	24/03/2016		18/07/2016		Sí	0.24
28	EJECUCIÓN: Presentación de recomendaciones para mejorar la recolección de datos en el futuro para monitorear los ODS - Agua y Saneamiento elaborada.	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		18/07/2016		Sí	0.28
29	EJECUCIÓN: Informe del estado de contrataciones para el proyecto. Causas identificadas para su retraso, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		18/07/2016		Sí	0.24
30	EJECUCIÓN: Informe del estado de contrataciones para el proyecto. Gestiones internas realizadas para dar continuidad a los procesos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	13/06/2016		18/07/2016		Sí	0.24
31	EJECUCIÓN: Contrato de consultoría "Investigación y análisis del Buen Vivir", suscrito.	5-Entregables Intermedios	17/06/2016		18/07/2016		Sí	0.2
32	EJECUCIÓN: Contrato de consultoría "Gestión de estudios científicos externos al INEC" suscrito.	5-Entregables Intermedios	24/06/2016		18/07/2016		Sí	0.2
33	EJECUCIÓN: Plan de Proyecto de Investigación y Análisis del Buen Vivir elaborado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2016		18/07/2016		Sí	0.64
34	EJECUCIÓN: Al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/o metodologías alternativas para medición del Bienestar.	5-Entregables Intermedios	17/07/2016		18/07/2016		Sí	0.64
35	EJECUCIÓN: Informe que contenga la definición teórica y operativa de los indicadores para el subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del SEN y los estudios cualitativos sobre Buen Vivir del INEC.	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		15/08/2016		Sí	0.64
36	EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #1 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.4
37	EJECUCIÓN: Informe que contenga para cada indicador. la justificación de la fijación de las líneas de pobreza, de suficiencia y de riqueza del subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del SEN	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.64
38	EJECUCIÓN: Al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/o metodologías alternativas para medición del Bienestar que hayan aprobado las distintas fases del proceso	5-Entregables Intermedios	20/10/2016		20/10/2016		Sí	0.64

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para la revisión y aceptación de postulaciones.							
39	EJECUCIÓN: Informe que contenga el marco conceptual para la definición de las unidades de análisis: pueblos, comunidades y nacionalidades, así como la caracterización de estas unidades acorde a la información estadística disponible.	5-Entregables Intermedios	15/11/2016		15/11/2016		Sí	0.64
40	EJECUCIÓN: Informe de resultados del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2016		28/11/2016		Sí	0.4
41	EJECUCIÓN: Taller de discusión sobre Buen Vivir #2 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2016		28/11/2016		Sí	0.4
42	EJECUCIÓN: Acta de la reunión para la presentación de la propuesta de indicadores del BV por parte de la Comisión Estadística para personas, comunidades y ambiente realizada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.4
43	EJECUCIÓN: Informe del Cálculo de indicadores del subsistema de armonía interna de las personas elaborado.	5-Entregables Intermedios	27/12/2016		27/12/2016		Sí	0.56
44	EJECUCIÓN: Informe final del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado.	5-Entregables Intermedios	27/12/2016		27/12/2016		Sí	0.64
45	EJECUCIÓN: Informe de actividades ejecutadas en el proyecto elaborado.	9-Entregables Formales	28/12/2016		28/12/2016		Sí	1.02
46	EJECUCIÓN: Informe de publicaciones impresas y su difusión realizada.	5-Entregables Intermedios	28/12/2016		28/12/2016		Sí	0.4
47	EJECUCIÓN: Contratos de personal firmados.	5-Entregables Intermedios	27/01/2017		27/01/2017		Sí	0.6
48	EJECUCIÓN: Informe de la primera difusión de documentos de estudios científicos publicados en el 2016.	5-Entregables Intermedios	24/02/2017		24/02/2017		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Matriz de Reporte para seguimiento y control mensual de actividades elaborado.	9-Entregables Formales	24/02/2017		24/02/2017		Sí	0.6
50	EJECUCIÓN: Plantilla Project Charter 2017 elaborado.	9-Entregables Formales	24/02/2017		24/02/2017		Sí	0.6
51	EJECUCIÓN: Agenda de investigación elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	EJECUCIÓN: Avance de la Sistematización del estudio cualitativo realizada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Documento Final de la Sistematización del estudio cualitativo realizada.	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.6
54	EJECUCIÓN: Indicadores en todas las dimensiones del BV calculados.	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.8
55	EJECUCIÓN: Informe de la segunda difusión de documentos de estudios científicos publicados en el 2016.	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Marco conceptual para la definición de las dimensiones e indicadores del Índice del Buen Vivir realizado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.8
57	EJECUCIÓN: Actas de las reuniones de aprobación de indicadores del Índice del Buen Vivir elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017	31/05/2017			No	1.8
58	EJECUCIÓN: Documentos metodológicos de innovación en métricas para el bienestar en agua, saneamiento e higiene elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.6
59	EJECUCIÓN: Acta de la reunión de socialización de la sistematización del estudio cualitativo con la Comisión Estadística del Buen Vivir levantada.	5-Entregables Intermedios	14/07/2017	14/07/2017			No	1.0
60	EJECUCIÓN: Informe de la primera publicación de estudios científicos realizada.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017	31/08/2017			No	0.9
61	EJECUCIÓN: Informe de la publicación de agua, saneamiento e higiene.	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.9
62	EJECUCIÓN: Informe de publicación de libro del Índice del Buen Vivir realizada.	5-Entregables Intermedios	29/10/2017	29/10/2017			No	1.0
63	EJECUCIÓN: Informe de la difusión de documentos de agua, saneamiento e higiene publicados.	5-Entregables Intermedios	29/11/2017	29/11/2017			No	0.5
64	EJECUCIÓN: Informe de la segunda publicación de estudios científicos realizada.	5-Entregables Intermedios	28/12/2017	28/12/2017			No	1.8
65	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre del Proyecto elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.9

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la construcción de indicadores para la nueva métrica del Buen Vivir.		91.67 %	1	0.9167	01/04/2016	Abr-Jun
2	Porcentaje de avance en el fortalecimiento e institucionalización del proceso de construcción de métricas del Buen Vivir.		100.00 %	0.66	0.66	01/07/2016	Abr-Jun
3	Porcentaje de avance en el análisis e investigación del Buen Vivir.		100.00 %	0.8	0.8	01/07/2016	Abr-Jun
4	Porcentaje de difusión para publicaciones en torno a nuevos indicadores del Buen Vivir.		100.00 %	0.95	0.95	01/10/2016	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	644,527.59 **
Costo Total:	757,508.00
Total Devengado:	574,050.04
% Costo Total Devengado:	75.78 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 75.78 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	722,307.84	0.00	0.00	722,307.84
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	722,307.84	282,307.84	0.00	1,004,615.68
Ppto. Codificado	618,038.58	117,125.00	0.00	735,163.58
Ppto. Comprometido	529,252.59	46,647.45	0.00	575,900.04
Planeado - Codificado (2017)		-117,125.00		
Programado a Devengar	618,038.58	117,125.00	0.00	735,163.58
Ppto. Devengado	527,402.59	46,647.45	0.00	574,050.04
Estimado a fin de año	* 527,402.59	0.00	0.00	527,402.59
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	90,635.99	117,125.00	0.00	207,760.99
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 85.33 %	39.83 %	0.00 %	78.08 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

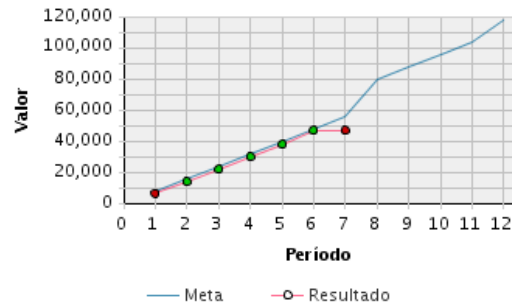

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	7,400.14	6,071.19	7,400.14	6,071.19	82.04 %		5.18 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	7,949.34	7,848.39	15,349.48	13,919.58	90.68 %		11.88 %
Mar	7,949.34	7,949.35	23,298.82	21,868.93	93.86 %		18.67 %
Abr	7,980.65	8,120.27	31,279.47	29,989.20	95.88 %		25.60 %
May	7,980.65	7,980.66	39,260.12	37,969.86	96.71 %		32.42 %
Jun	7,980.65	8,677.59	47,240.77	46,647.45	98.74 %		39.83 %
Jul	7,980.65	0.00	55,221.42	46,647.45	84.47 %		39.83 %
Ago	24,515.34		79,736.76				
Sep	7,980.65		87,717.41				
Oct	7,980.65		95,698.06				
Nov	7,980.65		103,678.71				
Dic	13,446.29		117,125.00				
Total	117,125.00	46,647.45					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el desarrollo de investigaciones científicas en función de la producción del SEN, MEDIANTE la elaboración de estudios y documentos analíticos, de tipo periódico o especializado en la temática de nuevas métricas y metodologías
14	Incrementar el posicionamiento institucional en la innovación de métricas y metodologías en el ámbito público y privado MEDIANTE la participación en espacios interinstitucionales, elaboración de documentos de análisis y alianzas estratégicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 16.- Documento técnico analítico sobre mediciones alternativas de bienestar a nivel internacional elaborado.	C5.pdf	10/12/2015
2	ASOCIACIÓN HITO 27.- Informe del estado de contrataciones consideradas en el proyecto elaborado.	E3.pdf	27/07/2016
3	ASOCIACIÓN HITO 31.- Contrato de consultoría "Investigación y análisis del Buen Vivir", suscrito.	E7.pdf	20/07/2016
4	Acta de constitución del Proyecto	B1.pdf	28/04/2015
5	Acta de Constitución Proyecto 2016	D8.pdf	19/02/2016
6	ASOCIACIÓN 9.- Fortalecimiento de la Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad de Cuenca.	A9.pdf	28/04/2015
7	ASOCIACIÓN HITO 1.- Agenda del taller Buen Vivir (Organización logística y técnica del Taller Nacional de Nuevas Métricas).	A1.pdf	28/04/2015
8	ASOCIACIÓN HITO 10.- Solicitud de conformación de la Comisión Estadística para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir.	B6.pdf	28/04/2015
9	ASOCIACIÓN HITO 11.- Acta de reunión de la videoconferencia realizada con expertos.	B7.pdf	28/04/2015
10	ASOCIACIÓN HITO 12.- Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir elaborado_final.	C1.pdf	04/06/2015
11	ASOCIACIÓN HITO 12.- Documento del Diseño metodológico de técnicas cualitativas para la construcción de nuevas métricas del Buen Vivir_Preliminar.	B9.pdf	08/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	ASOCIACIÓN HITO 13.- Documento de la Propuesta de Indicadores del Buen Vivir.	C2.pdf	04/06/2015
13	ASOCIACIÓN HITO 14.- Agenda del Evento Internacional de Nuevas Métricas _versiónfinal	C3.pdf	10/12/2015
14	ASOCIACIÓN HITO 15.- Taller Internacional de Nuevas Métricas realizado	C4.pdf	10/12/2015
15	ASOCIACIÓN HITO 17.- Hoja de ruta del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares en el Ecuador elaborada.	C6.pdf	10/12/2015
16	ASOCIACIÓN HITO 18.- Informe de ejecución de la prueba piloto de grupo de discusión para estudio cualitativo elaborado.	C7.pdf	10/12/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 19.- Informe de la capacitación metodológica en grupos de discusión elaborado.	D1.pdf	06/10/2015
18	ASOCIACIÓN HITO 2.- Conformación del Equipo técnico. Contratación experto en nuevas métricas.	A2.pdf	28/04/2015
19	ASOCIACIÓN HITO 20.- Documento con contenidos para la página web de la red académica elaborados _versión final.	D2.pdf	10/12/2015
20	ASOCIACIÓN HITO 21.- Acta de reunión de las subcomisiones sobre avances en la definición de indicadores del buen vivir elaborada.	D3.pdf	19/10/2015
21	ASOCIACIÓN HITO 22.- Informe de prueba piloto; e informe del operativo de levantamiento en campo de los estudios cualitativos a la fecha entregado _Versión Final	D4.pdf	10/12/2015
22	ASOCIACIÓN HITO 23.-Informe del acompañamiento y supervisión técnica a los levantamientos en campo del estudio cualitativo elaborado.	D5.pdf	10/12/2015
23	ASOCIACIÓN HITO 24.- Informes Analíticos por grupo de discusión entregados.	D6.pdf	31/12/2015
24	ASOCIACIÓN HITO 25.- Alianzas para el desarrollo del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizadas.	D7.pdf	19/02/2016
25	ASOCIACIÓN HITO 26.- Informe previo de resultados del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado.	D9.pdf	04/03/2016
26	ASOCIACIÓN HITO 28.- Presentación de recomendaciones para mejorar la recolección de datos en el futuro para monitorear los ODS - Agua y Saneamiento elaborada	E4.pdf	20/07/2016
27	ASOCIACIÓN HITO 29.- Informe del estado de contrataciones para el proyecto. Causas identificadas para su retraso, elaborado.	E5.pdf	27/07/2016
28	ASOCIACIÓN HITO 3.- Consolidación del Equipo Técnico. Contrataciones.	A3.rar	28/04/2015
29	ASOCIACIÓN HITO 30.- Informe del estado de contrataciones para el proyecto. Gestiones internas realizadas para dar continuidad a los procesos, elaborado	E6.pdf	27/07/2016
30	ASOCIACIÓN HITO 32.- Contrato de consultoría "Gestión de estudios científicos externos al INEC" suscrito.	E8.pdf	20/07/2016
31	ASOCIACIÓN HITO 33.- Plan de Proyecto de Investigación y Análisis del Buen Vivir elaborado.	E9.pdf	20/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
32	ASOCIACIÓN HITO 34.- Al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/o metodologías alternativas para medición del Bienestar.	F1.pdf	20/07/2016
33	ASOCIACIÓN HITO 35.- Informe que contenga la definición teórica y operativa de los indicadores para el subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del SEN y los estudios cualitativos sobre BV del INEC elaborado.	F2.pdf	23/08/2016
34	ASOCIACIÓN HITO 36.- Taller de discusión sobre Buen Vivir #1 realizado.	F3.pdf	20/10/2016
35	ASOCIACIÓN HITO 37.- Informe que contenga para cada indicador. la justificación de la fijación de las líneas de pobreza, de suficiencia y de riqueza del subsistema de armonía interna de las personas, acorde a la información disponible del SEN	F4.pdf	20/10/2016
36	ASOCIACIÓN HITO 38.- Al menos 4 estudios científicos relacionados con análisis y/o metodologías alternativas para medición del Bienestar que hayan aprobado las distintas fases del proceso para la revisión y aceptación de postulaciones.	F5.pdf	20/10/2016
37	ASOCIACIÓN HITO 39.- Informe que contenga el marco conceptual para la definición de las unidades de análisis: pueblos, comunidades y nacionalidades, así como la caracterización de estas unidades acorde a la información estadística disponible.	F6.pdf	21/11/2016
38	ASOCIACIÓN HITO 4.- Contrato para la Coordinación Logística del Taller Nacional de Nuevas Métricas.	A4.pdf	28/04/2015
39	ASOCIACIÓN HITO 40.- Informe de resultados del mapeo de pueblos, comunidades y nacionalidades del y propuesta de indicadores para los mismos realizado	F7.pdf	08/12/2016
40	ASOCIACIÓN HITO 41.- Taller de discusión sobre Buen Vivir #2 realizado.	F8.pdf	08/12/2016
41	ASOCIACIÓN HITO 42.- Acta de la reunión para la presentación de la propuesta de indicadores del BV por parte de la Comisión Estadística para personas, comunidades y ambiente realizada.	F9.pdf	08/12/2016
42	ASOCIACIÓN HITO 43.- Informe del Cálculo de indicadores del subsistema de armonía interna de las personas elaborado.	G1.pdf	29/12/2016
43	ASOCIACIÓN HITO 44.- Informe final del estudio cualitativo hacia la construcción de nuevas métricas del buen vivir basadas en el discurso social de la población ecuatoriana - sectores populares de Ecuador realizado.	G2.pdf	29/12/2016
44	ASOCIACIÓN HITO 45.- Informe de actividades ejecutadas en el proyecto elaborado.	G3.pdf	29/12/2016
45	ASOCIACIÓN HITO 46.- Informe de publicaciones impresas y su difusión realizada.	G4.pdf	29/12/2016
46	ASOCIACIÓN HITO 47.- Contratos de personal firmados.	G5.pdf	24/02/2017
47	ASOCIACIÓN HITO 48.- Informe de la primera difusión de documentos de estudios científicos publicados en el 2016.	G6.pdf	01/03/2017
48	ASOCIACIÓN HITO 49.- Matriz de Reporte para seguimiento y control mensual de actividades elaborado.	G7.pdf	01/03/2017
49	ASOCIACIÓN HITO 5.- Registro de asistencia al Taller Nacional de Nuevas Métricas realizado.	A5.rar	28/04/2015
50	ASOCIACIÓN HITO 50.- Plantilla Project Charter 2017 elaborada.	G8.pdf	01/03/2017
51	ASOCIACIÓN HITO 51.- Agenda de investigación elaborada.	G9.pdf	04/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	ASOCIACIÓN HITO 52.- Avance de la Sistematización del estudio cualitativo realizada.	H1.pdf	04/04/2017
53	ASOCIACIÓN HITO 53.- Documento Final de la Sistematización del estudio cualitativo realizada.	H2.pdf	04/05/2017
54	ASOCIACIÓN HITO 54.- Indicadores en todas las dimensiones del Buen Vivir calculados	H3.pdf	04/05/2017
55	ASOCIACIÓN HITO 55.- Informe de la segunda difusión de documentos de estudios científicos publicados en el 2016.	H4.pdf	04/05/2017
56	ASOCIACIÓN HITO 56.- Marco conceptual para la definición de las dimensiones e indicadores del índice del Buen Vivir realizado	H5.pdf	04/05/2017
57	ASOCIACIÓN HITO 58. Documentos metodológicos de innovación en métricas para el bienestar en agua, saneamiento e higiene elaborados.	H6.pdf	03/07/2017
58	ASOCIACIÓN HITO 6.- Sistematización Evento Nuevas Métricas, Experiencias Nacionales.	A6.pdf	28/04/2015
59	ASOCIACIÓN HITO 7.- Listado de expertos y referentes internacionales de métricas alternativas de Bienestar.	A7.pdf	28/04/2015
60	ASOCIACIÓN HITO 8.- Informe de gestión TDR's profesional especializado en metodología cualitativa.	A8.pdf	28/04/2015
61	ASOCIACIÓN HITO 9.- Fortalecimiento Red Académica del Buen Vivir. Convenio con Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí.	B5.pdf	28/04/2015
62	Documento de priorización del Proyecto de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas	B2.pdf	28/04/2015
63	Expediente Reestructuración de Hitos 2- Septiembre 2015	C9.rar	05/10/2015
64	Expediente Reestructuración de hitos 3	E2.pdf	20/07/2016
65	Project Charter 2016	E1.pdf	04/04/2016
66	Project Charter 2017	G9.pdf	28/03/2017
67	Proyecto aprobado por SENPLADES	B3.pdf	28/04/2015
68	Reestructuración de Hitos 1	C8.pdf	10/12/2015
69	Riesgo 2, acción 1. Contratación.	B4.pdf	28/04/2015
70	Riesgo 5. Acción 1. Reuniones de trabajo	Riesgo_5._Acción_1.pdf	27/06/2017
71	Riesgo 7. Acción 1. Contratación	Reisgo_7._Acción_1.pdf	28/06/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
García Gamboa, Nataly Raquel	Líder de Proyecto	Miembro de Equipo	nataly_garcia@inec.gob.ec	
Serrano Mera, Juan Carlos	Miembro de equipo	Analista	juan_serrano@inec.gob.ec	2448871
