

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K004 INEC - Encuesta de Infocentros y Televisión Digital Terrestre - ENINFOTDT

Líder del Proyecto:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline (estefania_encalada@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175400000.0000.374464	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	100,304.21
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2017 - 15/12/2017
Fecha de última actualización:	04/10/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Chiriboga Aguirre, Leonardo Gabriel	Fecha del siguiente Hito:	10/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

Se tiene previsto realizar un estudio a nivel de la población sobre su conocimiento del proceso de migración de la televisión análoga hacia la digital terrestre, así como evaluar su preparación para el cambio en función del equipamiento que dispongan en sus hogares. Se tiene previsto realizar el estudio en cinco cantones de la Provincia de Pichincha como son: Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo, con el fin de preparar adecuadamente a la ciudadanía para este cambio tecnológico, con el cual se podrá realizar el apagón analógico.

Objetivo General: Medir el nivel de conocimiento y el grado de preparación por parte de la población de la provincia de Pichincha (Cantones: Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo), en temas de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Objetivos Específicos

- 1) Determinar el conocimiento de la población de la provincia de Pichincha (Cantones: Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo), sobre el nivel de uso y acceso a internet, así como de herramientas ofimáticas.
- 2) Establecer el grado de conocimiento que tiene la población de la provincia de Pichincha (Cantones: Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo), sobre los servicios que brindan los Infocentros.
- 3) Identificar el nivel de preparación de la población de la provincia de Pichincha (Cantones: Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo), para el proceso de migración a la televisión digital terrestre TDT (abierto/gratuito) y conocer si está lista para el apagón analógico.
- 4) Generar indicadores necesarios para la formulación, evaluación y seguimiento de políticas en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC).

Descripción del Producto Final

De acuerdo al Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre INEC y MINTEL en la sección obligaciones del INEC se detalla las siguientes:

- Diseñar y delinear el formulario a ser aplicado, en coordinación con el MINTEL de acuerdo a sus necesidades.
- Documentar los procedimientos y manuales a aplicarse en el levantamiento de la información.
- Facilitar al MINTEL el acceso a la información proveniente del levantamiento de información.
- Entregar bases de datos expandidas y metodologías aplicadas.

Beneficios Cualitativos

La ejecución de la encuesta ENINFOTDT, permitirá incrementar el número de visitas a los Infocentros, la realización de capacitaciones, la planificación de futuras capacitaciones, dar a conocer la posibilidad de que se realicen nuevos emprendimientos, analizar requerimientos de la población respecto a nuevos cursos que podrían dictarse, llegar a ciudadanos que ya tienen algún conocimiento previo respecto a TIC, entre otros.

Tipo de Beneficiario

- Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC

Tipo de Beneficiario

-Dirección de Estadísticas Sociodemográficas
 -Gestión Estadística Permanente de Hogares
 -Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
 -Investigadores y público en general

Restricciones

Tiempo: El tiempo para el levantamiento del operativo de campo y entrega de productos es bastante corto.
 Costo: El financiamiento del operativo depende de la transferencia de recursos por parte del MINTEL
 Alcance: El operativo está sujeto a la firma del convenio interinstitucional entre INEC y MINTEL

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación


Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO


Transcurrido: 75.17 %

Fecha de Inicio: 01/03/2017

Fecha de Fin: 15/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL


Meta

Resultado

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
			0 %	0 %	10 %	40 %	40 %	50 %	50 %	80 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
			0 %	0 %	10 %	40 %	40 %	45 %	50 %			
2017	Estado											
			●	●	●	●	●	▼	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2017 Hito Nro. 8: PLANIFICACIÓN: Adendum al Plan de Dirección de Proyecto ENINFOTDT firmado En virtud del Adendum Modificadorio al Convenio de Cooperación Interinstitucional, DIES elaboró el Plan de Dirección del Proyecto ENINFOTDT en el cual se modifica el plazo de levantamiento de la información en campo, así como la contratación de vehículos y personal civil.	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 04:11 PM
AGOSTO 2017 Hito Nro. 7: PLANIFICACIÓN: Adendum al Convenio específico Interinstitucional firmado Las máximas autoridades de MINTEL e INEC realizaron el Adendum modificadorio al Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el cual se modifica el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de diciembre.	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 04:10 PM
JUNIO 2017 Hito Nro. 6: EJECUCIÓN: Malla de validación elaborada La Dirección de Estadísticas Sociodemográficas realizó la malla de validación que sirve de base para la elaboración del sistema de ingresos que permitirá el ingreso de la información diligenciada en campo.	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 04:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2017 Hito Nro. 5 - EJECUCIÓN: Instrumentos de recolección diseñados: La Dirección de Estadísticas Sociodemográficas preparó los instrumentos de recolección como: formulario, manual de crítica-codificación, manual del encuestador y manual de supervisor necesarios para el levantamiento de la información en campo	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 04:08 PM
JUNIO 2017 Hito Nro. 4 - Ejecución: Diseño Muestral elaborado: La Dirección de Infraestructura y muestreo entregó a la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas el documento metodológico del diseño muestral que se utilizará para el levantamiento de la información en campo	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 04:06 PM
JUNIO 2017 Hito Nro. 3 - Planificación: Plan de Dirección de Proyecto ENINFOTDT firmado En referencia a la firma del Convenio de Cooperación Técnica interinstitucional entre MINTEL e INEC, las autoridades del INEC firmaron el Plan de Dirección del Proyecto ENINFOTDT.	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 03:57 PM
JUNIO 2017 Hito Nro. 2 - Hoja de ruta del Proyecto ENINFOTDT elaborada: Se acordó y firmó la hoja de ruta de las actividades a ejecutar en la encuesta ENINFOTDT entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 01:16 PM
MAYO 2017 Hito Nro. 1 - Convenio específico Interinstitucional firmado: Se firmó del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	06/09/2017 - 01:13 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Costo. La no aprobación de los avales para certificación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, CAUSARÍA un ajuste a la hoja de ruta del operativo y con ello el retraso en el inicio del levantamiento.	07/09/2017	Estefania Jacqueline Encalada Sandoval	30 %	100	30	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio específico Interinstitucional firmado	4-Inicio de Trabajo	08/05/2017		08/05/2017		Sí	5.0
2	PLANIFICACIÓN: Hoja de ruta del Proyecto ENINFOTDT elaborada	4-Inicio de Trabajo	17/05/2017		17/05/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANIFICACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto ENINFOTDT firmado	4-Inicio de Trabajo	15/06/2017		15/06/2017		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Diseño Muestral elaborado	5-Entregables Intermedios	16/06/2017		16/06/2017		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Instrumentos de recolección diseñados	5-Entregables Intermedios	21/06/2017		21/06/2017		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Malla de validación elaborada	5-Entregables Intermedios	21/06/2017		21/06/2017		Sí	5.0
7	PLANIFICACIÓN: Adendum al Convenio específico Interinstitucional firmado	4-Inicio de Trabajo	23/08/2017		29/08/2017		Sí	5.0
8	PLANIFICACIÓN: Adendum al Plan de Dirección de Proyecto ENINFOTDT firmado	4-Inicio de Trabajo	25/08/2017		05/09/2017		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Recolección de Información ejecutada	5-Entregables Intermedios	10/10/2017	10/10/2017			No	30.0
10	SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Informe de cobertura ejecutada	9-Entregables Formales	25/11/2017	25/11/2017			No	10.0
11	CIERRE: Base de datos final entregada	9-Entregables Formales	15/12/2017	15/12/2017			No	10.0


INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de la ENINFOTDT	—	-	-	-	10/10/2017	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	100,304.21 **
Costo Total:	100,304.21
Total Devengado:	3,329.47
% Costo Total Devengado:	3.32 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

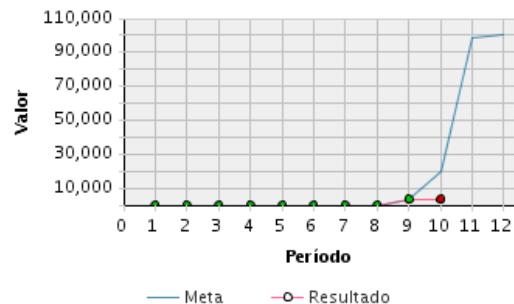
% COSTO TOTAL DEVENGADO


% Costo Total Devengado: 3.32 %










Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	100,304.21	0.00	100,304.21
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	100,304.21	0.00	100,304.21
Ppto. Comprometido	0.00	3,329.47	0.00	3,329.47
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	100,304.21	0.00	100,304.21
Ppto. Devengado	0.00	3,329.47	0.00	3,329.47
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	100,304.21	0.00	100,304.21
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	3.32 %	0.00 %	3.32 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	3,329.48	3,329.47	3,329.48	3,329.47	100.00 %		3.32 %
Oct	16,416.66	0.00	19,746.14	3,329.47	16.86 %		3.32 %
Nov	78,899.23		98,645.37				
Dic	1,658.84		100,304.21				
Total	100,304.21	3,329.47					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE elaboración de metodologías, la automatización de los procesos, diseño e implementación de proyectos de investigación sociodemográficos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de constitución	A9.pdf	29/09/2017
2	Asociación Hito 1.- Convenio específico Interinstitucional firmado	A1.pdf	13/09/2017
3	Asociación Hito 2.-Hoja de ruta del Proyecto ENINFOTDT elaborada	A2.pdf	13/09/2017
4	Asociación Hito 3.- Plan de Dirección de Proyecto ENINFOTDT firmado	A3.pdf	13/09/2017
5	Asociación Hito 4.- Metodología del Diseño Muestral	A4.pdf	14/09/2017
6	Asociación Hito 5.- Formulario diseñado	A5.pdf	14/09/2017
7	Asociación Hito 6: Malla de validación elaborada	A6.pdf	14/09/2017
8	Asociación Hito 7.-Adendum al Convenio específico Interinstitucional firmado	A7.pdf	14/09/2017
9	Asociación Hito 8.- Adendum al Plan de Dirección del Proyecto	A8.pdf	14/09/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Abril, Martha	Miembro de Equipo	Miembro de equipo	marha_abril@inec.gob.ec	
Artieda Espinoza, Carmita Elizabeth	Miembro de Equipo	Miembro de equipo	carmita_artieda@inec.gob.ec	
Haro Ibarra, Marlene Azucena	Miembro de Equipo	Miembro de equipo	marlene_haro@inec.gob.ec	
Hidalgo, Norma	Miembro de Equipo	Miembro de equipo	norma_hidalgo@inec.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Miembro de Equipo	Miembro de Equipo	patricio_rivas@inec.gov.ec	
