

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K006 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Castillo Añazco, Oscar Roberto | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Albán Fernández, Andrés Gregorio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 31210000.0000.382709 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 0 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,094,542.03 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/05/2018 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 07/01/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2018 |
| Modificado por: | Mendoza Moreira, Virginia Natali | Fecha del siguiente Hito: | 24/12/2018 |

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto:

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una operación estadística que pretende obtener información que identifique la situación de salud reproductiva, materna e infantil, estado nutricional acceso a programas de complementación alimentaria y suplementación profiláctica, entre otros temas de salud de la población. Además esta información permitirá evaluar y dar seguimiento al Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, el cual establece: "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas".

Producto:

Información de alrededor de 46392 viviendas contenida en bases de datos.

Línea de base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde el 16 de julio al 15 de diciembre del 2012, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Objetivo general:

Generar indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana con el fin de evaluar y generar las políticas públicas para la erradicación de la desnutrición crónica en menores de 2 años.

Objetivos específicos:

- .Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENSANUT 2018-2019.
- .Levantar la información de campo.
- .Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información.
- .Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta.

Beneficios Cualitativos

Levantar información de campo permitirá obtener indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana, indicadores que dan cuenta del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen el fin de evaluar y generar políticas públicas que sirvan para disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años.

Tipo de Beneficiario

- Población de referencia:

Considerando que el área de influencia del presente proyecto es nacional, la población de referencia es equivalente al total de habitantes de la República que según el censo nacional de población y vivienda 2010, elaborado por el INEC es de 14'483.499 personas, con una tasa de crecimiento anual estimada de 1,48%, la proyección estimada para el año 2018 es de 17'023.408 habitantes.

- Población demandante potencial:

Tipo de Beneficiario

Serán el Gobierno Nacional, 23 Gobiernos Provinciales, 27 Ministerios que forman parte del Gobierno Nacional; catedráticos, estudiantes, periodistas, científicos e investigadores sociales, y usuarios en general.

- Población demandante efectiva:


Serán Instituciones del Sector público: Ministerio de Salud Pública e Instituciones involucradas en el seguimiento del Plan de Nutrición (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Planificación).

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 15/05/2018 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

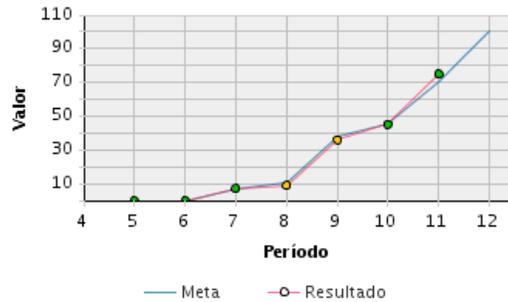

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 % | 0 % | 7 % | 11 % | 38 % | 45 % | 70 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 % | 0 % | 7 % | 9 % | 36 % | 45 % | 75 % | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ● | ● | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 07/01/2019 - 09:27 AM |
| PERIODO: OCTUBRE 2018 Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido)</p> <p>6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 en proceso)</p> <p>7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)</p> <p>PERIODO: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Descripción:</p> <p>1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido)</p> <p>2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido)</p> <p>3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido)</p> <p>4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido)</p> <p>5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido)</p> <p>6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido)</p> <p>7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)</p> <p>8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido)</p> <p>9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviembre (HITO 9 en proceso)</p> <p>10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso)</p> <p>11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso)</p> <p>12. Crítica, codificación y digitación (HITO 12 en proceso)</p> <p>13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p> <p>PERIODO: DICIEMBRE 2018</p> <p>Descripción:</p> <p>1.- Procesos administrativos finalizados (HITO 2 cumplido)</p> <p>2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido)</p> <p>3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido)</p> <p>4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido)</p> <p>5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido)</p> <p>6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido)</p> <p>7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)</p> <p>8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido)</p> <p>9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviembre (HITO 9 en proceso)</p> <p>10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso)</p> <p>11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso)</p> <p>12. Crítica, codificación y digitación en proceso (HITO 12 en proceso)</p> <p>13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p> | | |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | HITO 1:CONSTRUCCION-Formularios aprobados | 4-Inicio de Trabajo | 04/07/2018 | | 04/07/2018 |  | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2 | HITO 2: PLANIFICACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado | 4-Inicio de Trabajo | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 5.0 |
| 3 | HITO 3: CONSTRUCCIÓN- Manuales aprobados | 4-Inicio de Trabajo | 31/08/2018 | | 28/09/2018 | | Sí | 2.0 |
| 4 | HITO 4: CONSTRUCCIÓN- Mallas de validación aprobadas | 4-Inicio de Trabajo | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 2.0 |
| 5 | HITO 5: Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados | 4-Inicio de Trabajo | 01/09/2018 | | 03/09/2018 | | Sí | 25.0 |
| 6 | HITO 6: CONSTRUCCIÓN- Sistema de producción probado | 4-Inicio de Trabajo | 30/09/2018 | | 29/10/2018 | | Sí | 2.0 |
| 7 | HITO 7: RECOLECCIÓN- Capacitación del personal seleccionado | 4-Inicio de Trabajo | 27/10/2018 | | 27/10/2018 | | Sí | 5.0 |
| 8 | HITO 8: CONSTRUCCIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales | 4-Inicio de Trabajo | 30/10/2018 | | 30/10/2018 | | Sí | 2.0 |
| 9 | HITO 9: RECOLECCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta | 4-Inicio de Trabajo | 01/11/2018 | | 05/11/2018 | | Sí | 10.0 |
| 10 | HITO 10: RECOLECCIÓN - Reporte de cobertura elaborado | 4-Inicio de Trabajo | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 15.0 |
| 11 | HITO 11: RECOLECCION - Muestra seleccionada | 4-Inicio de Trabajo | 28/12/2018 | | 28/11/2018 | | Sí | 5.0 |
| 12 | HITO 12: PROCESAMIENTO - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada | 4-Inicio de Trabajo | 31/12/2018 | 24/12/2018 | | | No | 15.0 |
| 13 | HITO 13: PROCESAMIENTO - Validación y consistencia de la información | 4-Inicio de Trabajo | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 10.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 4 formularios, 4 manuales del encuestador, 1 manual del supervisor y 1 manual de crítica y codificación elaborados desde enero hasta agosto de 2018. | | 100.00 % | 11 | 11 | 15/05/2018 | Ene - Dic |
| 2 | 3.866 sectores actualizados a octubre de 2018 y 46.392 viviendas investigadas a noviembre de 2018. | | 100.00 % | 23,196 | 23,196 | 01/11/2018 | Diciembre |
| 3 | Base de datos de indicadores antropométricos validada a enero de 2019. | | - | - | - | 04/12/2018 | - |
| 4 | Presentación de principales resultados antropométricos y tabulados de principales resultados antropométricos a marzo de 2019. | | - | - | - | 15/05/2018 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,094,542.03 ** |
| Costo Total: | 6,118,016.39 |
| Total Devengado: | 4,459,888.17 |
| % Costo Total Devengado: | 72.90 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 72.90 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 628,237.27 | 0.00 | 628,237.27 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 5,466,304.76 | 0.00 | 5,466,304.76 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 6,118,016.39 | 0.00 | 6,118,016.39 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 5,976,549.84 | 0.00 | 5,976,549.84 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 4,634,892.23 | 0.00 | 4,634,892.23 |
| Planeado - Codificado (2018) | | -5,348,312.57 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 6,094,542.03 | 0.00 | 6,094,542.03 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 4,459,888.17 | 0.00 | 4,459,888.17 |
| Pagado Real | 0.00 | 3,530,799.38 | 0.00 | 3,530,799.38 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 6,094,542.03 | 0.00 | 6,094,542.03 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 73.18 % | 0.00 % | 73.18 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

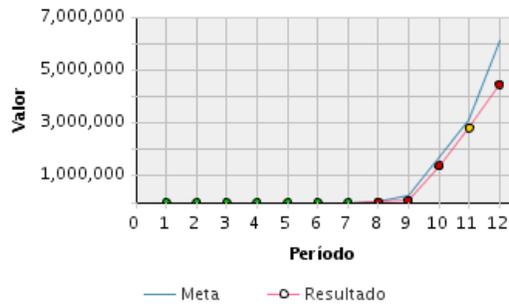

Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | | | | | | | |

| Presupuesto Mensual 2018 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | | | | | | | |
| Mar | | | | | | | |
| Abr | | | | | | | |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Ago | 25,426.97 | 16,512.77 | 25,426.97 | 16,512.77 | 64.94 % | | 0.27 % |
| Sep | 262,078.18 | 53,719.80 | 287,505.15 | 70,232.57 | 24.43 % | | 1.15 % |
| Oct | 1,417,008.58 | 1,305,053.78 | 1,704,513.73 | 1,375,286.35 | 80.68 % | | 22.57 % |
| Nov | 1,442,013.37 | 1,441,446.98 | 3,146,527.10 | 2,816,733.33 | 89.52 % | | 46.22 % |
| Dic | 2,948,014.93 | 1,643,154.84 | 6,094,542.03 | 4,459,888.17 | 73.18 % | | 73.18 % |
| Total | 6,094,542.03 | 4,459,888.17 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1 | HITO 6. CONSTRUCCIÓN: Sistema de producción probado - Formulario de pruebas | Formulario_de_pruebas_ENSANUT.pdf | 21/12/2018 |
| 2 | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ENSANUT 2018 | Acta_de_constitución_ENSANUT_2018.pdf | 21/12/2018 |
| 3 | HITO 1. CONSTRUCCIÓN: Formularios aprobados (F1) | 1._FORMULARIO_HOGAR_DEFINITIVO_26102018.pdf | 21/12/2018 |
| 4 | HITO 1. CONSTRUCCIÓN: Formularios aprobados (F2) | 2._FORMULARIO_MEF_DEFINITIVO_26102018_f.pdf | 21/12/2018 |
| 5 | HITO 1. CONSTRUCCIÓN: Formularios aprobados (F3) | 3._FORMULARIO_HOMBRES_DEFINITIVO_25102018.pdf | 21/12/2018 |
| 6 | HITO 1. CONSTRUCCIÓN: Formularios aprobados (F4) | 4._FORMULARIO_FACTORES_DE_RIESGO_DEFINITIVO_25102018.pdf | 21/12/2018 |
| 7 | HITO 10. RECOLECCIÓN: Reporte de cobertura elaborado | Resumen_de_cobertura.xlsx | 21/12/2018 |
| 8 | HITO 11. RECOLECCION: Muestra seleccionada - Formularios de muestra y cobertura MyC | MyC_17_Pichincha.pdf | 21/12/2018 |
| 9 | HITO 2. PLANIFICACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado | Plan_de_Proyecto_ENSANUT_2018_27072018.docm | 21/12/2018 |
| 10 | HITO 3. CONSTRUCCIÓN: Manuales aprobados (M1) | 1._MANUAL_HOGAR_DEFINITIVO_25102018.pdf | 21/12/2018 |
| 11 | HITO 3. CONSTRUCCIÓN: Manuales aprobados (M2) | 2._MANUAL_MEF_DEFINITIVO_2502018.pdf | 21/12/2018 |
| 12 | HITO 3. CONSTRUCCIÓN: Manuales aprobados (M3) | 3._MANUAL_SALUD_SEXUAL_Y_REPRODUCTIVA_DEFINITIVO_25102018.pdf | 21/12/2018 |
| 13 | HITO 3. CONSTRUCCIÓN: Manuales aprobados (M4) | 4._MANUAL_FACTORES_DE_RIESGO_DEFINITIVO_25102018.pdf | 21/12/2018 |
| 14 | HITO 4. CONSTRUCCIÓN: Mallas de validación aprobadas (F1) | Malla_de_validación_ENSANUT_2018_HOGAR_21082018_DEFINITIVO.xlsx | 21/12/2018 |
| 15 | HITO 4. CONSTRUCCIÓN: Mallas de validación aprobadas (F2) | PLAN_DE_INCONSISTENCIAS_MEF_19_11_2018.xlsx | 21/12/2018 |
| 16 | HITO 4. CONSTRUCCIÓN: Mallas de validación aprobadas (F3) | Malla_de_validación_ENSANUT_2018_Hombres_24082018.xlsx | 21/12/2018 |
| 17 | HITO 4. CONSTRUCCIÓN: Mallas de validación aprobadas (F4) | Malla_de_validación_ENSANUT_2018_FACTORES_DE_RIESGO_24082018.xlsx | 21/12/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 18 | HITO 5. Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados - Cronograma de recolección | Jornadas_y_cronograma_mod.xlsx | 21/12/2018 |
| 19 | HITO 7. RECOLECCIÓN: Capacitación del personal seleccionado - Pruebas realizadas (1) | EVALUACIÓN_TEORICA_ENSANUT_-_ENDEIN_2018_P1_sin.doc | 21/12/2018 |
| 20 | HITO 7. RECOLECCIÓN: Capacitación del personal seleccionado - Pruebas realizadas (2) | EVALUACIÓN_TEORICA_ENSANUT_-_ENDEIN_2018_P2_sin.doc | 21/12/2018 |
| 21 | HITO 9. RECOLECCIÓN: Inicio de operativo de levantamiento de encuesta - Programación de trabajo | programación_ENSANUT_jornada_1_(primera_parte).rar | 21/12/2018 |
| 22 | HITO 9. RECOLECCIÓN: Inicio de operativo de levantamiento de encuesta- Memorando de aprobación de inicio de operativo el 15 de noviembre | INEC-INEC-2018-0936-M.pdf | 21/12/2018 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Artieda Espinoza, Carmita Elizabeth | Técnica | Miembro de equipo | carmita_artieda@inec.gob.ec | |
| Herrera Jacome, Margoth Rocio | Técnica | Miembro de equipo | margoth_herrera@inec.gob.ec | |
| Hidalgo, Norma | Técnica | Miembro de equipo | norma_hidalgo@ine.gob.ec | |
| Marín Luna, Irina Elizabeth | Técnica | Miembro de Equipo | irina_marin@inec.gob.ec | |
| Mendoza Moreira, Virginia Natali | Líder de proyecto | Analista de Estadísticas Sociodemográficas | natali_mendoza@inec.gob.ec | |
