

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)

PROYECTO: K003 INEC - Censo de Población y Vivienda basado en registros administrativos

Líder del Proyecto:	Tirira Quiroz, Willam Roberth (willam_tirira@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACION Y ANALISIS)
Titular:	Vicuña Mendez, Cesar Rodolfo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380377	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,666,151.11
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	07/03/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Tirira Quiroz, Willam Roberth	Fecha del siguiente Hito:	30/03/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

2016.-Realizar en el año 2016 un análisis de la situación actual de las instituciones fuentes, relacionada con Población y Vivienda. Una vez definida esta cobertura deberá realizar una investigación en cada institución, en relacionado a Marco Legal, Metodologías, Procesos, Aplicaciones. El componente principal de este proyecto se basa en el desarrollo de modelos de gestión para la ejecución del proyecto Censos 2020 basados en Registros Administrativos. Es decir, la consultoría deberá, en base a los insumos que entrega el INEC como: metodologías ya utilizadas, pruebas pilotos ya realizadas; y en base al análisis de situación actual que haya realizado en las instituciones fuentes, realizar un estudio en el que se determine cuál o cuáles son los mejores caminos a seguir para llegar a ejecutar el Censo 2020 basado en registros administrativos. Cabe destacar que en el año 2015 se realizó un plan piloto en Galápagos sobre Censo basado en registros administrativos, en el que se aplicó la metodología y procesos creados en el INEC. En el año 2016 se pretende realizar una actualización de los registros administrativos en Galápagos, con la ayuda de planes de incentivos, utilizando los recursos disponibles al momento. El INEC continuará trabajando en procesamientos de información, que involucran fases como la captación, transformación, integración, interpretación, publicación de registros administrativos, fomentando cada día con más experiencias, procesos que se transferirán a la consultoría para su enriquecimiento y buenos resultados. Estos procesamientos se lograrán en base a la implementación de una arquitectura básica dentro del Cloud Computing.

2017.-La arquitectura de registros administrativos radica en cuatro aspectos, importantes: Datos, Procesos, Aplicaciones, Infraestructura tecnológica: describe el software y/o el hardware utilizados para soportar las aplicaciones, los procesos y los datos a utilizar. El proyecto Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos-2017 consiste en evaluar y mejorar esta arquitectura en cada una las temáticas de registros administrativos que se utilizarán en el proyecto Censo de Población y Vivienda basado en registros Administrativos 2020: nacimientos, defunciones, migración, vivienda y residencia. Partiendo de las metodologías desarrolladas en los pilotos efectuados en Galápagos durante el año 2015 y 2016; a fin de contar con el aprovechamiento de registros de diversas entidades fuentes, y del desarrollo de diversas herramientas generadas por el INEC para la captación, estandarización, integración, procesamiento, análisis de calidad y aprovechamiento en general de los registros administrativos. Todo esto con el fin de potencializarlos para su aprovechamiento con fines estadísticos, y contar con metodologías claras y precisas que robustezcan su validez, siendo necesaria la participación activa de las fuentes primarias de información estadística basada en registros, y de los demás actores involucrados. Adicional a esto se trabajará también con términos de referencia realizados en el año 2016 por temática de (nacimientos, defunciones, migración, vivienda y residencia) con los que se marcarán actividades y productos como: .Coordinar el registro oportuno de nacimientos, defunciones, de los movimientos migratorios internacionales, la actualización de la residencia en el ámbito de Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos. .Coordinar la construcción del registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica en el ámbito de Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos. Adicional se realizarán actividades a nivel nacional y para lo cual se llevarán a cabo salidas de campo como la realización de un piloto continental, evaluación Galápagos, en la que se efectuarán evaluaciones y diagnósticos a partir de la información y los procesos utilizados en los censos basados en registros administrativos.

Beneficios Cualitativos

2016

Beneficios Cualitativos

.Incrementar la efectividad de las operaciones estadísticas del INEC que cumplen con el Modelo de Producción en función de los requerimientos de la planificación nacional.
 .Los usuarios internos contarán con bases y directorios Galápagos con una amplia cobertura de los fenómenos socio-demográficos y económicos, para realizar estudios y análisis más específicos.
 .Los usuarios internos podrán actualizar las muestras utilizadas para realizar encuestas por muestreo con mejores índices de cobertura y confiabilidad.
 .Obtener la mejor alternativa en cuanto a metodologías para ejecutar el gran proyecto CPV 2020 basados en registros administrativos.

2017

Incrementar la oferta de registros estadísticos basados en registros administrativos MEDIANTE aplicación de procesos innovadores de calidad de datos e integración de información con el uso de infraestructura tecnológica.
 Contar con un análisis sobre la situación actual de la infraestructura tecnológica y su información, con la ayuda de una arquitectura empresarial, para entender las necesidades y cubrirlas, con el objetivo de lograr a futuro el Censo de Población y Vivienda Basado en Registros Administrativos 2020.

Tipo de Beneficiario

2016

Al ser un desarrollo de modelos de gestión para ejecutar un censo a nivel nacional para la ronda 2020, su impacto territorial sería para todo el Ecuador, generando también metodología para su consulta y potencial réplica a nivel regional y continental. No obstante, para la etapa correspondiente al año 2016 se tiene contemplado ejercer acciones a partir de las actividades enmarcadas en la constitución del Comité para Censos basados en Registros Administrativos, con la participación de todas las entidades fuente contempladas en el respectivo Decreto Ejecutivo de creación.
 Por otro lado, una vez obtenida la información estadística proveniente de la realización del censo basado en registros administrativos en Galápagos, se ofrecerá la facilidad de encontrarla en un mismo lugar. Estos registros podrán dar cuenta de diferentes características de la población, actividad económica, inmuebles y del mercado laboral, una vez que se puedan consolidar y articular en un sistema de información como parte de la generación de información estadística del INEC.

2017

En el proyecto 2017 se coordinará con Instituciones fuentes de registros administrativos para lograr automatizar la captación de información y aumentar la cobertura de registros oportunos de la ciudadanía, así mismo se trabajará en proponer mejoras en los componentes de la arquitectura de la información mencionada tales como: datos, procesos, aplicaciones e infraestructura tecnológica, por lo que su impacto territorial en el año 2017 será para todo el Ecuador.

Restricciones

2016

Tiempo:

Supuesto:

.Que la consultoría cumpla con los tiempos establecidos en los términos de referencia.

Restricción:

.Tiempo insuficiente para tener dictamen de prioridad del proyecto CPV 2020 en SENPLADES.

Alcance:

.Al ser un desarrollo de modelos de gestión para ejecutar un censo a nivel nacional para la ronda 2020, su impacto territorial sería para todo el Ecuador, generando también metodología para su consulta y potencial réplica a nivel regional y continental.

.Complementar los registros administrativos de Galápagos con los censos y encuestas por muestreo de tal forma que se obtenga información estadística de menor costo para el país.

.Contar con bases y directorios con una amplia cobertura de los fenómenos sociodemográficos y económicos, para realizar estudios y análisis más específicos.

.Obtener modelos de gestión de tal forma que sea la mejor alternativa para ejecutar el gran proyecto Censos 2020 basados en registros administrativos.

Recursos:

Supuestos:

.Contar con los recursos presupuestarios para cubrir las actividades del proyecto durante su periodo de ejecución.

.Contar con el recurso humano adecuado para realizar todas las actividades del proyecto durante su periodo de ejecución.

Restricción:

.No encontrar una empresa consultora capaz de concebir nuestros requerimientos de desarrollo de modelos de gestión para el censo 2020 basados en registros administrativos.

.Deserción de personal que va a ejecutar las actividades de coordinación en la consultoría de construcción de modelos de gestión, de análisis de situación actual, y de desarrollo de sistemas de interoperabilidad.

2017

Supuesto:

Que las aprobaciones externas solicitadas para el cumplimiento de procesos planificados se den en los tiempos establecidos.

Restricciones:

Obtener el dictamen de prioridad del proyecto a tiempo.

Supuesto:

Contar con los recursos presupuestarios, que permitan la ejecución de los procesos planificados para el buen desarrollo de las actividades del proyecto.

Restricciones

Contar con el recurso humano apto que apoye en la ejecución de las actividades planificadas.

Restricciones:

No contar con empresas que proveen los bienes o servicios (Servicio de actualización de licencias Oracle, Servicio de actualización y soporte de software Qlik View y Geo Clik) que se desea adquirir.

Renuncia del personal contratado para el desarrollo de actividades necesarias para el proyecto, por encontrar mejores ofertas laborales.

Supuesto:

Contar con el apoyo de las instituciones en las mesas técnicas para que en coordinación con el INEC se llegue a cumplir con el registro oportuno de información de población y vivienda.

Restricciones:

Cambiar el alcance del proyecto por temas políticos (año de elecciones)

Costos:

US\$1,539,382.73

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 72.63 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016

Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

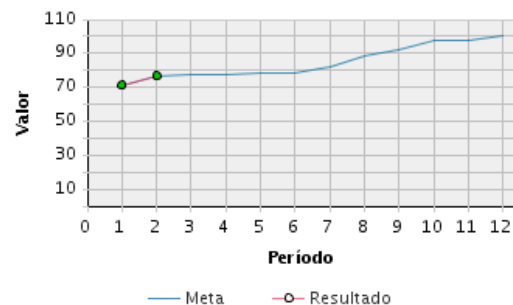

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	71 %	77 %	78 %	78 %	78 %	79 %	82 %	89 %	92 %	98 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	71 %	77 %										
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2018 1.- Con memorando INEC-CGTPE-DIRAD-2018-0029-M, de fecha 31 de enero de 2018, se remitió a la Coordinación General Técnica de la Producción Estadística el Cronograma de trabajo del proyecto "Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos" CPV-RA. En el mismo se incluye las actividades por componente (Hito cumplido 40). 2.- Se generó la siguiente documentación habilitante: (Documento de Postulación-proyecto-SENPLADES, Informe ejecutivo-SENPLADES, Marco lógico, Matriz de presupuesto, Matriz de flujo económico y financiero, Cronograma de contratación). Adicional se aprobó la siguiente documentación interna: (Plan de proyecto, Matriz de presupuesto). (Hito cumplido 41). FEBRERO 2018 1.- Se elaboró la hoja de ruta en la que se identificó los grupos de instituciones públicas y GADs a las cuales se les solicitará información. (Hito cumplido 42). 2.- Se realizó el mapeo de los registros administrativos de las instituciones públicas, para lo cual se elaboró una ficha o formulario que se utilizó para la ejecución de la actividad.(Hito cumplido 43).	Tirira Quiroz, Willam Roberth	07/03/2018 - 08:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2017 1.- Diagnóstico de la situación actual de los componentes de la arquitectura de los registros administrativos, se levantó información de RRAA en las temáticas de nacimientos, defunciones y residencia en las Instituciones Públicas fuente y se realizó un diagnóstico de los mismos. (Hito cumplido 28) 2.- En cuanto a coordinar el registro de los movimientos migratorios internacionales ocurridos a nivel nacional, a pesar de no reactivarse la mesa técnica de migración se realizó una reunión en la que se trató sobre movilidad humana y en la necesidad de la transmisión de información de migración al INEC para generar información estadística y para el CPVRA. (Hito cumplido 35) 3.- En cuanto a coordinar el registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, al momento se ha logrado registrar 326.334 nacimientos en el sistema SIES, y 494.549 registros en REVIT nacimientos. (Hito cumplido 36) 4.- En cuanto a coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, mediante reuniones se ha logrado definir una esquema de interoperabilidad para utilizarse en un segundo piloto de residencia, adicional se ha presentado a la mesa técnica un plan de ejecución del piloto e implementación del Registro único de Residencia. (Hito cumplido 37) 5.- en cuanto a coordinar la construcción del registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica, se ha logrado un avance mediante la mesa de IDE Catastral, en la revisión de la actualización de la Norma Técnica de Catastros, y en la adición de un anexo a la misma, que sirven para homologación de conceptos de vivienda. (Hito cumplido 38)		
NOVIEMBRE 2017 1.- Se elaboró un informe de evaluación y diagnóstico de los registros administrativos realizados en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos-San Cristóbal, para lo cual se elaboraron fichas técnicas que faciliten el levantamiento de la información, de acuerdo a los siguientes componentes: datos, procesos, aplicaciones e infraestructura tecnológica. (Hito cumplido 33). 2.- Para el buen desarrollo del piloto continental, se efectuaron las gestiones necesarias con el propósito de contar con la colaboración de los Municipios de: Cuenca, Guayaquil, Shushufindi, y Lago Agrio, para lo cual se emitieron oficios a cada una de las dependencias, se realizaron contactos telefónicos una vez que se contó con la apertura por parte de las instituciones en las que se coordinó la ejecución de las actividades planificadas. Sin embargo debido a la época del año en la que nos encontramos fue complicado asistir a todas las instituciones y por disponibilidad aérea se consiguió visitar el Municipio de Cuenca y efectuar la actividad de levantamiento de información planeada, por consiguiente se cuenta con un informe de diagnóstico sobre el resultado de procesamiento de información. (Hito cumplido 34)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	05/01/2018 - 03:18 PM
OCTUBRE 2017 1.- En cuanto al avance de actividades de la Mesa Técnica de Defunciones se tiene que: luego de que el INEC desarrolló el módulo de defunciones, el MINTEL informa que ha desarrollado una nueva versión de firma electrónica, misma que hay que actualizar en los aplicativos para solucionar algunos inconvenientes que tienen relación con la firma, para lo cual se pide al INEC que realice esta migración antes de realizar la transferencia del mismo a la DIGERCIC. El INEC realiza esta migración surgiendo un inconveniente, que en el documento físico que se imprime ya no aparece la firma que el usuario está acostumbrado a ver. El MINTEL se compromete a incluir esta firma en el físico, encontrándose en proceso. Adicional, el INEC procedió a realizar la actualización de los entregables para la transferencia del aplicativo a la DIGERCIC. Se realizó la planificación de las pruebas del módulo de defunciones en su última versión habiendo fijado como fechas el 6,7 y 8 de noviembre del presente año, con 3 hospitales. (Hito cumplido 32)	Aldaz Flores, Paola Tatiana	04/12/2017 - 03:24 PM
SEPTIEMBRE 2017 1.- El SIMIEC fue desarrollado por el Ministerio del Interior, y está funcionando desde el 17 de septiembre de 2016, en los puntos de ingreso y salida del país. En este momento la SENPLADES junto a otras instituciones públicas está trabajando en la creación de un acuerdo interministerial que servirá como amparo legal para continuar con la ejecución de actividades de las mesas técnicas de nacimientos, defunciones, migración, vivienda y residencia. Una vez creado este acuerdo interministerial se continuará con la activación de la mesa, y posteriormente con actividades tales como: .Transferencia de la BDD desde el Ministerio del Interior hacia el INEC .Evaluación del estado inicial del Registro Administrativo .Procesamiento de la BDD (transformación de RA en RE) (Hito cumplido 31)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	01/11/2017 - 03:26 PM
AGOSTO 2017	Tirira Quiroz, Willam Roberth	03/10/2017 - 09:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Segundo avance - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del censo basado en registros administrativos para reemplazar los CPV tradicionales: Luego de la ejecución del piloto efectuado en marzo del presente año, se trabajó en el desarrollo de un informe integral de los resultados del piloto. Así también se continúa trabajando en la solución del inconveniente detectado en el piloto, es decir la interoperabilidad entre las instancias participantes (ARCP, DEGERCIG, MEER, DINARDAP). En este momento existe una propuesta de mejoramiento de la interoperabilidad, la DINARDAP se encuentra a la espera de la certificación presupuestaria, y aprobación del gasto corriente 2017 y 2018. (Hito cumplido 30)		
JULIO 2017 1.- En lo relacionado a la adquisición de infraestructura básica para la captación y procesamiento de información de registros administrativos se ha procedido de acuerdo a lo planificado, teniendo lo siguiente: Capacitación de arquitectura empresarial , ejecutada. Capacitación de HTML5, ejecutada. Actualización, mantenimiento y soporte Citrix Netscaler, ejecutado. Servicio de actualización, mantenimiento y soporte del licenciamiento del software Vmware Vsphere. en proceso. Adquisición de un Servidor RACK, en proceso. Adquisición de Discos Duros para Eva 6000, en proceso. Servicio de actualización, soporte y mantenimiento de licencias BLUECOAT, por aumento en el costo se contemplo en el adendum al proyecto. Servicio de actualización de licencias Oracle Básico, en proceso. Servicio de actualización, soporte y mantenimiento de antivirus, planificado para diciembre. Actualización, soporte y mantenimiento APPLIANCE MCAFEE, planificado para diciembre. (Hito Cumplido 29)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	04/09/2017 - 02:38 PM
JUNIO 2017 1.- Diagnóstico de registros administrativos: se definió la estructura y actividades que va a realizar el grupo de trabajo, se realizó la socialización a la Dirección Ejecutiva y SENPLADES sobre las actividades a realizar. Se construyó la metodología para la consistencia de las variables de identificación. En nacimientos: se realizó la evaluación de calidad del registro administrativo (Complejidad 96,8%), En defunciones se realizó el desarrollo de un módulo de defunciones REVIT. Se ejecutó un Piloto defunciones REVIT. En residencia se ejecutó el primer piloto de la aplicación Registro Único de Residencia. (Hito asociado 28). 2.- Se realizó una planificación metodológica para analizar la consistencia de la BDD ENEMDU 2016 con los registros de personas (Cedulados, afiliados, etc.), se gestionó la transferencia de la BDD de ENEMDU Diciembre 2016. Se seleccionaron las variables a ser procesadas de ENEMDU para realizar consistencia con datos de registros de personas. (Indicador cumplido 8). 3.- Se gestionó la transferencia de información y se tiene ya en la institución las bases actualizadas a marzo del 2017 de: Residentes Permanentes, Residentes Temporales, Entrada y Salida de Residentes permanentes y temporales, Entrada y Salida de turistas y transeúntes. Se procesó (transformar RA en RE) las tres primeras tablas y se integraron entre sí para generar una base actualizada de residentes en Galápagos. (Indicador cumplido 9).	Tirira Quiroz, Willam Roberth	19/07/2017 - 02:40 PM
MAYO 2017 1.- Con el fin de mejorar el procesamiento de la estadística de Defunciones; la Dirección Nacional de Registro Civil Cedulación e Identificación - DIGERCIC, el Ministerio de Salud Pública - MSP, en un inicio el Ministerio del Interior - MDI actualmente es el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicitaron al Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC el apoyo en la creación del módulo para el registro de defunciones, de acuerdo al Compromiso presidencial 21730 "Registro automático de nacimientos y muertes" incorporando un módulo exclusivo de defunciones en el sistema actual del Registro Nacional de Datos Vitales - REVIT. El sistema contempla varias fases; inicialmente se levantó requerimientos para el registro de defunciones de personas ceduladas, muertas en establecimientos de salud o muertas en casa. El Sistema actualmente se encuentra en etapa de pilotaje con 10 establecimientos de salud, funcionando bajo la infraestructura del INEC en el ISP desde el 20 de diciembre de 2016 con 8 establecimientos de salud y aproximadamente en abril del 2017 se incorporaron dos establecimientos más. (Hito cumplido 27)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	04/07/2017 - 08:59 AM
ABRIL 2017 1.- Durante el año 2016 se registró un total de 266.081 nacimientos, de los cuales 170.394 fueron registrados a través del Sistema REVIT, el mismo que representa un 64% de cobertura a nivel nacional. A abril del 2017 el REVIT está implementado en 515 establecimientos de salud, 239 son públicos y 276 son del sector privado. Durante el año 2016 se implementaron en: 139	Tirira Quiroz, Willam Roberth	02/06/2017 - 03:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
establecimientos públicos y en 247 privados; en tanto que en el 2017 se han implementado en: 13 establecimientos públicos y 28 establecimientos privados. (Hito cumplido 26)		
MARZO 2017 1.- Primer avance de mesa técnica de Residencia: .Análisis de cobertura del registro administrativo fuente (Base de datos con los Códigos Únicos Eléctricos Nacionales). .El diseño y el desarrollo de una aplicación para el Registro Único de Residencia fase 1, la aplicación sirve para que el ciudadano sin excepción registre su residencia, cada vez que deban inscribir o registrar los hechos o actos relativos a su estado civil e identificación; cada vez que cambien de residencia, o cuando la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación lo requiera. .Piloto del funcionamiento de la aplicación Registro único de Residencia, con funcionarios del INEC y de la DIGERCIG. (Hito cumplido Nro. 25) 2.- En este proyecto se realizará un diagnóstico y propuestas de mejora en los componentes de los registros administrativos, para mejorar la generación de información estadística relacionada al Censo de Población y Vivienda basado en registros administrativos 2020. Se iniciará con la conformación de un grupo interinstitucional de trabajo que será el encargado de realizar un levantamiento de la situación actual de los registros administrativos así como de desarrollar las herramientas a utilizar. Entonces, en el primer trimestre del año 2017 se logra: .Definir el procedimiento para levantar la situación actual con Instituciones .Definir la hoja de ruta para levantar la situación actual con Instituciones .Socializar el procedimiento y hoja de ruta con la Dirección Ejecutiva (Indicador cumplido 07 - Primer trimestre)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	05/04/2017 - 10:40 AM
FEBRERO 2017 1.- Se elabora el Project Charter del proyecto Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos. 2.- Se define la estructura y actividades del grupo inter institucional (centro de gobierno), que gestionará y realizará el levantamiento de información relacionada a datos, procesos, aplicaciones e infraestructura relacionada al CPVBRA (Hito cumplido 24)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	03/04/2017 - 04:43 PM
ENERO 2017 1.- Mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2017-0001-M de fecha 03 de enero de 2017 la Dirección Ejecutiva aprueba el Plan de Dirección del Proyecto "Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos" 201; y mediante Resolución No. 002-COMPRAS-DIREJ-2017 de fecha 26 de enero de 2017, resuelve aprobar en el PAC 2017 del INEC, la adquisición de bienes y contratación de servicios, necesarios para el desarrollo de actividades del Plan de Dirección de Proyecto "Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos" 2017. (Hito cumplido 23) 2.- Mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2017-0054-M de 25 de enero de 2017, la Dirección ejecutiva aprueba el primer adendum al plan de proyecto Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos. (Hito cumplido 23)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	15/03/2017 - 11:14 AM
DICIEMBRE 2016 1.- Se desarrolla el sistema geoportal este es un sistema en el que podrá visualizar los puntos por lo que se movilizan los investigadores, los establecimientos económicos, indicadores económicos, y demás información cartográfica o georreferenciada. Los módulos que se desarrollaron fueron: .Importación automatizada de datos tracking desde las bases de datos SIPC y SIPRO a la base GEOINEC. .Generación de un servicio en ARCGIS server para administrar el tracking. .Vinculación de PrimeFaces (servidor) con Javascript (cliente), para comunicación de sistema GEOINEC con servicio ARCGIS. .Creación del módulo de georreferenciación de establecimientos. (Hito cumplido 21) 2.- En cuando al Cloud Computing: durante el cuarto trimestre se realizaron actividades obteniendo los siguientes productos: * Tablas Maestras * Data WareHouse de Población * Base de datos del visualizador de Nombres y Apellidos * Base de datos del Visor de Información de Registros Administrativos (VRAD) (Indicador 4 cumplido) 3.- Se elaboró un documento de propuestas de proyectos en forma general en los diferentes componentes de Población y Vivienda (nacimientos, defunciones, migración, vivienda y	Tirira Quiroz, Willam Roberth	02/03/2017 - 04:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
residencia), esto basado en las diferentes reuniones efectuadas por las mesas técnicas. (Hito cumplido 20).		
4.- Se realiza un informe ejecutivo de cierre de proyecto 2016 (Hito cumplido 22)		
NOVIEMBRE 2016 1.- Reestructuración de hitos: el 15 de noviembre de 2016 mediante memorando INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0223-M, se solicita a la CGTPE la reestructuración de hitos. El 17 de noviembre de 2016 mediante memorando INEC-CGTPE-2016-1203-M la CGTPE solicita a la Dirección Ejecutiva la autorización para la reestructuración de hitos. El 18 de noviembre de 2016 mediante memorando INEC-DIREJ-2016-0640-M la Dirección Ejecutiva autoriza la reestructuración de hitos en el GPR, procediendo a realizar este proceso, y adjuntando verificables en esta herramienta. 2.- Socialización del Proyecto CPV por Registros Administrativos Galápagos y entrega de bases catastrales municipales utilizadas en el Censo Comprobatorio Galápagos 2015 para actualización, realizado: En Galápagos se realiza la presentación para socialización de los objetivos del Censo por Registros Administrativos y principales resultados del Censo Comprobatorio Galápagos 2015, así como la entrega de la información geográfica utilizada para dichos procesos a las autoridades municipales (hito cumplido 13). 3.- Diseño de modelos de gestión - Términos de Referencia y mesas técnicas de Población y Vivienda - elaborados: El censo por registros administrativos tiene componentes principales como: Registro de Nacimientos, Registro Defunciones, Registro de Migración, Registro de Vivienda y Registro de Residencia. Cada uno ha conformado una Mesa Técnica que se reúne cada 15 días para medir los avances y tomar las acciones necesarias a fin de que cumplir con los productos de este compromiso. En las mesas técnicas se han acordado y firmado los Términos de Referencia que marcan las actividades y productos esperados, además de sus cronogramas de ejecución (Hito cumplido 14). 4.- Sistema de automatización para la transferencia de registros administrativos base, implementado: Las vistas materializadas son herramientas eficientes para el proceso de captura de información que permiten entre sus funcionalidades más destacadas la recepción de información dependiendo del modo de actualización que tenga el repositorio o base de datos origen; evitando el crecimiento desmesurado de información. En el proceso de captación de información que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, desde otras entidades, el uso de vistas materializadas representa optimización del uso del tiempo debido a que se realiza automáticamente, evitando la asignación de un recurso humano para la ejecución de esta tarea. (Hito cumplido 16). 5.- Diseño de modelos de gestión - Situación actual en Población y Vivienda, elaborado: siguiendo un modelo de gestión se ha venido trabajando con el decreto propuesto para esta actividad el mismo que consta de los siguientes componente: Registro central de población, Registro central de vivienda, Registro central de residencia. Se resuelve crear un comité interinstitucional como cuerpo colegiado intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación, articulación y emisión de políticas y lineamientos estratégicos para la implementación del Censo. (Hito cumplido 18). 6.- Registros administrativos de Galápagos, actualizado: Desde la ejecución del Censo comprobatorio en noviembre del 2015 y la construcción de la Línea Base a inicios del 2016 a través de la integración del Registro Poblacional (fusión de registros administrativos) con el censo tradicional, se han venido llevando algunas actividades que permitan mejorar la captación de los datos administrativos para posteriormente utilizarlos en la actualización de la línea base. La actualización de la línea base contempla dos aspectos: 1. La actualización del stock de la población, esto implica retirar del registro a los fallecidos y emigrantes, y añadir a los nuevos nacidos e inmigrantes y, 2. La actualización de las características (variables) de la población, para lo cual se toman datos actualizados de los distintos registros administrativos. (Hito cumplido 19).	Tirira Quiroz, Willam Roberth	05/01/2017 - 04:58 PM
OCTUBRE 2016 1.- Reestructuración de hitos: en el caso de la actividad "Consultoría para diseño de Modelos de Gestión" se consiguió la aprobación de la SNAP, sin embargo, existió demora en la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas, ante ello se ha planteado nuevas estrategias para cumplir con el objetivo de proyecto. En cuanto al hito "Decreto ejecutivo", a partir de la recomendación realizada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se cambia la estrategia hacia un mecanismo más dinámico en coordinación técnica, en lugar de las reuniones ejecutivas en el marco del CONEC, por lo tanto se elimina este hito. El hito "Plan de incentivos para	Tirira Quiroz, Willam Roberth	24/11/2016 - 12:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
actualización de información", se vuelve parte del nuevo hito "Diseño de modelos de gestión - Términos de Referencia y mesas técnicas de Población y Vivienda", por lo que se lo elimina como hito. En este sentido, se considera necesario efectuar la re estructuración integral de hitos. Se inicia este proceso enviando a DIPLA la ficha de justificación técnica y justificación. 2.- Aprovechamiento de registros de migración: Se describe el proceso inicial de diagnóstico y perfilamiento de la base de datos histórica de entradas y salidas, como análisis preliminar del nuevo sistema que está en operación por parte de la Dirección de Migración del Ministerio del Interior, desde hace aproximadamente un mes, hasta su remisión definitiva. Se encontraron varias inconsistencias en algunas variables llegando a la conclusión de que no se puede llegar a tener aún un registro estadístico. Se espera que lleguen nuevas bases de datos por parte del Ministerio del Interior para poder realizar más diagnósticos y obtener mejores resultados (Hito cumplido 15).		
SEPTIEMBRE 2016 1.- Con los pasajes aéreos, fondos a rendir cuentas y viáticos se logró realizar en Galápagos, un seguimiento a la actualización de bases de datos entregadas y capacitaciones para perfeccionar esta actualización. (Hito asociado 18) 2.- Proceso Consultoría Modelos de Gestión: el 15 de septiembre de 2016 mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2016-2434-M, la CGAF informa que la reforma presupuestaria planteada para cubrir el requerimiento programado se encuentra validada por parte del Ministerio de Finanzas, y solicita a la CGTPE informe si el proceso de consultoría debe continuar con el trámite normal de aval. Para lo cual el 26 de septiembre de 2016 mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0191-M se responde que con Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0168-M, de fecha 30 de Agosto de 2016, la Dirección de Registros Administrativos explica el motivo sobre el cual solicita la autorización para realizar la devolución del presupuesto asignado a la actividad antes descrita (consultoría) a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA) solicitando se disponga de este presupuesto, de acuerdo lo considere necesario. Este requerimiento se lo realiza de tal forma que las diligencias o acciones realizadas con dicho presupuesto no forme parte de las actividades planificadas en el Proyecto Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos (Fase de Preparación y Análisis 2016). Se requiere se informe de este particular a las direcciones correspondientes. (Hito asociado 13) 3.- Se elaboraron los documentos para postulación del proyecto CPV basado en Registros Administrativos 2017, contempla documento formato_postulación_proyectos_senplades 2017 CPV2017, formato_marco_lógico actualizado CPV2017, Matriz presupuesto, anexo_1 Cronograma de contratación CPV2017, anexo_2 Flujo económico y financiero CPV2017, y se remiten mediante memorando INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0108-M. (Hito cumplido 14)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	27/10/2016 - 02:26 PM
AGOSTO 2016 1.- Proceso Pasajes aéreos: Se publicó en el portal de compras, el 29 de Julio (régimen especial). DIJU informa que se ha enviado el contrato al Departamento Jurídico de TAME, con fecha 17 de agosto de 2016, aún no se lo recibe firmado. DIJU informa sobre este particular al Director del Administrativo del INEC. (Hito asociado 18). 2.- Proceso Fondos a rendir cuentas: Con fecha 24 de agosto tesorería del INEC informa que se encuentra acreditado el Fondo por el monto de 1.120,00 (en la cuenta y a la persona solicitada). (Hito asociado 18). 3.- Con los pasajes, fondos a rendir cuentas y viáticos se logró realizar en Galápagos, una reunión para la presentación y socialización del Proyecto Censo de Población y Vivienda por Registros Administrativos Galápagos y entrega de bases catastrales municipales utilizadas en el Censo Comprobatorio Galápagos 2015, con la finalidad de dar continuidad a la alimentación de las bases de datos en las fuentes de información. Las instituciones que intervinieron en esta reunión fueron: Consejo de Gobierno de Galápagos, GAD Municipal de Isabela, GAD Municipal de Santa Cruz, GAD Municipal de San Cristóbal, INEC. 4.- Proceso Consultoría Modelos de Gestión: el 9 de agosto de 2016 se emite el Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0154-M, en el que se mencionan las gestiones realizadas por DIRAD y el INEC para ejecutar el proceso de Consultoría, donde se señala la aprobación del AVAL otorgado por la SNAP; y se pide que la CGAF informe sobre el estado en el que se encuentra el pedido de AVAL requerido como parte del proceso por el Ministerio de Finanzas, documento que DIRAD lo solicitó con fecha 29 de mayo de 2016 mediante memorando No. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0098-M; además se le recuerda a la CGAF que la consultoría tiene	Tirira Quiroz, Willam Roberth	03/10/2016 - 09:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
una duración de ejecución de 3 meses y medio, es decir, que para estas fechas (semana del 09 de agosto de 2016), se debería contar con el AVAL del Ministerio de Finanzas, para que en el mes de agosto del presente año se realice el proceso de adquisición y desde septiembre iniciar la ejecución de esta consultoría. El 17 de agosto de 2016 la CGAF responde con memorando Nro. INEC-CGAF-2016-2159-M, indicando las gestiones realizadas por esta Coordinación y el INEC, concluyendo que: "... las modificaciones presupuestarias planteadas por motivo de los recortes efectuados al presupuesto de inversión del INEC no han sido validadas por el Ministerio de Finanzas; y recomienda "... tomar en consideración lo sugerido desde la Dirección de Egresos no Permanentes del Ministerio de Finanzas, siendo necesario que para la validación del comprobante de modificación presupuestaria INTRA1 CO2 No. 165, se gestione ante el Ministerio de Finanzas desde la instancia de la máxima autoridad del INEC. De no lograr el objetivo propuesto se recomienda, con miras a no perder ese dinero, se le destine a otro objetivo." El 30 de agosto de 2016 con Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0168-M, se indica que, debido a la no validación por parte del Ministerio de Finanzas, y tomando en cuenta el corto tiempo disponible que resta para ejecutar este proceso de consultoría; se toma en consideración lo sugerido por la Coordinación General Administrativa Financiera, es decir, se solicita a la CGTPE la autorización y gestión para entregar el presupuesto inicialmente asignado a la actividad antes descrita (consultoría) a DIPLA para que disponga de este presupuesto, de acuerdo lo considere necesario. (Hito asociado 13)		
JULIO 2016 1.- En cuanto a la situación actual de infraestructura y seguridad de la información: Actualmente se está procesando información relacionada registros administrativos en infraestructura básica situada en el INEC, pero adicional nos encontramos en proceso de contratación de Cloud Computing. En cuanto a la seguridad de la información, se está trabajando en el documento para transferencia de bases de datos internas y externas alineadas al EGSI y en la resolución en base al procedimiento de transferencia. Se ha tomado como marco de referencia el ESGI, el mismo que manifiesta los controles a implementarse en los 125 hitos prioritarios y 25 hitos seleccionados por la Institución. Estos hitos hacen referencia a la seguridad en el desarrollo de sistemas informáticos, procesamiento de datos etc. (Hito cumplido 12) 2.- Proceso Pasajes aéreos: El 27 de julio de 2016, con memorando Nro. INEC-CGAF-2016-1913-M, la CGAF solicita a la sub dirección la autorización de inicio de proceso. El 27 de julio de 2016 con memorando Nro. INEC-SUGEN-2016-0152-M, se aprueba y autoriza a la CGAF, proceder con los trámites respectivos y a DIJU elaborar resolución. Se publicó, el 29 de Julio (régimen especial). (Hito asociado 18) 3.- Fondos a rendir cuentas: El 25 de julio de 2016 con Memorando Nro. INEC-DIPLA-2016-0718-M, DIPLA emite respuesta favorable a la reprogramación. El 27 de julio con Memorando INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0141-M, se solicita a la CGTPE de su gestión solicitando a DIJU la reforma a la resolución de compras y el desembolso de los haberes. El 28 de julio de 2016, con Memorando Nro. INEC-CGTPE-2016-0801-M, la CGTPE, realiza esta solicitud a DIJU. (Hito asociado 18) 4.- Consultoría Modelos de Gestión: El 20 de Julio de 2016, con Oficio Nro. SNAP-CNGE-2016-0142-O, se nos informa la aprobación de AVAL por parte de la SNAP. Se informa este particular a la unidad de COMPRAS quienes son los encargados de continuar con el trámite. (Hito asociado 13)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	31/08/2016 - 02:55 PM
JUNIO 2016 1.- Se publicaron los TDR para la adquisición del servicio de cloud computing y documentos en formato SNAP, en el sistema CTI con la finalidad de que la SNAP emite su autorización formal. Con Memorando Nro. INEC-DIREJ-2016-0296-M, de fecha 13/06/2016, se tiene la autorización por parte del Director Ejecutivo quien a su vez solicita continuar con los tramites de Certificado-Aval por parte del Ministerio de Finanzas. Con fecha 24 de junio de 2016 y Trámite Aval 33 se solicita el AVAL al Ministerio de Finanzas. Al momento se espera respuesta por parte de esta entidad. (Hito asociado 11). 2.- Se recibe la autorización por mail por parte de la SNAP para publicar los documentos en formato SNAP y TDR para la adquisición de la consultoría para desarrollo de modelos de gestión, los mismos se encuentran en proceso de aprobación por parte del Director Ejecutivo. Así también, se espera la autorización por parte del Director Ejecutivo para continuar con la solicitud de AVAL del Ministerio de Finanzas. (Hito asociado 13)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	05/08/2016 - 02:39 PM
MAYO 2016	Tirira Quiroz, Willam Roberth	01/07/2016 - 03:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- El INEC ha recibido asesorías de parte de varias entidades y personal técnico en lo metodológico e informático: .Profesores Anders & Britt Wallgren: Los profesores Wallgren, referentes metodológicos en el desarrollo del aprovechamiento de los registros administrativos para su uso con fines estadísticos a nivel mundial. .KOSTAT: Con el Instituto de Estadísticas de Corea .BID: cooperación técnica "Promoting Use of Administrative Registries for Statistical Purposes (the AR4S initiative)". Adicionalmente se han realizado acercamientos con otras instituciones, para que el INEC socialice las metodologías e instrumentos desarrollados o asista técnicamente, en el marco de iniciativas tales como: .El programa de Bienes Públicos Regionales financiado por el BID/CAN .La creación del Grupo de Trabajo de Registros Administrativos en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL .Asistencia técnica y acompañamiento a entidades tales como la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) .Asistencia técnica con el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) (Hito cumplido 08) 2.- Dado el origen y características que tiene un registro administrativo para generar información de acuerdo a la línea de negocio de la institución que la levanta, fue necesario el desarrollo de aplicaciones por parte del INEC: .Nacimientos, Defunciones Generales y Fetales, Matrimonios y Divorcios .Revit Defunciones .Migración (Hito cumplido 09) 3.- EL INEC ha realizado talleres interinstitucionales principalmente en el marco del Programa de Bienes Públicos Regionales: .Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación a partir del Registro Nacional de Datos Vitales (REVIT). .Ministerio del Interior: aplicación del Sistema de Migración Ecuatoriano - SIMIEC en todos los puestos de control migratorio. .SENESCYT: Se revisó el nuevo Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador generado por SENESCYT para el registro de títulos de educación superior. .Ministerio de Educación: Se mantuvieron reuniones con el equipo técnico para conocer respecto al desarrollo de su sistema Comunidad Educativa en Línea (Educar Ecuador). .MIDUVI: Se continuaron las reuniones para incluir un artículo en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos, respecto a la obligatoriedad de registrar la residencia de la población. .DINADIS-MSP: Se continuaron los análisis de la información provista por la Dirección Nacional de Discapacidades. .Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG): Se continuaron las gestiones para el acceso, procesamiento, (Hito cumplido 10). 4.-Se elaboraron los TDR y documentos en formato SNAP para la adquisición del Cloud Computing, mismos que fueron revisados por mail por esta Institución. Se remitieron formalmente los TDRs e informes de justificación a la unidad de compras para la solicitud de aval por parte del Ministerio de Finanzas. (Hito asociado 11). 5.- Se elaboraron los TDR y documentos en formato SNAP para la adquisición de la consultoría para desarrollo de modelos de gestión, mismos que fueron remitidos por mail a la SNAP para su revisión. (Hito asociado 13).		
ABRIL 2016 1.- Se realizó un análisis de situación actual de los procesos existentes relacionados al Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos, en el que indica que el INEC ha participado de diversas maneras en el desarrollo de los procesos que han levantado las entidades que generan los registros administrativos principales para la construcción de registros centrales, tales como: .Nacimientos .Defunciones .Migración .Educación .Matrimonios y Divorcios .Discapacidad .Catastros .Empresas y Actividades (Hito cumplido 07) 2.- Luego de realizar el DEMO en un ambiente virtualizado (Cloud Computing de CNT), se procede a elaborar el TDR para la Adquisición del servicio de cloud computing para el proyecto	Tirira Quiroz, Willam Roberth	02/06/2016 - 01:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CPV2016, los mismos fueron enviados a la CGTPE mediante memorando N0. INEC-CGTPE-DIRAD-2016-0086-M, para que a su vez solicite a DITIC su validación. (Hito asociado 11) 3.- Se continua en reuniones con empresas para definir el alcance de la consultoría en el desarrollo de modelos de gestión e implementación de arquitectura empresarial.(Hito asociado 13)		
MARZO 2016 1.- En cuanto a la situación actual de construcción de Metodologías a utilizarse en el proyecto Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos, se cuenta con un documento que contiene metodologías que aportan en el aprovechamiento estadístico de datos administrativos, siguiendo una estructura basada en procesos, Este documento servirá como insumo para la consultoría de desarrollo de modelos de gestión. (Hito cumplido 05) 2.- Se realiza un análisis de situación actual de Marco Legal relacionado al Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos, en el que indica que se presentaron propuestas por parte del INEC para incluir sus requerimientos en algunos cuerpos legales. (Hito cumplido 06) 3.- Se realiza un adendum al plan de proyecto, en el que se incluye el financiamiento de 6 funcionarios de las direcciones de Estadísticas Económicas y de Estadísticas Socio-demográficas. El financiamiento para el personal mencionado fue autorizado por la Dirección Ejecutiva mediante memorando No. INEC-DIREJ-2016-0010-M de fecha 12 de enero de 2016. Adicional, debido a disminuciones de presupuesto, informado con Memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0470-M, de fecha 02 de marzo de 2016, por la Coordinación General Administrativa Financiera, se realiza una reestructuración en la planificación de actividades relacionadas a viáticos y pasajes aéreos de DICA, DIES, DIRAD. 4.- Dentro del plan de proyecto aprobado se contempla un funcionario para ejercer las tareas de Oficial de Seguridad de la Información (SP7), pero debido a priorización de necesidades del presente proyecto, se realiza un cambio en la denominación del puesto: de Oficial de Seguridad de la Información a Analista operativo y de gestión de Registros Administrativos 3 (SP7), ocupando otro funcionario este cargo, para realizar tareas de metodologías y procesos de mejoras para aprovechamiento de registros administrativos. Se realiza la gestión de la contratación de un SP7, completando el grupo de recursos humanos requeridos para el presente proyecto.(Indicador cumplido 01) 5.- Se realizan pruebas de instalación, configuración y procesamiento de información en un CLOUD DEMO facilitado por CNT, para analizar la factibilidad de la adquisición del servicio de Cloud, las pruebas se las debía realizar hasta el 31 de marzo de 2016; el 29 de marzo se emite por correo electrónico a CNT un dictamen no favorable sobre estas pruebas, CNT mejora los recursos del ambiente e indica que el plazo de las pruebas se extenderá. (Indicador 04, periodo cumplido 01)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	07/04/2016 - 02:38 PM
FEBRERO 2016 1.- Con el apoyo del BID/CAN el INEC realizó ejercicios de diagnóstico de los principales registros administrativos de población, y de inmuebles, para establecer así la calidad de los mismos para su aprovechamiento con fines estadísticos, es así que se organizó un "Taller Nacional para Discusión de Resultados de los Diagnósticos de Registros de Población y Vivienda", con las instituciones: SENPLADES, SNAP, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, MIDUVI, MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DEL TRABAJO, CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IESS, MINISTERIO DEL INTERIOR, AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL, en la que se informará sobre los avances realizados. Aprovechando este taller, se conformarán mesas de trabajo para el estudio y presentación de propuestas con miras al fortalecimiento y actualización de tales registros para la realización del Censo de Población y Vivienda basado en registros administrativos de la ronda 2020, contribuyendo a la vez para el cumplimiento del objetivo del proyecto Censos de Población y Vivienda basado en registros administrativos 2016. (Hito asociado 03).e 2.- Se realizan TDRs generales para la construcción de modelos de gestión para la ejecución de Censos de Población y Vivienda basados en registros administrativos, estos TDRs se encuentran anexos en los documentos aprobados por SENPLADES (Hito cumplido 04). 3.- En febrero de 2016 aprueba la Dirección Ejecutiva el project charter del proyecto CPVRA 2016. Adicional con fecha 16 de febrero de 2016 mediante Oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2016-0091-OF se emite el Dictamen de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES. Se anexan estos documentos en el hito 02 (Hito cumplido 02).	Tirira Quiroz, Willam Roberth	04/04/2016 - 11:04 AM
ENERO 2016 1.- Se realizaron cronogramas de ejecución de actividades del proyecto (Hito cumplido 01)	Tirira Quiroz, Willam Roberth	04/03/2016 - 09:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Se realizó la actualización del proyecto CPV 2016, y se envió a SENPLADES por medio del sistema SIPEIP, se espera priorización por parte de esta entidad. Mediante memorando Nro. INEC-DIREJ-2015-0732-M de 31 de diciembre de 2015, la Dirección Ejecutiva autoriza el Plan de Dirección del Proyecto "Censo de Población y Vivienda basado en registros administrativos (Fase de preparación y análisis)" correspondiente al año 2016, e indica ejecutar actividades según ámbito de competencia. Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2016-0191-M de 26 de enero de 2016, la COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, remite la Resolución N ° 015-COMPRAS-DIREJ-2016, la misma que resuelve: Aprobar e incluir en el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos - Oficina Matriz 2016, la contratación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Plan de Dirección del Proyecto: Censo de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos (Fase de preparación y análisis) correspondiente al año 2016. (Hito cumplido 02).		

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN Cronogramas de ejecución del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	14/01/2016		14/01/2016		Sí	0.69
2	DEFINICIÓN Documentos habilitantes del proyecto, aprobados	9-Entregables Formales	29/01/2016		29/01/2016		Sí	1.11
3	PLANEACIÓN Grupos de trabajo interinstitucionales, conformado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		09/03/2016		Sí	1.08
4	PLANEACIÓN Términos de referencia para la consultoría de Modelos de Gestión para el proyecto CPV 2020, elaborados	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.73
5	EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Metodologías, elaborado	5-Entregables Intermedios	10/03/2016		10/03/2016		Sí	0.14
6	EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Marco Legal elaborado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	0.14
7	EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Procesos elaborado	5-Entregables Intermedios	19/04/2016		19/04/2016		Sí	0.14
8	EJECUCIÓN Asesoramientos institucionales, obtenidos	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		02/05/2016		Sí	0.34
9	EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Aplicaciones desarrolladas elaborado	5-Entregables Intermedios	09/05/2016		09/05/2016		Sí	0.14
10	EJECUCIÓN Talleres interinstitucionales, efectuados	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCIÓN Informe de Contratación del Servicio de Cloud Computing, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.76
12	EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Infraestructura y Seguridad de la Información elaborado	5-Entregables Intermedios	18/07/2016		18/07/2016		Sí	0.14
13	EJECUCIÓN Socialización del Proyecto CPV por Registros Administrativos Galápagos y entrega de bases catastrales municipales utilizadas en el Censo Comprobatorio Galápagos 2015 para actualización, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.68
14	EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - Términos de Referencia y mesas técnicas de Población y Vivienda - elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	3.08
15	EJECUCIÓN Documento del proyecto en formato SENPLADES, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.9
16	EJECUCIÓN Sistema de automatización para la transferencia de registros administrativos base, implementado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	2.8
17	EJECUCIÓN Informe de aprovechamiento de registros de migración, aprobado	9-Entregables Formales	28/10/2016		28/10/2016		Sí	1.3
18	EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - Situación actual en Población y Vivienda, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	3.08
19	EJECUCIÓN Registros administrativos de Galápagos, actualizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	2.8
20	EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - propuesta de proyectos CPV2020, elaborado	9-Entregables Formales	29/12/2016		29/12/2016		Sí	3.08
21	EJECUCIÓN Sistema geoportal (Tracking, Georeferenciación de establecimientos económicos) , desarrollado	9-Entregables Formales	29/12/2016		29/12/2016		Sí	2.3
22	CIERRE Documento de cierre de proyecto, elaborado	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.73
23	PLANEACIÓN - Aprobaciones del proyecto, gestionadas	5-Entregables Intermedios	03/01/2017		03/01/2017		Sí	1.68
24	PLANEACIÓN - Estructura y actividades del centro de gobierno, definidos.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.68
25	EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del CPVBRA para reemplazar los	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	2.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	censos de población y vivienda tradicionales, .aprobado.							
26	EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, a través la automatización e implementación del registro electrónico de nacimientos como parte del CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	2.1
27	EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones como parte del CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	2.1
28	EJECUCIÓN - Diagnóstico de la situación actual de los componentes de la arquitectura de los registros administrativos a utilizarse en el desarrollo del CPVBRA 2020 y Portafolio de proyectos, propuesto.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		29/12/2017		Sí	4.2
29	EJECUCIÓN - Infraestructura básica para la captación y procesamiento de información de registros administrativos, adquirida.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	4.2
30	EJECUCIÓN - Segundo avance - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del censo basado en registros administrativos para reemplazar los CPV tradicionales, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2017		30/08/2017		Sí	2.1
31	EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro de los movimientos migratorios internacionales ocurridos a nivel nacional a través de la automatización e implementación del registro electrónico de migraciones como parte del CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	2.1
32	EJECUCIÓN - Coordinar el registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones como parte del CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	2.1
33	EJECUCIÓN - Evaluaciones y diagnósticos de los procesos de censos basados en	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	4.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	registros administrativos en Galápagos, realizado.							
34	EJECUCIÓN - Diagnósticos sobre los resultados del procesamiento de información del piloto continental, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		29/12/2017		Sí	4.2
35	EJECUCIÓN - Coordinar el registro de los movimientos migratorios internacionales ocurridos a nivel nacional a través de la automatización e implementación del registro electrónico de migraciones como parte del CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	2.1
36	EJECUCIÓN - Coordinar el registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, a través la automatización e implementación del registro electrónico de nacimientos como parte del Censo basado en registros administrativos, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	2.1
37	EJECUCIÓN - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del censo basado en registros administrativos para reemplazar los censos de población y vivienda tradicionales, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	2.1
38	EJECUCIÓN - Coordinar la construcción del registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica, en el ámbito de CPVBRA, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	2.1
39	CIERRE - Documentación de cierre de proyecto, elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.85
40	DEFINICIÓN.- Cronogramas del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.6
41	DEFINICIÓN.- Documentos habilitantes del proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.6
42	EJECUCIÓN.-Mapeo de registros administrativos en instituciones públicas, realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	3.6
43	PLANIFICACIÓN.- Planificación de grupos de instituciones públicas y GADs para solicitar información (Componente 1), elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.8
44	EJECUCIÓN.- Análisis de la información recopilada en el mapeo de registros administrativos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2018	30/03/2018			No	0.9
45	EJECUCIÓN.- Primer avance: Registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, a	5-Entregables Intermedios	30/04/2018	30/04/2018			No	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	través la automatización e implementación del registro electrónico de nacimientos, coordinado.							
46	EJECUCIÓN.- Primer avance: Registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones, coordinado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018	31/05/2018			No	0.3
47	EJECUCIÓN.- Primer avance: Construcción del Registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica, coordinado	5-Entregables Intermedios	29/06/2018	29/06/2018			No	0.6
48	EJECUCIÓN.- Infraestructura tecnológica básica, adquirida.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018	31/07/2018			No	3.0
49	EJECUCIÓN.- Levantamiento de situación actual de registros de migración y vivienda (focal), levantado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018	31/08/2018			No	6.9
50	EJECUCIÓN.- Inventario de registros de población, actualizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	3.3
51	EJECUCIÓN.- Inventario de registros de vivienda, actualizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	4.2
52	EJECUCIÓN.- Propuestas generales para implementación de mejoras de calidad de los datos de migración y catastro, socializadas	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	1.5
53	EJECUCIÓN.- Registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones, coordinado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	0.3
54	EJECUCIÓN.- Construcción del Registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica, coordinado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	0.3
55	EJECUCIÓN.- Registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, a través la automatización e implementación del registro electrónico de nacimientos, coordinado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	0.6
56	EJECUCIÓN.- Registro y actualización de la Residencia a nivel nacional, coordinado de nacimientos, coordinado.	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	0.6
57	CIERRE.- Cierre de proyecto anual, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	0.6

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la implementación del centro de gobierno interinstitucional	—	-	-	-	01/01/2017	-
2	Porcentaje de avance en la implementación de prueba piloto continental	—	-	-	-	01/01/2017	-
3	Porcentaje de avance en la construcción del documento de evaluación y diagnóstico de los procesos generados para la actualización del piloto Galápagos, con información basada en registros administrativos.	—	-	-	-	01/01/2017	-
4	Porcentaje de avance en la implementación de infraestructura tecnológica básica necesaria para el procesamiento de información	—	-	-	-	01/01/2017	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,666,151.11 **
Costo Total:	2,415,856.98
Total Devengado:	1,490,696.20
% Costo Total Devengado:	61.70 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 61.70 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,499,092.60	0.00	0.00	1,499,092.60
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,998,185.20	311,245.00	0.00	3,309,430.20
Ppto. Codificado	1,557,195.31	311,245.00	0.00	1,868,440.31
Ppto. Comprometido	1,404,525.13	135,790.09	0.00	1,540,315.22
Planeado - Codificado (2018)		-311,245.00		
Programado a Devengar	1,599,904.40	311,245.00	0.00	1,911,149.40
Ppto. Devengado	1,354,906.11	135,790.09	0.00	1,490,696.20
Pagado Real	1,339,130.61	135,633.84	0.00	1,474,764.45
Estimado a fin de año	* 1,354,906.11	0.00	0.00	1,354,906.11
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	244,998.29	311,245.00	0.00	556,243.29
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 84.69 %	43.63 %	0.00 %	78.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

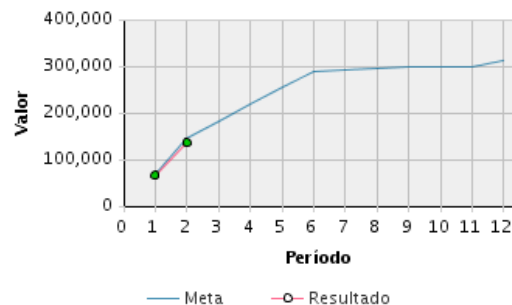

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	69,798.42	66,123.09	69,798.42	66,123.09	94.73 %		21.24 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	74,310.78	69,667.00	144,109.20	135,790.09	94.23 %		43.63 %
Mar	39,203.72		183,312.92				
Abr	36,483.61		219,796.53				
May	36,483.61		256,280.14				
Jun	32,500.08		288,780.22				
Jul	3,208.63		291,988.85				
Ago	4,566.67		296,555.52				
Sep	996.45		297,551.97				
Oct	996.45		298,548.42				
Nov	899.95		299,448.37				
Dic	11,796.63		311,245.00				
Total	311,245.00	135,790.09					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 01.- DEFINICIÓN Cronogramas de ejecución del proyecto, aprobados	A1.rar	04/03/2016
2	ASOCIACIÓN HITO 02.- DEFINICIÓN Documentos habilitantes del proyecto, aprobados	A2.rar	04/03/2016
3	ASOCIACIÓN HITO 02.- Dictamen de prioridad SENPLADES proyecto CPV RA 2016	A4.rar	07/03/2016
4	ASOCIACIÓN HITO 02.- Project Charter CPV RA 2016 aprobado	A3.rar	07/03/2016
5	ASOCIACIÓN HITO 04.- PLANEACIÓN Términos de referencia para la consultoría de Modelos de Gestión para el proyecto CPV 2020, elaborados	A6.rar	07/03/2016
6	ASOCIACIÓN HITO 05.- EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Metodologías, elaborado	A.7.rar	20/04/2016
7	ASOCIACIÓN HITO 06.- EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Marco Legal elaborado	A.8.rar	25/04/2016
8	ASOCIACIÓN HITO 07.- EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Procesos elaborado	A.9.rar	01/07/2016
9	ASOCIACIÓN HITO 08.- EJECUCIÓN Asesoramientos institucionales, obtenidos	B.1.rar	01/07/2016
10	ASOCIACIÓN HITO 09.- EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Aplicaciones desarrolladas elaborado	B.2.rar	04/07/2016
11	ASOCIACIÓN HITO 10.- EJECUCIÓN Talleres interinstitucionales, efectuados	B.3.rar	04/07/2016
12	ASOCIACIÓN HITO 11.- EJECUCIÓN Informe de Contratación del Servicio de Cloud Computing, aprobado	B.4.rar	05/07/2016
13	ASOCIACIÓN HITO 12.- EJECUCIÓN Documento de análisis de situación actual de Infraestructura y Seguridad de la Información elaborado	B.5.rar	31/08/2016
14	ASOCIACIÓN HITO 13.- EJECUCIÓN Socialización del Proyecto CPV por Registros Administrativos Galápagos y entrega de bases catastrales municipales utilizadas	B.6.rar	28/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	en el Censo Comprobatorio Galápagos 2015 para actualización, realizado.		
15	ASOCIACIÓN HITO 14.- EJECUCIÓN Consultoría Modelos de Gestión para el proyecto CPV 2020	B.7.rar	28/11/2016
16	ASOCIACIÓN HITO 14.- EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - Términos de Referencia y mesas técnicas de Población y Vivienda - elaborados	B.8.rar	28/11/2016
17	ASOCIACIÓN HITO 14.- Problema 1 Acción 1 no ejecutada - Consultoría	Probl_1_Ac_1.rar	28/10/2016
18	ASOCIACIÓN HITO 15.- EJECUCIÓN Documento del proyecto en formato SENPLADES, elaborado	B.9.rar	28/11/2016
19	ASOCIACIÓN HITO 16.- EJECUCIÓN Sistema de automatización para la transferencia de registros administrativos base, implementado.	C.1.rar	07/12/2016
20	ASOCIACIÓN HITO 17.- EJECUCIÓN Informe de aprovechamiento de registros de migración, aprobado	C.2.rar	28/11/2016
21	ASOCIACIÓN HITO 18.- EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - Situación actual en Población y Vivienda, elaborado	C.4.rar	04/01/2017
22	ASOCIACIÓN HITO 19.- EJECUCIÓN Registros administrativos de Galápagos, actualizado	C.5.rar	03/01/2017
23	ASOCIACIÓN HITO 20.- EJECUCIÓN Diseño de modelos de gestión - propuesta de proyectos CPV2020, elaborado	C.6.rar	27/01/2017
24	ASOCIACIÓN HITO 21.- EJECUCIÓN Sistema geoportal (Tracking, Georeferenciación de establecimientos económicos) , desarrollado	C.7.rar	27/01/2017
25	ASOCIACIÓN HITO 22.- CIERRE Informe de Cierre-CPV	C8.rar	27/01/2017
26	ASOCIACIÓN HITO 23.- PLANEACIÓN - Aprobaciones del proyecto, gestionadas	C.9.rar	03/03/2017
27	ASOCIACIÓN HITO 23.- PLANEACIÓN - Aprobaciones del proyecto, gestionadas (Project Charter)	D.1.rar	02/03/2017
28	ASOCIACIÓN HITO 24.- PLANEACIÓN - Estructura y actividades del centro de gobierno, definidos.	D.2.rar	16/03/2017
29	ASOCIACIÓN HITO 25.- EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del CPVBRA para reemplazar los censos de población y vivienda tradicionales, .aprobado	D.3.rar	06/04/2017
30	ASOCIACIÓN HITO 26.- EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, a través la automatización e implementación del registro electrónico de nacimientos como parte del CPVBRA, aprobado.	D.4.rar	22/05/2017
31	ASOCIACIÓN HITO 27.- EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones	D.5.rar	02/06/2017
32	ASOCIACIÓN HITO 29.- EJECUCIÓN - Infraestructura básica para la captación y procesamiento de información de registros administrativos, adquirida	D.6.rar	16/08/2017
33	ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN - Segundo avance - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, como parte del censo basado en registros administrativos para reemplazar los CPV tradicionales, aprobado	D.7.rar	08/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
34	ASOCIACIÓN HITO 31.- EJECUCIÓN - Primer avance - Coordinar el registro de los movimientos migratorios internacionales ocurridos a nivel nacional.	D.8.rar	11/10/2017
35	ASOCIACIÓN HITO 32.- EJECUCIÓN - Coordinar el registro oportuno de todas las defunciones ocurridas en el territorio ecuatoriano, a través de la automatización e implementación del registro electrónico de defunciones como parte del CPVBRA	D.9.rar	15/11/2017
36	ASOCIACIÓN HITO 33.- EJECUCIÓN - Evaluaciones y diagnósticos de los procesos de censos basados en registros administrativos en Galápagos, realizado.	E.1.rar	05/12/2017
37	ASOCIACIÓN HITO 34.- EJECUCIÓN - Diagnósticos sobre los resultados del procesamiento de información del piloto continental, realizado	E.2.rar	05/12/2017
38	ASOCIACIÓN HITO 35.- EJECUCIÓN - Coordinar el registro de los movimientos migratorios internacionales ocurridos a nivel nacional a través de la automatización e implementación del registro electrónico de migraciones como parte del CPVBRA, aprobado.	E.3.rar	09/02/2018
39	ASOCIACIÓN HITO 36.- EJECUCIÓN - Coordinar el registro oportuno de los nacimientos ocurridos en territorio ecuatoriano, aprobado.	E.4.rar	09/02/2018
40	ASOCIACIÓN HITO 37.- EJECUCIÓN - Coordinar el registro y actualización de la Residencia a nivel nacional para toda la población, aprobado.	E.5.rar	09/02/2018
41	ASOCIACIÓN HITO 38.- EJECUCIÓN - Coordinar la construcción del registro base de vivienda a partir de catastros municipales e información geográfica, en el ámbito de CPVBRA, aprobado	E.6.rar	09/02/2018
42	ASOCIACIÓN HITO 39- CIERRE.- Documentación de cierre de proyecto, elaborado	E7.rar	07/03/2018
43	Re estructuración de hitos	C.3.rar	28/11/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldaz Flores, Paola Tatiana	Miembro de equipo de la Dirección de Registros Administrativos	Miembro de equipo	paola_aldez@inec.gob.ec	
Escobar Quinche, Angel Fernando	Jefe de Gestión de Sistemas de Registros Administrativos	Jefe de Unidad	Fernando_Escobar@inec.gob.ec	
Jaime Cujilán, Yandre Luis	Jefe de Gestión de Planificación y Metodologías de Registros Administrativos	Jefe de Unidad	Yandre_Jaime@inec.gob.ec	
Rengel Sandoval, Hernán Vicente	Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	hernan_rengel@inec.gob.ec	
Valle Piñuela, Rosa Catalina	Directora de Cartografía Estadística y Operación de Campo	Directora de Cartografía Estadística y operaciones de Campo	catalina_valle@inec.gob.ec	
Villota Freire, José Antonio	Jefe de Gestión de Innovación para Automatizar la Producción Estadística	Jefe de Unidad	jose_villota@inec.gob.ec	
