

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**

**Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)**

**Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías (DINME)**

**PROYECTO: K002 INEC - Formulación de métricas y metodologías para el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030"**

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | García Gamboa, Nataly Raquel (nataly_garcia@inec.gob.ec)     |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Cervantes Esparza, James Reinaldo                            | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Moreno Enríquez, Lorena Elizabeth                            | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 31210000.0000.382701                                         | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                         | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 5,985.54                |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 17/05/2018                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2018              |
| Modificado por:                | García Gamboa, Nataly Raquel                                 | Fecha del siguiente Hito:       | 13/04/2018              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto de inversión busca dotar de métricas y metodologías a fin de ayudar al monitoreo y evaluación oportuna y fiable del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Agenda de Desarrollo 2030, lo que a su vez coadyuvará a un mejor diseño, seguimiento y evaluación de la política pública.

De manera concreta, el proyecto busca formular indicadores sociales, económicos y ambientales relacionados con el PND, y así como métricas y metodologías para el cálculo de indicadores Tier II y Tier III de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Contar con información oportuna, confiable, relevante y específica es primordial para la toma de decisiones. Así, el proyecto de inversión aporta para una mejor gestión en el sector público, la toma de decisiones informadas en el sector privado, y el empoderamiento de la sociedad para pedir cuentas a sus mandatarios.

**Beneficios Cualitativos**

La formulación de indicadores para el PND y la Agenda de Desarrollo Sostenible permitirá contar con información oportuna, confiable, relevante y específica para la toma de decisiones en el sector público y privado. En cuanto al sector público, se tendrá mejores herramientas para mejorar la gestión pública, a través del correcto seguimiento y evaluación de políticas, proyectos y planes nacionales o locales, en relación con su aporte al logro de los objetivos nacionales de desarrollo o al cumplimiento de la agenda internacional de desarrollo.

La formulación de indicadores que den cuenta de las realidades, problemas y necesidades específicas de la ciudadanía tiene un carácter inclusivo, pues permite dar voz a los que no tienen voz, al mostrar la realidad de todos los sectores de la población, en especial de los más vulnerables, y empoderar a la sociedad para pedir cuentas a sus mandatarios.

**Tipo de Beneficiario**

Los principales demandantes de los indicadores productos formulados por el proyecto son la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y la Organización de las Naciones Unidas como entes de monitoreo de la ejecución de las herramientas de planificación.

Otros demandantes serán las instituciones públicas encargadas de ejecutar políticas o plantear regulaciones en los ámbitos económicos, sociales y ambientales relacionados con los indicadores producidos en el proyecto. En un mapeo inicial de las instituciones beneficiarias de este proyecto se ha identificado a 14 instituciones de la Función Ejecutiva, 2 instituciones de la Función Judicial, 7 instituciones de la Función de Transparencia y Control Social, 245 Gobiernos Autónomos Descentralizados. A estas instituciones debería sumarse las 30 universidades públicas y 26 universidades privadas, quienes podrían utilizar las cifras, estudios e investigaciones generadas en este proyecto para fines educativos e investigativos.

Finalmente, la demanda de los productos generados en el proyecto viene dada por la ciudadanía en general, que pueden hacer uso de los cifras para fines educativos, investigativos, laborales, de información, de control social, entre otros. Para el presente análisis, se identifica a una población efectiva para 2018 de 8.408.510 personas, que corresponde a la población que ha cursado o se encuentra cursando educación media o secundaria o más y que tiene más de 15 años proyectada al 2018. Se delimita a este grupo porque es un grupo poblacional que tiene mayores probabilidades de hacer uso de estadísticas generadas por el proyecto por fines académicos, investigativos, laborales o de información.

### Restricciones

**TIEMPO:** El proyecto está planteado para un periodo de dos años. Sin embargo, algunos de los indicadores no tienen aún una fuente de información definida, por lo que se podría necesitar de nuevas operaciones estadísticas o mejoras a las operaciones existentes para recabar la información necesaria. Este proceso, podría llevar un tiempo mayor al contemplado en el proyecto.


**COSTO:** El presupuesto total planificado para el proyecto es de \$ 228.399,29 para sus dos años de ejecución, lo que corresponde al mínimo presupuesto requerido para llevar a cabo el proyecto. En caso de no recibir la asignación presupuestaria requerida no se podría cumplir con las actividades del proyecto a cabalidad, lo que a su vez afectaría el alcance e impacto final del proyecto.

**ALCANCE:** La información disponible tiene limitación en cuanto a su representatividad y desagregación. Esto afectaría el alcance del proyecto, puesto que los indicadores calculados tendrían un nivel limitado de desagregación y representatividad.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 42.86 %

Fecha de Inicio: 02/01/2018

Fecha de Fin: 31/12/2018

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

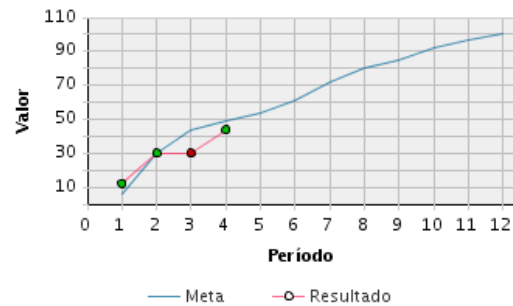

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2018                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 6 %                         | 30 % | 44 % | 49 % | 54 % | 61 % | 72 % | 80 % | 85 % | 92 % | 97 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 12 %                        | 30 % | 30 % | 44 % |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>ABRIL 2018</b><br><br>1. Se ejecuta \$279,22 correspondiente al pago de fondos de reserva de los funcionarios Juan Serrano y Andrés Silva quienes trabajaron hasta el 31 de marzo de 2018 dentro del proyecto "Formulación de métricas y metodologías para el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030" y quienes tienen derecho al pago de los fondos de reserva equivalentes al 8.33% de su remuneración mensual ya que trabajan en la institución por más de un año. Se procedió a cancelar los fondos de reserva de marzo 2018 con CUR No. 757 del 06 de abril de 2018.<br><br>2. En respuesta al memorando Nro. INEC-DIPLA-2018-0240-M de fecha 23 de marzo de 2018, en el que la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica solicita a la Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información operativizar el proceso de cancelación del proyecto de inversión en el sistema GPR, se remite mediante correo electrónico los informes ejecutivos y técnicos para la cancelación del proyecto en GPR y la baja de anteproyecto en SENPLADES, a fin de que sean revisados antes de su envío formal. | García Gamboa, Nataly Raquel | 17/05/2018 - 08:43 AM         |
| <b>MARZO 2018</b><br><br>1. Documento metodológico del índice de prevalencia de seguridad alimentaria elaborado (Hito asociado 6).- Durante este mes se trabajó en la elaboración y revisión del documento metodológico sobre el cálculo del índice de prevalencia de inseguridad alimentaria en el contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | García Gamboa, Nataly Raquel | 06/04/2018 - 03:17 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>ecuatoriano. Se programa que el documento sea publicado posteriormente como parte de las revisatas metodológicas institucionales.</p> <p>2. Se inicia el proceso para el cambio de fase a "cancelado" del proyecto en el sistema GPR.- Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2018-0240-M de fecha 23 de marzo de 2018, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica solicita a la Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, operativizar el proceso de cancelación del proyecto de inversión en el sistema GPR, teniendo como antecedente que mediante oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0190-OF la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo solicita al INEC la "no ejecución del proyecto". En respuesta al memorando mencionado se empieza la elaboración de los documentos correspondientes para la cancelación del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                               |
| <p><b>FEBRERO 2018</b></p> <p>1. Agenda para la construcción de indicadores PND y ODS, elaborada (Hito cumplido 3).- Se elabora la agenda para la construcción de los indicadores PND y ODS contemplados en el proyecto de inversión. La agenda comprende las principales actividades a realizar y los tiempos planificados de cumplimiento.</p> <p>2. Herramientas de gestión de proyecto elaboradas (Hito cumplido 4).- Se elabora el acta de constitución del proyecto, la que fue aprobada mediante memorando N° INEC-INEC-2018-0120-M de fecha 19 de febrero del 2018. Se actualiza la información en el sistema GPR, mismo que servirá para la gestión del proyecto especialmente en lo que se refiere a las tareas de monitoreo y control</p> <p>3. Se actualiza la fase del proyecto de "planeación" a "ejecución" en el sistema GPR.</p> <p><b>ENERO 2018</b></p> <p>1. Documentos de postulación del proyecto elaborados (Hito cumplido 1).- Se elaboró los documentos para la postulación del proyecto de inversión ante SENPLADES: ficha del proyecto, matriz de marco-lógico, análisis de la viabilidad económica y cronograma de contratación. Los documentos de postulación se elaboraron con anticipación a la fecha inicial del proyecto. Sin embargo, en el sistema GPR se los reporta como fecha real a la fecha comprometida, dada la configuración del sistema.</p> <p>2. Plan de Dirección de proyecto aprobado (Hito cumplido 2).- Se elabora el Plan de Dirección de Proyecto para 2018, mismo que fue aprobado mediante memorando Nro. INEC-INEC-2017-1004-M, del 29 de diciembre del 2017. La elaboración y aprobación del Plan de Dirección de Proyecto se realizó con anticipación a la fecha de inicio del proyecto. Sin embargo, en el sistema GPR se los reporta como fecha real a la fecha comprometida, dada la configuración del sistema.</p> <p>3. Cálculo de la tasa de pobreza multidimensional según la metodología actualizada. (Hito cumplido 5).- Se actualiza la metodología de cálculo de la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM) según la última homologación para el cálculo de la escolaridad. Con la metodología actualizada, se calcula la Tasa de Pobreza Multidimensional para diciembre del 2017 y se publica los resultados oficiales en la página institucional del INEC. El cálculo de la Tasa de Pobreza Multidimensional se debió realizar con anticipación a lo inicialmente planificado a fin de ajustarse al calendario de publicación de cifras estadísticas del INEC.</p> | García Gamboa, Nataly Raquel | 05/03/2018 - 02:55 PM         |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                                                                                     | Fecha de última actualización | Responsable                 | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| El dictamen no favorable de SENPLADES para la ejecución del proyecto CAUSÓ que el proyecto finalizara antes de lo programado | 17/05/2018                    | Nataly Raquel García Gamboa | 100      | 100     | 100          | 0/1                         |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de última actualización | Responsable                      | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>El retraso en la firma del convenio de cooperación con Equity for Children CAUSARÍA retraso en la elaboración de la propuesta metodológica para el cálculo del indicador ODS de niños menores a 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado. | 17/05/2018                    | Lorena Elizabeth Moreno Enríquez | 30 %         | 60      | 18           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | ANTEPROYECTO: Documentos de postulación del proyecto elaborados                                    | 4-Inicio de Trabajo       | 10/01/2018         |                | 10/01/2018 |    | Sí            | 4.0           |
| 2  | DEFINICIÓN: Plan de Dirección de proyecto aprobado                                                 | 4-Inicio de Trabajo       | 11/01/2018         |                | 11/01/2018 |    | Sí            | 2.0           |
| 3  | PLANEACIÓN: Agenda para la construcción de indicadores PND y ODS, elaborada.                       | 4-Inicio de Trabajo       | 09/02/2018         |                | 09/02/2018 |  | Sí            | 16.0          |
| 4  | PLANEACIÓN: Herramientas de gestión de proyecto elaboradas                                         | 4-Inicio de Trabajo       | 23/02/2018         |                | 19/02/2018 |  | Sí            | 2.0           |
| 5  | EJECUCIÓN: Cálculo de la tasa de pobreza multidimensional según la metodología actualizada         | 5-Entregables Intermedios | 26/02/2018         |                | 16/01/2018 |  | Sí            | 6.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Documento metodológico del índice de prevalencia de seguridad alimentaria publicado     | 9-Entregables Formales    | 28/03/2018         |                | 10/04/2018 |  | Sí            | 14.0          |
| 7  | EJECUCIÓN: Propuesta metodológica para el cálculo del indicador de agua residual tratada elaborada | 5-Entregables Intermedios | 13/04/2018         | 13/04/2018     |            |  | No            | 5.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Propuesta metodológica para los indicadores de transparencia y corrupción elaborada     | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         | 31/05/2018     |            |  | No            | 5.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Ficha metodológica del indicador de agua residual tratada homologada                    | 9-Entregables Formales    | 08/06/2018         | 08/06/2018     |            |  | No            | 2.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Ficha metodológica del índice de prevalencia de seguridad alimentaria homologada        | 9-Entregables Formales    | 08/06/2018         | 08/06/2018     |            |  | No            | 2.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Cálculo del indicador de agua residual tratada, realizado                               | 5-Entregables Intermedios | 22/06/2018         | 22/06/2018     |            |  | No            | 3.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 12 | EJECUCIÓN: Cálculo preliminar de indicadores de transparencia y corrupción, realizado.                                                              | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2018         | 27/07/2018     |            |    | No            | 5.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Documento analítico de agua residual tratada elaborado                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2018         | 30/07/2018     |            |    | No            | 6.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Propuesta metodológica para el cálculo del indicador ODS de niños menores a 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado elaborada | 5-Entregables Intermedios | 17/08/2018         | 17/08/2018     |            |    | No            | 5.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Documento analítico de agua residual tratada publicado                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 28/08/2018         | 28/08/2018     |            |    | No            | 3.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Propuesta metodológica para el cálculo del índice de habitabilidad elaborada                                                             | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2018         | 28/09/2018     |            |    | No            | 5.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Cálculo del indicador ODS de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado, realizado                              | 5-Entregables Intermedios | 29/10/2018         | 29/10/2018     |            |    | No            | 5.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Ficha metodológica del índice de habitabilidad homologada                                                                                | 9-Entregables Formales    | 29/10/2018         | 29/10/2018     |            |    | No            | 2.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Propuesta metodológica para el indicador de acceso sostenible a fuentes mejoradas de agua elaborada                                      | 5-Entregables Intermedios | 23/11/2018         | 23/11/2018     |            |  | No            | 5.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Avance del documento metodológico del índice de habitabilidad, elaborado.                                                                | 5-Entregables Intermedios | 24/12/2018         | 24/12/2018     |            |  | No            | 3.0           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                  | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Agenda de trabajo para la construcción de los indicadores PND y ODS aprobada                               |  | 100.00 %          | 1    | 1                     | 02/01/2018      | Ene-Jun                    |
| 2 | Porcentaje de avance en la homologación de fichas metodológicas de los indicadores PND                     |  | -                 | -    | -                     | 02/01/2018      | -                          |
| 3 | Porcentaje de avance en el cálculo de indicadores PND                                                      |  | 100.00 %          | 0.25 | 0.25                  | 02/01/2018      | Ene-Mar                    |
| 4 | Porcentaje de avance en la homologación de fichas metodológicas de los indicadores de la Agenda 2030 (ODS) |  | -                 | -    | -                     | 02/01/2018      | -                          |
| 5 | Porcentaje de avance en el cálculo de indicadores ODS                                                      |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 02/01/2018      | Ene-Mar                    |
| 6 | Porcentaje de avance en la publicación de documentos analíticos y metodológicos de indicadores PND y ODS   |  | -                 | -    | -                     | 02/01/2018      | -                          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                              | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 7 | Porcentaje de avance en la publicación de investigaciones científicas entorno a métricas para el desarrollo sostenible |  | -                 | -    | -                     | 02/01/2018      | -                          |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00        |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 5,985.54 ** |
| Costo Total:                  | 5,985.54    |
| Total Devengado:              | 6,261.09    |
| % Costo Total Devengado:      | 104.60 %    |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 104.60 %

## Perfil Económico 2018

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total    |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 5,985.54          | 0.00         | 5,985.54 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00     |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 5,985.54          | 0.00         | 5,985.54 |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 5,985.54          | 0.00         | 5,985.54 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00     |
| Planeado - Codificado (2018)                            |              | 0.00              |              |          |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 5,985.54          | 0.00         | 5,985.54 |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 6,261.09          | 0.00         | 6,261.09 |
| Pagado Real                                             | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00     |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00     |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 5,985.54          | 0.00         | 5,985.54 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 104.60 %          | 0.00 %       | 104.60 % |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00     |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00     |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

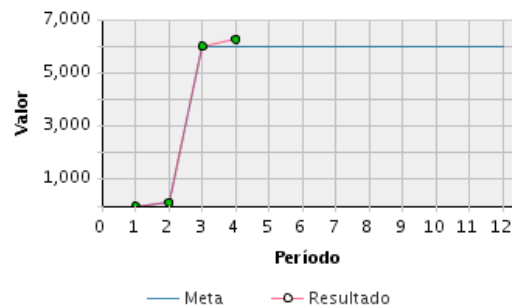

## Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 128.67                     | 125.00              | 128.67                       | 125.00                | 97.15 %          |  | 2.09 %       |
| Mar                      | 5,856.87                   | 5,856.87            | 5,985.54                     | 5,981.87              | 99.94 %          |  | 99.94 %      |
| Abr                      | 0.00                       | 279.22              | 5,985.54                     | 6,261.09              | 104.60 %         |  | 104.60 %     |
| May                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Jun                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Jul                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Ago                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Sep                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Oct                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 5,985.54                     |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>5,985.54</b>            | <b>6,261.09</b>     |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                   | Incrementar la investigación científica y metodológica, en el área de competencia de DINME, MEDIANTE la elaboración de los estudios propuestos |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                                                                                  | Archivo                                                           | Fecha de Alta |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Acta de constitución PDP Formulación de Métricas y Metdologías                                          | Acta_de_constitución_P_formulacion_de_metricas_y_metodologias.pdf | 23/03/2018    |
| 2 | ASOCIACIÓN HITO 1.- Documentos de postulación del proyecto elaborados                                   | A1.rar                                                            | 05/03/2018    |
| 3 | ASOCIACIÓN HITO 2.- Plan de Dirección de proyecto aprobado                                              | A2.pdf                                                            | 05/03/2018    |
| 4 | ASOCIACIÓN HITO 3.- Agenda para la construcción de indicadores PND y ODS, elaborada                     | A3.rar                                                            | 05/03/2018    |
| 5 | ASOCIACIÓN HITO 4.- Herramientas de gestión de proyecto elaboradas.                                     | A4.pdf                                                            | 05/03/2018    |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO 5.- Cálculo de la tasa de pobreza multidimensional según la metodología actualizada.    | A5.rar                                                            | 05/03/2018    |
| 7 | ASOCIACIÓN HITO 6.- Documento metodológico del índice de prevalencia de seguridad alimentaria publicado | A6.pdf                                                            | 25/04/2018    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                           | Rol               | Puesto                                                            | Correo Electrónico           | Teléfono(s) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| García Gamboa, Nataly Raquel     | Líder de proyecto | Jefe de la Gestión de Innovación en Métrica Social y Demográfica  | nataly_garcia@inec.gob.ec    | ext. 1616   |
| Jimenez León, Gianella Xiomara   | Miembro de equipo | miembro de equipo                                                 | gianella_jimenez@inec.gob.ec |             |
| Pozo, Mónica                     | Miembro de equipo | miembro de equipo                                                 | monica_pozo@inec.gob.ec      |             |
| Serrano Mera, Juan Carlos        | Miembro de equipo | Jefe de la Gestión de Innovación en Métrica Económica y Ambiental | juan_serrano@inec.gob.ec     | 2448871     |
| Serrano Piedra, Melody Stephanie | Miembro de equipo | miembro de equipo                                                 | melody_serrano@inec.gob.ec   |             |
