

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K005 INEC-Actualización del Registro Social

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (patricio_rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382804	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,097,319.01
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/07/2019
Fecha de última actualización:	09/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/07/2019
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2018

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Objetivo Operativo al que se alinea.- Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.

Propósito.- Generar información que permita la identificación y selección de potenciales beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".

Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan "Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos

- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES, permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

Localidad de Impacto:- Nacional

Costo: 18'466.362,17

Línea Base: -N/A

Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas en las áreas a intervenir.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)

Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7'816.489 personas registradas.

Restricciones

Tiempo.- El proyecto tendrá una duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el 31 de julio del 2019)

Costo.- 18'466.362,17

Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través de encuestas mediante aplicativo móvil.

Descripción del Producto Final.-

Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Restricciones


- a) Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
- b) Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
- c) Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 54.07 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Fin: 31/07/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

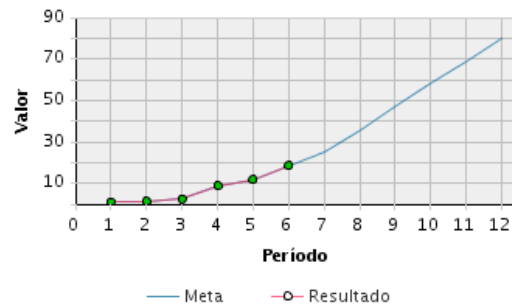

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	1 %	1 %	2 %	9 %	12 %	19 %	25 %	36 %	47 %	58 %	69 %	80 %
	Avance real acumulado											
	1 %	1 %	2 %	9 %	12 %	19 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2018 No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscrito el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, a la fecha no ha sido efectiva (HITO 10. asociado).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	15/10/2018 - 12:04 PM
AGOSTO 2018 No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC. (HITO 9. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/10/2018 - 02:49 PM
JULIO 2018 No se inició con la ejecución del operativo de campo, con la intervención de hogares socializados, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC.(HITO 8. asociado) En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo del Personal preseleccionado; Ciudad de Sto Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y en la Zona Centro (Ambato), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para el inicio del proyecto. (HITO-7. CUMPLIDO).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/09/2018 - 05:39 PM
JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administración Central	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:41 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-7. asociado)		
JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coord. Zonales y en Administración Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:15 AM
MAYO-2018 Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/07/2018 - 04:03 PM
ABRIL-2018 Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido) Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el proyecto (HITO-4. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:16 AM
MARZO-2018 Se suscribieron los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
FEBRERO-2018 Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
ENERO-2018 Se realizó observaciones al formulario y manual enviado por SENPLADES- (HITO 1. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 08:52 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN"-revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo revisado (formulario y manual)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.8
2	PLANEACIÓN".- Ficha técnica del proyecto definida	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.64
3	PLANEACIÓN".- Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.96
4	PLANEACIÓN".-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados	5-Entregables Intermedios	13/04/2018		13/04/2018		Sí	2.56
5	PLANEACIÓN".- Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado	9-Entregables Formales	23/04/2018		23/04/2018		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN.-Instructivos de diligenciamiento del formulario	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	2.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Control de Cobertura elaborados							
7	EJECUCIÓN.-Personal preseleccionado capacitados	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	6.92
8	EJECUCIÓN.-Hogares a intervenir socializados	5-Entregables Intermedios	31/07/2018	31/07/2018			No	6.12
9	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (agosto)	5-Entregables Intermedios	31/08/2018	31/08/2018			No	11.04
10	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (septiembre)	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	11.04
11	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (octubre)	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	11.04
12	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (noviembre)	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	11.04
13	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre)	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	11.04
14	EJECUCIÓN-Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(enero-marzo 2019)	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	9.0
15	EJECUCIÓN- Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(abril-junio 2019)	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	9.0
16	EJECUCIÓN- Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(julio 2019)	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de viviendas ocupadas con relación al total de viviendas ocupadas		-	-	-	01/08/2018	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,097,319.01 **
Costo Total:	9,612,953.83
Total Devengado:	89,174.72
% Costo Total Devengado:	0.93 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.93 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,010,588.35	0.00	1,010,588.35
Ppto. Externo Planeado	0.00	3,086,730.66	0.00	3,086,730.66
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	640,180.67	0.00	640,180.67
Ppto. Codificado	0.00	4,097,319.01	0.00	4,097,319.01
Ppto. Comprometido	0.00	211,268.45	0.00	211,268.45
Planeado - Codificado (2018)		-3,086,730.66		
Programado a Devengar	0.00	4,097,319.01	0.00	4,097,319.01
Ppto. Devengado	0.00	89,174.72	0.00	89,174.72
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	4,097,319.01	0.00	4,097,319.01
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	2.18 %	0.00 %	2.18 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

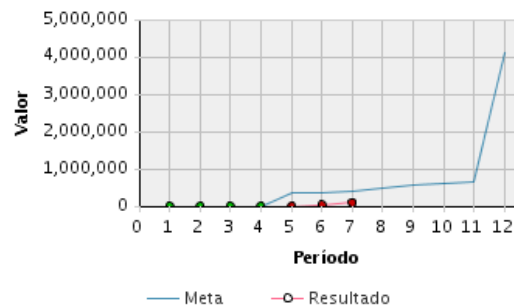

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	354,343.25	0.00	354,343.25	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	20,628.23	21,244.18	374,971.48	21,244.18	5.67 %		0.52 %
Jul	39,303.23	67,930.54	414,274.71	89,174.72	21.53 %		2.18 %
Ago	70,304.90		484,579.61				
Sep	78,624.80		563,204.41				
Oct	23,939.86		587,144.27				
Nov	42,680.32		629,824.59				
Dic	3,467,494.42		4,097,319.01				
Total	4,097,319.01	89,174.72					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el análisis cuantitativo en operaciones estadísticas sociodemográficas MEDIANTE la elaboración de investigaciones metodológicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005	ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf	01/06/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo"	A.1.pdf	10/07/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 2. "Ficha técnica del proyecto definida"	A.2.pdf	10/07/2018
4	ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)"	A.3.pdf	10/07/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados"	A.4.pdf	10/07/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado"	A.5.pdf	10/07/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados"	A.6.pdf	10/07/2018
8	ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado capacitado"	A.7.pdf	14/08/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Abril, Martha	Técnica	Miembro de equipo	marha_abril@inec.gob.ec	
Castillo Castillo, Cristina Cecivel	Técnica	Analista	cristina_castillo@inec.gob.ec	
Haro Ibarra, Marlene Azucena	Técnica	Miembro de equipo	marlene_haro@inec.gob.ec	
Mier Sanchez, Galo Anibal	Técnico	Miembro de equipo	galo_mier@inec.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Lider de Proyecto	Analista Sociodemográfica	patricio_rivas@inec.go b.ec	
Tipán, vladimir	Técnico	Analista	Vladimir_Tipan@inec.go b.ec	
