

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K005 INEC-Actualización del Registro Social

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Rivas Villalba, Edwin Patricio (patricio_rivas@inec.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Castillo Añazco, Oscar Roberto | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Albán Fernández, Andrés Gregorio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Organización / Cultura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 30400000.0000.382804 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 2 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,041,811.17 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Donaciones | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2018 - 31/12/2019 |
| Fecha de última actualización: | 06/09/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/07/2019 |
| Modificado por: | Rivas Villalba, Edwin Patricio | Fecha del siguiente Hito: | 30/09/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Objetivo General: Levantar información socio económico en los hogares de los sectores priorizados por SENPLADES, para los años 2018 y 2019, con el propósito de actualizar los datos del Registro Social; e identificar potenciales beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a nivel de familias como de individuos.

Objetivos Específicos:

1. Actualizar la información de los hogares en las tres provincias afectadas por la catástrofe natural y los 2116 sectores no cubiertos en el operativo 2013 2014.
2. Identificar posibles beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a través del Levantamiento de información socioeconómica en los hogares de las provincias y sectores priorizados.

Propósito.- Generar información que permita la identificación y selección de potenciales beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".

Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan "Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos

- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES, permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

Localidad de Impacto:.- Nacional

Costo: 18'466.362,17

Línea Base: -N/A

Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Producto Final 2019:

1. Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
2. Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
3. Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas en las áreas a intervenir.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)
 Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7'816.489 personas registradas.


Restricciones

Tiempo.- El proyecto tendrá un duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el 31 de julio del 2019)
 Costo.- 18'466.362,17
 Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través de encuestas mediante aplicativo móvil.
 Descripción del Producto Final.-
 Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.
 a) Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
 b) Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
 c) Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.38 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

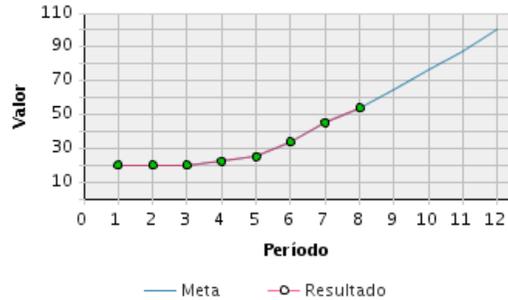

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 20 % | 20 % | 20 % | 22 % | 25 % | 34 % | 45 % | 54 % | 65 % | 76 % | 88 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 20 % | 20 % | 20 % | 22 % | 25 % | 34 % | 45 % | 54 % | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| AGOSTO 2019 Se realizó el levantamiento en el mes de Agosto cumpliendo la fase 7 del proyecto "Actualización del Registro Social", y los procesos necesarios para el levantamiento del mes de Septiembre, también se realizó la capacitación del personal civil del proyecto. (HITO-25. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 06/09/2019 - 12:14 PM |
| JULIO 2019 En este mes se levantaron de acuerdo a la programación 42.498 viviendas 5,16% de las viviendas programadas totales llegando a un acumulado total del 23, 32 %. | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:42 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2019</p> <p>De acuerdo a la programación establecida, en este mes se realizó la re-instrucción al personal que participa en la Actualización del Registro Social, se realizaron las contrataciones del personal de campo y de los vehículos necesarios para el operativo de campo, y a partir del 15 de junio se comenzó la socialización a las viviendas de los sectores seleccionadas y desde el 18 de junio se inició con el levantamiento de la información. Además indicar que en la zonal del Litoral existió un retraso en la contratación de vehículos lo que ocasionó que alrededor de 40 equipos de levantamiento salgan al quinto día del operativo según lo planificado.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:41 AM |
| <p>MAYO 2019</p> <p>En este mes las zonales terminan en realizar el pedido de contratación de vehículos, como también la de confirmación de participantes necesarios para el levantamiento de la información de campo.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:41 AM |
| <p>ABRIL 2019</p> <p>Mediante Memorando INEC-INEC-2019-0380-M, el señor Director Ejecutivo aprueba y autoriza se inicie las actividades del Plan de Proyecto RS, con lo que las zonales y Administración tanto Central como Campo, inician los procesos para las diferentes contrataciones de personal civil, vehículos, seguros y viáticos, según PDP aprobado.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:41 AM |
| <p>MARZO 2019</p> <p>Mediante Memorando INEC-CGAF-2019-0430-M, en el que se hace conocer el incremento del techo presupuestario del RS, se procedió a la elaboración del Plan de Proyecto, para la aprobación y ejecución de las diferentes actividades dentro del proyecto,.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:41 AM |
| <p>FEBRERO 2019</p> <p>En este mes se sigue realizando gestiones a fin de que nos transfieran de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo, se ha realizado una revisión de la base de datos proporcionada por SENPLADES, en la cual de emitio observaciones para que sean corregidas.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:40 AM |
| <p>ENERO 2019</p> <p>En este mes se ha realizado gestiones a fin de que se realice la transferencia de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:39 AM |
| <p>DICIEMBRE 2018</p> <p>En este mes se continua con las fases 2 y 3 de levantamiento de información teniendo una cobertura del 8,34%, llegando al 12,45% del total de las fases programadas, en este mes se levantaron 64.114 viviendas, de las cuales 47.322 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:39 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>En este mes se inicia el levantamiento de la información a partir del 16 de noviembre de 2018, en la cual se levanta información con una cobertura del 4,17% de la información total, levantando 42.355 viviendas, de las cuales 30.179 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:38 AM |
| <p>OCTUBRE 2018</p> <p>No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscribio el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, fue dada el 02 de octubre, razón por la cual se realizó una nueva programación en la cual el operativo inicia el 10 de noviembre con el equipo de avanzada y el 16 de noviembre con el equipo de levantamiento de información (HITO 11 asociado).</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 13/08/2019 - 11:33 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscribio el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, a la fecha no ha sido efectiva (HITO 10. asociado).</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 20/11/2018 - 08:41 AM |
| <p>AGOSTO 2018</p> <p>No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC . (HITO 9. asociado)</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 03/10/2018 - 02:49 PM |
| <p>JULIO 2018</p> <p>No se inicio con la ejecución del operativo de campo, con la intervención de hogares socializados, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC.(HITO 8. asociado)</p> <p>En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo del Personal preseleccionado; Ciudad de Sto Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y en la Zona Centro</p> | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 05/09/2018 - 05:39 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| (Ambato), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para el inicio del proyecto. (HITO-7. CUMPLIDO). | | |
| JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-7. asociado) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 09/08/2018 - 11:41 AM |
| JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 09/08/2018 - 11:15 AM |
| MAYO-2018 Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 02/07/2018 - 04:03 PM |
| ABRIL-2018 Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido) Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el proyecto (HITO-4. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 04/06/2018 - 09:16 AM |
| MARZO-2018 Se suscribieron los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 04/06/2018 - 09:00 AM |
| FEBRERO-2018 Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 04/06/2018 - 09:00 AM |
| ENERO-2018 Se realizó observaciones al formulario y manual enviado por SENPLADES-(HITO 1. cumplido) | Rivas Villalba, Edwin Patricio | 04/06/2018 - 08:52 AM |

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. * General. La no contratación de los vehículos necesarios para la ejecución del proyecto, CAUSARÍA retraso en el inicio del levantamiento de información según lo planificado | 14/08/2019 | Edwin Patricio Rivas Villalba | 60 % | 50 | 30 | 1/1 |

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN" -revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo revisado (formulario y manual) | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018 | | 31/01/2018 | | Sí | 0.27 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2 | PLANEACIÓN".- Ficha técnica del proyecto definida | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 0.21 |
| 3 | PLANEACIÓN".- Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios) | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 0.32 |
| 4 | PLANEACIÓN".-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados | 5-Entregables Intermedios | 13/04/2018 | | 13/04/2018 | | Sí | 0.86 |
| 5 | PLANEACIÓN".- Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado | 9-Entregables Formales | 23/04/2018 | | 23/04/2018 | | Sí | 1.34 |
| 6 | EJECUCIÓN.-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 0.94 |
| 7 | EJECUCIÓN.-Personal preseleccionado capacitados | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018 | | 29/06/2018 | | Sí | 2.31 |
| 8 | EJECUCIÓN.-- Personal seleccionado capacitado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 2.04 |
| 9 | EJECUCIÓN- completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 2.04 |
| 10 | EJECUCIÓN-Preparación de material cartográfico a nivel Nacional | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 1.67 |
| 11 | EJECUCIÓN- Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 1.67 |
| 12 | EJECUCIÓN- Hogares a intervenir socializados | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 2.65 |
| 13 | EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre) | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2018 | | 27/12/2018 | | Sí | 3.69 |
| 14 | PLANEACIÓN - Plan de Proyecto elaborado y aprobado | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2019 | | 26/04/2019 | | Sí | 1.0 |
| 15 | EJECUCIÓN - Muestra seleccionada abril - agosto | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 1.0 |
| 16 | EJECUCIÓN - Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2019 | | 30/05/2019 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo abril - agosto | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 2.0 |
| 18 | PLANEACIÓN - Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019 | | 28/06/2019 | | Sí | 1.0 |
| 19 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - junio | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 20 | EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 1.0 |
| 21 | EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo abril - agosto | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 5.67 |
| 22 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - julio | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 11.33 |
| 23 | EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019 | | 30/08/2019 | | Sí | 2.0 |
| 24 | EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019 | | 30/08/2019 | | Sí | 1.0 |
| 25 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - agosto | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 5.67 |
| 26 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - septiembre | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | 30/09/2019 | | | No | 11.33 |
| 27 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - octubre | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | 31/10/2019 | | | No | 11.33 |
| 28 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - noviembre | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | 30/11/2019 | | | No | 11.33 |
| 29 | EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico septiembre - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 13/12/2019 | 13/12/2019 | | | No | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - diciembre | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 11.33 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de cobertura de viviendas ocupadas con relación al total de viviendas ocupadas | | 100.00 % | 0.18 | 0.18 | 01/10/2018 | Abr-Jun |
| 2 | Procentaje de supervisiones realizadas en función de las supervisiones planificadas | | 100.00 % | 0.25 | 0.25 | 15/06/2019 | Ene-Jun |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,041,811.17 ** |
| Costo Total: | 9,612,953.83 |
| Total Devengado: | 3,256,240.20 |
| % Costo Total Devengado: | 33.87 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 33.87 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 535,464.44 | 6,739,602.82 | 0.00 | 7,275,067.26 |
| Ppto. Externo Planeado | 3,086,730.66 | 0.00 | 0.00 | 3,086,730.66 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 640,180.67 | 1,273,458.23 | 0.00 | 1,913,638.90 |
| Ppto. Codificado | 3,622,195.10 | 6,739,602.82 | 0.00 | 10,361,797.92 |
| Ppto. Comprometido | 211,268.45 | 0.00 | 0.00 | 211,268.45 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 3,622,195.10 | 6,739,602.82 | 0.00 | 10,361,797.92 |
| Ppto. Devengado | 2,302,208.35 | 954,031.85 | 0.00 | 3,256,240.20 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 2,302,208.35 | 0.00 | 0.00 | 2,302,208.35 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,319,986.75 | 6,739,602.82 | 0.00 | 8,059,589.57 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 63.56 % | 14.16 % | 0.00 % | 31.43 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 10,704.89 | 0.00 | 10,704.89 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| May | 1,452.46 | 7,817.81 | 12,157.35 | 7,817.81 | 64.31 % | | 0.12 % |
| Jun | 6,830.25 | 2,015.55 | 18,987.60 | 9,833.36 | 51.79 % | | 0.15 % |
| Jul | 320,152.86 | 252,430.43 | 339,140.46 | 262,263.79 | 77.33 % | | 3.89 % |
| Ago | 693,999.07 | 691,768.06 | 1,033,139.53 | 954,031.85 | 92.34 % | | 14.16 % |
| Sep | 414,141.36 | | 1,447,280.89 | | | | |
| Oct | 1,350,891.94 | | 2,798,172.83 | | | | |
| Nov | 1,349,587.54 | | 4,147,760.37 | | | | |
| Dic | 2,591,842.45 | | 6,739,602.82 | | | | |
| Total | 6,739,602.82 | 954,031.85 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 16 | Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información. |
| 17 | Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005 | ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf | 01/06/2018 |
| 2 | ASOCIACION HITO 17_Personal Civil contratado periodo abril_agosto | B.8.pdf | 13/08/2019 |
| 3 | ASOCIACION HITO 18_Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre-diciembre | B.9.pdf | 13/08/2019 |
| 4 | ASOCIACION HITO 19_ Información y sincronización de los hogares levantada - junio | C.1.pdf | 28/08/2019 |
| 5 | ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo" | A.1.pdf | 10/07/2018 |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO 10. "Preparación de material cartográfico a nivel Nacional " | B.1.pdf.pdf | 06/05/2019 |
| 7 | ASOCIACIÓN HITO 11. "Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto " | B.2.pdf.pdf | 06/05/2019 |
| 8 | ASOCIACIÓN HITO 12. "Hogares a intervenir socializados " | B.3.pdf.rar | 06/05/2019 |
| 9 | ASOCIACIÓN HITO 13. "Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre) " | B.4.pdf | 06/05/2019 |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 14 .Plan de Proyecto elaborado y aprobado | B.5.pdf | 06/05/2019 |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 15 .Muestra Seleccionada | B._6.pdf | 06/05/2019 |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 16: EJECUCIÓN -Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre | B.7.pdf | 13/08/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 2."Ficha técnica del proyecto definida" | A.2.pdf | 10/07/2018 |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 20_Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto | C.2.pdf | 28/08/2019 |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 21_Vehículos contratados periodo abril - agosto | C.3.pdf | 28/08/2019 |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO 22_Información y sincronización de los hogares levantada - julio | C.4..pdf | 30/08/2019 |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 23_Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre | C.5.pdf | 02/09/2019 |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO 24_Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre | C.6.pdf | 02/09/2019 |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO 25_Información y sincronización de los hogares levantada - agosto | C.7.pdf | 02/09/2019 |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)" | A.3.pdf | 10/07/2018 |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados" | A.4.pdf | 10/07/2018 |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado" | A.5.pdf | 10/07/2018 |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados" | A.6.pdf | 10/07/2018 |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado capacitado" | A.7.pdf | 14/08/2018 |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO 8. "Personal seleccionado capacitado" | A.8.pdf.rar | 27/12/2018 |
| 26 | ASOCIACIÓN HITO 9. "Completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información " | A.9.pdf.rar | 27/12/2018 |
| 27 | CIERRE PROBLEMA 13/08/2019 | PROBLEMA.pdf | 13/08/2019 |
| 28 | CIERRE RIESGO 13/08/2019 | RIESGO.pdf | 13/08/2019 |
| 29 | REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2018-2019 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL | REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2018-2019.rar | 28/12/2018 |
| 30 | REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2019 | JUSTIF_TEC_REG_SOCIAL.pdf | 19/06/2019 |
| 31 | VERIFICABLE RIESGO 1 | INEC-CGTPE-DIES-2018-0444-M_(3)_(INFORMES_DE_UTILIZACIÓN_DE_RECURSOS).pdf | 28/12/2018 |
| 32 | VERIFICABLES RIESGO 2 | MEMORANDOS_ZONALES_DE_SOLICITUD_VEHÍCULOS.rar | 09/06/2019 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| Abril, Martha | Técnica | Miembro de equipo | marha_abril@inec.gob.ec | |
| Arias, José | Técnico | Miembro de equipo | Jose_Arias@inec.gob.ec | 2544326/1522 |
| Haro Ibarra, Marlene Azucena | Técnica | Miembro de equipo | marlene_haro@inec.gob.ec | |
| Jimenez, Jeanneth | Técnica | Miembro de equipo | Jeanneth_Jimenez@inec.gob.ec | 2544326/1522 |
| Rivas Villalba, Edwin Patricio | Lider de Proyecto | Analista Sociodemográfica | patricio_rivas@inec.gob.ec | |
| Tipán, Vladimir | Técnico | Miembro de equipo | Vladimir_Tipan@inec.gob.ec | 2544326/1522 |
