

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**

**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**

**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K007** Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

|                                |                                                                |                                 |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Urcuango Conumba, Adriana Mabel (adriana_urcuango@inec.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                                 | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Albán Fernández, Andrés Gregorio                               | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 31210000.0000.382902                                           | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                              | VAN:                            | 0.00                    |
| Víabilidad Técnica:            | Muy Alta                                                       | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 4,132,136.53            |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3   |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                                | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 04/09/2018 - 31/12/2019 |
| Fecha de última actualización: | 06/08/2019                                                     | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2018              |
| Modificado por:                | Urcuango Conumba, Adriana Mabel                                | Fecha del siguiente Hito:       | 30/08/2019              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

La Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, es una operación estadística, que proporciona información para la evaluación y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A partir de EPSPND, se garantiza la sostenibilidad y comparabilidad de información con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, que antes se utilizaba como instrumento de monitoreo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

**Productos:**

Los productos que se entregarán al finalizar el proyecto, permitirán monitorear los 33 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo:

- Presentación de Resultados
- Base de datos
- Formulario
- Sintaxis.
- Tabulados Marco conceptual vigente
- Metodología
- Informe ejecutivo

**Línea base del proyecto**

En los últimos diez años, debido a la frecuencia anual y población objetivo de investigación, la ENEMDU ha sido el instrumento de medición de los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, surge la necesidad de disponer una encuesta específica multitemática, diseñada para la medición de los 35 indicadores del PND; de los cuales 19 fueron considerados para el diseño; 14 se encuentran en construcción y 2 no son factibles de investigar. A partir de lo mencionado, se establece que la línea base son los 19 indicadores de diseño, con una medición actualizada en la ENEMDU de diciembre 2017.

**Objetivo general:**

Generar información que permita el cálculo y seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 a través de una operación estadística, alineada al modelo de producción establecido.

**Objetivos específicos**

- . Planificar, diseñar, construir y validar la operación estadística para la realización de la encuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021.
- . Recolectar la Información por medio de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2017-2022.

**Beneficios Cualitativos**

- La información estadística a partir de la EPSPND, constituye el principal insumo para el monitoreo y evaluación de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de perfiles de la población: sociodemográfico, económico y social, permitirá integrar información básica, relevante y necesaria, para los procesos de planificación y toma de decisiones de los actores de política pública.

- Al ser un proyecto de inversión pública y por la naturaleza de actuar del INEC, que es producir, analizar y difundir información estadística oficial y oportuna. El proyecto genera insumos que son utilizados por los encargados de generar políticas encaminadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

### Beneficios Cualitativos

- Generar indicadores e información actualizada de temas de educación, vivienda hogar, calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, entre otros. A fin de garantizar el seguimiento y evaluación a los múltiples objetivos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.

### Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios que utilizarán la información son las siguientes instituciones:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL)
- Ministerio del interior
- Fiscalía General del Estado
- Consejo de la Judicatura
- Población Estudiantil

Las mismas que se beneficiarán las siguientes temáticas:

- Educación, Datos de la Vivienda y El Hogar, TICS, Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Corrupción y transparencia.
- Educación
- Datos de la Vivienda y El Hogar
- TICS
- Seguridad Ciudadana
- Seguridad Ciudadana
- Corrupción y Transparencia

### Restricciones


No disponer de capital humano especializado en encuestas, para ejecutar el proyecto.  
No contar a tiempo con una marco de muestreo actualizado, para la selección de las viviendas de la encuesta.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 69.63 %

Fecha de Inicio: 04/09/2018

Fecha de Fin: 31/12/2019

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

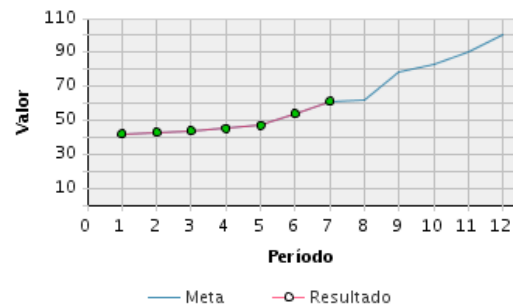

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2019                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 42 %                        | 43 % | 44 % | 45 % | 47 % | 54 % | 61 % | 62 % | 78 % | 83 % | 90 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 42 %                        | 43 % | 44 % | 45 % | 47 % | 54 % | 61 % |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| AGOSTO 2019.-<br>PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 06/08/2019 -<br>08:26 AM      |
| JULIO 2019.-<br>PLANEACIÓN : Construir formularios para la recolección, manuales, presentaciones y plan de inconsistencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 04/07/2019 -<br>10:16 AM      |
| JUNIO 2019<br>EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 04/07/2019 -<br>10:16 AM      |
| MAYO 2019.-<br>PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 04/07/2019 -<br>10:16 AM      |
| ABRIL 2019<br>PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 04/07/2019 -<br>10:14 AM      |
| PERIODO MARZO -2019<br>16.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito cumplido 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 06/05/2019 -<br>10:30 AM      |
| PERIODO FEBRERO -2019<br>15.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 18/03/2019 -<br>04:44 PM      |
| PERIODO ENERO -2019<br>14.-Se definieron los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ESPND (Hito 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 18/03/2019 -<br>04:04 PM      |
| PERIODO: DICIEMBRE 2018<br>12.- Se elaboró Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados (HITO 12)<br>13.- Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc. (HITO 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 11/02/2019 -<br>08:43 AM      |
| PERIODO: NOVIEMBRE 2018<br>8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.<br>9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 03/01/2019 -<br>02:34 PM      |
| PERIODO: NOVIEMBRE 2018<br>8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.<br>9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 03/01/2019 -<br>02:33 PM      |
| PERIODO: OCTUBRE 2018<br>5.- Se elaboraron los informes de los resultados de las pruebas piloto del formulario ESPND. (HITO CUMPLIDO 5)<br>6.- Se diseñó los acuerdos de confidencialidad y autenticación. (HITO CUMPLIDO 6)<br>7.- Se actualizó el material cartográfico que se utilizará en el proyecto ESPND. (HITO CUMPLIDO 7)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                               |
| PERIODO: SEPTIEMBRE 2018<br><br>Descripción:<br>1.- Se elaboró el informe de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ENEMDU. (HITO CUMPLIDO 1)<br>2.- Se elaboró el documento habilitante aprobado por el director ejecutivo, cronograma de trabajo, el presupuesto para el año 2018 (HITO CUMPLIDO 2)<br>3. Se diseñó el formulario y el manual de capacitación del encuestador (HITO CUMPLIDO 4)<br>4. Se identificó los dos clasificadores que se utilizaran dentro del proyecto EPSPND y se diseñó la malla de validación (HITO CUMPLIDO 5). | Urcuango<br>Conumba,<br>Adriana Mabel | 14/11/2018 -<br>01:44 PM      |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de última actualización | Responsable                    | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. * General.</b><br>Deserción del personal a vísperas del inicio de la etapa de recolección de información CAUSARÍA retraso en los tiempos planificados para iniciar del operativo de recolección de información | 06/08/2019                    | Adriana Mabel Urcuango Conumba | 20 %         | 90      | 18           | 0/2                         |
| <b>5- PROYECTO. * General.</b><br>Retraso en la entrega de formularios y manuales para la capacitación causarían el retraso en el inicio del proceso de capacitación al personal                                               | 06/08/2019                    | Adriana Mabel Urcuango Conumba | 70 %         | 10      | 7            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto                                         |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | PLANEACIÓN : Plan de proyecto de la ESPND aprobado.                                | 9-Entregables Formales    | 04/09/2018         |                | 04/09/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 2  | PLANEACIÓN : Indicadores del plan nacional de desarrollo y ODS con fuente EPSPND.  | 5-Entregables Intermedios | 07/09/2018         |                | 07/09/2018 |          | Sí            | 3.0           |
| 3  | PLANEACIÓN : Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 4  | PLANEACIÓN : Instrumentos de análisis y procesamiento diseñados                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 2.0           |
| 5  | EJECUCIÓN : Prueba piloto ejecutada                                                | 5-Entregables Intermedios | 12/10/2018         |                | 12/10/2018 |          | Sí            | 3.0           |
| 6  | EJECUCIÓN:Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad construidos  | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2018         |                | 30/10/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 2.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.    | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2018         |                | 06/11/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 9  | EJECUCIÓN:Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación construidos | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2018         |                | 15/11/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado                            | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados                   | 9-Entregables Formales    | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 4.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 12 | PLANEACIÓN: Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados                       | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2018         |                | 30/12/2018 |    | Sí            | 4.0           |
| 13 | CIERRE:Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) recolectada                   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |    | Sí            | 4.0           |
| 14 | PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.   | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2019         |                | 30/01/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 15 | PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística                            | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019         |                | 28/02/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 16 | PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística                            | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2019         |                | 30/03/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 17 | PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 18 | PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2019         |                | 30/05/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 19 | EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto                                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019         |                | 30/06/2019 |    | Sí            | 7.0           |
| 20 | PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación co          | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2019         |                | 30/07/2019 |    | Sí            | 7.0           |
| 21 | PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019         | 30/08/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse               | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |  | No            | 7.0           |
| 23 | EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad               | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |  | No            | 3.0           |
| 24 | EJECUCIÓN : Verificar Cartografía                                                               | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |  | No            | 2.0           |
| 25 | PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 26 | PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).                      | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |  | No            | 3.0           |
| 27 | EJECUCIÓN : Probar Sistema INFOCAPT y formulario                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2019         | 30/10/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 28 | ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSPND.                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         | 30/11/2019     |            |  | No            | 2.0           |
| 29 | EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado                             | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         | 30/11/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 30 | EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)               | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2019         | 30/12/2019     |            |  | No            | 7.0           |
| 31 | PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2019         | 30/12/2019     |            |  | No            | 3.0           |

# INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                                            | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | C1. Número de instrumentos elaborados                                                                                                |  | 200.00 %          | 1    | 2                     | 04/09/2018      | Abr-Jun                    |
| 2 | C2. Número de viviendas efectivas de la encuesta sobre la muestra teórica (35484 viviendas) durante el operativo                     |  | 100.00 %          | 0    | 35,484                | 04/09/2018      | Abr-Jun                    |
| 3 | C3. Número de inconsistencias detectadas en validación sobre el numero total de variables de la encuesta (aproximado 450 variables). |  | 100.00 %          | 0    | 450                   | 04/09/2018      | Abr-Jun                    |
| 4 | C4. Número de productos (4 tabulados, 4 presentaciones, 4 formularios, 4 base de datos) al fin de proyecto.                          |  | 100.00 %          | 0    | 1                     | 04/09/2018      | Abr-Jun                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 4,132,136.53 ** |
| Costo Total:                  | 5,916,646.53    |
| Total Devengado:              | 1,512,658.71    |
| % Costo Total Devengado:      | 25.57 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 25.57 %

## Perfil Económico 2019

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total        |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado                                          | 143,389.10     | 2,829,860.62      | 0.00         | 2,973,249.72 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 1,334,274.92   | 0.00              | 0.00         | 1,334,274.92 |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 1,485,583.87   | 34,651.21         | 0.00         | 1,520,235.08 |
| Ppto. Codificado                                        | 1,477,664.02   | 2,829,860.62      | 0.00         | 4,307,524.64 |
| Ppto. Comprometido                                      | 183,183.50     | 0.00              | 0.00         | 183,183.50   |
| Planeado - Codificado (2019)                            |                | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 1,477,664.02   | 2,829,860.62      | 0.00         | 4,307,524.64 |
| Ppto. Devengado                                         | 1,302,275.91   | 210,382.80        | 0.00         | 1,512,658.71 |
| Pagado Real                                             | 26,074.28      | 0.00              | 0.00         | 26,074.28    |
| Estimado a fin de año                                   | * 1,302,275.91 | 0.00              | 0.00         | 1,302,275.91 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 175,388.11     | 2,829,860.62      | 0.00         | 3,005,248.73 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 88.13 %      | 7.43 %            | 0.00 %       | 35.12 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

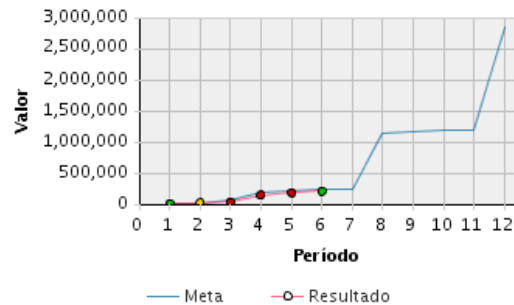

## Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 9,457.41                   | 9,390.65            | 9,457.41                     | 9,390.65              | 99.29 %          |        | 0.33 %       |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 11,314.86                  | 8,741.55            | 20,772.27                    | 18,132.20             | 87.29 %          |  | 0.64 %       |
| Mar                      | 36,627.71                  | 11,685.31           | 57,399.98                    | 29,817.51             | 51.95 %          |  | 1.05 %       |
| Abr                      | 126,907.48                 | 116,441.15          | 184,307.46                   | 146,258.66            | 79.36 %          |  | 5.17 %       |
| May                      | 33,998.30                  | 33,427.10           | 218,305.76                   | 179,685.76            | 82.31 %          |  | 6.35 %       |
| Jun                      | 14,319.29                  | 30,697.04           | 232,625.05                   | 210,382.80            | 90.44 %          |  | 7.43 %       |
| Jul                      | 15,629.69                  |                     | 248,254.74                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| Ago                      | 897,000.70                 |                     | 1,145,255.44                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Sep                      | 15,629.69                  |                     | 1,160,885.13                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Oct                      | 15,621.77                  |                     | 1,176,506.90                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 19,468.86                  |                     | 1,195,975.76                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 1,633,884.86               |                     | 2,829,860.62                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>2,829,860.62</b>        | <b>210,382.80</b>   |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                   | Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información. |
| 17                   | Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.                                |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                 | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | ASOCIACION HITO 1.- PLAN DE PROYECTO DE LA ESPND APROBADO.                                             | A1.pdf  | 09/01/2019    |
| 2  | ASOCIACION HITO 2.- INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ODS CON FUENTE EPSPND.               | A2.pdf  | 09/01/2019    |
| 3  | ASOCIACION HITO 3.- BASES DE DATOS, INFORMES, PRESENTACIONES Y SINTAXIS DISEÑADOS                      | A3.pdf  | 09/01/2019    |
| 4  | ASOCIACION HITO 4.- INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DISEÑADOS                                 | A4.pdf  | 09/01/2019    |
| 5  | ASOCIACION HITO 5: PRUEBA PILOTO EJECUTADA                                                             | A5.pdf  | 09/01/2019    |
| 6  | ASOCIACION HITO 6: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROLES DE CONFIDENCIALIDAD CONSTRUIDOS             | A6.pdf  | 09/01/2019    |
| 7  | ASOCIACION HITO 7: EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada                                     | A7.pdf  | 09/01/2019    |
| 8  | ASOCIACION HITO 8: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.     | A8.pdf  | 09/01/2019    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación construidos | A9.pdf  | 09/01/2019    |
| 10 | ASOCIADO HITO 10 :EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado                              | B1.pdf  | 04/04/2019    |
| 11 | ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados                     | B2.pdf  | 09/01/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                         | Archivo | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 12 | ASOCIADO HITO 12: EJECUCIÓN bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados                      | B3.pdf  | 09/01/2019    |
| 13 | ASOCIADO HITO 13 CIERRE información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) Recolectada.                | B4.pdf  | 09/01/2019    |
| 14 | ASOCIADO HITO 14 PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND. | B5.pdf  | 11/02/2019    |
| 15 | ASOCIADO HITO 15 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística                           | B6.pdf  | 18/03/2019    |
| 16 | ASOCIADO HITO 16 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística                           | B7.pdf  | 01/04/2019    |
| 17 | ASOCIADO HITO 17 PLANEACIÓN: Elaborar Documento Metodológico                                                   | B8.pdf  | 03/06/2019    |
| 18 | ASOCIADO HITO 18 PLANEACIÓN: Elaborar Glosario de Términos                                                     | B9.pdf  | 03/06/2019    |
| 19 | ASOCIADO HITO 19 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto                                                            | C1.pdf  | 06/08/2019    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                          | Rol               | Puesto                    | Correo Electrónico           | Teléfono(s) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Urcuango Conumba, Adriana Mabel | Líder de proyecto | Analista Sociodemográfico | adriana_urcuango@inec.gob.ec |             |
