

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K009 INEC: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU

Líder del Proyecto:	Marín Luna, Irina Elizabeth (irina_marin@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	50610000.0000.382652	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	876,862.09
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/03/2019 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/08/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	10/05/2019

DATOS GENERALES

Descripción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, acorde a su nueva política institucional y plan estratégico, siguiendo el principio de la oferta y demanda estadística, en donde, conjuntamente con los usuarios, definen las necesidades de los temas a investigar, y al ser de interés para el país, evaluar la persistencia de la violencia de género contra las mujeres, una vez que se cuenta con una línea base inicial y con políticas de Estado para erradicar esta problemática en Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, acordó realizar un segundo levantamiento de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, de acuerdo al ámbito de las competencias que regulan a las referidas instituciones, con la finalidad de proveer información estadística fundamental, objetiva y oportuna para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en el país, con el fin de "Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas"; medidas articuladas al cumplimiento del PND.

Es importante recordar que de acuerdo al Programa Nacional de Estadística, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres tiene una periodicidad quinquenal por lo que tenía que realizarse en el 2016 y a pesar de haber sido postulada para ser ejecutada en el año 2016 y 2017, por restricción presupuestaria no se priorizó.

Además esta segunda investigación está dirigida a mantener una línea de continuidad en los diagnósticos de esta población, a través de los indicadores generados en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a partir de la información estadística recolectada por el INEC.

Línea Base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizó el primer levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011 con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial. Los resultados de esta primera investigación muestran la magnitud y persistencia de este problema, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más (60.6%) han sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales por el hecho de ser mujeres.

Objetivo General:

Obtener datos estadísticos sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual, patrimonial) que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como en el privado (hogar, familia, relación de pareja), y sobre el conocimiento o búsqueda de servicio e instancias de justicia para enfrentar la violencia; y sus percepciones sobre la respuesta institucional.

Objetivos Específicos:

1. Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENVIGMU 2018
2. Llevar a cabo el levantamiento de información en el tiempo planificado.
3. Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información
4. Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta

Productos:

DATOS GENERALES

Descripción

Cuadro resumen
Presentación de los principales resultados
Tabulados
Bases de datos
Ficha de indicadores
Diccionario de variables
Sintaxis
Metodología (de la operación estadística)
Formulario
Manual del encuestador

Beneficios Cualitativos

La violencia de género contra la mujer ha sido una problemática largamente debatida en el ámbito nacional e internacional y, producto de ello, se ha formulado un conjunto de instrumentos (tratados, convenios, planes de acción, declaraciones, directrices) con el fin de erradicarla. En el caso de Ecuador, la violencia es un problema estructural que afecta la calidad de vida de las mujeres y que debe ser enfrentado por el Estado con la generación de políticas públicas y a nivel del sistema de justicia, para lo cual es necesario contar con estadísticas actualizadas, exactas y fiables sobre la magnitud de la violencia contra la mujer, las mismas que permitirán diseñar una respuesta apropiada para prevenir y erradicar este problema.

Tipo de Beneficiario

Presidencia de la República
Secretaría de Derechos Humanos
Consejo Nacional para la Igualdad de Género
SENPLADES
Ministerio de Salud
Consejo de la Judicatura
Secretaría Plan toda una vida
Ministerio del Interior
Fiscalía General del Estado
Ministerio de Inclusión Económica y social
ONU Mujeres
UNFPA
EUROSOCIAL
Cooperación Técnica Alemana - GIZ
Académicos e Investigadores

Restricciones

Tiempo: 9 meses

Costo: \$876.862.09

Alcance: La encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres indaga los tipos de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, y gineco-obstétrica, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (escolar, laboral, social, familiar, de pareja y recopila información sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones. La Encuesta mide la violencia ocurrida a lo largo de la vida y la ocurrida en los últimos 12 meses. Aporta datos de las acciones que emprendieron las mujeres violentadas como de búsqueda de información, apoyo o denuncia de lo sucedido en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o con su pareja.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 48.42 %

Fecha de Inicio: 22/03/2019

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
			0 %	6 %	28 %	37 %	47 %	52 %	62 %	67 %	92 %	100 %
	Avance real acumulado											
			0 %	6 %								
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL - 2019 Se elaboró y aprobó el cronograma de actividades de la ENVIGMU 2019 (HITO 1, cumplido) Se elaboró el PDP de la encuesta y fue aprobado por la Dirección ejecutiva, mediante Memorando No. INEC-INEC-2019-0279-M (HITO 2, cumplido) Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2019-0151-M, se envió a la Dirección de Registros Administrativos todos los documentos solicitados para el desarrollo del sistema de ingreso de datos. (HITO 3, cumplido) MAYO - 2019 Se enviaron los formularios de MyC a las coordinaciones zonales, elaboró y aprobó el cronograma de actividades de la ENVIGMU 2019 (HITO 2, cumplido) Se elaboró el PDP de la encuesta y fue aprobado por la Dirección ejecutiva, mediante Memorando No. INEC-INEC-2019-0279-M (HITO 2, cumplido) Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2019-0151-M, se envió a la Dirección de Registros Administrativos todos los documentos solicitados para el desarrollo del sistema de ingreso de datos. (HITO 3, cumplido)	Marín Luna, Irina Elizabeth	19/07/2019 - 04:14 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1- INTERNACIONAL.* General. La no entrega de formularios impresos a tiempo CAUSARÍA el retraso en el inicio del proceso de capacitación y levantamiento de información.	18/04/2019	Irina Elizabeth Marín Luna	80 %	70	56	0/1
1- INTERNACIONAL.* General. El no contar con el suficiente número de personal y vehículos CAUSARÍA retrasos en las diferentes fases del Modelo de Producción Estadística	18/04/2019	Irina Elizabeth Marín Luna	20 %	60	12	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Cronograma revisado y aprobado	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	2.0
2	PLANIFICACIÓN - Plan de proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN - Requerimientos para el desarrollo del sistema de ingreso de datos enviado	5-Entregables Intermedios	15/04/2019		15/04/2019		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN - Formularios de Muestra y Cobertura enviados a Coordinaciones Zonales	5-Entregables Intermedios	10/05/2019	10/05/2019			No	10.0
5	PLANIFICACIÓN - Formularios de control de calidad elaborados y aprobados	5-Entregables Intermedios	10/05/2019	10/05/2019			No	2.0
6	PLANIFICACIÓN - Instrumentos de recolección y capacitación elaborados y aprobados	5-Entregables Intermedios	10/05/2019	10/05/2019			No	5.0
7	PLANIFICACIÓN - Plan de comunicación aprobado	5-Entregables Intermedios	17/05/2019	17/05/2019			No	5.0
8	PLANIFICACIÓN - Manual de ingreso de datos elaborado	5-Entregables Intermedios	21/06/2019	21/06/2019			No	2.0
9	EJECUCIÓN - Agenda de capacitación aprobada	5-Entregables Intermedios	27/06/2019	27/06/2019			No	5.0
10	PLANIFICACIÓN - Informe de prueba piloto de sistema de ingreso entregado	5-Entregables Intermedios	27/06/2019	27/06/2019			No	2.0
11	EJECUCIÓN - Programación del operativo de campo enviada	5-Entregables Intermedios	07/07/2019	07/07/2019			No	10.0
12	EJECUCIÓN - Informes de Control y Cobertura elaborados	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	5.0
13	EJECUCIÓN - Informe de Crítica y codificación elaborado	5-Entregables Intermedios	06/09/2019	06/09/2019			No	5.0
14	EJECUCIÓN - Informe de información validada elaborada	5-Entregables Intermedios	20/09/2019	20/09/2019			No	5.0
15	EJECUCIÓN - Listado de principales indicadores elaborado	5-Entregables Intermedios	25/10/2019	25/10/2019			No	5.0
16	EJECUCIÓN - Presentación de resultados aprobada	5-Entregables Intermedios	20/11/2019	20/11/2019			No	5.0
17	EJECUCIÓN - Base de datos validada	5-Entregables Intermedios	22/11/2019	22/11/2019			No	10.0
18	EJECUCIÓN - Informe de productos elaborados	5-Entregables Intermedios	22/11/2019	22/11/2019			No	10.0
19	CIERRE - Informe técnico de operativo elaborado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	8.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	4 formularios, 1 manual de la encuestadora, 1 manual del supervisor y 1 manual de crítica y codificación elaborados desde abril a hasta mayo		-	-	-	12/04/2019	-

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	de 2019. Personal para trabajar en campo capacitado a agosto de 2019						
2	2.606 sectores y 20.848 viviendas investigadas a agosto de 2019.		-	-	-	12/04/2019	-
3	Base de datos de indicadores de violencia validada a octubre de 2019.		-	-	-	12/04/2019	-
4	Presentación de principales resultados de violencia contra las mujeres a noviembre de 2019.		-	-	-	12/04/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	876,862.09 **
Costo Total:	876,862.09
Total Devengado:	14,529.73
% Costo Total Devengado:	1.66 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 1.66 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Codificado	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Devengado	0.00	14,529.73	0.00	14,529.73
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	1.66 %	0.00 %	1.66 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

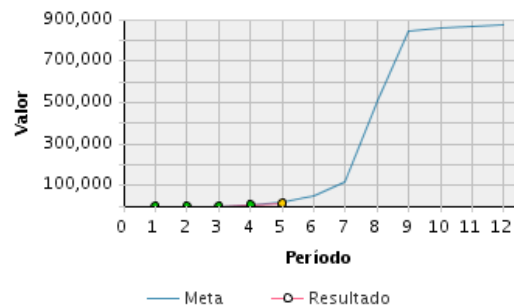

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	6,345.52	6,345.52	6,345.52	6,345.52	100.00 %		0.72 %
May	10,015.79	8,184.21	16,361.31	14,529.73	88.81 %		1.66 %
Jun	34,402.24		50,763.55				
Jul	65,616.84		116,380.39				
Ago	388,359.78		504,740.17				
Sep	338,828.42		843,568.59				
Oct	16,265.97		859,834.56				
Nov	5,124.68		864,959.24				
Dic	11,902.85		876,862.09				
Total	876,862.09	14,529.73					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
