

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)

Dirección de Estudios y Análisis de la Información (DEAN)

PROYECTO: K001 INEC Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador

Líder del Proyecto:	González, Sandra Gabriela (sandra_gonzalez@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	García Mosquera, María Isabel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375416	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,774,865.97
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2018 - 31/10/2020
Fecha de última actualización:	08/08/2019	Fecha de Fin Base:	31/10/2020
Modificado por:	González, Sandra Gabriela	Fecha del siguiente Hito:	15/08/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El INEC intervendrá en el subcomponente 3.2 "Estimación de la Demanda del Mercado Laboral", que forma parte del componente 3. "Fortalecimiento de los mecanismos de Coordinación institucional, impulsando demanda y gestión, así como el monitoreo y la evaluación del proyecto.

Este proyecto se ejecutará en 4 componentes, a través de los cuales se busca la generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas generación de análisis y estudios a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

OBJETIVO GENERAL:

Estimar la Demanda Laboral para el PRETT, que incluye la Generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas, generación de análisis y estudios a través del Laboratorio del Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE) y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1) Levantar una Encuesta Nacional de Demanda Laboral a empresas grandes, medianas y pequeñas.
- 2) Realizar la actualización del marco de Empresas, partiendo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE).
- 3) Generar estudios especializados y análisis de la demanda laboral a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.
- 4) Fortalecer las capacidades institucionales tanto del personal como tecnología.

Beneficios Cualitativos

1. Identificar el nivel de percepción de la preparación con la fuerza de trabajo joven y determinar sus características educativas.
2. Mejorar de la calidad de la ubicación geográfica y su georeferenciación disponible para las empresas pequeñas en el Directorio de Empresas y Establecimientos, el cual se convertirá en el marco muestral de empresas pequeñas que servirán para el posterior levantamiento de información sobre Demanda Laboral en este grupo.
3. Proveer información referente a las empresas que se ubican en el territorio nacional, la cual estará sujeta a análisis y estudios que contribuirán a conocer la situación de la demanda laboral en el país.

Tipo de Beneficiario

- .Instituciones públicas promotoras, rectoras de la educación superior técnica y tecnológica: SENESCYT, CES.
- .MTD, MINTEL
- .Instituciones de educación superior técnico-tecnológica públicas y privadas
- .Población educativa.
- .Sector privado empresarial

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 24 meses


COSTO: \$ 2.353.466,68

ALCANCE: La evolución mensual del mercado laboral en los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios a partir de las vinculaciones, vacantes y desvinculaciones de aproximadamente 859 empresas; el registro de 18.000 empresas para el marco muestral 2018, registros administrativos e información de empleo con desagregaciones como educación superior, educación básica y bachillerato

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 38.30 %

Fecha de Inicio: 01/11/2018

Fecha de Fin: 31/10/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

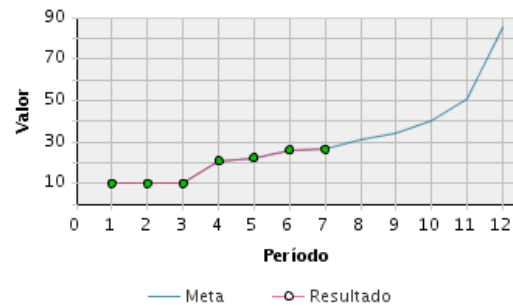

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	10 %	10 %	10 %	21 %	22 %	26 %	26 %	31 %	34 %	40 %	50 %	85 %
	Avance real acumulado											
	10 %	10 %	10 %	21 %	22 %	26 %	26 %					
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2019 Con fecha 25 de julio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de junio 2019 con información del período de referencia mayo 2019. En este período de los 887 registros planificados, se investigaron 883 alcanzando una cobertura de recolección del 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Datos correspondientes al cumplimiento del hito No.13).	González, Sandra Gabriela	06/08/2019 - 01:01 PM
JUNIO 2019 1. Con fecha 30 de junio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de mayo 2019 con información del período de referencia abril 2019. En este período, de los 883 registros planificados se investigaron 879 alcanzando una cobertura de recolección de 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. 2. Una vez finalizadas las pruebas al aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se logró obtener una herramienta informática actualizada y funcional para el proceso de recolección y crítica de la encuesta. 3. Se ejecutó la capacitación de la metodología e instrumentos de recolección de la ENESEM 2018 - incluido en el módulo de Demanda Laboral dirigidos a grandes y medianas empresas. Se cumplieron las metas establecidas para el segundo trimestre del año con respecto a los siguientes indicadores: 1.Tasa de Cobertura Operativa - EG 2.Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO 3.Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO	González, Sandra Gabriela	12/07/2019 - 11:41 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4.17.992 empresas registradas y zonificadas como parte del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) para el primer trimestre del año 2019 5. Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas		
MAYO 2019 Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0069-M con fecha 09 de mayo de 2019, se solicitó la Reprogramación de Hitos GPR del Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, solicitud que se envió acompañada de la Ficha de Justificación Técnica, Actualización y Ajuste de Proyectos Nro. JT-PPP-DEAN- N° 001. Con fecha 10 de mayo de 2019, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0483-M, se autoriza la reprogramación solicitada, en tal virtud, el 13 de mayo del presente año se procede con la reestructuración de hitos en el sistema respectivo. Una vez estructurados los hitos, se procede atender las observaciones enviadas mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0358-M con fecha 06 de mayo de 2019, en donde se solicita la actualización en el Sistema GPR de los indicadores y los riesgos aprobados en el Plan de Dirección del Proyecto 2019; para proceder con lo solicitado, con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0018-M del 16 de mayo de 2019, se solicita a DIPLA se realice la detención de los indicadores reportados en el 2018, adicionalmente con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0019-M del 17 de mayo de 2019, se realiza el envío de la matriz solicitada con las acciones tomadas para solventar las observaciones realizadas al Proyecto en el Sistema GPR (excepto la actualización de indicadores), el 20 de mayo de 2019 se recibe el memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0389-M en donde se comunica la efectiva detención de los indicadores, a partir de este pronunciamiento se procede a la actualización de los indicadores 2019 en el Sistema GPR. Con fecha 31 de mayo de 2019 se entrega el Informe del envío de muestra Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM - incluido el módulo de Demanda Laboral dirigidas a grandes y medianas empresas) adicionalmente con memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2019-0203-M del 23 de mayo de 2019 se realiza la solicitud de envío de la muestra a las Coordinaciones Zonales y a la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de campo.	González, Sandra Gabriela	03/06/2019 - 04:09 PM
ABRIL 2019 1. Se elaboró y se aprobó el Plan de Dirección del Proyecto.-En el memorando Nro. INEC-INEC-2019-0259 del 25 de marzo de 2019, se establece la aprobación del Plan de Dirección del Proyecto. 2. Se realizó la contratación de equipo de apoyo (personal civil) y consultores para el proyecto.- Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2019-0524-M del 25 de abril de 2019 se autoriza la realización de los contratos del personal civil, de igual forma en los memorandos Nro. INEC-CGAF-DIAD-2019-0559-M y 0560-M del 12 de abril de 2019, se autoriza la realización de los contratos del personal consultor.	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 03:03 PM
ENERO A MARZO 2019 1. Mediante Oficio SENESCYT 2019-066 de fecha 17 de Enero de 2019, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador remite la No objeción al Manual de Operaciones (MOP) -Actualización 1. 2. Con oficio Nro. IESS-GS-2019-0007-O del 12 de febrero de 2019 el Dr. Víctor Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social solicita al Ing. Juan Carlos Proaño, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Encargado solicita la inclusión al PAI 2019 y transferencia presupuestaria del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador (EOD PETT)". 3. Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0028-M del 15 de marzo de 2019, la Coordinadora General Técnico de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, Subrogante solicita a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica se gestione la revisión y aprobación del Plan de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador". 4. Con memorando No. INEC-INEC-2019-0259-M, del 25 de Marzo del 2019, el señor Director Ejecutivo Encargado aprueba el Plan de Dirección de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador".	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 02:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018 1. Se dio inicio a la prueba piloto para las empresas pequeñas que se efectuará en el Componente 1 - Encuesta de Demanda Laboral. - Se realiza capacitación al personal que trabajará en la actualización cartográfica correspondiente al Componente 2. Además se generó el punteo de las empresas pequeñas sobre las cuales se realizaría la actualización de información. El avance en georeferenciación de empresas fue de 44,49%. (HITO CUMPLIDO 3.)	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 02:48 PM
NOVIEMBRE 2018 1. Una vez se contó con el oficio No. SENESCYT 2018-59 del 8 de noviembre de 2018, mediante el cual Banco Mundial emite la NO OBJECCIÓN a los procedimientos para la ejecución de Costos de la Encuesta a levantarse por el INEC bajo el Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública Del Ecuador", se procedió a elaborar la planificación del proyecto, el presupuesto y cronograma de actividades, el cual fue aprobado con Memorando No. INEC-INEC-2018-0998-M, de 12 de noviembre del 2018, por el señor Director Ejecutivo del INEC. (HITO CUMPLIDO 1.) 2. Mediante oficio SENESCYT-PRETT-2018-0166-CO de 13 de noviembre, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador informa al INEC que el POA 2018-2020 es aprobado, posteriormente el 15 de noviembre, una vez que se contaba con los insumos necesarios, se procedió a elaborar los documentos sobre los requerimientos de contratación de servicios para ejecutar los procedimientos relativos a costos de la encuesta. (HITO CUMPLIDO 2)	Fuentes Sinche, Diego Patricio	13/05/2019 - 11:02 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Calidad. Que las pequeñas empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información.	25/07/2019	Sandra Gabriela González	20 %	70	14	0/1
5- PROYECTO. Calidad. Que las grandes y medianas empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información.	25/07/2019	Sandra Gabriela González	20 %	70	14	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. La falta de infraestructura tecnológica para procesamiento CAUSARÍA un retraso en las actividades programadas.	25/07/2019	Sandra Gabriela González	10 %	10	1	2/3

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 3

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Plan de Proyecto "Apoyo a la	4-Inicio de Trabajo	29/11/2018		12/11/2018		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador" elaborado							
2	EJECUCIÓN: Documento Costo de la Encuesta Características del Bien / Servicio como requerimiento para la contratación de bienes y servicios elaborados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2018		29/11/2018		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Informe de avance de cobertura sobre georeferenciación de empresas del DICE a Diciembre 2018 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		28/12/2018		Sí	4.0
4	EJECUCIÓN: Informe de Gestión PRETT 2018 de actividades realizadas	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		14/12/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Equipo de consultores para el proyecto contratados	5-Entregables Intermedios	12/04/2019		12/04/2019		Sí	2.5
6	PLANIFICACIÓN: Planificación integral del proyecto realizada	5-Entregables Intermedios	12/04/2019		12/04/2019		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Equipo de apoyo del proyecto contratado	5-Entregables Intermedios	25/04/2019		25/04/2019		Sí	2.5
8	EJECUCIÓN: GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas entregada	5-Entregables Intermedios	13/05/2019		13/05/2019		Sí	1.5
10	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de mayo 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	24/06/2019		24/06/2019		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas elaborado	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/07/2019		25/07/2019		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos (DICE 2017) actualizado y zonificado realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2019	15/08/2019			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos	5-Entregables Intermedios	15/08/2019	15/08/2019			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Económicos Actualizado (2017) realizado							
16	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de julio 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	26/08/2019	26/08/2019			No	0.5
17	EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	06/09/2019	06/09/2019			No	1.0
18	EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	06/09/2019	06/09/2019			No	2.0
19	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de agosto 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	26/09/2019	26/09/2019			No	0.5
20	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de septiembre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/10/2019	25/10/2019			No	0.5
21	EJECUCIÓN: Laboratorio de Demanda Laboral Reforzado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	5.0
22	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de octubre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/11/2019	25/11/2019			No	0.5
23	EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas finalizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	10.0
24	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de noviembre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	0.5
25	EJECUCIÓN: Informe de gestión del Plan de Proyecto 2019 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	12.0
27	EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación FASE 1 de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas finalizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	EJECUCIÓN: Planificación integral del proyecto realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
29	EJECUCIÓN: Validación de la BDD de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas FASE 1 elaborada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
30	EJECUCIÓN: Validación de la BDD del Módulo de Encuesta Demanda Laboral a medianas y grandes empresas elaborada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
31	CIERRE: Documento de Análisis de Información 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Tasa de Cobertura Operativa - EG		45.00 %	0.05	0.0225	03/06/2019	Abr-Jun
2	Porcentaje de ejecución de crítica - EG		-	-	-	01/07/2019	-
3	Tasa de Cobertura Operativa - EP		-	-	-	19/08/2019	-
4	Porcentaje de ejecución de crítica - EP		-	-	-	16/09/2019	-
5	Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO		103.62 %	0.8	0.829	02/04/2019	Abr-Jun
6	Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO		100.00 %	0.1	0.1	08/04/2019	Abr-Jun
7	17.992 empresas registradas y zonificadas como parte del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) para el primer trimestre del año 2019		100.00 %	1	1	02/01/2019	Abr-Jun
8	Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas		100.00 %	0.4	0.4	01/04/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,774,865.97 **
Costo Total:	684,732.06
Total Devengado:	561,565.58
% Costo Total Devengado:	82.01 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 82.01 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	684,732.06	1,760,461.57	0.00	2,445,193.63
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	684,732.06	1,760,461.57	0.00	2,445,193.63
Ppto. Codificado	684,732.06	1,760,461.57	0.00	2,445,193.63
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	684,732.06	1,760,461.57	0.00	2,445,193.63
Ppto. Devengado	14,404.40	547,161.18	0.00	561,565.58
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 14,404.40	0.00	0.00	14,404.40
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	670,327.66	1,760,461.57	0.00	2,430,789.23
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 2.10 %	31.08 %	0.00 %	22.97 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

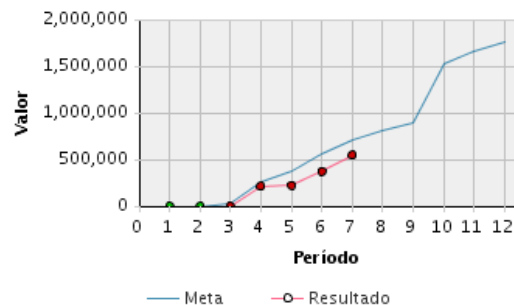

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	24,912.72	0.00	24,912.72	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	240,398.89	210,075.61	265,311.61	210,075.61	79.18 %		11.93 %
May	117,947.23	13,541.38	383,258.84	223,616.99	58.35 %		12.70 %
Jun	182,505.31	148,188.85	565,764.15	371,805.84	65.72 %		21.12 %
Jul	137,236.71	175,355.34	703,000.86	547,161.18	77.83 %		31.08 %
Ago	99,225.97		802,226.83				
Sep	87,419.02		889,645.85				
Oct	627,725.87		1,517,371.72				
Nov	141,245.43		1,658,617.15				
Dic	101,844.42		1,760,461.57				
Total	1,760,461.57	547,161.18					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar mejoras en las distintas etapas de al producción estadística en el área de competencia de DEAN, MEDIANTE la generación de investigaciones científicas y metodológicas, e informes analíticos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Constitución PRETT	Acta_de_Constitución_PRETT.pdf	15/05/2019
2	ASOCIACIÓN HITO 1. Revisión y aprobación del Plan de Proyecto PRETT	A.1.pdf	22/05/2019
3	ASOCIACIÓN HITO 10. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO)	B.1.pdf	02/07/2019
4	ASOCIACIÓN HITO 11. Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas	B.2.pdf	08/07/2019
5	ASOCIACIÓN HITO 12. Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas	B.3.pdf	08/07/2019
6	ASOCIACIÓN HITO 13. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado	B.4.pdf	30/07/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 2. Autorización solicitud ejecución proceso costo de encuesta, suministros	A.2.pdf	22/05/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 3. Informe de Avance de Preubicación y Preparación de material	A.3.pdf	22/05/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 4. Informe de actividades PRETT	A.4.pdf	22/05/2019
10	ASOCIACIÓN HITO 5. Equipo de consultores para el proyecto PRETT contratados	A.5.pdf	22/05/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 6. Plan de trabajo del proyecto PRETT para 2019	A.6.pdf	22/05/2019
12	ASOCIACIÓN HITO 7. Equipo de apoyo del proyecto PRETT contratado	A.7.pdf	22/05/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 8. GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado	A.8.pdf	22/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ASOCIACIÓN HITO 9. Muestra a las Coordinaciones Zonales para asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas	A.9.pdf	31/05/2019
15	Expedientes de Reestructura de Hitos	Expedientes_de_Reestructura_de_Hitos.pdf	14/05/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
García Mosquera, María Isabel	Miembro de equipo	Directora de Estudios y Analisis de la Información	mariaisabel_garcia@inec.gob.ec	
González, Sandra Gabriela	Lider del Proyecto	Responsable Nacional del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador"	sandra_gonzalez@inec.gob.ec	2544326
