

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K006 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382709	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,279,917.33
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/05/2018 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/08/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto:

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una operación estadística que pretende obtener información que identifique la situación de salud reproductiva, materna e infantil, estado nutricional acceso a programas de complementación alimentaria y suplementación profiláctica, entre otros temas de salud de la población. Además esta información permitirá evaluar y dar seguimiento al Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, el cual establece: "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas".

Producto:

Información de alrededor de 46392 viviendas contenida en bases de datos.

Línea de base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde el 16 de julio al 15 de diciembre del 2012, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Objetivo general:

Generar indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana con el fin de evaluar y generar las políticas públicas para la erradicación de la desnutrición crónica en menores de 2 años.

Objetivos específicos:

- .Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENSANUT 2018-2019.
- .Levantar la información de campo.
- .Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información.
- .Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta.

Beneficios Cualitativos

Levantar información de campo permitirá obtener indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana, indicadores que dan cuenta del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen el fin de evaluar y generar políticas públicas que sirvan para disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años.

Tipo de Beneficiario

- Población de referencia:

Considerando que el área de influencia del presente proyecto es nacional, la población de referencia es equivalente al total de habitantes de la República que según el censo nacional de población y vivienda 2010, elaborado por el INEC es de 14'483.499 personas, con una tasa de crecimiento anual estimada de 1,48%, la proyección estimada para el año 2018 es de 17'023.408 habitantes.

- Población demandante potencial:

Serán el Gobierno Nacional, 23 Gobiernos Provinciales, 27 Ministerios que forman parte del Gobierno Nacional; catedráticos, estudiantes, periodistas, científicos e investigadores sociales, y usuarios en general.

Tipo de Beneficiario


- Población demandante efectiva:
Serán Instituciones del Sector público: Ministerio de Salud Pública e Instituciones involucradas en el seguimiento del Plan de Nutrición (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Planificación).

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 75.34 %
Fecha de Inicio: 15/05/2018 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

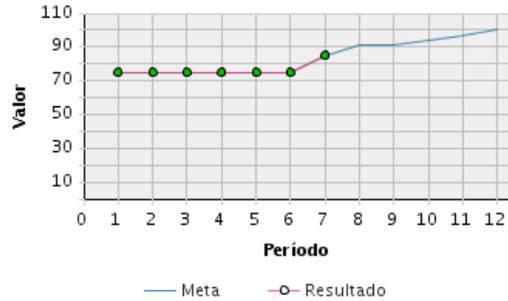

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	85 %	91 %	91 %	94 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	85 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO: JULIO 2019 Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta (HITO 13 ASOCIADO) 2.- Se finalizaron los procesos de recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente (HITO 12 CUMPLIDO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/08/2019 - 03:12 PM
PERIODO: JUNIO 2019 Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta (HITO 13 ASOCIADO) 2.- Se iniciaron los procesos de recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente (HITO 12 ASOCIADO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/08/2019 - 03:10 PM
PERIODO: MAYO 2019 Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta 2.- Se capacitó al personal que trabajará a partir del mes de junio en la recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente	Mendoza Moreira, Virginia Natali	03/07/2019 - 03:10 PM
PERÍODO: ABRIL 2019 Descripción: 1.- Se retomaron las actividades de validación de la Encuesta y se inició la ejecución presupuestaria	Mendoza Moreira, Virginia Natali	04/06/2019 - 09:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Se Autoriza mediante memorando INEC-INEC-2019-0436-M la reestructuración de HITOS y Fecha Fin del proyecto		
<p>PERÍODO: MARZO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se cuenta con el incremento de techo presupuestario, se está gestionando la reestructuración de HITOS y cambio de fecha fin</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/05/2019 - 03:01 PM
<p>PERIODO: FEBRERO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Las actividades pendientes no han podido ser ejecutadas, puesto que aún no se cuenta con el financiamiento para el operativo restante</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:02 PM
<p>PERIODO: ENERO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Las actividades pendientes no han sido posible de ejecutarse, puesto que aún no se cuenta con el financiamiento para el operativo restante</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:02 PM
<p>PERIODO: DICIEMBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Procesos administrativos finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido) 8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido) 9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviemnre (HITO 9 en proceso) 10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso) 11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso) 12. Crítica, codificación y digitación en proceso (HITO 12 en proceso) 13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:01 PM
<p>PERIODO: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido) 8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido) 9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviemnre (HITO 9 en proceso) 10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso) 11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso) 12. Crítica, codificación y digitación (HITO 12 en proceso) 13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:01 PM
<p>PERIODO: OCTUBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 en proceso) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)		
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:00 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. No contar con bases de datos completas a tiempo CAUSARÍA retraso en la entrega de resultados finales	19/07/2019	Virginia Natali Mendoza Moreira	40 %	80	32	0/0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	HITO 1:DEFINICIÓN- Formularios aprobados	4-Inicio de Trabajo	04/07/2018		04/07/2018		Sí	2.0
2	HITO 2: PLANEACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2018		31/07/2018		Sí	5.0
3	HITO 3: DEFINICIÓN- Manuales aprobados	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		28/09/2018		Sí	2.0
4	HITO 4: DEFINICIÓN- Mallas de validación aprobadas	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		31/08/2018		Sí	2.0
5	HITO 5: EJECUCIÓN- Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados	4-Inicio de Trabajo	01/09/2018		03/09/2018		Sí	25.0
6	HITO 6: DEFINICIÓN- Sistema de producción probado	4-Inicio de Trabajo	30/09/2018		29/10/2018		Sí	2.0
7	HITO 7: EJECUCIÓN- Capacitación del personal seleccionado	4-Inicio de Trabajo	27/10/2018		27/10/2018		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	HITO 8: DEFINICIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales	4-Inicio de Trabajo	30/10/2018		30/10/2018		Sí	2.0
9	HITO 9: EJECUCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta	4-Inicio de Trabajo	01/11/2018		05/11/2018		Sí	10.0
10	HITO 10: EJECUCIÓN - Reporte de cobertura elaborado	4-Inicio de Trabajo	30/11/2018		30/11/2018		Sí	15.0
11	HITO 11: EJECUCIÓN - Muestra seleccionada	4-Inicio de Trabajo	28/12/2018		28/11/2018		Sí	5.0
12	HITO 12: EJECUCIÓN - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada	4-Inicio de Trabajo	17/07/2019		17/07/2019		Sí	10.0
13	HITO 13: EJECUCIÓN- Validación y consistencia de la información	4-Inicio de Trabajo	30/08/2019	30/08/2019			No	6.0
14	HITO 14: EJECUCIÓN - Productos mínimos elaborados	9-Entregables Formales	31/10/2019	31/10/2019			No	3.0
15	HITO 15: EJECUCIÓN - Productos publicados	9-Entregables Formales	29/11/2019	29/11/2019			No	3.0
16	HITO 16: CIERRE - Productos y procesos evaluados	9-Entregables Formales	20/12/2019	20/12/2019			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	3.866 sectores actualizados a noviembre de 2018 y 46.392 viviendas investigadas a diciembre de 2018	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/11/2018	-
2	1 Base de datos de indicadores antropométricos validada a diciembre de 2019	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/11/2019	-
3	1 Presentación de principales resultados antropométricos y 1 tabulado de principales resultados antropométricos a diciembre de 2019	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/11/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,279,917.33 **
Costo Total:	6,118,016.39
Total Devengado:	5,320,007.75
% Costo Total Devengado:	86.96 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 86.96 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	510,245.08	1,820,029.16	0.00	2,330,274.24
Ppto. Externo Planeado	5,466,304.76	0.00	0.00	5,466,304.76
Ppto. Aprobado Inicial	6,118,016.39	995,953.89	0.00	7,113,970.28
Ppto. Codificado	5,976,549.84	1,820,029.16	0.00	7,796,579.00
Ppto. Comprometido	4,634,892.23	540,875.32	0.00	5,175,767.55
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	5,976,549.84	1,820,029.16	0.00	7,796,579.00
Ppto. Devengado	4,459,888.17	860,119.58	0.00	5,320,007.75
Pagado Real	3,530,799.38	0.00	0.00	3,530,799.38
Estimado a fin de año	* 4,459,888.17	0.00	0.00	4,459,888.17
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,516,661.67	1,820,029.16	0.00	3,336,690.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 74.62 %	47.26 %	0.00 %	68.24 %
Ppto. Codificado 998	0.00	1,820,029.16	0.00	1,820,029.16
Ppto. Devengado 998	0.00	595,365.33	0.00	595,365.33

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	4,620.91	0.00	4,620.91	115.00 %		0.25 %
Mar	658,830.32	595,365.33	658,830.32	599,986.24	91.07 %		32.97 %
Abr	14,805.72	30,776.87	673,636.04	630,763.11	93.64 %		34.66 %
May	45,915.36	31,412.29	719,551.40	662,175.40	92.03 %		36.38 %
Jun	68,282.20	33,183.05	787,833.60	695,358.45	88.26 %		38.21 %
Jul	594,383.80	164,761.13	1,382,217.40	860,119.58	62.23 %		47.26 %
Ago	397,934.75		1,780,152.15				
Sep	32,185.47		1,812,337.62				
Oct	1,568.00		1,813,905.62				
Nov	1,568.00		1,815,473.62				
Dic	4,555.54		1,820,029.16				
Total	1,820,029.16	860,119.58					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ENSANUT 2018	Acta_de_constitución_ENSANUT_2018.pdf	21/12/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 1.- DEFINICIÓN - Formularios aprobados	A1.rar	09/05/2019
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- EJECUCIÓN - Reporte de cobertura elaborado	B1.rar	15/05/2019
4	ASOCIACIÓN HITO 11.- EJECUCIÓN -Muestra seleccionada	B2.rar	15/05/2019
5	ASOCIACIÓN HITO 12.- EJECUCIÓN - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada	B3.rar	29/07/2019
6	ASOCIACIÓN HITO 2.- PLANEACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado	A2.rar	09/05/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 3.- DEFINICIÓN- Manuales aprobados	A3.7z	09/05/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 4.- DEFINICIÓN- Mallas de validación aprobadas	A4.rar	09/05/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 5.- EJECUCIÓN- Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados	A5.rar	09/05/2019
10	ASOCIACIÓN HITO 6.- DEFINICIÓN- Sistema de producción probado	A6.rar	09/05/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 7.- EJECUCIÓN- Capacitación del personal seleccionado	A7.rar	15/05/2019
12	ASOCIACIÓN HITO 8.- DEFINICIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales	A8.rar	15/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACIÓN HITO 9.- EJECUCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta	A9.rar	15/05/2019
14	CIERRE DE RIESGO 001	R1.rar	29/07/2019
15	EXP RESTHITOS ENSANUT 2018	Reestructura_y_modificación_de_fecha_fin_ENSANUT_GPR_001	02/02/2019
16	EXP RESTHITOS ENSANUT 2019	Reestructura_de_hitos_y_fecha_fin_ensanut_042019.rar	04/07/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Artieda Espinoza, Carmita Elizabeth	Técnica	Miembro de equipo	carmita_artieda@inec.gob.ec	
Herrera Jacome, Margoth Rocio	Técnica	Miembro de equipo	margoth_herrera@inec.gob.ec	
Hidalgo, Norma	Técnica	Miembro de equipo	norma_hidalgo@ine.gob.ec	
Mendoza Moreira, Virginia Natali	Líder de proyecto	Analista de Estadísticas Sociodemográficas	natali_mendoza@inec.gob.ec	
