

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**  
**PROYECTO: K005 INEC-Actualización del Registro Social**

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (patricio_rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382804	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,302,208.35
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 30/11/2019
Fecha de última actualización:	05/04/2019	Fecha de Fin Base:	31/07/2019
Modificado por:	Rivas Villalba, Edwin Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2019

## DATOS GENERALES

### Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Objetivo Operativo al que se alinea.- Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.

Propósito.- Generar información que permita la identificación y selección de potenciales beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".

Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan "Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos

- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES, permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

Localidad de Impacto:- Nacional

Costo: 18'466.362,17

Línea Base: -N/A

Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

### Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas en las áreas a intervenir.

### Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)

Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7'816.489 personas registradas.

### Restricciones

Tiempo.- El proyecto tendrá un duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el 31 de julio del 2019)

Costo.- 18'466.362,17

Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través de encuestas mediante aplicativo móvil.

Descripción del Producto Final.-

Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

a) Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.

### Restricciones

- b) Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
- c) Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 66.09 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Fin: 30/11/2019

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

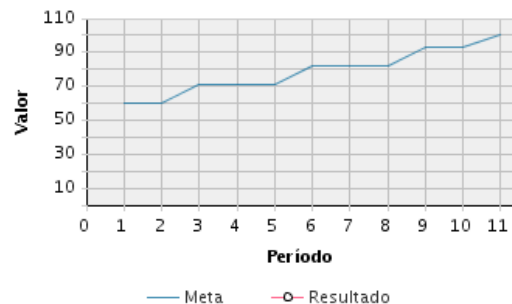

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	60 %	60 %	71 %	71 %	71 %	82 %	82 %	82 %	93 %	93 %	100 %	0 %
	Avance real acumulado											
2019	Estado											

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2019</b> Mediante Memorando INEC-CGAF-2019-0430-M, en el que se hace conocer el incremento del techo presupuestario del RS, se procedió a la elaboración del Plan de Proyecto, para la aprobación y ejecución de las diferentes actividades dentro del proyecto.</p> <p><b>FEBRERO 2019</b> En este mes se sigue realizando gestiones a fin de que nos transfieran de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo, se ha realizado una revisión de la base de datos proporcionada por SENPLADES, en la cual de emitio observaciones para que sean corregidas.</p> <p><b>ENERO 2019</b> En este mes se ha realizado gestiones a fin de que se realice la transferencia de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo</p> <p><b>DICIEMBRE 2018</b> En este mes se continua con las fases 2 y 3 de levantamiento de información teniendo una cobertura del 8,34%, llegando al 12,45% del total de las fases programadas, en este mes se levantaron 64.114 viviendas, de las cuales 47.322 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.</p> <p><b>NOVIEMBRE 2018</b></p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/04/2019 - 10:16 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En este mes se inicia el levantamiento de la información a partir del 16 de noviembre de 2018, en la cual se levanta información con una cobertura del 4,17% de la información total, levantando 42.355 viviendas, de las cuales 30.179 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.</p> <p><b>OCTUBRE 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscrito el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, fue dada el 02 de octubre, razón por la cual se realizó una nueva programación en la cual el operativo inicia el 10 de noviembre con el equipo de avanzada y el 16 de noviembre con el equipo de levantamiento de información (HITO 11 asociado).</p>		
<p><b>SEPTIEMBRE 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscrito el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, a la fecha no ha sido efectiva (HITO 10. asociado).</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	20/11/2018 - 08:41 AM
<p><b>AGOSTO 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC. (HITO 9. asociado)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/10/2018 - 02:49 PM
<p><b>JULIO 2018</b> No se inicio con la ejecución del operativo de campo, con la intervención de hogares socializados, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC.(HITO 8. asociado)</p> <p>En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo del Personal preseleccionado; Ciudad de Sto Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y en la Zona Centro (Ambato), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para el inicio del proyecto. (HITO-7. CUMPLIDO).</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/09/2018 - 05:39 PM
<p><b>JUNIO-2018</b> En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-7. asociado)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:41 AM
<p><b>JUNIO-2018</b> En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:15 AM
<p><b>MAYO-2018</b> Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/07/2018 - 04:03 PM
<p><b>ABRIL-2018</b> Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido) Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el proyecto (HITO-4. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:16 AM
<p><b>MARZO-2018</b> Se suscribieron los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
<p><b>FEBRERO-2018</b> Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
<p><b>ENERO-2018</b> Se realizó observaciones al formulario y manual enviado por SENPLADES-( HITO 1. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 08:52 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible


## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN"-revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo revisado ( formulario y manual)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.8
2	PLANEACIÓN".- Ficha técnica del proyecto definida	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.64
3	PLANEACIÓN".- Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.96
4	PLANEACIÓN".-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados	5-Entregables Intermedios	13/04/2018		13/04/2018		Sí	2.56
5	PLANEACIÓN".- Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado	9-Entregables Formales	23/04/2018		23/04/2018		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN.-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	2.8
7	EJECUCIÓN.-Personal preseleccionado capacitados	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	6.92
8	EJECUCIÓN.-- Personal seleccionado capacitado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	6.12
9	EJECUCIÓN- completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	6.12
10	EJECUCIÓN-Preparación de material cartográfico a nivel Nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN- Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN- Hogares a intervenir socializados	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	7.92
13	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre)	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	11.04
14	EJECUCIÓN-Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(enero-marzo 2019)	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	11.04
15	EJECUCIÓN- Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(abril-junio 2019)	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	11.04

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN- Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(julio-septiembre 2019)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	11.04
17	EJECUCIÓN- Informes técnicos de avance del proyecto en la fase de recolección elaborados(octubre-noviembre 2019)	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	7.0

## INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de viviendas ocupadas con relación al total de viviendas ocupadas		-	-	-	01/10/2018	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,302,208.35 **
Costo Total:	9,612,953.83
Total Devengado:	2,302,208.35
% Costo Total Devengado:	23.95 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 23.95 %

### Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	535,464.44	0.00	0.00	535,464.44
Ppto. Externo Planeado	3,086,730.66	0.00	0.00	3,086,730.66
Ppto. Aprobado Inicial	640,180.67	0.00	0.00	640,180.67
Ppto. Codificado	3,622,195.10	0.00	0.00	3,622,195.10
Ppto. Comprometido	211,268.45	0.00	0.00	211,268.45
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	3,622,195.10	0.00	0.00	3,622,195.10
Ppto. Devengado	2,302,208.35	0.00	0.00	2,302,208.35
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,302,208.35	0.00	0.00	2,302,208.35
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,319,986.75	0.00	0.00	1,319,986.75
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 63.56 %	0.00 %	0.00 %	63.56 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005	ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf	01/06/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo"	A.1.pdf	10/07/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 10. "Preparación de material cartográfico a nivel Nacional "	A.10.pdf.pdf	27/12/2018

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIACIÓN HITO 11. "Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto "	A.11.pdf.pdf	27/12/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 12. "Hogares a intervenir socializados "	A.12.pdf.rar	27/12/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 13. "Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre) "	A.13.pdf	04/01/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 2. "Ficha técnica del proyecto definida"	A.2.pdf	10/07/2018
8	ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)"	A.3.pdf	10/07/2018
9	ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados"	A.4.pdf	10/07/2018
10	ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado"	A.5.pdf	10/07/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados"	A.6.pdf	10/07/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado capacitado"	A.7.pdf	14/08/2018
13	ASOCIACIÓN HITO 8. "Personal seleccionado capacitado"	A.8.pdf.rar	27/12/2018
14	ASOCIACIÓN HITO 9. "Completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información "	A.9.pdf.rar	27/12/2018
15	REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2018-2019 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL	REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2018-2019.rar	28/12/2018
16	VERIFICABLE RIESGO 1	INEC-CGTPE-DIES-2018-0444-M_(3)_ (INFORMES_DE_UTILIZACIÓN_DE_RECURSOS).pdf	28/12/2018

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Abril, Martha	Técnica	Miembro de equipo	marha_abril@inec.gob.ec	
Castillo Castillo, Cristina Cecivel	Técnica	Analista	cristina_castillo@inec.gob.ec	
Haro Ibarra, Marlene Azucena	Técnica	Miembro de equipo	marlene_haro@inec.gob.ec	
Mier Sanchez, Galo Anibal	Técnico	Miembro de equipo	galo_mier@inec.gob.ec	
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Lider de Proyecto	Analista Sociodemográfica	patricio_rivas@inec.gob.ec	
Tipán, vladimir	Técnica	Analista	Vladimir_Tipan@inec.gob.ec	
