

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K009 INEC: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU

Líder del Proyecto:	Marín Luna, Irina Elizabeth (irina_marin@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Andrade, Diego	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	50610000.0000.382652	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	863,155.97
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/03/2019 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	09/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	27/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, acorde a su nueva política institucional y plan estratégico, siguiendo el principio de la oferta y demanda estadística, en donde, conjuntamente con los usuarios, definen las necesidades de los temas a investigar, y al ser de interés para el país, evaluar la persistencia de la violencia de género contra las mujeres, una vez que se cuenta con una línea base inicial y con políticas de Estado para erradicar esta problemática en Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, acordó realizar un segundo levantamiento de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, de acuerdo al ámbito de las competencias que regulan a las referidas instituciones, con la finalidad de proveer información estadística fundamental, objetiva y oportuna para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en el país, con el fin de "Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas"; medidas articuladas al cumplimiento del PND.

Es importante recordar que de acuerdo al Programa Nacional de Estadística, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres tiene una periodicidad quinquenal por lo que tenía que realizarse en el 2016 y a pesar de haber sido postulada para ser ejecutada en el año 2016 y 2017, por restricción presupuestaria no se priorizó.

Además esta segunda investigación está dirigida a mantener una línea de continuidad en los diagnósticos de esta población, a través de los indicadores generados en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a partir de la información estadística recolectada por el INEC.

Línea Base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizó el primer levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011 con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial. Los resultados de esta primera investigación muestran la magnitud y persistencia de este problema, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más (60.6%) han sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales por el hecho de ser mujeres.

Objetivo General:

Obtener datos estadísticos sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual, patrimonial) que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como en el privado (hogar, familia, relación de pareja), y sobre el conocimiento o búsqueda de servicio e instancias de justicia para enfrentar la violencia; y sus percepciones sobre la respuesta institucional.

Objetivos Específicos:

1. Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENVIGMU 2018
2. Llevar a cabo el levantamiento de información en el tiempo planificado.
3. Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información
4. Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta

Productos:


DATOS GENERALES

Descripción
Cuadro resumen Presentación de los principales resultados Tabulados Bases de datos Ficha de indicadores Diccionario de variables Sintaxis Metodología (de la operación estadística) Formulario Manual del encuestador
Beneficios Cualitativos
La violencia de género contra la mujer ha sido una problemática largamente debatida en el ámbito nacional e internacional y, producto de ello, se ha formulado un conjunto de instrumentos (tratados, convenios, planes de acción, declaraciones, directrices) con el fin de erradicarla. En el caso de Ecuador, la violencia es un problema estructural que afecta la calidad de vida de las mujeres y que debe ser enfrentado por el Estado con la generación de políticas públicas y a nivel del sistema de justicia, para lo cual es necesario contar con estadísticas actualizadas, exactas y fiables sobre la magnitud de la violencia contra la mujer, las mismas que permitirán diseñar una respuesta apropiada para prevenir y erradicar este problema.
Tipo de Beneficiario
Presidencia de la República Secretaría de Derechos Humanos Consejo Nacional para la Igualdad de Género SENPLADES Ministerio de Salud Consejo de la Judicatura Secretaría Plan toda una vida Ministerio del Interior Fiscalía General del Estado Ministerio de Inclusión Económica y social ONU Mujeres UNFPA EUROSOCIAL Cooperación Técnica Alemana - GIZ Académicos e Investigadores
Restricciones
Tiempo: 9 meses Costo: \$876.862.09 Alcance: La encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres indaga los tipos de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, y gineco-obstétrica, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (escolar, laboral, social, familiar, de pareja y recopila información sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones. La Encuesta mide la violencia ocurrida a lo largo de la vida y la ocurrida en los últimos 12 meses. Aporta datos de las acciones que emprendieron las mujeres violentadas como de búsqueda de información, apoyo o denuncia de lo sucedido en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o con su pareja.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.93 %
Fecha de Inicio: 22/03/2019 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
			0 %	6 %	28 %	37 %	47 %	52 %	57 %	67 %	92 %	100 %
	Avance real acumulado											
			0 %	16 %	31 %	41 %	47 %	52 %	62 %	67 %	92 %	
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE - 2019</p> <p>Se aprobó la presentación de resultados por la máxima autoridad, misma que fue presentada y publicada en la página WEB institucional (HITO 16, cumplido)</p> <p>Se publicó la base de datos validada (HITO 17, cumplido)</p> <p>Se elaboraron, revisaron y aprobaron los productos que debían ser publicados (HITO 18, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	05/12/2019 - 11:53 AM
<p>OCTUBRE - 2019</p> <p>Se cumplió y finalizó con el proceso de validación en todas las Coordinaciones Zonales, se ha generado el informe de esta actividad (HITO 14, cumplido)</p> <p>Se cumplió y se finalizó con la elaboración del plan de indicadores y tabulados (HITO 15, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	06/11/2019 - 10:46 AM
<p>SEPTIEMBRE - 2019</p> <p>Se cumplió y finalizó con el proceso de crítica - codificación en todas las Coordinaciones Zonales, se ha generado el informe de estas dos actividades (HITO 13, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	24/10/2019 - 09:52 AM
<p>AGOSTO - 2019</p> <p>Una vez finalizado la fase del operativo de campo, se han generado los listados de cobertura de las Coordinaciones Zonales (HITO 12, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	24/10/2019 - 09:52 AM
<p>JULIO - 2019</p> <p>El inicio del proceso de digitación se postergo para el 11 de julio, por lo que todas las actividades referentes a este se recorrieron, además se tuvieron que solventar varias novedades que presentaba el sistema por lo que el informe de la prueba piloto se presento con fecha 03 de julio de 2019. (HITO 10, cumplido)</p> <p>En referencia a lo antes mencionado se remitió por parte de DIRAD, el manual de ingreso de datos el 11 de julio, para su envío a las Coordinaciones Zonales. (HITO 8, cumplido)</p> <p>Una vez que se definieron los indicadores de control de calidad que se iban a reportar, se generaron los instrumentos para el registro de los mismos, por tal motivo se enviaron a las Coordinaciones Zonales los mencionados formularios con fecha 22 de julio de 2019. (HITO 5, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	24/10/2019 - 09:52 AM
<p>JUNIO - 2019</p> <p>Se elaboró la agenda de capacitación (HITO 9, cumplido)</p> <p>Los manuales para la capacitación fueron enviados con fecha 12 de junio de 2019 a las Coordinaciones Zonales, el retraso se debió a que se tuvo que trabajar conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos en la elaboración de los mismos y las últimas observaciones se las recepto con fecha 07 de junio de 2019 (HITO 6, cumplido)</p>	Marín Luna, Irina Elizabeth	24/10/2019 - 09:51 AM
<p>MAYO - 2019</p> <p>Considerando que la ENVIGMU de acuerdo a la metodología propuesta, será levantada únicamente por mujeres se diseño un plan de seguridad conjuntamente con el MDI y la SDH, por lo que era necesario contar con la programación del levantamiento oportunamente. En este sentido las Coordinaciones Zonales enviaron las programaciones hasta el 28 de mayo de 2019 (HITO 11, cumplido)</p>	Fuentes Sinche, Diego Patricio	22/10/2019 - 12:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se envió por parte de DICOS el plan de comunicación para la ENVIGMU 2019 (HITO 7, cumplido)		
<p>ABRIL - 2019</p> <p>Se elaboró y aprobó el cronograma de actividades de la ENVIGMU 2019 (HITO 1, cumplido)</p> <p>Se elaboró el PDP de la encuesta y fue aprobado por la Dirección ejecutiva, mediante Memorando No. INEC-INEC-2019-0279-M (HITO 2, cumplido)</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CGTP-E-DIES-2019-0151-M, se envió a la Dirección de Registros Administrativos todos los documentos solicitados para el desarrollo del sistema de ingreso de datos. (HITO 3, cumplido)</p> <p>Se enviaron los formularios de MyC a las coordinaciones zonales, el 23 de abril de 2019 (HITO 4, cumplido)</p>	Fuentes Sinche, Diego Patricio	22/10/2019 - 12:00 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>1- INTERNACIONAL.* General.</p> <p>El no contar con la información requerida para los productos mínimos CAUSARÍA retrasos en la generación de las presentaciones de resultados</p>	24/10/2019	Irina Elizabeth Marín Luna	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Cronograma revisado y aprobado	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	2.0
2	PLANIFICACIÓN - Plan de proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	08/04/2019		08/04/2019		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN - Requerimientos para el desarrollo del sistema de ingreso de datos enviado	5-Entregables Intermedios	15/04/2019		15/04/2019		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN - Formularios de Muestra y Cobertura enviados a Coordinaciones Zonales	5-Entregables Intermedios	10/05/2019		23/04/2019		Sí	10.0
5	PLANIFICACIÓN - Formularios de control de calidad elaborados y aprobados	5-Entregables Intermedios	10/05/2019		22/07/2019		Sí	2.0
6	PLANIFICACIÓN - Instrumentos de recolección y capacitación elaborados y aprobados	5-Entregables Intermedios	10/05/2019		12/06/2019		Sí	5.0
7	PLANIFICACIÓN - Plan de comunicación aprobado	5-Entregables Intermedios	17/05/2019		31/05/2019		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	PLANIFICACIÓN - Manual de ingreso de datos elaborado	5-Entregables Intermedios	21/06/2019		11/07/2019		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN - Agenda de capacitación aprobada	5-Entregables Intermedios	27/06/2019		12/06/2019		Sí	5.0
10	PLANIFICACIÓN - Informe de prueba piloto de sistema de ingreso entregado	5-Entregables Intermedios	27/06/2019		03/07/2019		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN - Programación del operativo de campo enviada	5-Entregables Intermedios	07/07/2019		28/05/2019		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN - Informes de Control y Cobertura elaborados	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN - Informe de Crítica y codificación elaborado	5-Entregables Intermedios	06/09/2019		06/09/2019		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN - Informe de información validada elaborada	5-Entregables Intermedios	09/10/2019		28/10/2019		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN - Listado de principales indicadores elaborado	5-Entregables Intermedios	25/10/2019		09/09/2019		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN - Presentación de resultados aprobada	5-Entregables Intermedios	20/11/2019		20/11/2019		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN - Base de datos validada	5-Entregables Intermedios	22/11/2019		22/11/2019		Sí	10.0
18	EJECUCIÓN - Informe de productos elaborados	5-Entregables Intermedios	22/11/2019		22/11/2019		Sí	10.0
19	CIERRE - Informe técnico de operativo elaborado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	8.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	4 formularios, 1 manual de la encuestadora, 1 manual del supervisor y 1 manual de crítica y codificación elaborados desde abril a hasta mayo de 2019. Personal para trabajar en campo capacitado a agosto de 2019		100.00 %	0	0	12/04/2019	Ene-Jun
2	2.606 sectores y 20.848 viviendas investigadas a agosto de 2019.		100.00 %	0	0	12/04/2019	Ene-Jun
3	Base de datos de indicadores de violencia validada a octubre de 2019.		100.00 %	0	0	12/04/2019	Ene-Jun
4	Presentación de principales resultados de violencia contra las mujeres a noviembre de 2019.		100.00 %	0	0	12/04/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	863,155.97 **
Costo Total:	876,862.09
Total Devengado:	781,045.24
% Costo Total Devengado:	89.07 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 89.07 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Codificado	0.00	876,862.09	0.00	876,862.09
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	863,155.97	0.00	863,155.97
Ppto. Devengado	0.00	781,045.24	0.00	781,045.24
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	863,155.97	0.00	863,155.97
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	90.49 %	0.00 %	90.49 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

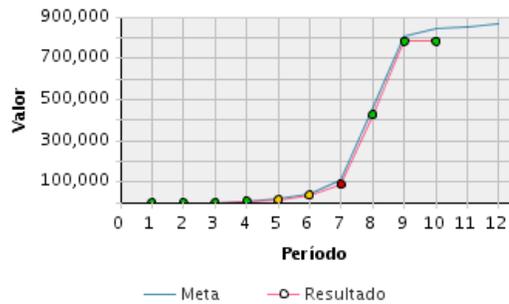

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	6,345.52	6,345.52	6,345.52	6,345.52	100.00 %		0.74 %
May	9,990.45	8,184.21	16,335.97	14,529.73	88.94 %		1.68 %
Jun	22,856.03	19,271.55	39,192.00	33,801.28	86.25 %		3.92 %
Jul	67,548.13	54,396.95	106,740.13	88,198.23	82.63 %		10.22 %
Ago	353,813.68	337,940.12	460,553.81	426,138.35	92.53 %		49.37 %
Sep	347,142.28	354,885.21	807,696.09	781,023.56	96.70 %		90.48 %
Oct	32,466.75	21.68	840,162.84	781,045.24	92.96 %		90.49 %
Nov	7,447.96		847,610.80				
Dic	15,545.17		863,155.97				
Total	863,155.97	781,045.24					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1_Cronograma ENVIGMU	A1_Cronograma_Final_ENVIGMU_ZONALES.pdf	16/08/2019
2	A1_HITO 1	A1_HITO_1.pdf	16/08/2019
3	A2_HITO 2	A2_HITO_2.pdf	16/08/2019
4	A2_Memorando aprobación	A2_Memorando_INEC-INEC-2019-0279-M.pdf	16/08/2019
5	A3_HITO 3	A3_HITO_3.pdf	16/08/2019
6	A3_Memorando requerimiento aplicativo	A3_Memorando_INEC-CGTPE-DIES-2019-0151-M.pdf	16/08/2019
7	A4_Formulario MyC	A4_Formulario_MyC.pdf	16/08/2019
8	A4_HITO 4	A4_HITO_4.pdf	16/08/2019
9	A5_Formularios Control de Calidad	A5_FORMULARIOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_ENVIGMU-2019-119.pdf	16/08/2019
10	A5_HITO 5	A5_HITO_5.pdf	16/08/2019
11	A6_HITO 6	A6_HITO_6.pdf	16/08/2019
12	A6_Manuales 1 y 2	A6_Manuales_1_y_2_ENVIGMU_2019.pdf	16/08/2019
13	A6_Memorando aprobación formulario	A6_Memorando_INEC-INEC-2019-0343-M.pdf	16/08/2019
14	A7_HITO 7	A7_HITO_7.pdf	16/08/2019
15	A7_Plan de comunicación ENVIGMU	A7_Plan_de_Comunicación_ENVIGMU.pdf	16/08/2019
16	A8_HITO 8	A8_HITO_8.pdf	16/08/2019
17	A8_Manual usuario captura información	A8_MANUAL_DE_USUARIO_SIPE_CAPTURENREFAM.pdf	16/08/2019
18	A9_Agenda capacitación	A9_Agenda_capacitación_ENCUESTA_ENVIGMU-17-28-2019.pdf	16/08/2019
19	A9_HITO 9	A9_HITO_9.pdf	16/08/2019
20	B1_HITO 10	B1_HITO_10.pdf	13/09/2019
21	B2_HITO 11	B2_HITO_11.pdf	13/09/2019
22	B3_Memorando aprobación formularios	B3_Memorando_INEC-INEC-2019-0343-M.pdf	16/08/2019
23	B3_RIESGO 1	B3_RIESGO_1.pdf	16/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	B4_Informe personal-vehículos ENVIGMU 2019	B4_Informe_Personal-Vehículos_ENVIGMU_2019.pdf	16/08/2019
25	B4_RIESGO 2	B4_RIESGO_2.pdf	16/08/2019
26	B5_HITO12	B5_HITO_12.pdf	24/10/2019
27	B6_HITO13	B6_HITO_13.pdf	24/10/2019
28	B7_HITO14	B7_HITO_14.pdf	06/11/2019
29	B8_HITO15	B8_HITO_15.pdf	06/11/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Artieda Espinoza, Carmita Elizabeth	Miembro equipo técnico ENVIGMU 2019	Miembro de equipo	carmita_artieda@inec.gob.ec	
Hidalgo, Norma	Miembro equipo técnico ENVIGMU 2019	Miembro de equipo	norma_hidalgo@ine.gob.ec	
Marín Luna, Irina Elizabeth	Responsable ENVIGMU 2019	Miembro de Equipo	irina_marin@inec.gob.ec	
