

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K007 Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

Líder del Proyecto:	Urcuango Conumba, Adriana Mabel (adriana_urcuango@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382902	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viability Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,132,136.53
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	04/09/2018 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	06/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2019

DATOS GENERALES

Descripción

La Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, es una operación estadística, que proporciona información para la evaluación y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A partir de EPSPND, se garantiza la sostenibilidad y comparabilidad de información con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, que antes se utilizaba como instrumento de monitoreo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

Productos:

Los productos que se entregarán al finalizar el proyecto, permitirán monitorear los 33 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo:

- Presentación de Resultados
- Base de datos
- Formulario
- Sintaxis.
- Tabulados Marco conceptual vigente
- Metodología
- Informe ejecutivo

Línea base del proyecto

En los últimos diez años, debido a la frecuencia anual y población objetivo de investigación, la ENEMDU ha sido el instrumento de medición de los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, surge la necesidad de disponer una encuesta específica multitemática, diseñada para la medición de los 35 indicadores del PND; de los cuales 19 fueron considerados para el diseño; 14 se encuentran en construcción y 2 no son factibles de investigar. A partir de lo mencionado, se establece que la línea base son los 19 indicadores de diseño, con una medición actualizada en la ENEMDU de diciembre 2017.

Objetivo general:

Generar información que permita el cálculo y seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 a través de una operación estadística, alineada al modelo de producción establecido.

Objetivos específicos

- . Planificar, diseñar, construir y validar la operación estadística para la realización de la encuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021.
- . Recolectar la Información por medio de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2017-2022.

Beneficios Cualitativos

- La información estadística a partir de la EPSPND, constituye el principal insumo para el monitoreo y evaluación de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de perfiles de la población: sociodemográfico, económico y social, permitirá integrar información básica, relevante y necesaria, para los procesos de planificación y toma de decisiones de los actores de política pública.
- Al ser un proyecto de inversión pública y por la naturaleza de actuar del INEC, que es producir, analizar y difundir información estadística oficial y oportuna. El proyecto genera insumos que son utilizados por los encargados de generar políticas encaminadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

Beneficios Cualitativos

- Generar indicadores e información actualizada de temas de educación, vivienda hogar, calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, entre otros. A fin de garantizar el seguimiento y evaluación a los múltiples objetivos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios que utilizarán la información son las siguientes instituciones:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL)
- Ministerio del interior
- Fiscalía General del Estado
- Consejo de la Judicatura
- Población Estudiantil

Las mismas que se beneficiarán las siguientes temáticas:

- Educación, Datos de la Vivienda y El Hogar, TICS, Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Corrupción y transparencia.
- Educación
- Datos de la Vivienda y El Hogar
- TICS
- Seguridad Ciudadana
- Seguridad Ciudadana
- Corrupción y Transparencia

Restricciones

No disponer de capital humano especializado en encuestas, para ejecutar el proyecto.

No contar a tiempo con una marco de muestreo actualizado, para la selección de las viviendas de la encuesta.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación


Ejecución

Cierre

Completado

Congelado


Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO


Transcurrido: 88.43 %

Fecha de Inicio: 04/09/2018

Fecha de Fin: 31/12/2019

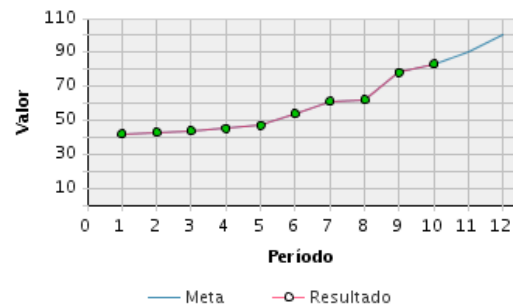AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL


Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	42 %	43 %	44 %	45 %	47 %	54 %	61 %	62 %	78 %	83 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	42 %	43 %	44 %	45 %	47 %	54 %	61 %	62 %	78 %	83 %		
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO: OCTUBRE 2019 Descripción: EJECUCIÓN : Se probó el sistema INFOCAPT y formulario ESPND 2019	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/11/2019 - 09:02 AM
SEPTIEMBRE 2019.- 22 EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable 26 PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/10/2019 - 02:28 PM
AGOSTO 2019.- PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/08/2019 - 08:26 AM
JULIO 2019.- PLANEACIÓN : Construir formularios para la recolección, manuales, presentaciones y plan de inconsistencias.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
JUNIO 2019 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
MAYO 2019.- PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
ABRIL 2019 PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:14 AM
PERIODO MARZO -2019 16.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito cumplido 16).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/05/2019 - 10:30 AM
PERIODO FEBRERO -2019 15.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito 15).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:44 PM
PERIODO ENERO -2019 14.-Se definieron los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ESPND (Hito 14).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:04 PM
PERIODO: DICIEMBRE 2018 12.- Se elaboró Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados (HITO 12) 13.- Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc. (HITO 13)	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	11/02/2019 - 08:43 AM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:34 PM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:33 PM
PERIODO: OCTUBRE 2018 5.- Se elaboraron los informes de los resultados de las pruebas piloto del formulario ESPND. (HITO CUMPLIDO 5) 6.- Se diseñó los acuerdos de confidencialidad y autenticación. (HITO CUMPLIDO 6) 7.- Se actualizó el material cartográfico que se utilizará en el proyecto ESPND. (HITO CUMPLIDO 7)		
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: 1.- Se elaboró el informe de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ENEMDU. (HITO CUMPLIDO 1) 2.- Se elaboró el documento habilitante aprobado por el director ejecutivo, cronograma de trabajo, el presupuesto para el año 2018 (HITO CUMPLIDO 2) 3. Se diseñó el formulario y el manual de capacitación del encuestador (HITO CUMPLIDO 4)	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	14/11/2018 - 01:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. Se identificó los dos clasificadores que se utilizaran dentro del proyecto EPSPND y se diseñó la malla de validación (HITO CUMPLIDO 5).		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Deserción del personal a vísperas del inicio de la etapa de recolección de información CAUSARÍA retraso en los tiempos planificados para iniciar del operativo de recolección de información	06/08/2019	Adriana Mabel Urcuango Conumba	20 %	90	18	0/2
5- PROYECTO. * General. Retraso en la entrega de formularios y manuales para la capacitación causarían el retraso en el inicio del proceso de capacitación al personal	06/08/2019	Adriana Mabel Urcuango Conumba	70 %	10	7	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN : Plan de proyecto de la ESPND aprobado.	9-Entregables Formales	04/09/2018		04/09/2018		Sí	4.0
2	PLANEACIÓN : Indicadores del plan nacional de desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	07/09/2018		07/09/2018		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN : Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN : Instrumentos de análisis y procesamiento diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN : Prueba piloto ejecutada	5-Entregables Intermedios	12/10/2018		12/10/2018		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN:Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad construidos	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	5-Entregables Intermedios	06/11/2018		06/11/2018		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN:Formularios, manuales, presentaciones	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y mallas de validación construidos							
10	EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	4.0
12	PLANEACIÓN: Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	4.0
13	CIERRE: Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) recolectada	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	4.0
14	PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/01/2019		30/01/2019		Sí	2.0
15	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.0
16	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	30/03/2019		30/03/2019		Sí	1.0
17	PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.0
18	PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	7.0
20	PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación co	5-Entregables Intermedios	30/07/2019		30/07/2019		Sí	7.0
21	PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	7.0
23	EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.0
25	PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
26	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	3.0
27	EJECUCIÓN : Probar Sistema INFOCAPT y formulario	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		30/10/2019		Sí	5.0
28	ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	5.0
30	EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019			No	7.0
31	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1. Número de instrumentos elaborados		100.00 %	6	6	04/09/2018	Jul-Sep
2	C2. Número de viviendas efectivas de la encuesta sobre la muestra teórica (35484 viviendas) durante el operativo		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep
3	C3. Número de inconsistencias detectadas en validación sobre el numero total de variables de la encuesta (aproximado 450 variables).		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep
4	C4. Número de productos (4 tabulados, 4 presentaciones, 4 formularios, 4 base de datos) al fin de proyecto.		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,132,136.53 **
Costo Total:	5,916,646.53
Total Devengado:	1,565,598.48
% Costo Total Devengado:	26.46 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 26.46 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	143,389.10	2,829,860.62	0.00	2,973,249.72
Ppto. Externo Planeado	1,334,274.92	0.00	0.00	1,334,274.92
Ppto. Aprobado Inicial	1,485,583.87	34,651.21	0.00	1,520,235.08
Ppto. Codificado	1,477,664.02	2,829,860.62	0.00	4,307,524.64
Ppto. Comprometido	183,183.50	0.00	0.00	183,183.50
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	1,477,664.02	2,829,860.62	0.00	4,307,524.64
Ppto. Devengado	1,302,275.91	263,322.57	0.00	1,565,598.48
Pagado Real	26,074.28	0.00	0.00	26,074.28
Estimado a fin de año	* 1,302,275.91	0.00	0.00	1,302,275.91
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	175,388.11	2,829,860.62	0.00	3,005,248.73
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.13 %	9.31 %	0.00 %	36.35 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

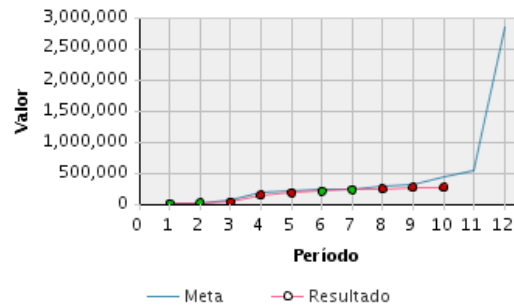

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,458.73	9,390.65	9,458.73	9,390.65	99.28 %		0.33 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	10,258.15	8,741.55	19,716.88	18,132.20	91.96 %		0.64 %
Mar	36,504.74	11,685.31	56,221.62	29,817.51	53.04 %		1.05 %
Abr	126,852.57	116,441.15	183,074.19	146,258.66	79.89 %		5.17 %
May	33,943.39	33,427.10	217,017.58	179,685.76	82.80 %		6.35 %
Jun	14,264.38	30,697.04	231,281.96	210,382.80	90.96 %		7.43 %
Jul	15,574.78	19,447.65	246,856.74	229,830.45	93.10 %		8.12 %
Ago	50,668.29	16,308.70	297,525.03	246,139.15	82.73 %		8.70 %
Sep	15,574.78	17,170.00	313,099.81	263,309.15	84.10 %		9.30 %
Oct	122,389.09	13.42	435,488.90	263,322.57	60.47 %		9.31 %
Nov	101,794.41		537,283.31				
Dic	2,292,577.31		2,829,860.62				
Total	2,829,860.62	263,322.57					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1.- PLAN DE PROYECTO DE LA ESPND APROBADO.	A1.pdf	09/01/2019
2	ASOCIACION HITO 2.- INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ODS CON FUENTE EPSPND.	A2.pdf	09/01/2019
3	ASOCIACION HITO 3.- BASES DE DATOS, INFORMES, PRESENTACIONES Y SINTAXIS DISEÑADOS	A3.pdf	09/01/2019
4	ASOCIACION HITO 4.- INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DISEÑADOS	A4.pdf	09/01/2019
5	ASOCIACION HITO 5: PRUEBA PILOTO EJECUTADA	A5.pdf	09/01/2019
6	ASOCIACION HITO 6: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROLES DE CONFIDENCIALIDAD CONSTRUIDOS	A6.pdf	09/01/2019
7	ASOCIACION HITO 7: EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	A7.pdf	09/01/2019
8	ASOCIACION HITO 8: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	A8.pdf	09/01/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación construidos	A9.pdf	09/01/2019
10	ASOCIADO HITO 10 :EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	B1.pdf	04/04/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	B2.pdf	09/01/2019
12	ASOCIADO HITO 12: EJECUCIÓN bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	B3.pdf	09/01/2019
13	ASOCIADO HITO 13 CIERRE información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) Recolectada.	B4.pdf	09/01/2019
14	ASOCIADO HITO 14 PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	B5.pdf	11/02/2019
15	ASOCIADO HITO 15 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B6.pdf	18/03/2019
16	ASOCIADO HITO 16 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B7.pdf	01/04/2019
17	ASOCIADO HITO 17 PLANEACIÓN: Elaborar Documento Metodológico	B8.pdf	03/06/2019
18	ASOCIADO HITO 18 PLANEACIÓN: Elaborar Glosario de Términos	B9.pdf	03/06/2019
19	ASOCIADO HITO 19 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	C1.pdf	06/08/2019
20	ASOCIADO HITO 20 PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación	C2.pdf	07/08/2019
21	ASOCIADO HITO 21 PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	C3.pdf	05/09/2019
22	ASOCIADO HITO 22 EJECUCIÓN: Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	C4.pdf	07/10/2019
23	ASOCIADO HITO 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	C5.pdf	07/10/2019
24	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	C6.pdf	07/10/2019
25	ASOCIADO HITO 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	C7.pdf	07/10/2019
26	ASOCIADO HITO 26 PLANEACIÓN: Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	C8.pdf	07/10/2019
27	ASOCIADO HITO 27 EJECUCIÓN: Probar Sistema INFOCAPT y formulario	C9.pdf	06/11/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Urcuango Conumba, Adriana Mabel	Líder de proyecto	Analista Sociodemográfico	adriana_urcuango@inec.gob.ec	
