

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K005 INEC-Actualización del Registro Social

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (Patricio_Rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382804	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,041,811.17
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Donaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	06/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/07/2019
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2019

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Objetivo General: Levantar información socio económico en los hogares de los sectores priorizados por SENPLADES, para los años 2018 y 2019, con el propósito de actualizar los datos del Registro Social; e identificar potenciales beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a nivel de familias como de individuos.

Objetivos Específicos:

1. Actualizar la información de los hogares en las tres provincias afectadas por la catástrofe natural y los 2116 sectores no cubiertos en el operativo 2013 2014.
2. Identificar posibles beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a través del Levantamiento de información socioeconómica en los hogares de las provincias y sectores priorizados.

Propósito.- Generar información que permita la identificación y selección de potenciales beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".

Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan "Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos

- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES, permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

Localidad de Impacto:.- Nacional

Costo: 18'466.362,17

Línea Base: -N/A

Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Producto Final 2019:

1. Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
2. Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
3. Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas en las áreas a intervenir.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)
Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7'816.489 personas registradas.

Restricciones

Tiempo.- El proyecto tendrá una duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el 31 de julio del 2019)

Costo.- 18'466.362,17

Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través de encuestas mediante aplicativo móvil.

Descripción del Producto Final.-

Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

a) Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.

b) Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).

c) Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.33 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

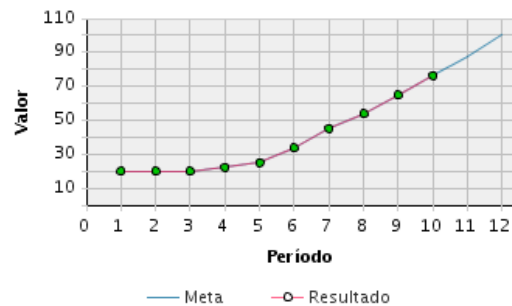

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	20 %	20 %	20 %	22 %	25 %	34 %	45 %	54 %	65 %	76 %	88 %	100 %
	Avance real acumulado											
	20 %	20 %	20 %	22 %	25 %	34 %	45 %	54 %	65 %	76 %		
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2019 Se realizó el levantamiento en el mes de Octubre cumpliendo la fase 10 del proyecto "Actualización del Registro Social", también se sincronizó la información levantada en los hogares	Rivas Villalba, Edwin Patricio	31/10/2019 - 11:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en octubre en las tablets, cumpliendo con el HITO 27.; se espera la remisión de la base por parte de la Unidad del Registro Social		
SEPTIEMBRE 2019 Se realizó el levantamiento en el mes de Septiembre cumpliendo la fase 8 y 9 del proyecto "Actualización del Registro Social", también se retroalimentó al personal civil del proyecto con una capacitación. (HITO-26. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	31/10/2019 - 10:57 AM
AGOSTO 2019 Se realizó el levantamiento en el mes de Agosto cumpliendo la fase 7 del proyecto "Actualización del Registro Social", y los procesos necesarios para el levantamiento del mes de Septiembre, también se realizó la capacitación del personal civil del proyecto. (HITO-25. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	25/09/2019 - 09:42 AM
JULIO 2019 En este mes se levantaron de acuerdo a la programación 42.498 viviendas 5,16% de las viviendas programadas totales llegando a un acumulado total del 23, 32 %.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:42 AM
JUNIO 2019 De acuerdo a la programación establecida, en este mes se realizó la re-instrucción al personal que participa en la Actualización del Registro Social, se realizaron las contrataciones del personal de campo y de los vehículos necesarios para el operativo de campo, y a partir del 15 de junio se comenzó la socialización a las viviendas de los sectores seleccionadas y desde el 18 de junio se inició con el levantamiento de la información. Además indicar que en la zonal del Litoral existió un retraso en la contratación de vehículos lo que ocasionó que alrededor de 40 equipos de levantamiento salgan al quinto día del operativo según lo planificado.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
MAYO 2019 En este mes las zonales terminan en realizar el pedido de contratación de vehículos, como también la de confirmación de participantes necesarios para el levantamiento de la información de campo.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
ABRIL 2019 Mediante Memorando INEC-INEC-2019-0380-M, el señor Director Ejecutivo aprueba y autoriza se inicie las actividades del Plan de Proyecto RS, con lo que las zonales y Administración tanto Central como Campo, inician los procesos para las diferentes contrataciones de personal civil, vehículos, seguros y viáticos, según PDP aprobado.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
MARZO 2019 Mediante Memorando INEC-CGAF-2019-0430-M, en el que se hace conocer el incremento del techo presupuestario del RS, se procedió a la elaboración del Plan de Proyecto, para la aprobación y ejecución de las diferentes actividades dentro del proyecto,.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
FEBRERO 2019 En este mes se sigue realizando gestiones a fin de que nos transfieran de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo, se ha realizado una revisión de la base de datos proporcionada por SENPLADES, en la cual de emitio observaciones para que sean corregidas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:40 AM
ENERO 2019 En este mes se ha realizado gestiones a fin de que se realice la transferencia de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:39 AM
DICIEMBRE 2018 En este mes se continua con las fases 2 y 3 de levantamiento de información teniendo una cobertura del 8,34%, llegando al 12,45% del total de las fases programadas, en este mes se levantaron 64.114 viviendas, de las cuales 47.322 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:39 AM
NOVIEMBRE 2018 En este mes se inicia el levantamiento de la información a partir del 16 de noviembre de 2018, en la cual se levanta información con una cobertura del 4,17% de la información total, levantando 42.355 viviendas, de las cuales 30.179 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:38 AM
OCTUBRE 2018 No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscribió el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, fue dada el 02 de octubre, razón por la cual se realizó una nueva programación en la cual el operativo inicia el 10 de noviembre con el equipo de avanzada y el 16 de noviembre con el equipo de levantamiento de información (HITO 11 asociado).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2018 No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscrito el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, a la fecha no ha sido efectiva (HITO 10. asociado).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	20/11/2018 - 08:41 AM
AGOSTO 2018 No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC. (HITO 9. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/10/2018 - 02:49 PM
JULIO 2018 No se inicio con la ejecución del operativo de campo, con la intervención de hogares socializados, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC.(HITO 8. asociado) En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo del Personal preseleccionado; Ciudad de Sto Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y en la Zona Centro (Ambato), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para el inicio del proyecto. (HITO-7. CUMPLIDO).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/09/2018 - 05:39 PM
JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coord. Zonales y en Administración Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la última capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-7. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:41 AM
JUNIO-2018 En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coord. Zonales y en Administración Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la última capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:15 AM
MAYO-2018 Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/07/2018 - 04:03 PM
ABRIL-2018 Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido) Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el proyecto (HITO-4. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:16 AM
MARZO-2018 Se suscribieron los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
FEBRERO-2018 Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
ENERO-2018 Se realizó observaciones al formulario y manual enviado por SENPLADES-(HITO 1. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 08:52 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. El no contar con el personal necesario planificado CAUSARÍA la disminución de viviendas programadas.	24/10/2019	Edwin Patricio Rivas Villalba	60 %	50	30	2/2

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN"-revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo revisado (formulario y manual)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.27
2	PLANEACIÓN".- Ficha técnica del proyecto definida	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.21
3	PLANEACIÓN".- Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.32
4	PLANEACIÓN".-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados	5-Entregables Intermedios	13/04/2018		13/04/2018		Sí	0.86
5	PLANEACIÓN".- Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado	9-Entregables Formales	23/04/2018		23/04/2018		Sí	1.34
6	EJECUCIÓN.-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.94
7	EJECUCIÓN.-Personal preseleccionado capacitados	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	2.31
8	EJECUCIÓN.-- Personal seleccionado capacitado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	2.04
9	EJECUCIÓN- completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	2.04
10	EJECUCIÓN-Preparación de material cartográfico a nivel Nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.67
11	EJECUCIÓN- Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.67
12	EJECUCIÓN- Hogares a intervenir socializados	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	2.65
13	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre)	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	3.69
14	PLANEACIÓN - Plan de Proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	26/04/2019		26/04/2019		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN - Muestra seleccionada abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN - Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
18	PLANEACIÓN - Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	5.67
22	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	11.33
23	EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	5.67
26	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	11.33
27	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	11.33
28	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	11.33
29	EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	13/12/2019	13/12/2019			No	1.0
30	EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - diciembre	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	11.33

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de viviendas ocupadas con relación al total de viviendas ocupadas		96.67 %	0.3	0.29	01/10/2018	Jul-Sep
2	Procentaje de supervisiones realizadas en función de las supervisiones planificadas		100.00 %	0.25	0.25	15/06/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,041,811.17 **
Costo Total:	9,612,953.83
Total Devengado:	3,473,392.21
% Costo Total Devengado:	36.13 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 36.13 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	535,464.44	6,739,602.82	0.00	7,275,067.26
Ppto. Externo Planeado	3,086,730.66	0.00	0.00	3,086,730.66
Ppto. Aprobado Inicial	640,180.67	1,273,458.23	0.00	1,913,638.90
Ppto. Codificado	3,622,195.10	6,739,602.82	0.00	10,361,797.92
Ppto. Comprometido	211,268.45	0.00	0.00	211,268.45
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	3,622,195.10	6,739,602.82	0.00	10,361,797.92
Ppto. Devengado	2,302,208.35	1,171,183.86	0.00	3,473,392.21
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,302,208.35	0.00	0.00	2,302,208.35
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,319,986.75	6,739,602.82	0.00	8,059,589.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 63.56 %	17.38 %	0.00 %	33.52 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

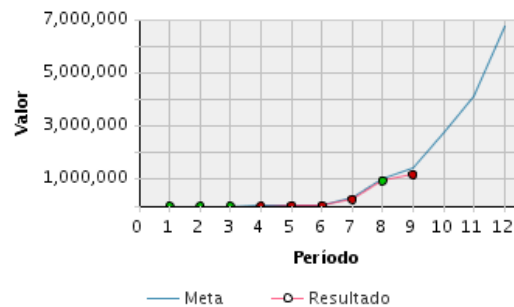

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	10,704.89	0.00	10,704.89	0.00	0.00 %		0.00 %
May	1,452.46	7,817.81	12,157.35	7,817.81	64.31 %		0.12 %
Jun	1,240.65	2,015.55	13,398.00	9,833.36	73.39 %		0.15 %
Jul	320,170.99	252,430.43	333,568.99	262,263.79	78.62 %		3.89 %
Ago	687,647.35	691,768.06	1,021,216.34	954,031.85	93.42 %		14.16 %
Sep	391,895.67	217,152.01	1,413,112.01	1,171,183.86	82.88 %		17.38 %
Oct	1,359,338.14		2,772,450.15				
Nov	1,356,222.56		4,128,672.71				
Dic	2,610,930.11		6,739,602.82				
Total	6,739,602.82	1,171,183.86					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005	ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf	01/06/2018
2	ASOCIACION HITO 17_Personal Civil contratado periodo abril_agosto	B.8.pdf	13/08/2019
3	ASOCIACION HITO 18_Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre-diciembre	B.9.pdf	13/08/2019
4	ASOCIACION HITO 19_ Información y sincroniacion de los hogares levantada - junio	C.1.pdf	28/08/2019
5	ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo"	A.1.pdf	10/07/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 10. "Preparación de material cartográfico a nivel Nacional "	B.1.pdf.pdf	06/05/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 11. "Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto "	B.2.pdf.pdf	06/05/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 12. "Hogares a intervenir socializados "	B.3.pdf.rar	06/05/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 13. "Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre) "	B.4.pdf	06/05/2019
10	ASOCIACIÓN HITO 14 .Plan de Proyecto elaborado y aprobado	B.5.pdf	06/05/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 15 .Muestra Seleccionada	B._6.pdf	06/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	ASOCIACIÓN HITO 16: EJECUCIÓN -Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre	B.7.pdf	13/08/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 2."Ficha técnica del proyecto definida"	A.2.pdf	10/07/2018
14	ASOCIACIÓN HITO 20_Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto	C.2.pdf	28/08/2019
15	ASOCIACIÓN HITO 21_Vehículos contratados periodo abril - agosto	C.3.pdf	28/08/2019
16	ASOCIACIÓN HITO 22_Información y sincroniacion de los hogares levantada - julio	C.4..pdf	30/08/2019
17	ASOCIACIÓN HITO 23_Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre	C.5.pdf	02/09/2019
18	ASOCIACIÓN HITO 24_Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre	C.6.pdf	02/09/2019
19	ASOCIACIÓN HITO 25_Información y sincroniación de los hogares levantada - agosto	C.7.pdf	02/09/2019
20	ASOCIACIÓN HITO 26_Información y sincroniacion de los hogares levantada - septiembre	C8.pdf	22/10/2019
21	ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)"	A.3.pdf	10/07/2018
22	ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados"	A.4.pdf	10/07/2018
23	ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado"	A.5.pdf	10/07/2018
24	ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados"	A.6.pdf	10/07/2018
25	ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado capacitado"	A.7.pdf	14/08/2018
26	ASOCIACIÓN HITO 8. "Personal seleccionado capacitado"	A.8.pdf.rar	27/12/2018
27	ASOCIACIÓN HITO 9. "Completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información "	A.9.pdf.rar	27/12/2018
28	CIERRE PROBLEMA 13/08/2019	PROBLEMA.pdf	13/08/2019
29	CIERRE RIESGO 13/08/2019	RIESGO.pdf	13/08/2019
30	REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2018-2019 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL	REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2018-2019.rar	28/12/2018
31	REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2019	JUSTIF_TEC_REG_SOCIAL.pdf	19/06/2019
32	VERIFICABLE RIESGO 1	INEC-CGTPE-DIES-2018-0444-M_(3)_INFORMES_DE_UTILIZACIÓN_DE_RECURSOS).pdf	28/12/2018
33	VERIFICABLE RIESGO 3	VERIFICABLE_RIESGO_3.pdf	25/10/2019
34	VERIFICABLES RIESGO 2	MEMORANDOS_ZONALES_DE_SOLICITUD_VEHÍCULOS.rar	19/06/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Abril, Martha	Técnica	Miembro de equipo	Marha_Abril@inec.gob.ec	
Arias, José	Técnico	Miembro de equipo	Jose_Arias@inec.gob.ec	2544326/1522
Haro Ibarra, Marlene Azucena	Técnica	Miembro de equipo	marlene_haro@inec.gob.ec	
Jimenez, Jeanneth	Técnica	Miembro de equipo	Jeanneth_Jimenez@inec.gob.ec	2544326/1522

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Lider de Proyecto	Analista Sociodemográfica	Patricio_Rivas@inec.go b.ec	
Tipán, Vladimir	Técnico	Miembro de equipo	Vladimir_Tipan@inec.go b.ec	2544326/1522
