

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K008** VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020.

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Naranjo Orozco, María Lorena (lorena_naranjo@inec.gob.ec)    |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                               | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Albán Fernández, Andrés Gregorio                             | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 31210000.0000.382700                                         | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                         | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 26,736,021.78           |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/01/2018 - 29/12/2023 |
| Fecha de última actualización: | 06/11/2019                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2018              |
| Modificado por:                | Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela                             | Fecha del siguiente Hito:       | 30/09/2019              |

*Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales*

## DATOS GENERALES

### Descripción

La información censal es prioritaria para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la población ya que a través de ella es posible obtener diagnósticos de la situación demográfica y socioeconómica del país, de cada provincia, municipio o localidad; sino se disponen de cifras precisas, oportunas y de calidad se podría incurrir en un deficiente uso de recursos públicos, equivocar las decisiones de política y finalmente no adoptar las acciones necesarias para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

#### Línea Base:

La última información censal disponible corresponde al censo 2010, sus principales resultados a nivel nacional son los siguientes  
Población Total 14.483.499

Área geográfica: Urbana 9.090.786 - Rural 5.392.713

Sexo: Hombres 7.177.683 - Mujeres 7.305.816

Grandes grupos de edad: 0-14 4.528.425 - 15-64 9.014.169 - 65 y más 940.905

Auto identificación según su cultura y costumbres: Indígena 1.018.176 - Afroecuatoriano/afrodescendiente/ negro/ mulato 1.041.559 -

Montubio 1.070.728 - Mestizo 10.417.299 - Blanco 882.383 - Otro 53.354

Estado civil o conyugal: Casado 3.521.424 - Unido 2.214.067 - Separado 526.860 - Divorciado 203.393 - Viudo 413.296 - Soltero 3.960.653

Condición de alfabetismo: Alfabeto 9.282.978 - Analfabeto 672.096

Condición de actividad económica: PEA 6.023.679 - PEI 3.931.395

Discapacidad: Si tiene 816.156 - No tiene 12.546.802

\*Pobreza por NBI\*: Pobres 8.605.803 - No pobres 5.723.803

#### Producto:

Componente 1: Base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada, del 63,7% de sectores censales del país

Componente 2: Informe técnico con información que permita comprobar la planificación del operativo censal, mediante el 100% de ejecución del Censo Experimental, al mes de diciembre de 2019.

Componente 3: Reuniones interinstitucionales realizadas y cuestionario censal aprobado en diciembre 2019

Componente 4: Informe de resultados de la Prueba Piloto de la Encuesta Post Censal, al mes de diciembre de 2019.

Componente 5: Ejecución del 20% de los costos operativos y la adquisición de bienes y servicios conforme los procesos de contratación respectivos durante la ejecución del proyecto; además se aplicará de manera periódica el proceso de seguimiento y control (ejecución física y presupuestaria); y se asegurará el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad.

#### Objetivo General:

## DATOS GENERALES

### Descripción

Proporcionar información actualizada sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas; así como, establecer el volumen y características de las viviendas en que habita la población, y los servicios básicos que disponen, al mayor nivel de desagregación territorial.

### Objetivos Específicos:

1. Disponer de una base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada a nivel nacional, que sirva para la organización y ejecución del empadronamiento, y como insumo para otros procesos asociados a la información cartográfica y pre censal.
2. Comprobar la adecuada planificación del operativo censal en cuanto a sus instrumentos, métodos, sistemas informáticos e infraestructura tecnológica requerida; a través, de un Censo Experimental
3. Proporcionar una base de datos actualizada a nivel nacional con información sobre las características de la población, los hogares y de las viviendas que ellos ocupan, mediante entrevista a los hogares a través de un cuestionario censal
4. Generar información que permita evaluar directamente la cobertura y calidad de los resultados del censo, a través de una Encuesta Post Censal realizada a una muestra representativa de la población objetivo del empadronamiento.
5. Coordinar la gestión operativa y logística de las actividades, así como realizar procesos de monitoreo y seguimiento del proyecto; y el aseguramiento de su calidad."

### Beneficios Cualitativos

Información base de 50.561 sectores censales amanzanados y dispersos.

5056 sectores censales amanzanados y dispersos actualizados, supervisados, revisados, digitados y digitalizados, durante el año 2018

### Tipo de Beneficiario

Instituciones del Sistema Estadístico Nacional

Instituto Nacional de Estadística y Censos

### Restricciones

Tiempo: La demora en la adquisición (suministros, equipos de oficina, equipos tecnológicos, etc.) De acuerdo al cronograma planificado ocasionaría un retraso para el inicio de las actividades del proceso de preparación de material.

Costo: El recorte de presupuesto del proyecto, causaría retraso o suspensión de actividades planificadas.

Alcance: Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos, y la realización de investigaciones en el ámbito geográfico que fortalezcan la producción estadística del INEC.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 30.76 %

Fecha de Inicio: 02/01/2018

Fecha de Fin: 29/12/2023

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

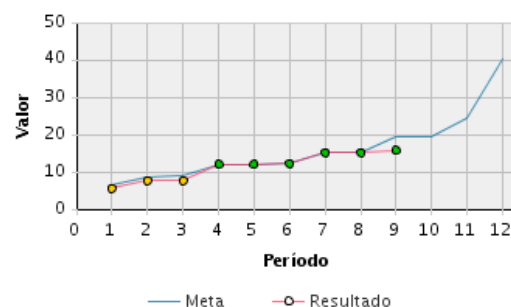

### Porcentaje de Avance

| Año    | Ene                         | Feb | Mar | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|--------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2019   | Avance programado acumulado |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | 7 %                         | 9 % | 9 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 19 % | 19 % | 24 % | 40 % |
|        | Avance real acumulado       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | 6 %                         | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 16 % |      |      |      |
| Estado |                             |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Porcentaje de Avance |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Año                  | Ene                                                                               | Feb                                                                               | Mar                                                                               | Abr                                                                               | May                                                                               | Jun                                                                               | Jul                                                                               | Ago                                                                               | Sep                                                                                | Oct | Nov | Dic |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>AGOSTO 2019</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el levantamiento de información en campo de las jornadas 9 y 10 (Actualización Cartográfica)</li> <li>Avance en la construcción del sistema de codificación automática y asistida y del sistema de áreas de empadronamiento (Censo Experimental).</li> <li>Ajuste en el diseño del operativo de campo del Censo Experimental en función a los resultados de la Actualización Cartográfica 2020. (Censo Experimental).</li> <li>Reuniones en mesas temáticas con Organizaciones Sociales, Academia y Organismos Internacionales, además de reuniones internas con la Gerencia del Proyecto y la Dirección Ejecutiva del INEC, para realizar ajustes en el cuestionario censal. (Empadronamiento).</li> <li>Elaboración de manuales e instructivos preliminares (Post Censal).</li> <li>Se realizó Talleres "Rumbo al Censo 2020" para la construcción del cuestionario censal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Naranjo Orozco, María Lorena | 05/09/2019 - 11:17 AM         |
| <b>Julio 2019</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones en mesas temáticas (Comisión Especial de Estadística CPV2020) otras reuniones con Organizaciones Sociales, Academia y Organismos Internacionales.</li> <li>Ajuste en el diseño de manuales e instructivos a utilizar en el Censo Experimental.</li> <li>Ajuste al cuestionario censal con observaciones de la piloto y las mesas temáticas Empadronamiento.</li> <li>Avance en la construcción del sistema de codificación automática y asistida Actualización Cartográfica.</li> <li>La Presidencia de la República aprobó el uso del logo Censo independiente a la imagen gubernamental.</li> <li>Se generó el reporte de indicadores de calidad para actualización cartográfica en función de la última actualización de los indicadores solicitada por la gerencia del proyecto.</li> <li>Se trabajó en la propuesta de indicadores de calidad para el censo experimental.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lara Bolaños, Luis Bayardo   | 20/08/2019 - 10:34 AM         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación de Digitalización Cartográfica</li> <li>Actualización de sectores censales en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</li> <li>Preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</li> <li>Cumpliendo con el cronograma establecido de la Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020, se solicitó a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional presenten sus necesidades de información para el análisis de las mismas, además se incluyó solicitudes de varias entidades públicas y privadas, que realizaron oportunamente sus requerimientos, en total se receptaron en total 320 requerimientos.</li> <li>En base a las observaciones realizadas en la tercera prueba piloto, y a las propuestas presentadas por las instituciones del Sistema Estadístico Nacional, se realizaron reuniones de trabajo interinstitucionales para la definición del cuestionario censal para la IV prueba piloto.</li> <li>Ejecución de la IV prueba piloto del Cuestionario Censal - en 4 dominios seleccionados en área urbana y rural-. Se evaluaron las variables de discapacidad de acuerdo a recomendaciones internacionales, estado civil o conyugal, reciclaje, mascotas, la nueva metodología de las preguntas de trabajo, otras modificaciones en diseño y contenido; además de tiempos de diligenciamiento.</li> </ul> | Naranjo Orozco, María Lorena | 15/07/2019 - 04:43 PM         |
| <b>MAYO 2019</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de mesas temáticas (Comisión Especial de Estadística), otras reuniones con Sociedad Civil y Academia para construir el cuestionario</li> <li>Reuniones internas para ajustes a los instrumentos censales.</li> <li>Ajuste al diseño de manuales conforme se avanza en la construcción del cuestionario</li> <li>Se construyeron los manuales de sectores homogéneos para Administración Central Campo y Coordinaciones Zonales</li> <li>Crítico e integrar la base de datos de Sectores Revisados en Administración Central Campo y Coordinaciones Zonales</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naranjo Orozco, María Lorena | 12/06/2019 - 03:50 PM         |
| <b>ABRIL 2019</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de mesas temáticas con instituciones públicas y II Taller de Planificación del Empadronamiento</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Naranjo Orozco, María Lorena | 12/06/2019 - 03:45 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2. Ejecución de la III Prueba Piloto del cuestionario censal</p> <p>3. Preparación de material para campo</p> <p>4. Levantamiento de Campo (Actualización Cartográfica)</p> <p>5. Elaboración de video de lanzamiento, coberturas de las pruebas piloto y de la CEE, Caja de mensajes para Voceros INEC</p> <p>6. Se cuenta con el primer borrador de las actividades del MPE definidas para los cuatros componentes, además se inició con el reporte de los indicadores de calidad para actualización cartográfica, cuyo primeros resultados se generarán en el siguiente mes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                               |
| <p>MARZO 2019:</p> <p>1. Se realizó la capacitación del personal civil para Actualización cartográfica.</p> <p>2. Ajustes al sistema SIPE</p> <p>3. Se remitieron los instrumentos para la capacitación y actualización cartográfica (formulario, manuales, instructivos, videos).</p> <p>4. Preparación de material y generación de tiles (jornada 1).</p> <p>5. Se realizaron talleres internos de definición del cuestionario censal para discusión en la Comisión Especial de Estadística 2020.</p> <p>6. Elaboración de matriz de comparación del cuestionario 2020 con los censos de la Región.</p> <p>7. Planificación y Organización de la III Prueba Piloto, ajuste al cuestionario y documentos de capacitación.</p> <p>8. Elaboración de hoja de ruta, insumos, designación de delegados y funciones para la activación de la Comisión Especial de Estadística 2020 y los grupos temáticos de discusión del cuestionario censal 2020.</p> <p>9. Avance de 43.272 descripciones y códigos ingresados de imágenes del censo 2010 para el sistema de codificación automática y asistida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Albán Fernández,<br>Andrés Gregorio | 04/04/2019 - 02:43 PM         |
| <p>FEBRERO 2019:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de Coordinación del CPV para el componente de actualización cartográfica</p> <p>2.- Elaboración y revisión de instrumentos para el componente de actualización cartográfica.</p> <p>3.- Preparación de material para capacitación en actualización cartográfica</p> <p>6.- Se realizó curso a personal técnico del INEC sobre el proceso de actualización cartográfica</p> <p>7.- Capacitación al personal que realizará las actividades de preparación de material para el objetivo Campo</p> <p>7.- Se realizó prueba de funcionalidad del aplicativo para el levantamiento de la información en campo en el cantón Cevallos</p> <p>8.- Se realizó el cuestionario preliminar para la Comisión especial de estadística</p> <p>9.- Se desarrolló el plan de trabajo para la Comisión especial de estadística</p> <p>10. Digitación de los formularios cpv para la codificación automática cpv 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Albán Fernández,<br>Andrés Gregorio | 04/04/2019 - 02:43 PM         |
| <p>ENERO 2019:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de Coordinación del CPV para el componente de actualización cartográfica</p> <p>2.- Elaboración y revisión de instrumentos para el componente de actualización cartográfica.</p> <p>3.- Se realizaron pruebas al aplicativo del Precenso.</p> <p>4.- Elaboración de Adendum al Plan de Dirección de Proyecto CPV 2020.</p> <p>5.- Preparación de material para capacitación en actualización cartográfica</p> <p>6.- Elaboración del Informe consolidado a nivel nacional de la 2da prueba piloto del cuestionario censal</p> <p>7.- Construcción del Sistema de ingreso de datos de cuestionarios de pruebas piloto</p> <p>8.- Ingreso y base de datos de cuestionarios de 2da prueba piloto</p> <p>9.- Ajuste al cuestionario preliminar para discusión interinstitucional en base a prueba piloto y observaciones de Coordinaciones Zonales.</p> <p>10.- Documentos de planificación: matriz de personal ocasional, matriz de desarrollos informáticos, información para el 1er adendum del proyecto, asignación de responsabilidades, elaboración de matriz de necesidades de espacio físico, revisión y corrección de partidas, objetos de contratación y grupos de gasto.</p> <p>11.- Elaboración de hoja de ruta, mapeo de instituciones, conformación de grupos temáticos, revisión de resolución de la Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020.</p> <p>12.- Participación de prueba en campo del formulario del pre censo y en pruebas del sistema informático.</p> | Albán Fernández,<br>Andrés Gregorio | 07/02/2019 - 04:09 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 12 cumplido).</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 13 cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albán Fernández,<br>Andrés Gregorio | 07/02/2019 - 04:09 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>4.- Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>5.- Se realizó el plan del proyecto del CPV-2020 para el año 2019.</p> <p>6.- Se realizó la reunión de evaluación y planificación del CPV-2020.</p> <p>7.- Se realizó la prueba piloto del aplicativo de ingreso del precenso en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>8.- Ajuste de coberturas censales a los límites del CONALI, en Administración Central y las Coordinaciones Zonales.</p> |                             |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 11 cumplido).</p> <p>3.-Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>4.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p> <p>5.- Se atiende las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>6.- Se realiza reuniones de seguimiento para revisar el Sistema de Precenso.</p>              | Meza Moreno, Aldana Geomara | 03/01/2019 - 11:56 AM         |
| <p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 10 cumplido).</p> <p>3.-Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>4.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p> <p>5.- Se atiende las observaciones emitidas por SENPLADES.</p>                                                                                                    | Meza Moreno, Aldana Geomara | 02/12/2018 - 08:45 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 9 cumplido).</p> <p>4.-Se realizó la capacitación del proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>5.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p>                                                  | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/10/2018 - 08:25 AM         |
| <p>AGOSTO 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 8 cumplido).</p> <p>4.-Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.</p>                                                                                                                                                                                                           | Meza Moreno, Aldana Geomara | 03/10/2018 - 08:51 AM         |
| <p>JULIO 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 7 cumplido).</p> <p>4.- Se realizó la prueba piloto del sistema de ingreso en tablets en la ciudad de Santo Domingo</p> <p>5.- Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.</p>                                                                                                    | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/09/2018 - 02:38 PM         |
| <p>JUNIO 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 6 cumplido).</p> <p>4.- Se realizo la prueba del formulario para el Censo 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                               | Meza Moreno, Aldana Geomara | 20/08/2018 - 09:13 AM         |
| <p>MAYO 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.- Se realizó el 2do adendum del proyecto para realiar la replanificación dle</p> <p>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>4.- Informe de avance (Hito5 cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                            | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/06/2018 - 08:20 AM         |
| <p>ABRIL 2018:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.- Se realizó el taller de Cartografía para definir metodologías para el proceso de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>4.- Informe de avance (Hito4 cumplido).</p>                                                                                                                                                                                          |                             |                               |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>MARZO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para definir las metodologías a desarrollar para la preparación de material para el operativo de campo.<br>2.- Se asistió al taller del Censo 2020 para identificación de necesidades<br>3.- Informe de avance (Hito3 cumplido).                                                                                                                                                                                                         | Meza Moreno, Aldana Geomara | 27/04/2018 - 08:10 AM         |
| <b>FEBRERO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo con algunas Instituciones (Agencia de Regulación Postal, Senplades, Instituto Geográfico Militar) con el objetivo de obtener información estandarizadas para el diseño de Cartografía.<br>2.- Se revisó las imágenes satélites de la empresa "Digital Globe" que nos proporcionaron una cuenta de pruebas para poder evaluar estas imágenes para su adquisición.<br>3.- Informe de avance del diseño del formulario (Hito 2 cumplido). | Meza Moreno, Aldana Geomara | 29/03/2018 - 08:49 AM         |
| <b>ENERO 2018:</b><br>1.- Se realizó el requerimiento inicial par la generación del sistema de ingreso de información.<br>2.- Se mantuvo un taller para planificación y definición de actividades del VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020. (Hito 1 cumplido).<br>3.- Se realizó reuniones de trabajo para la definición del Formulario al año anterior con las áreas de Sociodemográficas y Muestreo.<br>4.- Se realizó la planificación a mas detalle para el proyecto CPV-2020     |                             |                               |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de última actualización | Responsable                 | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Alcance.</b><br>El retraso o negacion de los avales de Inmobiliar y Mintel causaría retraso para las adecuaciones y/o alquiler de los espacios físicos, y la adquisición de equipos informáticos para la actividades de Actualización Cartográfica y el Censo Experimental. | 05/09/2019                    | María Lorena Naranjo Orozco | 50 %         | 90      | 45           | 2/2                         |
| <b>5- PROYECTO. Alcance.</b><br>El retraso en el cumplimiento de la cargas establecidas en el levantamiento de campo CAUSARÍA un desfase en la programación y en las metas planificadas.                                                                                                    | 05/03/2018                    | Aldana Geomara Meza Moreno  | 40 %         | 60      | 24           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|   | Hito                                                                                                      | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Planeación: Actas de reuniones realizadas para identificar necesidades y aprobación del Plan de Proyecto. | 1-Solicitud de Información | 24/01/2018         |                | 24/01/2018 |          | Sí            | 0.22          |
| 2 | Ejecución: Avance de diseño de formularios Ca-04 y Ca-06.                                                 | 4-Inicio de Trabajo        | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 0.33          |
| 3 | Ejecución: Avance de diseño de documentos metodológicos.                                                  | 4-Inicio de Trabajo        | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |          | Sí            | 0.39          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - abril                           | 4-Inicio de Trabajo       | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |    | Sí            | 0.49          |
| 5  | Ejecución: Reporte de cobertura de investigación en el período de enero a mayo 2018.                           | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |    | Sí            | 0.33          |
| 6  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - junio                           | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 7  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - julio                           | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |    | Sí            | 0.49          |
| 8  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - agosto                          | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 9  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - septiembre                      | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |    | Sí            | 0.49          |
| 10 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - octubre                         | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 11 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - noviembre                       | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |    | Sí            | 0.49          |
| 12 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre final                 | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         |                | 28/12/2018 |   | Sí            | 0.28          |
| 13 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre                       | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         |                | 28/12/2018 |  | Sí            | 0.5           |
| 14 | Ejecución: Aplicativo elaborado y entregado (ACT CARTOGRAFICA)                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019         |                | 17/04/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 15 | Ejecución: Documento de metodología censal elaborado (EMPADRONAMIENTO)                                         | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019         |                | 28/02/2019 |  | Sí            | 2.0           |
| 16 | Ejecución: Portafolio de imagen gráfica inicial del censo elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)                       | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         |                | 01/04/2019 |  | Sí            | 0.53          |
| 17 | Ejecución: Material cartográfico para el operativo de campo preparado (ACT CARTOGRAFICA)                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |  | Sí            | 3.0           |
| 18 | Ejecución: Cuestionario preliminar ajustado para encuesta post censal elaborado (POST CENSAL)                  | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 28/06/2019 |  | Sí            | 0.08          |
| 19 | Ejecución: Instrumentos necesarios para el proceso de actualización cartográfica elaborados (ACT CARTOGRAFICA) | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         |                | 31/07/2019 |  | Sí            | 3.0           |
| 20 | Ejecución: Manuales e instructivos preliminares para encuesta post censal elaborados (POST CENSAL)             | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019         |                | 30/08/2019 |  | Sí            | 0.08          |
| 21 | Definición: Cuestionario censal para pruebas y censo                                                           | 5-Entregables Intermedios | 17/09/2019         |                | 26/09/2019 |  | Sí            | 0.52          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | experimental elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)                                                                        |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 22 | Definición: Concertaciones interinstitucionales para construir el cuestionario censal realizadas (EMPADRONAMIENTO) | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |    | No            | 2.0           |
| 23 | Ejecución: Estrategia comunicacional para el censo experimental elaborada (CENSO EXPERIMENTAL)                     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |    | No            | 0.53          |
| 24 | Ejecución: Informes técnicos de pruebas pilotos elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |    | No            | 0.52          |
| 25 | Planeación: Documentos para el censo experimental: manuales e instructivos elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |    | No            | 0.26          |
| 26 | Planeación: Documentos para el procesamiento: manuales y planes elaborados (POST CENSAL)                           | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         | 30/09/2019     |            |    | No            | 0.17          |
| 27 | Ejecución: Documentos para el procesamiento: manuales y planes elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)                     | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019         | 31/10/2019     |            |    | No            | 0.26          |
| 28 | Ejecución: Material cartográfico (mapas, planos, ca04 y ca06) digitalizados (ACT CARTOGRAFICA)                     | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         | 30/11/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 29 | Ejecución: Base de datos de resultados preliminares aprobada (CENSO EXPERIMENTAL)                                  | 5-Entregables Intermedios | 05/12/2019         | 05/12/2019     |            |  | No            | 0.53          |
| 30 | Ejecución: Informes técnicos de prueba piloto elaborados (POST CENSAL)                                             | 5-Entregables Intermedios | 13/12/2019         | 13/12/2019     |            |  | No            | 0.17          |
| 31 | Ejecución: Métodos de análisis de satisfacción a usuarios definidos (COMUNICACIÓN)                                 | 5-Entregables Intermedios | 13/12/2019         | 13/12/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 32 | Definición: Plan de dirección del proyecto CPV 2020 aprobado (periodo 2020)                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 2.0           |
| 33 | Ejecución: Base de datos del censo experimental aprobada (CENSO EXPERIMENTAL)                                      | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 0.53          |
| 34 | Ejecución: Documento de análisis de resultados del censo experimental elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)              | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 0.26          |
| 35 | Ejecución: Información cartográfica y listados de jefes de hogar actualizados (ACT CARTOGRAFICA)                   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 7.0           |
| 36 | Ejecución: Informe de evaluación de la aplicación del plan de comunicación elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)          | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 0.53          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                        | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 37 | Ejecución: Informe técnico de evaluación del censo experimental elaborado                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |    | No            | 0.53          |
| 38 | Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |    | No            | 1.0           |
| 39 | Planeación: Cuestionario censal definitivo aprobado (EMPADRONAMIENTO)                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |    | No            | 2.0           |
| 40 | Ejecución: Cuestionario para encuesta Post censal aprobado                                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020         | 30/06/2020     |            |    | No            | 2.5           |
| 41 | Ejecución: Base de datos del pre censo aprobada                                                             | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020         | 31/08/2020     |            |    | No            | 10.0          |
| 42 | Ejecución: Informe técnico de levantamiento del censo nacional elaborado                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |    | No            | 20.0          |
| 43 | Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |    | No            | 3.0           |
| 44 | Ejecución: Base de datos preliminar del censo nacional aprobado                                             | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2021         | 28/02/2021     |            |    | No            | 2.0           |
| 45 | Ejecución: Base de datos definitiva del censo nacional aprobado                                             | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            |   | No            | 6.0           |
| 46 | Ejecución: Informe de resultados Encuesta Post censal aprobado                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            |  | No            | 2.0           |
| 47 | Ejecución: Base de datos geográfica y alfanumérica entregada                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |  | No            | 6.0           |
| 48 | Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |  | No            | 2.0           |
| 49 | Ejecución: Documentos de análisis de resultados elaborados                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         | 31/12/2022     |            |  | No            | 3.0           |
| 50 | Ejecución: Documentos de proyecciones de población elaborados                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         | 31/12/2022     |            |  | No            | 1.0           |
| 51 | Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         | 31/12/2022     |            |  | No            | 2.0           |
| 52 | Cierre: Informes de cierre de proyecto aprobado                                                             | 9-Entregables Formales    | 29/12/2023         | 29/12/2023     |            |  | No            | 0.19          |
| 53 | Cierre: Informes de cierre de proyecto elaborado                                                            | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         | 29/12/2023     |            |  | No            | 0.3           |

# INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                        | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Sectores Censales actualizados                                     |  | 73.68 %           | 0.19 | 0.14                  | 01/01/2019      | Abr-Jun                    |
| 2 | Porcentaje de Informes de evaluación del Censo Experimental realizados           |  | 108.00 %          | 0.25 | 0.27                  | 01/01/2019      | Abr-Jun                    |
| 3 | Porcentaje de informes del avance de empadronamiento realizados                  |  | 100.00 %          | 0.1  | 0.1                   | 01/01/2019      | Abr-Jun                    |
| 4 | Porcentaje de informes de avance de la Encuesta post censal realizados           |  | 75.00 %           | 0    | 0                     | 01/01/2019      | Abr-Jun                    |
| 5 | Porcentaje de cumplimiento del presupuesto y actividades del proyecto ejecutados |  | 100.00 %          | 0.1  | 0.1                   | 01/01/2019      | Abr-Jun                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 26,736,021.78 ** |
| Costo Total:                  | 72,397,330.62    |
| Total Devengado:              | 8,895,346.39     |
| % Costo Total Devengado:      | 12.29 %          |

**\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 12.29 %

## Perfil Económico 2019

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 1,719,633.57   | 25,276,752.45     | 0.00         | 26,996,386.02 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 4,715,207.88   | 17,314,320.79     | 0.00         | 22,029,528.67 |
| Ppto. Codificado                                        | 1,719,633.57   | 25,276,752.45     | 0.00         | 26,996,386.02 |
| Ppto. Comprometido                                      | 1,478,263.44   | 12,818,158.17     | 0.00         | 14,296,421.61 |
| Planeado - Codificado (2019)                            |                | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 1,719,633.57   | 25,276,752.45     | 0.00         | 26,996,386.02 |
| Ppto. Devengado                                         | 1,459,269.33   | 7,436,077.06      | 0.00         | 8,895,346.39  |
| Pagado Real                                             | 1,053,623.61   | 6,470,837.62      | 0.00         | 7,524,461.23  |
| Estimado a fin de año                                   | * 1,459,269.33 | 0.00              | 0.00         | 1,459,269.33  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 260,364.24     | 25,276,752.45     | 0.00         | 25,537,116.69 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 84.86 %      | 29.42 %           | 0.00 %       | 32.95 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

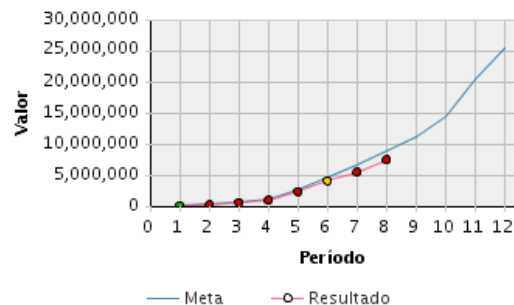

## Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 105,653.27                 | 103,874.09          | 105,653.27                   | 103,874.09            | 98.32 %          |        | 0.41 %       |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 165,445.97                 | 106,190.49          | 271,099.24                   | 210,064.58            | 77.49 %          |        | 0.83 %       |
| Mar                      | 411,968.43                 | 354,482.81          | 683,067.67                   | 564,547.39            | 82.65 %          |        | 2.23 %       |
| Abr                      | 453,108.80                 | 392,587.25          | 1,136,176.47                 | 957,134.64            | 84.24 %          |        | 3.79 %       |
| May                      | 1,547,869.59               | 1,318,491.26        | 2,684,046.06                 | 2,275,625.90          | 84.78 %          |        | 9.00 %       |
| Jun                      | 1,869,926.90               | 1,736,025.77        | 4,553,972.96                 | 4,011,651.67          | 88.09 %          |        | 15.87 %      |
| Jul                      | 2,092,520.50               | 1,444,212.49        | 6,646,493.46                 | 5,455,864.16          | 82.09 %          |        | 21.58 %      |
| Ago                      | 2,271,495.12               | 1,980,212.90        | 8,917,988.58                 | 7,436,077.06          | 83.38 %          |        | 29.42 %      |
| Sep                      | 2,259,326.12               |                     | 11,177,314.70                |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 3,113,050.43               |                     | 14,290,365.13                |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 6,025,875.96               |                     | 20,316,241.09                |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 4,960,511.36               |                     | 25,276,752.45                |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>25,276,752.45</b>       | <b>7,436,077.06</b> |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                   | Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información. |

| Objetivos Operativos Matriciales                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                                                                                                                                                                                    | Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos y la incorporación de dispositivos móviles en el levantamiento de información. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                            | Archivo                                          | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  |                                                                                   | Variaciones_logo2_Censo_25_Marzo_2019_HITO16.pdf | 14/06/2019    |
| 2  | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO                                                 | A3.PDF                                           | 29/03/2018    |
| 3  | ASOCIACION HITO 1.- ACTA DE REUNION                                               | A1.pdf                                           | 06/03/2018    |
| 4  | ASOCIACION HITO 2.- INFORME DE AVANCE DEL DISEÑO DEL FORMULARIO                   | A2.pdf                                           | 06/03/2018    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | B2.pdf                                           | 03/11/2018    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 11.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | B3.pdf                                           | 16/01/2019    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 12.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | B4.pdf                                           | 11/01/2019    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 13.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | B5.pdf                                           | 03/01/2019    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 14.- Aplicativo elaborado y entregado (ACT CARTOGRAFICA)          | B6.HITO_14_APLICATIVO.pdf                        | 28/06/2019    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 15.- DOCUMENTO DE METODOLOGÍA CENSAL ELABORADO                    | B7.HITO_15_METODOLOGIA_CENSAL.rar                | 28/06/2019    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 16.- PORTAFOLIO DE IMAGEN GRAFICA INICIAL DEL CENSO ELABORADO     | HITO_16_PORTAFOLIO_DE_IMAGEN_GRAFICA.pdf         | 07/05/2019    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 16.- PORTAFOLIO DE IMAGEN GRAFICA INICIAL DEL CENSO ELABORADO v2  | hITO16.rar                                       | 14/06/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                  | Archivo                                 | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                               | Hito_17.pdf                             | 17/06/2019    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORME MATERIAL CARTOGRAFICO                                                                      | HITO_17_MATERIAL_CARTOGRAFICO.pdf       | 07/05/2019    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 18: Cuestionario aprobado ajustado                                                                      | B9.pdf                                  | 16/09/2019    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO 18: Instrumentos necesarios para el proceso de actualización cartográfica elaborados (ACT CARTOGRÁFICA) | C2_.pdf.pdf                             | 05/08/2019    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 20: Manuales e instructivos aprobados                                                                   | C2.pdf                                  | 16/09/2019    |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO 21.- CUESTIONARIO CENSAL PARA PRUEBAS Y CENSO EXPERIMENTAL ELABORADO (CENSO EXPERIMENTAL)               | Cuestionario_Particulares_10_OCT_V1.pdf | 22/10/2019    |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO 3.- INFORME DE AVANCE METODOLÓGICO                                                                      | A4.PDF                                  | 24/04/2018    |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO 4.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | A5.PDF                                  | 09/05/2018    |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO 5.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | A6.pdf                                  | 03/07/2018    |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO 6.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | A7.PDF                                  | 03/08/2018    |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO 7.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | A8.pdf                                  | 03/08/2018    |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO 8.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | A9.PDF                                  | 04/10/2018    |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO 9.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA                                        | B1.PDF                                  | 04/10/2018    |
| 26 | Dictamen de Prioridad del Proyecto CPV                                                                                  | Dictamen_de_prioridad_Proyecto_CPV.pdf  | 06/02/2019    |
| 27 | Expediente de Reestructura del Proyecto CPV 2020                                                                        | Exp_Reestruct_proyecto_CPV.pdf          | 06/02/2019    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                                  | Rol                | Puesto                                                                                   | Correo Electrónico             | Teléfono(s) |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cañizares Hinojosa, Luis Eduardo        | Miembro de Equipo  | Miembro de equipo                                                                        | luis_canizares@inec.gob.ec     | 2231600     |
| Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline | Miembro de Equipo  | Responsable de la Gestión de Operaciones de Campo y Actualización Cartográfica a Hogares | estefania_encalada@inec.gob.ec |             |
| Naranjo Orozco, María Lorena            | Líder del Proyecto | Gerente del Proyecto VIII Censo de Población y VII de Vivienda                           | lorena_naranjo@inec.gob.ec     |             |
| Valdivia Miranda, Cecilia Marisol       | Miembro de Equipo  | Jefa de la Unidad de gestión de estadísticas estructurales, sociales y demográficas      | cecilia_valdivia@inec.gob.ec   |             |
