

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K007 Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

Líder del Proyecto:	Urcuango Conumba, Adriana Mabel (adriana_urcuango@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Andrade, Diego	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382902	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,899,258.79
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	04/09/2018 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	07/07/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

DATOS GENERALES

Descripción

La Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, es una operación estadística, que proporciona información para la evaluación y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A partir de EPSPND, se garantiza la sostenibilidad y comparabilidad de información con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, que antes se utilizaba como instrumento de monitoreo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

Productos:

Los productos que se entregarán al finalizar el proyecto, permitirán monitorear los 33 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo:

- Presentación de Resultados
- Base de datos
- Formulario
- Sintaxis.
- Tabulados Marco conceptual vigente
- Metodología
- Informe ejecutivo

Línea base del proyecto

En los últimos diez años, debido a la frecuencia anual y población objetivo de investigación, la ENEMDU ha sido el instrumento de medición de los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, surge la necesidad de disponer una encuesta específica multitemática, diseñada para la medición de los 35 indicadores del PND; de los cuales 19 fueron considerados para el diseño; 14 se encuentran en construcción y 2 no son factibles de investigar. A partir de lo mencionado, se establece que la línea base son los 19 indicadores de diseño, con una medición actualizada en la ENEMDU de diciembre 2017.

Objetivo general:

Generar información que permita el cálculo y seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 a través de una operación estadística, alineada al modelo de producción establecido.

Objetivos específicos

- . Planificar, diseñar, construir y validar la operación estadística para la realización de la encuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021.
- . Recolectar la Información por medio de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2017-2022.

Beneficios Cualitativos

- La información estadística a partir de la EPSPND, constituye el principal insumo para el monitoreo y evaluación de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de perfiles de la población: sociodemográfico, económico y social, permitirá integrar información básica, relevante y necesaria, para los procesos de planificación y toma de decisiones de los actores de política pública.

- Al ser un proyecto de inversión pública y por la naturaleza de actuar del INEC, que es producir, analizar y difundir información estadística oficial y oportuna. El proyecto genera insumos que son utilizados por los encargados de generar políticas encaminadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

Beneficios Cualitativos

- Generar indicadores e información actualizada de temas de educación, vivienda hogar, calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, entre otros. A fin de garantizar el seguimiento y evaluación a los múltiples objetivos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios que utilizarán la información son las siguientes instituciones:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL)
- Ministerio del interior
- Fiscalía General del Estado
- Consejo de la Judicatura
- Población Estudiantil

Las mismas que se beneficiarán las siguientes temáticas:

- Educación, Datos de la Vivienda y El Hogar, TICS, Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Corrupción y transparencia.
- Educación
- Datos de la Vivienda y El Hogar
- TICS
- Seguridad Ciudadana
- Seguridad Ciudadana
- Corrupción y Transparencia

Restricciones


No disponer de capital humano especializado en encuestas, para ejecutar el proyecto.
No contar a tiempo con una marco de muestreo actualizado, para la selección de las viviendas de la encuesta.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 79.18 %

Fecha de Inicio: 04/09/2018

Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

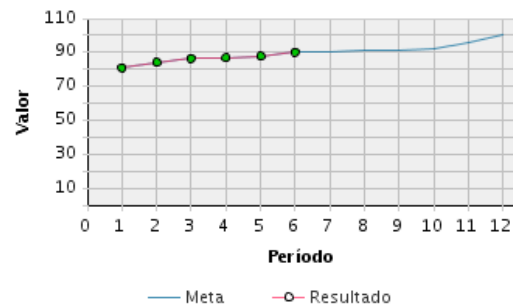

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	81 %	84 %	86 %	87 %	88 %	90 %	91 %	91 %	92 %	92 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	81 %	84 %	86 %	87 %	88 %	90 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO JUNIO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 52: Cierre.- Se cuenta con el reporte de indicadores de calidad de la ESPND elaborado HITO ASOCIADO 53: Cierre.- Se cuenta con el Informe de evaluación de los indicadores de calidad elaborado HITO ASOCIADO 54: Definición.- Se cuenta con el Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado. HITO ASOCIADO 55: Definición.- Se cuenta con los productos estadísticos diseñados, formularios ESPND 1 y 2 HITO ASOCIADO 56: Ejecución.- Se cuenta con el registro de respuesta a los requerimientos de información de usuarios HITO ASOCIADO 57: Ejecución.- Se cuenta con los medios de difusión de la ESPND habilitados	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/07/2020 - 11:49 AM
PERIODO: MAYO 2020 HITO ASOCIADO 49: Planeación.- Se cuenta con el documento de comparabilidad entre la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y ENEMDU elaborado. HITO ASOCIADO 50: Planeación.- Se cuenta con el documento metodológico de la operación estadística ESPND 2020 elaborado. HITO ASOCIADO 51: Planeación.- Se cuenta con el Plan de Dirección de Proyecto ESPND 2020 elaborado y aprobado con memo Nro. INEC-INEC-2019-1728-M	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	05/06/2020 - 12:47 PM
PERIODO: ABRIL 2020 Descripción HITO ASOCIADO 48: Cierre .- Se archivaron los formularios físicos.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/05/2020 - 03:38 PM
PERIODO: MARZO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 43: Ejecución.- Se cuenta con los productos mínimos de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo finalizados. HITO ASOCIADO 44: Ejecución.- Se cuenta con el documento elaborado de análisis de consistencia y coherencia de resultados. HITO ASOCIADO 45: Ejecución.- Se enviaron los productos mínimos por correo electrónico para aprobación. HITO ASOCIADO 46: Ejecución.- Productos mínimos cargados en el Repositorios Institucional de Bases de Datos, listos para publicar. HITO ASOCIADO 47: Ejecución.- Comunicación de disponibilidad de información de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo en la página web institucional.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/04/2020 - 04:57 PM
PERIODO: FEBRERO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 34 Ejecución.- Se elaboró el plan de muestreo. HITO ASOCIADO 35 Cierre.- Se elaboró la matriz de indicadores de calidad para la ESPND. HITO ASOCIADO 36 Ejecución.- Se elaboró el Boletín Técnico. HITO ASOCIADO 37 Ejecución.- Se elaboró el documento de acuerdo de confidencial HITO ASOCIADO 38 Ejecución.- Se elaboró el plan de tabulados. HITO ASOCIADO 39 Ejecución.- Se elaboraron los productos estadísticos para publicar HITO ASOCIADO 40 Ejecución.- Se consolidaron los productos mínimos HITO ASOCIADO 41 Planeación.- Se elaboró el documento de continuidad de la operación estadística. HITO ASOCIADO 42 Planeación.- Se elaboró la matriz de identificación de usuarios.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/03/2020 - 11:29 AM
PERIODO: ENERO 2020 Descripción HITO CUMPLIDO 32 Ejecución.- Se descargo y generó las variables auxiliares en la base de datos ESPND HITO CUMPLIDO 33 Planeación .- Se alcanzó la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto ESPND 2020	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/02/2020 - 10:42 AM
PERIODO: DICIEMBRE 2019 Descripción: HITO CUMPLIDO 30 EJECUCIÓN: Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) HITO CUMPLIDO 31 PLANEACIÓN: Se diseño Instrumentos de análisis y procesamiento	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 04:07 PM
PERIODO: NOVIEMBRE 2019 Descripción: ANTEPROYECTO: Aprobación del Plan de Proyecto de la EPSPND.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 09:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
EJECUCIÓN: Materiales necesarios y personal capacitado para ejecución del operativo de campo		
PERIODO: OCTUBRE 2019 Descripción: EJECUCIÓN : Se probó el sistema INFOCAPT y formulario ESPND 2019	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 09:21 AM
SEPTIEMBRE 2019.- 22 EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable 26 PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/10/2019 - 02:28 PM
AGOSTO 2019.- PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/08/2019 - 08:26 AM
JULIO 2019.- PLANEACIÓN : Construir formularios para la recolección, manuales, presentaciones y plan de inconsistencias.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
JUNIO 2019 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
MAYO 2019.- PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
ABRIL 2019 PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:14 AM
PERIODO MARZO -2019 16.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito cumplido 16).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/05/2019 - 10:30 AM
PERIODO FEBRERO -2019 15.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito 15).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:44 PM
PERIODO ENERO -2019 14.-Se definieron los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ESPND (Hito 14).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:04 PM
PERIODO: DICIEMBRE 2018 12.- Se elaboró Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados (HITO 12) 13.- Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc. (HITO 13)	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	11/02/2019 - 08:43 AM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:34 PM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:33 PM
PERIODO: OCTUBRE 2018 5.- Se elaboraron los informes de los resultados de las pruebas piloto del formulario ESPND. (HITO CUMPLIDO 5) 6.- Se diseñó los acuerdos de confidencialidad y autenticación. (HITO CUMPLIDO 6) 7.- Se actualizó el material cartográfico que se utilizará en el proyecto ESPND. (HITO CUMPLIDO 7)		
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: 1.- Se elaboró el informe de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ENEMDU. (HITO CUMPLIDO 1) 2.- Se elaboró el documento habilitante aprobado por el director ejecutivo, cronograma de trabajo, el presupuesto para el año 2018 (HITO CUMPLIDO 2)	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	14/11/2018 - 01:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se diseñó el formulario y el manual de capacitación del encuestador (HITO CUMPLIDO 4) 4. Se identificó los dos clasificadores que se utilizarán dentro del proyecto EPSPND y se diseñó la malla de validación (HITO CUMPLIDO 5).		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN : Plan de proyecto de la ESPND aprobado.	9-Entregables Formales	04/09/2018		04/09/2018		Sí	4.0
2	PLANEACIÓN : Indicadores del plan nacional de desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	07/09/2018		07/09/2018		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN : Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN : Instrumentos de análisis y procesamiento diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN : Prueba piloto ejecutada	5-Entregables Intermedios	12/10/2018		12/10/2018		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad construidos	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	5-Entregables Intermedios	06/11/2018		06/11/2018		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación construidos	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	4.0
12	PLANEACIÓN: Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	CIERRE:Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) recolectada	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	4.0
14	PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/01/2019		30/01/2019		Sí	2.0
15	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.0
16	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	30/03/2019		30/03/2019		Sí	1.0
17	PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.0
18	PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	4.0
20	PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación co	5-Entregables Intermedios	30/07/2019		30/07/2019		Sí	4.0
21	PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	4.0
23	EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
25	PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
26	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN : Probar Sistema INFOCAPT y formulario	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		30/10/2019		Sí	4.0
28	ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	4.0
31	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	3.0
32	Ejecución.- Base de datos consolidada	5-Entregables Intermedios	10/01/2020		10/01/2020		Sí	0.44
33	Planeación .- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	5-Entregables Intermedios	20/01/2020		20/01/2020		Sí	0.36

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	Ejecución.- Plan de muestreo elaborado.	5-Entregables Intermedios	03/02/2020		03/02/2020		Sí	0.44
35	Cierre.- Matriz de indicadores de calidad para la OE elaborada	5-Entregables Intermedios	27/02/2020		27/02/2020		Sí	0.36
36	Ejecución.- Boletín Técnico elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.18
37	Ejecución.- Check list de los procedimientos de control y acceso a la información confidencial elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.18
38	Ejecución.- Plan de tabulados elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.44
39	Ejecución.- Productos estadísticos compilados para el análisis .	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.44
40	Ejecución.- Productos mínimos consolidados listos para publicar.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.44
41	Planeación.- Documento de continuidad de la operación estadística presentado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.44
42	Planeación.- Matriz de identificación de usuarios elaborada	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.44
43	Ejecución - Productos mínimos publicados.	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.44
44	Ejecución.- Documento de análisis de consistencia y coherencia de resultados elaborado	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.44
45	Ejecución.- Productos mínimos aprobados.	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.44
46	Ejecución.- Reporte de aprobación de productos para la publicación elaborado	5-Entregables Intermedios	27/03/2020		27/03/2020		Sí	0.44
47	Ejecución.- Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.44
48	Cierre .- Formularios físicos archivados	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.36
49	Planeación.- Documento de comparabilidad elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.36
50	Planeación.- Documento metodológico de la OE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.36
51	Planeación.- Plan de Dirección de Proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.36
52	Cierre.- Documento de resultados de indicadores de calidad elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.44
53	Cierre.- Informe de evaluación elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.44
54	Definición.- Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.44

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	Definición.- Productos estadísticos diseñados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.44
56	Ejecución.- Registros de respuesta a requerimientos de usuarios consolidados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.36
57	Ejecución.- Medios de difusión habilitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.36
58	Cierre.- Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado .	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.36
59	Definición .- Diccionario de variables de la OE elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2020	30/08/2020			No	0.44
60	Definición.- Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.44
61	Definición . - Sintaxis para la selección de la muestra elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.44
62	Definición .- Formato para generación de mapas, planos, croquis elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.44
63	Ejecución.- Correo de confirmación de carga de muestra seleccionada en el sistema de digitación	5-Entregables Intermedios	23/11/2020	23/11/2020			No	0.44
64	Definición .- Informe de prueba piloto elaborado	5-Entregables Intermedios	25/11/2020	25/11/2020			No	0.44
65	Ejecución.- Plan de recolección elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2020	27/11/2020			No	0.44
66	Definición .- Sistema informático entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2020	28/11/2020			No	0.44
67	Ejecución .- Muestra georreferenciada y revisada	5-Entregables Intermedios	28/11/2020	28/11/2020			No	0.44
68	Definición .- Formulario de recolección de información diseñado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.44
69	Definición .- Manual de procesos y flujos de trabajo que detalle todas las fases del MPE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.44
70	Definición.- Manual de supervisor y encuestador y demás manuales elaborados	5-Entregables Intermedios	28/12/2020	28/12/2020			No	0.44
71	Ejecución.- Matriz de control de cobertura diseñada	5-Entregables Intermedios	28/12/2020	28/12/2020			No	0.44
72	Definición.- Manuales técnicos: de instalación, configuración y administración del sistema y manual de usuarios elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44
73	Definición.- Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para el procesamiento, crítica, codificación, validación, imputación, integración y tratamiento de errores elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44
74	Ejecución.- Base de datos macro consolidada y validada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	Ejecución.- Base de datos micro consolidada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44
76	Ejecución.- Base de datos micro validada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44
77	Ejecución.- Informe final de control de cobertura elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.44
78	Definición.- Metodología de prueba piloto diseñada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.44
79	Definición.- Plan de inconsistencias elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.56

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1. Número de instrumentos elaborados		100.00 %	1	1	04/09/2018	Abr-Jun
2	C2. Número de viviendas efectivas de la encuesta sobre la muestra teórica (12072 viviendas) durante el operativo		100.00 %	0	0	04/09/2018	Abr-Jun
3	C3. Número de inconsistencias detectadas en validación sobre el numero total de variables de la encuesta (aproximado 450 variables).		100.00 %	0	0	04/09/2018	Abr-Jun
4	C4. Número de productos (4 tabulados, 4 presentaciones, 4 formularios, 4 base de datos) al fin de proyecto.		100.00 %	0	0	04/09/2018	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,899,258.79 **
Costo Total:	5,916,646.53
Total Devengado:	2,275,059.22
% Costo Total Devengado:	38.45 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 38.45 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,973,249.72	668,070.77	0.00	3,641,320.49
Ppto. Externo Planeado	1,334,274.92	0.00	0.00	1,334,274.92
Ppto. Aprobado Inicial	1,520,235.08	1,612,879.98	0.00	3,133,115.06
Ppto. Codificado	2,484,731.61	668,070.77	0.00	3,152,802.38
Ppto. Comprometido	1,131,220.54	126,506.90	0.00	1,257,727.44
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	2,594,873.93	668,070.77	0.00	3,262,944.70
Ppto. Devengado	2,231,188.02	43,871.20	0.00	2,275,059.22
Pagado Real	744,463.49	24,443.73	0.00	768,907.22
Estimado a fin de año	* 2,231,188.02	0.00	0.00	2,231,188.02
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	363,685.91	668,070.77	0.00	1,031,756.68
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 85.98 %	6.57 %	0.00 %	69.72 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

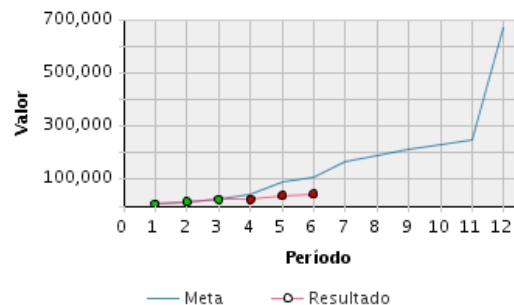

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	7,672.41	7,672.40	7,672.41	7,672.40	100.00 %	●	1.15 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	8,146.24	8,146.23	15,818.65	15,818.63	100.00 %		2.37 %
Mar	8,146.24	8,151.27	23,964.89	23,969.90	100.02 %		3.59 %
Abr	16,887.51	473.83	40,852.40	24,443.73	59.83 %		3.66 %
May	47,385.47	15,003.26	88,237.87	39,446.99	44.71 %		5.90 %
Jun	19,847.87	4,424.21	108,085.74	43,871.20	40.59 %		6.57 %
Jul	57,060.52		165,146.26				
Ago	24,852.10		189,998.36				
Sep	21,700.64		211,699.00				
Oct	19,140.25		230,839.25				
Nov	17,259.43		248,098.68				
Dic	419,972.09		668,070.77				
Total	668,070.77	43,871.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 35 Matriz de indicadores de calidad para la operación estadística	D8_HITO_35.rar	03/03/2020
2	ASOCIACIÓN HITO 36 Boletín Técnico	D9_HITO_36.rar	03/03/2020
3	ASOCIACIÓN HITO 41 Documento de continuidad de la operación estadística	E5_HITO_41.rar	03/03/2020
4	ASOCIADO HITO 33 Planeación .- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	D6.rar	05/02/2020
5	ASOCIACION HITO 1.- PLAN DE PROYECTO DE LA ESPND APROBADO.	A1.pdf	09/01/2019
6	ASOCIACION HITO 2.- INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ODS CON FUENTE EPSPND.	A2.pdf	09/01/2019
7	ASOCIACION HITO 3.- BASES DE DATOS, INFORMES, PRESENTACIONES Y SINTAXIS DISEÑADOS	A3.pdf	09/01/2019
8	ASOCIACION HITO 4.- INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DISEÑADOS	A4.pdf	09/01/2019
9	ASOCIACION HITO 5: PRUEBA PILOTO EJECUTADA	A5.pdf	09/01/2019
10	ASOCIACION HITO 6: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROLES DE CONFIDENCIALIDAD CONSTRUIDOS	A6.pdf	09/01/2019
11	ASOCIACION HITO 7: EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	A7.pdf	09/01/2019
12	ASOCIACION HITO 8: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	A8.pdf	09/01/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 34 Plan de muestreo	D7_HITO_34.rar	03/03/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ASOCIACIÓN HITO 37 Check list de los procedimientos de control y acceso a la información confidencial	E1_HITO_37.rar	03/03/2020
15	ASOCIACIÓN HITO 38 Plan de tabulados	E2_HITO_38.rar	03/03/2020
16	ASOCIACIÓN HITO 39 Productos estadísticos compilados para el análisis.	E3_HITO_39.rar	03/03/2020
17	ASOCIACIÓN HITO 40 Productos mínimos consolidados	E4_HITO_40.rar	03/03/2020
18	ASOCIACIÓN HITO 42 Matriz de identificación de usuarios	E6_HITO_42.rar	03/03/2020
19	ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación contruidos	A9.pdf	09/01/2019
20	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 43: Ejecución.- Productos mínimos finalizados	E7_HITO_43.rar	07/04/2020
21	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 44: Ejecución.- Documento de análisis de consistencia y coherencia de resultados elaborado	E8_HITO_44.rar	07/04/2020
22	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 45: Ejecución.- Productos mínimos aprobados	E9_HITO_45.pdf	07/04/2020
23	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 46: Ejecución.- Reporte de aprobación de productos para la publicación elaborado	F1_HITO_46.pdf	07/04/2020
24	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 47: Ejecución.- Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información	F2_HITO_47.pdf	07/04/2020
25	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 48: Cierre.- Se archivaron los formularios físicos.	F3_HITO_48.pdf	06/05/2020
26	ASOCIADO HITO 10 :EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	B1.pdf	04/04/2019
27	ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	B2.pdf	09/01/2019
28	ASOCIADO HITO 12: EJECUCIÓN bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	B3.pdf	09/01/2019
29	ASOCIADO HITO 13 CIERRE información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) Recolectada.	B4.pdf	09/01/2019
30	ASOCIADO HITO 14 PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	B5.pdf	11/02/2019
31	ASOCIADO HITO 15 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B6.pdf	18/03/2019
32	ASOCIADO HITO 16 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B7.pdf	01/04/2019
33	ASOCIADO HITO 17 PLANEACIÓN: Elaborar Documento Metodológico	B8.pdf	03/06/2019
34	ASOCIADO HITO 18 PLANEACIÓN: Elaborar Glosario de Términos	B9.pdf	03/06/2019
35	ASOCIADO HITO 19 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	C1.pdf	06/08/2019
36	ASOCIADO HITO 20 PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación	C2.pdf	07/08/2019
37	ASOCIADO HITO 21 PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	C3.pdf	05/09/2019
38	ASOCIADO HITO 22 EJECUCIÓN: Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	C4.pdf	07/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
39	ASOCIADO HITO 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	C5.pdf	07/10/2019
40	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	C6.pdf	07/10/2019
41	ASOCIADO HITO 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	C7.pdf	07/10/2019
42	ASOCIADO HITO 26 PLANEACIÓN: Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	C8.pdf	07/10/2019
43	ASOCIADO HITO 27 EJECUCIÓN: Probar Sistema INFOCAPT y formulario	C9.pdf	06/11/2019
44	ASOCIADO HITO 28 ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSPND.	D1.rar	04/01/2020
45	ASOCIADO HITO 29 EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado	D2.rar	04/01/2020
46	ASOCIADO HITO 30 EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)	D3.rar	03/01/2020
47	ASOCIADO HITO 31 PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento	D4.rar	03/01/2020
48	ASOCIADO HITO 32 Ejecución.- Base de datos consolidada	D5.rar	05/02/2020
49	Ficha de reestructuración de hitos y ampliación de fecha fin 2020	Ficha_Reestructuración_de_Hitos_y_Ampliación_de_Fecha_Fin.pdf	05/02/2020
50	HITO ASOCIADO 49: Planeación.- Documento de comparabilidad	F4_HITO_49.rar	05/06/2020
51	HITO ASOCIADO 50: Planeación.- Documento metodológico de la OE elaborado	F5_HITO_50.rar	05/06/2020
52	HITO ASOCIADO 51: Planeación.- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	F6_HITO_51_.rar	05/06/2020
53	HITO ASOCIADO 52: Cierre.- Documento de resultados de indicadores de calidad elaborado	F7_HITO_52.rar	06/07/2020
54	HITO ASOCIADO 53: Cierre.- Informe de evaluación elaborado	F8_HITO_53.rar	06/07/2020
55	HITO ASOCIADO 54: Definición.- Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado.	F9_HITO_54.rar	06/07/2020
56	HITO ASOCIADO 55: Definición.- Productos estadísticos diseñados	G1_HITO_55.rar	06/07/2020
57	HITO ASOCIADO 56: Ejecución.- Registros de respuesta a requerimientos de usuarios consolidados	G2_HITO_56.rar	06/07/2020
58	HITO ASOCIADO 57: Ejecución.- Medios de difusión habilitados	G3_HITO_57.rar	06/07/2020
59	P001 La oportuna respuesta al pedido de priorización de procesos de compra de insumos y materiales para análisis de agua, garantizaría la importación y entrega de los insumos y materiales para el cumplimiento del operativo de campo.	P001.pdf	07/05/2020
60	R001 El recorte presupuestario CAUSARÍA que no se ejecute parte de las operaciones planificadas para el presente periodo fiscal, afectando así, a la consecución de los objetivos del proyecto.	R001.pdf	15/01/2020
61	R002 Deserción del personal a vísperas del inicio de la etapa de recolección de información CAUSARÍA retraso en los tiempos planificados para iniciar del operativo de recolección de información	R002.pdf	15/01/2020
62	R003 No contar con los materiales y suministros para la ejecución del test de calidad de agua, en el tiempo planificado, CAUSARÍA la imposibilidad de recolectar información necesaria para el reporte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo	R003.pdf	15/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
63	R004 No contar con los materiales y suministros para la ejecución del test de calidad de agua, en el tiempo planificado CAUSARÍA la imposibilidad de recolectar información necesaria para el reporte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo	R004.pdf	15/01/2020
64	R005 Retraso en la entrega de formularios y manuales para la capacitación causaría el retraso en el inicio del proceso de capacitación al personal	R005.pdf	15/01/2020
65	R006 la falta de respuesta a la priorización de procesos de compra, CAUSARÍA que los tiempos de importación de reactivos para análisis de agua y botellas para muestras de agua de extiendan y pongan en riesgo el operativo	R006.pdf	07/05/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Urcuango Conumba, Adriana Mabel	Líder de proyecto	Analista Sociodemográfico	adriana_urcuango@inec.gob.ec	
