

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**  
**PROYECTO: K005 INEC-Actualización del Registro Social**

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (Patricio_Rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Andrade, Diego	Programas Relacionados:	
Titular:	Carrera, Soledad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30400000.0000.382804	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,069,386.27
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	08/12/2020	Fecha de Fin Base:	31/07/2019
Modificado por:	Rivas Villalba, Edwin Patricio	Fecha del siguiente Hito:	25/11/2020

## DATOS GENERALES

### Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Objetivo General: Levantar información socio económico en los hogares de los sectores priorizados por SENPLADES, para los años 2018 y 2019, con el propósito de actualizar los datos del Registro Social; e identificar potenciales beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a nivel de familias como de individuos.

#### Objetivos Específicos:

1. Actualizar la información de los hogares en las tres provincias afectadas por la catastrofe natural y los 2116 sectores no cubiertos en el operativo 2013 2014.
2. Identificar posibles beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales a través del Levantamiento de información socioeconómica en los hogares de las provincias y sectores priorizados.

Propósito.- Generar información que permita la identificación y selección de potenciales beneficiarios para programas y servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".

Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan "Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos

- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES, permitirá contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.

Localidad de Impacto:.- Nacional

Costo: 18'466.362,17

Línea Base: -N/A

Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Producto Final 2019:

1. Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
2. Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
3. Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

### Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas en las áreas a intervenir.

### Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)  
Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7'816.489 personas registradas.

### Restricciones

Tiempo.- El proyecto tendrá una duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el 31 de julio del 2019)

Costo.- 18'466.362,17

Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través de encuestas mediante aplicativo móvil.

Descripción del Producto Final.-

Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

a) Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.

b) Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).

c) Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 97.81 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Fin: 31/12/2020

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

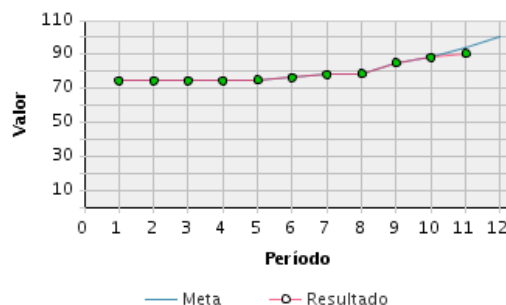

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	74 %	74 %	74 %	74 %	75 %	76 %	78 %	79 %	85 %	88 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	74 %	74 %	74 %	74 %	75 %	76 %	78 %	79 %	85 %	88 %	90 %	
2020	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2020  En esta mes se realizó la recolección de información de la fase 18 y 19, en las provincias de Esmeraldas, Sato. Domingo y Manabí. Cumpliendo con el Hito 44. EJECUCIÓN.-Información de noviembre levantada y sincronizada	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/12/2020 - 12:39 PM
SEPTIEMBRE 2020	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/11/2020 - 06:33 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En esta fase 15, se inicio con el operativo de campo del proyecto en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, con el fin que tenga lugar el levantamiento de información, cumpliendo con el hito 37 EJECUCIÓN.- Información de septiembre levantada y sincronizada		
<p>AGOSTO 2020</p> <p>Mediante oficio Nro. URS-DEJ-2020-0176-O, del 27 de agosto de 2020, la URS en basea la reunión mantenida entre el personal de la Unidad del Registro Social y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la cual se informó sobre la actualización del Registro Social con el formulario optimizado, remite adjunto la Resolución Nro.URS-DEJ-2020-0013-R, del 24 de agosto del 2020 y el referido formulario, con lo cual solicito se tome las acciones necesarias a fin de cumplir con la implementación del nuevo formulario y cargas de trabajo, a partir del mes septiembre del presente año.</p> <p>Con memorando Nro. INEC-CGTPE-2020-0407-M, 28 de agosto de 2020, se solicita la autorización de cambio de fechas de inicio del operativo "Actualización del Registro Social" al señor Director Ejecutivo. Con memorando Nro. INEC-INEC-2020-0388-M, del 28 de agosto de 2020, el señor Director Ejecutivo autoriza la solicitud de cambio de fechas de inicio del operativo "Actualización del Registro Social".</p> <p>En este marco de referencia y por los cambios que implican la aplicación del formulario reducido con un incremento en la nueva carga de trabajo, se requiere incrementar la cantidad de socializadores para cubrir la nueva demanda que implica los cambios antes indicados, ya que de no existir este incremento de personal existiría sectores sin la previa socialización necesaria para que los hogares investigados dispongan de la documentación como son las cédulas de identidad de todos los miembros del hogar y la factura del pago de luz, para poder realizar el levantamiento de información con oportunidad y calidad, evitando que exista una menor cobertura de lo planificado, razón por la cual se realiza un Adendum al PDP "Actualización del Registro Social" y una nueva reestructura de hitos de acuerdo al nuevo cronograma planificado para dar cumplimiento al convenio suscrito. Con estos antecedentes, y con la finalidad de dar inicio al proceso de levantamiento de información del mencionado proyecto, se remite mediante INEC-CGTPE-DIES-2020-0311-M, con fecha 04 de septiembre de 2020, el Adendum al Plan de Dirección de Proyecto "Actualización del Registro Social" del año 2020, así como la reestructura de hitos, a la CGTPE a fin de que se sirva disponer a quien corresponda se proceda con el trámite pertinente para la aprobación por parte del señor Director Ejecutivo del Adendum y de la reestructura de hitos del proyecto en GPR.</p> <p>Con memorando Nro. INEC-INEC-2020-0410-M de fecha 8 de septiembre del 2020, el Señor Director Ejecutivo autoriza el primer Adendum y la reestructura de hitos al Plan de Dirección de Proyecto: "Actualización del Registro Social". Cumpliendo con el HITO 36.- EJECUCIÓN.- Matriz de Personal civil aspirante definida.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/10/2020 - 07:04 PM
<p>JULIO 2020</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2020-0621-M de 22 de julio de 2020 es aprobado el PDP de "Actualización del Registro Social RS". Por gestiones legales para la aprobación de PDP's y por tiempos de contratación ocasional según el grupo experto, las contrataciones de personal ocasional no podrán ingresar según lo planificado desde el mes de julio, razón por la cual, el personal ingresará a partir de agosto y se gestionará la devolución por un valor de USD 20.887,17 dólares que no se pudo ejecutar. En el caso de los valores por honorarios del personal civil, se tomó como referencia los valores que el INEC paga a dicho personal, es decir el valor mensual, sumado a los días de viáticos por estipendio (13 dólares por 22 días) , razón por la cual, se gestionará la devolución por un valor de USD 371.683,28 dólares americanos. El proyecto cuenta con un valor asignado de USD. 3'384.807,29 del cual se ejecutará USD. 2'.992.236,84. Cumpliendo con el HITO 32.- EJECUCIÓN.- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/09/2020 - 05:04 PM
<p>JUNIO 2020.</p> <p>Con Memorando Nro. INEC-CGAF-2020-0709-M de 10 de junio de 2020, mediante el cual, la Coordinación General Administrativa Financiera informa sobre el incremento al techo presupuestario institucional de gasto de inversión por un valor de USD \$ 3.384.807,29; necesarios para la ejecución del proyecto. Cumpliendo con el HITO 31.-PLANEACIÓN.-Oficio de respuesta de no objeción al proyecto por parte del Banco Mundial, emitido.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/08/2020 - 11:58 AM
<p>MAYO 2020</p> <p>El 24 de marzo de 2020, el INEC y la URS suscribieron el Convenio Específico para la cuarta transferencia de recursos económicos por el valor de \$. 3'384.807,29 para garantizar la</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	06/08/2020 - 11:57 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>contratación de los bienes, servicios y personal planificado por el INEC enmarcados en los objetivos del operativo de Actualización del Registro Social.</p> <p>Con fecha 30 de abril se suscribe el Adendum Nro. 1 al Convenio Específico de Cooperación interinstitucional, entre la Unidad del Registro Social - URS y el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, con base al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la URS- y el INEC (6005), y al Convenio de Préstamo Nro. BIRF8946-EC, con la finalidad de aclarar que actualmente en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 0001 de 02 de enero de 2020, así como en la Enmienda al Contrato de Préstamo 8946-EC de 16 de marzo de 2020, y notificada a la Unidad del Registro Social el 25 de marzo de 2020, el valor a transferir al INEC es de USD. 3.384.807,29 .</p> <p>Con Memorando Nro. INEC-CGTPE-2020-0179-M de 06 de mayo de 2020, la Coordinación General Técnica de Producción Estadística informa sobre el dictamen favorable para la inclusión y transferencia de recursos desde la URS al INEC para la ejecución del Proyecto Actualización del Registro Social. cumpliendo al HITO 31. .PLANEACIÓN.-Oficio de respuesta de no objeción al proyecto por parte del Banco Mundial, emitido.</p>		
<p>DICIEMBRE 2019.</p> <p>En el presente mes se realizó el levantamiento físico de la información de las fases 13 y 14 del proyecto, adicionalmente se realizó el pago a vehículos de los meses de noviembre y diciembre, también se sincronizó la información levantada del mes de diciembre cumpliendo con el HITO 30: Información y sincronización de los hogares levantada en diciembre</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/08/2020 - 11:50 PM
<p>NOVIEMBRE 2019.</p> <p>En el presente mes se realizó el levantamiento físico de la información de las fases 11 y 12 del proyecto, adicionalmente se realizó el pago a vehículos de los meses de septiembre y octubre, también se sincronizó la información levantada del mes de noviembre cumpliendo con el HITO 28: Información y sincronización de los hogares levantada en noviembre.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	24/12/2019 - 03:41 PM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>Se realizó el levantamiento en el mes de Octubre cumpliendo la fase 10 del proyecto "Actualización del Registro Social", también se sincronizó la información levantada en los hogares en octubre en las tablets, cumpliendo con el HITO 27.; se espera la remisión de la base por parte de la Unidad del Registro Social</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/12/2019 - 05:55 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Se realizó el levantamiento en el mes de Septiembre cumpliendo la fase 8 y 9 del proyecto "Actualización del Registro Social", también se retroalimentó al personal civil del proyecto con una capacitación. (HITO-26. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	31/10/2019 - 10:57 AM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>Se realizó el levantamiento en el mes de Agosto cumpliendo la fase 7 del proyecto "Actualización del Registro Social", y los procesos necesarios para el levantamiento del mes de Septiembre, también se realizó la capacitación del personal civil del proyecto. (HITO-25. cumplido)</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	25/09/2019 - 09:42 AM
<p>JULIO 2019</p> <p>En este mes se levantaron de acuerdo ala programación 42.498 viviendas 5,16% de las viviendas programadas totales llegando a un acumulado total del 23, 32 %.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:42 AM
<p>JUNIO 2019</p> <p>De acuerdo a la programación establecida, en este mes se realizó la re-instrucción al personal que participa en la Actualización del Registro Social, se realizaron las contrataciones del personal de campo y de los vehículos necesarios para el operativo de campo, y a partir del 15 de junio se comenzó la socialización a las viviendas de los sectores seleccionadas y desde el 18 de junio se inició con el levantamiento de la información. Además indicar que en la zonal del Litoral existió un retraso en la contratación de vehículos lo que ocasionó que alrededor de 40 equipos de levantamiento salgan al quinto día del operativo según lo planificado.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>En este mes las zonales terminan en realizar el pedido de contratación de vehículos, como también la de confirmación de participantes necesarios para el levantamiento de la información de campo.</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
<p>ABRIL 2019</p> <p>Mediante Memorando INEC-INEC-2019-0380-M, el señor Director Ejecutivo aprueba y autoriza se inicie las actividades del Plan de Proyecto RS, con lo que las zonales y Administración tanto</p>	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Central como Campo, inician los procesos para las diferentes contrataciones de personal civil, vehículos, seguros y viáticos, según PDP aprobado.		
<b>MARZO 2019</b> Mediante Memorando INEC-CGAF-2019-0430-M, en el que se hace conocer el incremento del techo presupuestario del RS, se procedió a la elaboración del Plan de Proyecto, para la aprobación y ejecución de las diferentes actividades dentro del proyecto,.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:41 AM
<b>FEBRERO 2019</b> En este mes se sigue realizando gestiones a fin de que nos transfieran de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo, se ha realizado una revisión de la base de datos proporcionada por SENPLADES, en la cual de emito observaciones para que sean corregidas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:40 AM
<b>ENERO 2019</b> En este mes se ha realizado gestiones a fin de que se realice la transferencia de los recursos presupuestarios, para la continuación de las dos fases programadas, además indicar que se cuenta con todos los instrumentos y dispositivos móviles, listos para el inicio del operativo	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:39 AM
<b>DICIEMBRE 2018</b> En este mes se continua con las fases 2 y 3 de levantamiento de información teniendo una cobertura del 8,34%, llegando al 12,45% del total de las fases programadas, en este mes se levantaron 64.114 viviendas, de las cuales 47.322 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:39 AM
<b>NOVIEMBRE 2018</b> En este mes se inicia el levantamiento de la información a partir del 16 de noviembre de 2018, en la cual se levanta información con una cobertura del 4,17% de la información total, levantando 42.355 viviendas, de las cuales 30.179 corresponden a viviendas ocupadas efectivas.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:38 AM
<b>OCTUBRE 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscribio el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, fue dada el 02 de octubre, razón por la cual se realizó una nueva programación en la cual el operativo inicia el 10 de noviembre con el equipo de avanzada y el 16 de noviembre con el equipo de levantamiento de información (HITO 11 asociado).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	13/08/2019 - 11:33 AM
<b>SEPTIEMBRE 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a que el segundo convenio específico fue suscribio el 27 de septiembre del 2018, sin embargo la asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC, a la fecha no ha sido efectiva (HITO 10. asociado).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	20/11/2018 - 08:41 AM
<b>AGOSTO 2018</b> No se elaboró el Informe Técnico de avance del proyecto en la fase de recolección, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC . (HITO 9. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	03/10/2018 - 02:49 PM
<b>JULIO 2018</b> No se inicio con la ejecución del operativo de campo, con la intervención de hogares socializados, debido a la falta de asignación presupuestaria por parte de SENPLADES al INEC.(HITO 8. asociado)  En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo del Personal preseleccionado; Ciudad de Sto Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y en la Zona Centro (Ambato), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para el inicio del proyecto. (HITO-7. CUMPLIDO).	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/09/2018 - 05:39 PM
<b>JUNIO-2018</b> En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coord. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-7. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:41 AM
<b>JUNIO-2018</b> En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo del Personal preseleccionado; del 02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coord. Zonales y en Administracion Central Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	09/08/2018 - 11:15 AM
<b>MAYO-2018</b> Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	02/07/2018 - 04:03 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL-2018 Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido) Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el proyecto (HITO-4. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:16 AM
MARZO-2018 Se suscribieron los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
FEBRERO-2018 Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 09:00 AM
ENERO-2018 Se realizó observaciones al formulario y manual enviado por SENPLADES- (HITO 1. cumplido)	Rivas Villalba, Edwin Patricio	04/06/2018 - 08:52 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO






Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. * General.</b> El incremento de la pronta oferta laboral en nuevos proyectos referentes al Registro Social por parte de la URS, CAUSARÍA la migración del personal capacitado en el tema para el levantamiento de la información del Registro Social en el INEC	04/12/2020	Edwin Patricio Rivas Villalba	70 %	50	35	0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN"-revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo revisado ( formulario y manual)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.2
2	PLANEACIÓN".- Ficha técnica del proyecto definida	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.16
3	PLANEACIÓN".- Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.24
4	PLANEACIÓN".-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados	5-Entregables Intermedios	13/04/2018		13/04/2018		Sí	0.64
5	PLANEACIÓN".- Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado	9-Entregables Formales	23/04/2018		23/04/2018		Sí	1.0



## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN.-Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.7
7	EJECUCIÓN.-Personal preseleccionado capacitados	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.72
8	EJECUCIÓN.-- Personal seleccionado capacitado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.52
9	EJECUCIÓN- completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.52
10	EJECUCIÓN-Preparación de material cartográfico a nivel Nacional	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.24
11	EJECUCIÓN- Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.24
12	EJECUCIÓN- Hogares a intervenir socializados	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.97
13	EJECUCIÓN- Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre)	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	2.74
14	PLANEACIÓN - Plan de Proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	26/04/2019		26/04/2019		Sí	0.74
15	EJECUCIÓN - Muestra seleccionada abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.74
16	EJECUCIÓN - Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	0.74
17	EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.49
18	PLANEACIÓN - Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	0.74
19	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.74
20	EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.74
21	EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo abril - agosto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	4.21
22	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	8.42
23	EJECUCIÓN - Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.49
24	EJECUCIÓN - Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.74

# HITOS



	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	4.21
26	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	8.42
27	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	8.42
28	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	8.42
29	EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico septiembre - diciembre	5-Entregables Intermedios	13/12/2019		13/12/2019		Sí	0.74
30	EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada - diciembre	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	8.37
31	PLANEACIÓN.-Oficio de respuesta de no objeción al proyecto por parte del Banco Mundial, emitido.	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.63
32	EJECUCIÓN.- Muestra seleccionada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.59
33	PLANEACIÓN.- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados.	5-Entregables Intermedios	22/07/2020		22/07/2020		Sí	1.59
34	EJECUCIÓN.- Matriz de Personal civil aspirante definida.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.63
35	EJECUCIÓN.- Personal civil contratado	5-Entregables Intermedios	13/09/2020		13/09/2020		Sí	1.59
36	EJECUCIÓN.- Vehículos contratados	5-Entregables Intermedios	13/09/2020		13/09/2020		Sí	1.59
37	EJECUCIÓN.- Información de septiembre levantada y sincronizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.59
38	EJECUCIÓN.-Información a los hogares a ser intervenidos en septiembre, socializada	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.59
39	EJECUCIÓN.- Información de octubre a los hogares a ser intervenidos, socializada	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	1.59
40	EJECUCIÓN.-Información de octubre levantada y sincronizada	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	1.59
41	EJECUCIÓN.- Cronogramas de intervención elaborados.	5-Entregables Intermedios	04/11/2020		04/11/2020		Sí	0.95
42	EJECUCIÓN.-Material cartográfico reproducido	5-Entregables Intermedios	04/11/2020		04/11/2020		Sí	1.27
43	EJECUCIÓN.-Información de noviembre a los hogares a ser intervenidos, socializada	5-Entregables Intermedios	25/11/2020	25/11/2020			No	1.59
44	EJECUCIÓN.-Información de noviembre levantada y sincronizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.59



## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
45	EJECUCIÓN.- Información de diciembre a los hogares a ser intervenidos, socializada	5-Entregables Intermedios	10/12/2020	10/12/2020			No	1.59
46	EJECUCIÓN.-Información de diciembre levantada y sincronizada	5-Entregables Intermedios	15/12/2020	15/12/2020			No	1.59
47	EJECUCIÓN.-Validación de información en hogares y sincronizada	5-Entregables Intermedios	19/12/2020	19/12/2020			No	1.59
48	CIERRE.-Informe final a ser presentado a la Unidad de Registro Social, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.59

## INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cobertura de viviendas ocupadas con relación al total de viviendas ocupadas proyectadas		95.00 %	0.8	0.76	01/10/2018	Jul-Sep
2	Procentaje de supervisiones realizadas en función de las supervisiones planificadas		100.00 %	0	0	15/06/2019	Ene-Jun


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,069,386.27 **
Costo Total:	9,612,953.83
Total Devengado:	8,358,904.83
% Costo Total Devengado:	86.95 %

**\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 86.95 %

## Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,275,067.26	2,987,062.44	0.00	10,262,129.70
Ppto. Externo Planeado	3,086,730.66	2,987,062.44	0.00	6,073,793.10
Ppto. Aprobado Inicial	640,180.67	3,384,807.29	0.00	4,024,987.96
Ppto. Codificado	10,042,621.70	2,987,062.44	0.00	13,029,684.14
Ppto. Comprometido	5,988,871.76	0.00	0.00	5,988,871.76
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	10,255,072.95	2,987,062.44	0.00	13,242,135.39
Ppto. Devengado	7,082,323.83	1,276,581.00	0.00	8,358,904.83
Pagado Real	4,174,705.89	0.00	0.00	4,174,705.89
Estimado a fin de año	* 7,082,323.83	0.00	0.00	7,082,323.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,172,749.12	2,987,062.44	0.00	6,159,811.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.06 %	42.74 %	0.00 %	63.12 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00





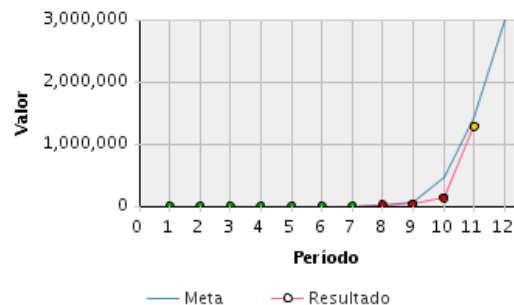






\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



## Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	19,548.74	15,793.14	19,548.74	15,793.14	80.79 %		0.53 %
Sep	32,274.52	16,522.39	51,823.26	32,315.53	62.36 %		1.08 %
Oct	414,252.08	105,087.82	466,075.34	137,403.35	29.48 %		4.60 %
Nov	952,886.36	1,139,177.65	1,418,961.70	1,276,581.00	89.97 %		42.74 %
Dic	1,568,100.74		2,987,062.44				
<b>Total</b>	<b>2,987,062.44</b>	<b>1,276,581.00</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005	ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf	01/06/2018
2	ASOCIACION HITO 17_Personal Civil contratado periodo abril_agosto	B.8.pdf	13/08/2019
3	ASOCIACION HITO 18_Adendum al Plan de Proyecto elaborado y aprobado periodo septiembre-diciembre	B.9.pdf	13/08/2019
4	ASOCIACION HITO 19_ Información y sincroniacion de los hogares levantada - junio	C.1.pdf	28/08/2019
5	ASOCIACION HITO 27_EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - octubre	ASOCIACION_HITO_27_EJECUCIÓN_-_Información_y_sincroniacion_de_los_hogares_levantada_-_octubre.pdf	24/12/2019
6	ASOCIACION HITO 28_EJECUCIÓN - Información y sincroniacion de los hogares levantada - noviembre	ASOCIACION_HITO_28_EJECUCIÓN_-_Información_y_sincroniacion_de_los_hogares_levantada_-_noviembre.pdf	24/12/2019
7	ASOCIACION HITO 29_EJECUCIÓN - Reproducir material cartográfico sep_dic	ASOCIACION_HITO_29_EJECUCIÓN_-_Reproducir_material_cartográfico_sep_dic.pdf	08/01/2020
8	ASOCIACION HITO 30_EJECUCIÓN - Información y sincronización de los hogares levantada_dic	ASOCIACION_HITO_30_EJECUCIÓN_-_Información_y_sincronización_de_los_hogares_levantada_dic.pdf	08/01/2020
9	ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes y metodologías para el levantamiento de campo"	A.1.pdf	10/07/2018
10	ASOCIACIÓN HITO 10. "Preparación de material cartográfico a nivel Nacional "	B.1.pdf.pdf	06/05/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 11. "Homologación de conocimientos en el manejo del dispositivo móvil, por	B.2.pdf.pdf	06/05/2019

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	parte de SENPLADES a los funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto "		
12	ASOCIACIÓN HITO 12. "Hogares a intervenir socializados "	B.3.pdf.rar	06/05/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 13. "Informe técnico de avance del proyecto en la fase de recolección elaborado (diciembre) "	B.4.pdf	06/05/2019
14	ASOCIACIÓN HITO 14 .Plan de Proyecto elaborado y aprobado	B.5.pdf	06/05/2019
15	ASOCIACIÓN HITO 15 .Muestra Seleccionada	B._6.pdf	06/05/2019
16	ASOCIACIÓN HITO 16: EJECUCIÓN -Muestra seleccionada periodo septiembre - diciembre	B.7.pdf	13/08/2019
17	ASOCIACIÓN HITO 2."Ficha técnica del proyecto definida"	A.2.pdf	10/07/2018
18	ASOCIACIÓN HITO 20_Reproducir material cartográfico periodo abril - agosto	C.2.pdf	28/08/2019
19	ASOCIACIÓN HITO 21_Vehículos contratados periodo abril - agosto	C.3.pdf	28/08/2019
20	ASOCIACIÓN HITO 22_ Información y sincronización de los hogares levantada - julio	C.4..pdf	30/08/2019
21	ASOCIACIÓN HITO 23_Personal Civil contratado periodo septiembre - diciembre	C.5.pdf	02/09/2019
22	ASOCIACIÓN HITO 24_Vehículos contratados periodo septiembre - diciembre	C.6.pdf	02/09/2019
23	ASOCIACIÓN HITO 25_ Información y sincronización de los hogares levantada - agosto	C.7.pdf	02/09/2019
24	ASOCIACIÓN HITO 26_ Información y sincronización de los hogares levantada - septiembre	C8.pdf	22/10/2019
25	ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos de información identificados (convenios)"	A.3.pdf	10/07/2018
26	ASOCIACIÓN HITO 31.- PLANEACIÓN.- Oficio de respuesta de no objeción al proyecto por parte del Banco Mundial, emitido.	D4_hito31_(1).pdf	05/10/2020
27	ASOCIACIÓN HITO 32. EJECUCIÓN.- Muestra seleccionada.	D5_hito_32.pdf	05/10/2020
28	ASOCIACIÓN HITO 33.- EJECUCIÓN.- Matriz de Personal civil aspirante definida.	D6_hito33.pdf	05/10/2020
29	ASOCIACIÓN HITO 34. PLANEACIÓN- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados.	D7_hito34.pdf	05/10/2020
30	ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN.- Personal civil contratado	D8_hito_35.pdf	05/10/2020
31	ASOCIACIÓN HITO 36 EJECUCIÓN.- Vehículos contratado	D9_hito36.pdf	05/10/2020
32	ASOCIACIÓN HITO 37._ EJECUCIÓN.- Información de septiembre levantada y sincronizada	E1_Hito_37.pdf	07/10/2020
33	ASOCIACIÓN HITO 38._EJECUCIÓN.-Información a los hogares a ser intervenidos en septiembre, socializada	E2_hito_38.pdf	07/10/2020
34	ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN.- Información de octubre a los hogares a ser intervenidos, socializada	E3_HITO_39_(1).pdf	06/11/2020
35	ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura diseñados"	A.4.pdf	10/07/2018
36	ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN.-Información de octubre levantada y sincronizada	E4_HITO_40_(1).pdf	06/11/2020
37	ASOCIACIÓN HITO 41.-EJECUCIÓN.- Cronogramas de intervención elaborados.	Cronograma_de_intervención_eleborado_CENTRO.pdf	08/12/2020

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
38	ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN.-Material cartográfico reproducido	Ca06_130658999005.pdf	08/12/2020
39	ASOCIACIÓN HITO 43 EJECUCIÓN.-Información de noviembre a los hogares a ser intervenidos, socializada	1.1_Matriz_de_planificación_de_socialización_CENTRO.pdf	08/12/2020
40	ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCIÓN.-Información de noviembre levantada y sincronizada	COBERTURA_NOVIEMBRE.pdf	08/12/2020
41	ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización del Registro Social elaborado y aprobado"	A.5.pdf	10/07/2018
42	ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura elaborados"	A.6.pdf	10/07/2018
43	ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado capacitado"	A.7.pdf	14/08/2018
44	ASOCIACIÓN HITO 8. "Personal seleccionado capacitado"	A.8.pdf.rar	27/12/2018
45	ASOCIACIÓN HITO 9. "Completar el número de personas requeridas para el levantamiento de información "	A.9.pdf.rar	27/12/2018
46	CIERRE DE RIESGO 30/10/2019	CIERRE_RIESGO_3.pdf	08/01/2020
47	CIERRE PROBLEMA 13/08/2019	PROBLEMA.pdf	13/08/2019
48	CIERRE RIESGO 13/08/2019	RIESGO.pdf	13/08/2019
49	FICHA DE REESTRUCTURA DE HITOS II ADENDUM	just_rest-hitos-social_ii_adendum.pdf	18/11/2020
50	Memorando aprobación reestructura de hitos II Adendum	INEC-INEC-2020-0626-M.pdf	17/11/2020
51	REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2018-2019 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL	REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2018-2019.rar	28/12/2018
52	REESTRUCTURACIÓN HITOS 2020	MEMOS_REESTRUCTURA_HITOS.pdf	20/08/2020
53	REESTRUCTURACIÓN HITOS 2020 ADENDUM FICHA	just_rest_hitos_2020_reg_social_(ok)_final_01092020-signed-signed.pdf	05/09/2020
54	REESTRUCTURACIÓN HITOS 2020 ADENDUM MEMORANDO	solicitud_reestructura_de_hitos_adendum.pdf	08/09/2020
55	REESTRUCTURACIÓN HITOS 2020 FICHA	JUST_REST_HITOS_2020_REG_SOCIAL_(OK_FINAL03AG02092020).pdf	02/09/2020
56	REESTRUCTURACIÓN DE HITOS 2019	JUSTIF_TEC_REG_SOCIAL.pdf	19/06/2019
57	VERIFICABLE RIESGO 1	INEC-CGTPE-DIES-2018-0444-M_(3)_INFORMES_DE_UTILIZACIÓN_DE_RECURSOS).pdf	28/12/2018
58	VERIFICABLE RIESGO 3	VERIFICABLE_RIESGO_3.pdf	25/10/2019
59	VERIFICABLES RIESGO 2	MEMORANDOS_ZONALES_DE_SOLICITUD_VEHÍCULOS.rar	10/06/2019

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Arias, José	Técnico	Miembro de equipo	Jose_Arias@inec.gob.ec	2544326/1522
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Lider de Proyecto	Analista Sociodemográfica	Patricio_Rivas@inec.gob.ec	
Tamayo, Diana	Técnica	Miembro de equipo	Diana_Tamayo@inec.gob.ec	
Tipán, Vladimir	Técnico	Miembro de equipo	Vladimir_Tipan@inec.gob.ec	2544326/1522
