

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)

Dirección de Estudios y Análisis de la Información (DEAN)

PROYECTO: K001 INEC Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador

Líder del Proyecto:	González, Sandra Gabriela (sandra_gonzalez@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Andrade, Diego	Programas Relacionados:	
Titular:	García Mosquera, María Isabel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375416	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,922,398.40
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	08/10/2020	Fecha de Fin Base:	31/10/2020
Modificado por:	González, Sandra Gabriela	Fecha del siguiente hito:	31/10/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El INEC intervendrá en el subcomponente 3.2 "Estimación de la Demanda del Mercado Laboral", que forma parte del componente 3. "Fortalecimiento de los mecanismos de Coordinación institucional, impulsando demanda y gestión, así como el monitoreo y la evaluación del proyecto.

Este proyecto se ejecutará en 4 componentes, a través de los cuales se busca la generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas generación de análisis y estudios a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

OBJETIVO GENERAL:

Estimar la Demanda Laboral para el PRETT, que incluye la Generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas, generación de análisis y estudios a través del Laboratorio del Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE) y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1) Levantar una Encuesta Nacional de Demanda Laboral a empresas grandes, medianas y pequeñas.
- 2) Realizar la actualización del marco de Empresas, partiendo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE).
- 3) Generar estudios especializados y análisis de la demanda laboral a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.
- 4) Fortalecer las capacidades institucionales tanto del personal como tecnología.

Beneficios Cualitativos

1. Identificar el nivel de percepción de la preparación con la fuerza de trabajo joven y determinar sus características educativas.
2. Mejorar de la calidad de la ubicación geográfica y su georeferenciación disponible para las empresas pequeñas en el Directorio de Empresas y Establecimientos, el cual se convertirá en el marco muestral de empresas pequeñas que servirán para el posterior levantamiento de información sobre Demanda Laboral en este grupo.
3. Proveer información referente a las empresas que se ubican en el territorio nacional, la cual estará sujeta a análisis y estudios que contribuirán a conocer la situación de la demanda laboral en el país.

Tipo de Beneficiario

- .Instituciones públicas promotoras, rectoras de la educación superior técnica y tecnológica: SENESCYT, CES.
- .MTD, MINTEL
- .Instituciones de educación superior técnico-tecnológica públicas y privadas
- .Población educativa.
- .Sector privado empresarial

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 24 meses


COSTO: \$ 2.353.466,68

ALCANCE: La evolución mensual del mercado laboral en los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios a partir de las vinculaciones, vacantes y desvinculaciones de aproximadamente 859 empresas; el registro de 18.000 empresas para el marco muestral 2018, registros administrativos e información de empleo con desagregaciones como educación superior, educación básica y bachillerato

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 61.11 %

Fecha de Inicio: 01/11/2018

Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

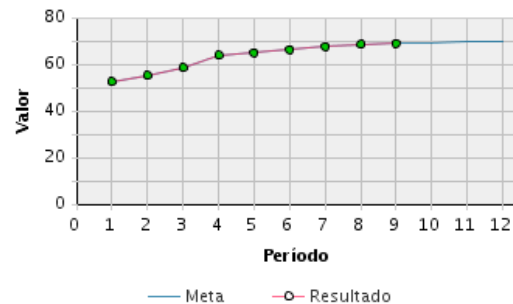

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	53 %	55 %	59 %	64 %	65 %	66 %	68 %	68 %	69 %	69 %	69 %	70 %
	Avance real acumulado											
	53 %	55 %	59 %	64 %	65 %	66 %	68 %	68 %	69 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2020 1) Se realizó el avance del 100% de la sintaxis del modelo de estimación de demanda laboral. (Hito 45 cumplido). 2) En cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Tercera Enmienda al Convenio de Préstamo 8667-EC del Proyecto PRETT en el mes de septiembre se han elaborado los documentos habilitantes para la solicitud del 2do Adendum 2020 del Proyecto PRETT, herramienta que permite financiar las necesidades actuales del proyecto que incluye el personal técnico y los servicios que se requieren en INEC para proceder con las siguientes actividades: .La continuación del levantamiento de la encuesta de demanda laboral dirigida a grandes y medianas empresas. .El análisis de la información derivada de registros administrativos provenientes de IESS, SRI, SENESCYT, MEF y MDT, y el estudio de la demanda laboral. .El procesamiento de registros administrativos para alimentar el Sistema de Seguimiento a graduados. 3) En virtud de las nuevas actividades del Proyecto, se realizó la actualización, tanto del cronograma de actividades físicas para los meses de noviembre y diciembre de 2020, como de la reestructuración de hitos del GPR para noviembre, diciembre 2020, y macro hitos 2021. El cronograma y la ficha de reestructuración de hitos suscritos fueron enviados conjuntamente con los documentos habilitantes del II Adendum del Proyecto PRETT el 23/09/2020 mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2020-0314-M. 4) En cuanto a la obtención de las Certificaciones Plurianuales 2020 2021, el 02/09/2020 mediante Oficio Nro. INEC-SUGEN-2020-0091-O se solicitó la gestión de Certificaciones Presupuestarias Plurianuales 2020 2021- INEC a la EOD-PRETT. El 10/09/2020 SENESCYT solicitó el dictamen favorable a la postulación de certificación plurianual al Consejo Sectorial. El Consejo aprobó esta petición y remitió el pedido a la Secretaria Técnica Planifica Ecuador donde se encuentra en trámite hasta la actualidad.	González, Sandra Gabriela	06/10/2020 - 04:30 PM
AGOSTO 2020 1) Se realizó la entrega de la Base de Datos final de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 procesada y pseudonimizada con Factor de Expansión Calculada, se entregó una base con un	González, Sandra Gabriela	06/10/2020 - 04:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>total de 5802 registros validados. Se pseudonimizó la base para la entrega solicitada por las productoras requirientes. (Hito 44 cumplido).</p> <p>2) En cuanto a la gestión realizada para la actualización y aprobación de herramientas de planificación necesarias para el ajuste de los nuevos requerimientos de Proyecto PRETT, mediante memorando INEC-INEC-2020-0320-M el 04 de agosto de 2020, se aprueba el 1er Adendum PRETT 2020.</p> <p>3) Una vez suscrita la Tercera Enmienda al Convenio de Préstamo 8667-EC del Proyecto PRETT, en el mes de agosto se alcanzó la suscripción del Convenio Modificadorio al Convenio Marco (17/08/2020) y Segundo Modificadorio al Convenio Específico (28/08/2020) suscritos entre la SENESCYT e INEC.</p> <p>4) Se alcanzó la aprobación de la actualización del Plan Operativo Anual POA 2018-2021, otorgada por la EOD-PRETT el 22/08/2020 mediante Oficio Nro. INEC-CTIMA-2020-0022-O.</p>		
<p>JULIO 2020</p> <p>1) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de junio 2020 con información del periodo de referencia mayo 2020. En este periodo, de los 894 registros planificados se investigaron 815 alcanzando una cobertura de recolección del 91,16% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Hito 43 cumplido).</p> <p>2) En cuanto a la gestión realizada para la actualización y aprobación de herramientas de planificación necesarias para el ajuste de los nuevos requerimientos de Proyecto PRETT, en virtud de la emergencia sanitaria, el 29 de julio de 2020 se alcanzó la aprobación de la actualización del Plan Operativo Anual 2020 mediante Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0149-CO. Adicionalmente, el 04 de agosto de 2020 el Proyecto PRETT alcanza la aprobación del 1er Adendum 2020 mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2020-0320-M.</p>	González, Sandra Gabriela	07/09/2020 - 11:09 AM
<p>JUNIO 2020</p> <p>1) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de mayo 2020 con información del periodo de referencia abril 2020. En este periodo, de los 894 registros planificados se investigaron 817 alcanzando una cobertura de recolección del 91,39% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Hito 42 cumplido).</p> <p>2) Cierre de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2020, con respecto a los siguientes indicadores: .Indicador 8: Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO .Indicador 9: Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO .Indicador 12: Porcentaje de avance de la construcción del Modelo Preliminar de Proyección de Demanda Laboral</p>	González, Sandra Gabriela	04/08/2020 - 10:02 PM
<p>MAYO 2020</p> <p>1) El 08 de mayo de 2020 mediante memorando Nro. INEC-INEC-2020-0182-M se alcanza la aprobación del Plan de Dirección del Proyecto PRETT, esta aprobación permite el arranque de la ejecución presupuestaria 2020, en la que se prioriza el pago de los haberes pendientes de todos los proveedores del PRETT, en tal virtud, el 30 de mayo de 2020 todos los pagos de los proveedores del Proyecto PRETT salieron de INEC/DIFI al MEF para su acreditación. Es importante recalcar que el 98% de los proveedores del PRETT, cuentan con certificación plurianual para el 2020, por lo que han venido desarrollado las actividades establecidas en sus contratos de manera normal hasta la presente fecha, en consecuencia, en cuanto al avance técnico, se han cumplido todas las metas establecidas en la planificación prevista para el 2020.</p> <p>2) El 21 de mayo de 2020, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2020-0197-M, se alcanza la aprobación para la reestructuración de hitos del Proyecto PRETT, a partir de este momento se realiza la actualización del Sistema GPR.</p>	González, Sandra Gabriela	03/07/2020 - 03:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de abril 2020 con información del período de referencia marzo 2020. En este período, de los 894 registros planificados se investigaron 797 alcanzando una cobertura de recolección del 89,15% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Hito 41 cumplido)</p>		
<p>ABRIL 2020</p> <p>1) Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2020-0059-M del 03 de abril de 2020 CTIMA envía el Informe para Convenio Modificatorio al Convenio Específico suscrito entre SENESCYT e INEC - Proyecto PRETT.</p> <p>2) El 06 de abril de 2020, el Proyecto PRETT alcanza la aprobación del Plan Operativo Anual POA 2020 mediante Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0093-CO.</p> <p>3) DIPLA mediante memorando Nro. INEC-INEC-2020-0165-M el 15 de abril de 2020, envía a DIREJ la versión final del Convenio Modificatorio, para su autorización y suscripción.</p> <p>4) El 16 de abril de 2020 se suscribe el modificadorio al convenio específico entre la entidad operativa desconcentrada (EOD-PRETT) de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).</p> <p>5) El 20 de abril de 2020 mediante Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0096-CO la Gerencia del Proyecto EOD-PRETT remite al INEC el Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Transferencia de Recursos de 01 de octubre de 2018, documento que ha sido suscrito con fecha 16 de abril de 2020.</p> <p>6) La asignación presupuestaria del Proyecto PRETT se hizo efectiva el 27 de abril de 2020, se oficializó mediante Memorando Nro. INEC-CGAF-2020-0540-M.</p> <p>7) EL 20 y 21 de abril de 2020 los integrantes del Grupo Experto se reunieron para la revisión del Plan de Dirección del Proyecto PDP PRETT 2020; actualmente la herramienta se encuentra en proceso de aprobación se estima alcanzarla la primera semana de mayo.</p>	<p>González, Sandra Gabriela</p>	<p>05/06/2020 - 02:43 PM</p>
<p>MARZO 2020</p> <p>1) En el marco de la ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SENESCYT e INEC para el diseño e implementación de un sistema de información estadística sobre demanda laboral del proyecto "Apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador-PRETT". Y, teniendo en consideración el Acuerdo Ministerial No. 0001 del Ministerio de Economía y Finanzas emitido el 02 de enero de 2020; y, la Enmienda de reestructura de financiamiento del Impuesto de Valor Agregado (IVA) del Convenio de Préstamo BIRF No. 8667 firmada el 25 de marzo de 2020.</p> <p>El 31 de marzo de 2020, mediante Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0090-CO, la Gerente del Proyecto Reconversión de la Educación Técnica Y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, informa que previo a realizar la transferencia de los recursos a INEC asignados para el 2020, se ha visto la necesidad de modificar la fuente de financiamiento del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que consta en el actual Convenio Específico de Transferencia de Recursos de 01 de octubre de 2018, para lo cual remite la propuesta de Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Transferencia de Recursos, para la aprobación y firma del Director del INEC.</p> <p>2) En base a la propuesta mencionada anteriormente, DIPLA mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2020-0354-M solicita al Coordinador General de CTIMA la elaboración de un Informe para Convenio Modificatorio al Convenio Específico entre SENESCYT e INEC.</p> <p>3) Una vez que la Gerente del Proyecto Reconversión de la Educación Técnica Y Tecnológica Superior Pública del Ecuador firme el Modificadorio al Convenio Específico de Transferencia de Recursos, se realizará la asignación presupuestaria al Proyecto PRETT-INEC.</p>	<p>González, Sandra Gabriela</p>	<p>07/05/2020 - 04:08 PM</p>
<p>FEBRERO 2020</p> <p>1) El 31/01/2020, desde la Gerencia del Proyecto PRETT a través del oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0029-CO, se insiste en la solicitud del envío de las directrices debido a que, al no encontrarse suscrita la adenda al Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial y no contar con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para el uso de los recursos de Libre Disponibilidad para el pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, el Proyecto no puede iniciar la ejecución del Presupuesto del presente año.</p> <p>En tal virtud, se solicita:</p> <p>.Autorizar que se financie el pago total del IVA con Recursos de Libre Disponibilidad de los contratos que se deban suscribir previo a la firma de la adenda al Convenio de Préstamo con el Banco Mundial.</p>	<p>González, Sandra Gabriela</p>	<p>07/04/2020 - 04:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Autorizar la primera transferencia del techo presupuestario al INEC correspondiente al IVA y pago de obligaciones con recursos de Libre Disponibilidad.		
<p>ENERO 2020</p> <p>A continuación se detallan las gestiones realizadas por la Coordinación General del Proyecto PRETT en seguimiento a la asignación del presupuesto 2020:</p> <p>1) A través del correo electrónico dirigido a la Analista del Desarrollo de la Investigación 3 - EOD, el 04/01/2020 la Coordinadora del Proyecto PRETT solicita se informe las gestiones que se están realizando respecto a la recepción de presupuesto 2020.</p> <p>2) En contestación al correo descrito en el párrafo que antecede, el 06/01/2020 se informa que mediante Oficio Nro. STPE-SIP-2020-0004-OF del 03 de enero del 2020, suscrito por Econ. Katherine Liseth Villacís Flores SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA (E) - STPE solicitó al MEF las modificaciones presupuestarias de todos los proyectos de inversión, entre los que se encuentra el PRETT tanto para aumento del INEC como para disminución de SENESCYT.</p> <p>3) Mediante Oficio Nro. INEC-CTIMA-2020-0001-O, del 09/01/2020, el Coordinador General CTIMA envió al Gerente de la EOD la información solicitada por esta entidad a través del Oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2020-0004-CO, de fecha 04/01/2020, misma que tiene la finalidad de remitir a la Subsecretaría de Financiamiento Público el informe técnico y solicitud de reprogramación de los componentes del Proyecto, para continuar con el trámite de aprobación ante los organismos financiadores y la suscripción de la adenda al Convenio de Préstamo. Esta gestión se realiza en conformidad a las directrices informadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>4) Con fecha 10/01/2020, INEC envía el Oficio Nro. INEC-CTIMA-2020-0002-O, en el cual se solicita una actualización en los avances de la gestión realizada por parte de la EOD PRETT en este respecto.</p> <p>Adicionalmente, durante este periodo, la Especialista de Gestión Financiera de INEC y el equipo financiero de la EOD PRETT, así como la Coordinación PRETT-INEC y la Administración del Convenio de la EOD PRETT, han mantenido constante comunicación a fin de dar seguimiento a la transferencia del presupuesto.</p> <p>5) Con fecha 13/01/2020, a través del correo electrónico dirigido a la Analista del Desarrollo de la Investigación 3 - EOD, la Coordinadora del Proyecto PRETT, en función de los avances mencionados, solicita se confirme sobre los siguientes pasos a realizar así como otros avances que hayan sido alcanzados desde la última comunicación respecto a la transferencia de presupuesto, y de ser posible conocer una fecha tentativa en la cual se va a contar con el mismo, por cuanto se requiere cumplir con la directrices de apertura del ejercicio fiscal 2020, dentro de las cuales se establece que hasta el 13 de enero del 2020 se deberían generar los compromisos de las certificaciones plurianuales, para evitar su anulación conforme a la normativa legal vigente.</p> <p>6) El 24/01/2020 la Especialista de Gestión Financiera de la EOD remite para conocimiento del INEC, las directrices enviadas mediante correo electrónico de 10 de enero de 2020 por la Mgs. Bélgica Guerrero Cañas, Consultora para el Seguimiento de Proyectos Banco Mundial del Ministerio de Economía y Finanzas y un Memorando de 14 de enero en el que el señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación solicita al señor Ministro de Finanzas las directrices operativas para la aplicación del Acuerdo Ministerial 0001.</p> <p>Además informa que el 15/01/2020 mediante oficio SENESCYT-PRETT-2020-0016-CO se envió desde la EOD el Informe Técnico requerido y al momento se encuentran a la espera de las directrices definitivas por parte del MEF. Adicionalmente comunica que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá remitir al Banco Mundial la solicitud de autorización para que el IVA sea financiado con los recursos del Préstamo.</p>	González, Sandra Gabriela	05/03/2020 - 04:35 PM
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de noviembre 2019 con información del período de referencia octubre 2019.</p> <p>En este período, de los 893 registros planificados se investigaron 889 alcanzando una cobertura de recolección del 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>2) Avance del 100% de la nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir del Módulo de Demanda Laboral de las encuestas de empresas.</p> <p>3) Al 27/12/2019 se presenta el 60% de avance en la cobertura en campo y el 54% de avance en la crítica de la encuesta a pequeñas empresas de acuerdo a lo re-programado considerando 8.364 empresas planificadas.</p> <p>4) En la Fase 1 del proceso de validación de la Encuesta de Demanda Laboral a pequeñas empresas 2018, se validó a 4.000 encuestas a nivel nacional en 4 cortes, los cuales</p>	González, Sandra Gabriela	05/03/2020 - 04:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>corresponden a las siguientes fechas: 25 de octubre, 2 de diciembre, 12 de diciembre y 26 de diciembre de 2019.</p> <p>5) Se realizaron 5 validaciones preliminares a la Encuesta Estructural Empresarial 2018 (incluido el Módulo de Demanda Laboral a grandes y medianas empresas) dando como resultado la validación de 4.093 casos levantados y criticados a nivel nacional por las coordinaciones zonales.</p> <p>6) En cuanto al Informe de gestión del Plan de Proyecto 2019, se tiene previsto la finalización de este ejercicio de acuerdo a las directrices de la Dirección de Planificación para el 17/01/2020.</p> <p>7) En referencia a la Planificación integral del proyecto (PDP 2020), este ejercicio se encuentra en construcción y finalizará el 24/01/2020.</p> <p>8) Se ha realizado el cierre de las metas establecidas para el cuarto trimestre del año 2019 con respecto a los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Indicador 4: Tasa de Cobertura Operativa - EG .Indicador 5: Porcentaje de ejecución de crítica - EG .Indicador 6: Tasa de Cobertura Operativa - EP .Indicador 7: Porcentaje de ejecución de crítica - EP .Indicador 8: Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO .Indicador 9: Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO .Indicador 11: Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas 		
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1) A través del memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0359-M el 31 de octubre de 2019 la Coordinación General del Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" (PRETT), solicita la autorización para la reestructuración de los hitos GPR, la misma que se requiere específicamente para el hito No. 21. En el memorando en cuestión se adjunta la correspondiente ficha de Justificación Técnica, Actualización y Ajuste de Proyectos JT-PPP-DEAN- N° 002 y la actualización del Cronograma de Actividades 2019. El 06 de noviembre de 2019 a través del Memorando Nro. INEC-INEC-2019-1519-M, se autoriza la reestructuración de los hitos del Proyecto PRETT, en tal virtud se procede a realizar la correspondiente reestructuración en el Sistema GPR.</p> <p>2) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de octubre 2019 con información del período de referencia septiembre 2019.</p> <p>En este periodo, de los 892 registros planificados se investigaron 890 alcanzando una cobertura de recolección del 99,78% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>3) Se realizó el cierre del proceso de campo y crítica codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, cuyo resultado fue del 100,10% ejecutado(95.2% de efectividad y 4.8% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar.</p>	González, Sandra Gabriela	05/12/2019 - 08:20 AM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de septiembre 2019 con información del período de referencia agosto 2019.</p> <p>En este período, de los 892 registros planificados se investigaron 887 alcanzando una cobertura de recolección del 99,44% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>2) En referencia al cumplimiento del hito 21, que contempla la adquisición de Equipos - Sistemas y Paquetes informáticos para reforzar el Laboratorio de Demanda Laboral, es menester aclarar que, la fecha de ejecución de adquisición de Equipos - Sistemas y Paquetes informáticos fue trasladada a 2020 conforme el Plan Operativo Anual 2019-2020 aprobado por la EOD PRETT, mediante oficio Nro. SENESCYT-PRETT-2019-0209-CO del 29 de agosto de 2019, y la 2da Adenda del Proyecto PRETT, otorgada mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-1357-M</p>	González, Sandra Gabriela	05/11/2019 - 09:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del 18 de Octubre de 2019. Este proceso de adquisición ha quedado debidamente anclado para su inicio en 2019 y ejecución en abril - mayo del 2020 mediante el uso de una Certificación Presupuestaria Plurianual, actualmente en trámite, y la cual cuenta con criterio favorable emitido por la Secretaría Técnica de Planificación mediante Oficio Nro. STPE-SIP-2019-0860-OF del 16 de octubre de 2019. En tal virtud el Hito 21 se ejecutará en 2020.</p> <p>En base a lo mencionado anteriormente, se ha solicitado la correspondiente reestructuración de los hitos del Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" a través del Memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0359-M el 31 de Octubre de 2019.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1) Con respecto a las actividades realizadas en el marco del cumplimiento de la capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento de la Encuesta de Demanda Laboral a pequeñas empresas, estas actividades se iniciaron en agosto y culminaron en septiembre de acuerdo a lo planificado, a continuación la descripción de las mismas:</p> <p>Del 15 al 16 de agosto de 2019 se llevó a cabo la capacitación al personal técnico en las diferentes Coordinaciones Zonales a través de videoconferencias sobre la metodología e instrumentos (formulario manual) de la Encuesta de Demanda Laboral a pequeñas empresas 2018, con el propósito de dar soporte a la capacitación de los aspirantes a encuestadores y revisores de calidad.</p> <p>Del 19 al 20 de agosto 2019 se realizó la capacitación a aspirantes a encuestadores y revisores de calidad respecto a la metodología e instrumentos (formulario manual) de la Encuesta de Demanda Laboral a pequeñas empresas 2018. A través de una presentación y revisión del manual, los técnicos de planta central acompañados por los técnicos respectivos de las Coordinaciones Zonales capacitaron a las persona aspirantes, capacitación que se evaluó y se procedió a escoger el personal requerido.</p> <p>El 21 de agosto de 2019, se llevó a cabo la capacitación con respecto al funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT - módulo del informante.</p> <p>El 05 y 06 de septiembre de 2019, se realizó la capacitación al personal seleccionado de encuestadores y revisores de calidad respecto a los clasificadores y nomenclaturas.</p> <p>El 27 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la capacitación con respecto al funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT - módulo de crítica y revisor.</p> <p>2) El 02 de septiembre de 2019 mediante correo electrónico, la Gestión de Estadísticas Estructurales (GESE) envió a las Coordinaciones Zonales la muestra para la asignación de cargas de trabajo de la Encuesta de Demanda Laboral a pequeñas empresas, de acuerdo a la siguiente distribución: Litoral (3.198), Ac Campo (3.135), Centro (921), y Sur (1.110), generándose una muestra total de 8.634 casos.</p> <p>3) Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de agosto 2019 con información del período de referencia julio 2019.</p> <p>En este período, de los 892 registros planificados se investigaron 886 alcanzando una cobertura de recolección del 99.33% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>Se cumplieron las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2019 con respecto a los siguientes indicadores:</p> <p>.Indicador 4: Tasa de Cobertura Operativa - EG .Indicador 5: Porcentaje de ejecución de crítica - EG .Indicador 6: Tasa de Cobertura Operativa - EP .Indicador 8: Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO .Indicador 9: Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO</p>	<p>González, Sandra Gabriela</p>	<p>07/10/2019 - 07:58 AM</p>
<p>AGOSTO 2019</p>	<p>González, Sandra Gabriela</p>	<p>29/08/2019 - 03:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Una vez finalizado el operativo de campo realizado en el marco de la actualización cartográfica de Empresas y Establecimientos 2019, la Dirección de Cartografía y Operaciones de Campo DICA, ha consolidado la Base de Datos definitiva del Directorio de Empresas y Establecimientos DICE actualizada y zonificada con 17.992 empresas, disponible en el aplicativo INFOCAPT a partir del 08 de julio de 2019; en tal virtud, con fecha 15 de agosto de 2019, a través del Memorando Nro. INEC-CGTPE-DICA-2019-0695-M, conforme al cronograma y formato sugerido, DICA emite el Informe Final del Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Información de Empresas; Subcomponente 2.1 -Actualización del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos DICE del proyecto PRETT".</p> <p>2.- De igual forma el 15 de agosto del 2019 a través del acta No. DICE-DECON-2019-017, la Gestión de Estadísticas Económicas en base a Registros Administrativos GEERA, realiza la entrega formal de DECON a DINEM de la base de datos DICE 2017 (5'122.111 registros) actualizada según matriz de prioridades con la información de las 17.992 empresas levantadas en DICA y con Información del Call Center. La entrega se realiza a través de una tabla plana en formato (.sav).</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de julio 2019, con información del período de referencia junio 2019. En este período de los 891 registros planificados se investigaron 889 alcanzando una cobertura de recolección del 99,78% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados, en tal virtud, el 16 de agosto de 2019 se entregó el Informe de cobertura del proceso de validación del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo julio 2019.</p>		
<p>JULIO 2019</p> <p>Con fecha 25 de julio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de junio 2019 con información del período de referencia mayo 2019.</p> <p>En este período de los 887 registros planificados, se investigaron 883 alcanzando una cobertura de recolección del 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Datos correspondientes al cumplimiento del hito No.13).</p>	González, Sandra Gabriela	06/08/2019 - 01:01 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>1. Con fecha 30 de junio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de mayo 2019 con información del período de referencia abril 2019.</p> <p>En este período, de los 883 registros planificados se investigaron 879 alcanzando una cobertura de recolección de 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>2. Una vez finalizadas las pruebas al aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se logró obtener una herramienta informática actualizada y funcional para el proceso de recolección y crítica de la encuesta.</p> <p>3. Se ejecutó la capacitación de la metodología e instrumentos de recolección de la ENESEM 2018 - incluido en el módulo de Demanda Laboral dirigidos a grandes y medianas empresas. Se cumplieron las metas establecidas para el segundo trimestre del año con respecto a los siguientes indicadores:</p> <p>1.Tasa de Cobertura Operativa - EG</p> <p>2.Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO</p> <p>3.Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO</p> <p>4.17.992 empresas registradas y zonificadas como parte del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DICE) para el primer trimestre del año 2019</p> <p>5.Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas</p>	González, Sandra Gabriela	12/07/2019 - 11:41 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0069-M con fecha 09 de mayo de 2019, se solicitó la Reprogramación de Hitos GPR del Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, solicitud que se envió acompañada de la Ficha de Justificación Técnica, Actualización y Ajuste de Proyectos Nro. JT-PPP-DEAN- N° 001.</p>	González, Sandra Gabriela	03/06/2019 - 04:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con fecha 10 de mayo de 2019, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0483-M, se autoriza la reprogramación solicitada, en tal virtud, el 13 de mayo del presente año se procede con la reestructuración de hitos en el sistema respectivo.</p> <p>Una vez estructurados los hitos, se procede atender las observaciones enviadas mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0358-M con fecha 06 de mayo de 2019, en donde se solicita la actualización en el Sistema GPR de los indicadores y los riesgos aprobados en el Plan de Dirección del Proyecto 2019; para proceder con lo solicitado, con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0018-M del 16 de mayo de 2019, se solicita a DIPLA se realice la detención de los indicadores reportados en el 2018, adicionalmente con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0019-M del 17 de mayo de 2019, se realiza el envío de la matriz solicitada con las acciones tomadas para solventar las observaciones realizadas al Proyecto en el Sistema GPR (excepto la actualización de indicadores), el 20 de mayo de 2019 se recibe el memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0389-M en donde se comunica la efectiva detención de los indicadores, a partir de este pronunciamiento se procede a la actualización de los indicadores 2019 en el Sistema GPR.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019 se entrega el Informe del envío de muestra Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM - incluido el módulo de Demanda Laboral dirigidas a grandes y medianas empresas) adicionalmente con memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2019-0203-M del 23 de mayo de 2019 se realiza la solicitud de envío de la muestra a las Coordinaciones Zonales y a la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de campo.</p>		
<p>ABRIL 2019</p> <p>1. Se elaboró y se aprobó el Plan de Dirección del Proyecto.-En el memorando Nro. INEC-INEC-2019-0259 del 25 de marzo de 2019, se establece la aprobación del Plan de Dirección del Proyecto.</p> <p>2. Se realizó la contratación de equipo de apoyo (personal civil) y consultores para el proyecto.- Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2019-0524-M del 25 de abril de 2019 se autoriza la realización de los contratos del personal civil, de igual forma en los memorandos Nro. INEC-CGAF-DIAD-2019-0559-M y 0560-M del 12 de abril de 2019, se autoriza la realización de los contratos del personal consultor.</p>	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 03:03 PM
<p>ENERO A MARZO 2019</p> <p>1. Mediante Oficio SENESCYT 2019-066 de fecha 17 de Enero de 2019, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador remite la No objeción al Manual de Operaciones (MOP) -Actualización 1.</p> <p>2. Con oficio Nro. IESS-GS-2019-0007-O del 12 de febrero de 2019 el Dr. Victor Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social solicita al Ing. Juan Carlos Proaño, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Encargado solicita la inclusión al PAI 2019 y transferencia presupuestaria del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador (EOD PETT)".</p> <p>3. Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0028-M del 15 de marzo de 2019, la Coordinadora General Técnico de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, Subrogante solicita a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica se gestione la revisión y aprobación del Plan de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador".</p> <p>4. Con memorando No. INEC-INEC-2019-0259-M, del 25 de Marzo del 2019, el señor Director Ejecutivo Encargado aprueba el Plan de Dirección de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador".</p>	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 02:51 PM
<p>DICIEMBRE 2018</p> <p>1. Se dio inicio a la prueba piloto para las empresas pequeñas que se efectuará en el Componente 1 - Encuesta de Demanda Laboral.</p> <p>- Se realiza capacitación al personal que trabajará en la actualización cartográfica correspondiente al Componente 2. Además se generó el punteo de las empresas pequeñas sobre las cuales se realizaría la actualización de información. El avance en georeferenciación de empresas fue de 44,49%. (HITO CUMPLIDO 3.)</p>	González, Sandra Gabriela	13/05/2019 - 02:48 PM
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>1. Una vez se contó con el oficio No. SENESCYT 2018-59 del 8 de noviembre de 2018, mediante el cual Banco Mundial emite la NO OBJECCIÓN a los procedimientos para la ejecución de Costos de la Encuesta a levantarse por el INEC bajo el Proyecto "Apoyo a la Reconversión de</p>	Fuentes Sinche, Diego Patricio	13/05/2019 - 11:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública Del Ecuador", se procedió a elaborar la planificación del proyecto, el presupuesto y cronograma de actividades, el cual fue aprobado con Memorando No. INEC-INEC-2018-0998-M, de 12 de noviembre del 2018, por el señor Director Ejecutivo del INEC. (HITO CUMPLIDO 1.)</p> <p>2. Mediante oficio SENESCYT-PRETT-2018-0166-CO de 13 de noviembre, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador informa al INEC que el POA 2018-2020 es aprobado, posteriormente el 15 de noviembre, una vez que se contaba con los insumos necesarios, se procedió a elaborar los documentos sobre los requerimientos de contratación de servicios para ejecutar los procedimientos relativos a costos de la encuesta. (HITO CUMPLIDO 2)</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Plan de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador" elaborado	4-Inicio de Trabajo	29/11/2018		12/11/2018		Sí	3.0
2	EJECUCIÓN: Documento Costo de la Encuesta Características del Bien / Servicio como requerimiento para la contratación de bienes y servicios elaborados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2018		29/11/2018		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Informe de avance de cobertura sobre georeferenciación de empresas del DICE a Diciembre 2018 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		28/12/2018		Sí	4.0
4	EJECUCIÓN: Informe de Gestión PRETT 2018 de actividades realizadas	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		14/12/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Equipo de consultores para el proyecto contratados	5-Entregables Intermedios	12/04/2019		12/04/2019		Sí	2.0
6	PLANIFICACIÓN: Planificación integral del proyecto realizada	5-Entregables Intermedios	12/04/2019		12/04/2019		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Equipo de apoyo del proyecto contratado	5-Entregables Intermedios	25/04/2019		25/04/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a	5-Entregables Intermedios	13/05/2019		13/05/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	grandes y medianas empresas entregada							
10	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de mayo 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	24/06/2019		24/06/2019		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas elaborado	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/07/2019		25/07/2019		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2017) actualizado y zonificado realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2019		15/08/2019		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos Actualizado (2017) realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2019		15/08/2019		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de julio 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	26/08/2019		26/08/2019		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	06/09/2019		06/09/2019		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	5-Entregables Intermedios	06/09/2019		06/09/2019		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de agosto 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	26/09/2019		26/09/2019		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de septiembre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/10/2019		25/10/2019		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto	5-Entregables Intermedios	25/11/2019		25/11/2019		Sí	0.5


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	plazo (SIPRO) de octubre 2019 ejecutado							
22	EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas finalizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	5.0
23	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de noviembre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		27/12/2019		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Informe de gestión del Plan de Proyecto 2019 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación FASE 1 de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas finalizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Planificación integral del proyecto realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		13/01/2020		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Validación de la BDD de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas FASE 1 elaborada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Validación de la BDD del Módulo de Encuesta Demanda Laboral a medianas y grandes empresas elaborada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de diciembre 2019 ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/01/2020		15/01/2020		Sí	1.27
31	PLANEACIÓN: Proyecto o plan de trabajo del proyecto para 2020 elaborado	5-Entregables Intermedios	27/01/2020		27/01/2020		Sí	1.26
32	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de enero 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	14/02/2020		14/02/2020		Sí	1.27
33	EJECUCIÓN: Entrega a través de acta a muestreo de base DIEE 2018 con información actualizada para factores de expansión - EG entregada	5-Entregables Intermedios	21/02/2020		21/02/2020		Sí	1.27
34	EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas realizado	5-Entregables Intermedios	13/03/2020		13/03/2020		Sí	1.0






HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
35	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de febrero 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	16/03/2020		16/03/2020		Sí	1.27
36	EJECUCIÓN: Reporte de validaciones de BDD de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas realizado	5-Entregables Intermedios	23/03/2020		23/03/2020		Sí	1.27
37	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de marzo 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/04/2020		15/04/2020		Sí	1.27
38	EJECUCIÓN: Entrega a través de acta a muestreo de base DIEE 2018 con información actualizada para factores de expansión - EP entregada	5-Entregables Intermedios	17/04/2020		17/04/2020		Sí	1.27
39	EJECUCIÓN: Informe de análisis de la consistencia y coherencia de la base de datos final de la ENESEM 2018 (Módulo de Demanda Laboral a medianas y grandes empresas) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.27
40	EJECUCIÓN: Informe de entrega de la base de datos final de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.27
41	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de abril 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/05/2020		15/05/2020		Sí	1.27
42	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de mayo 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/06/2020		15/06/2020		Sí	1.27
43	EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2020 ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.27
44	EJECUCIÓN: Entrega de bases de datos procesadas y pseudonimizadas solicitadas por las productoras requirientes realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Sintaxis preliminar del modelo de estimación de demanda laboral realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
46	CIERRE: Documento con la metodología y estimación de la proyección de demanda laboral realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.25
47	EJECUCIÓN: Documentación de resultados del módulo	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de demanda laboral de la ENESEM realizada							
48	EJECUCIÓN: Documentación de resultados del módulo de demanda laboral de SIPRO realizada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	0.35
49	EJECUCIÓN: Recolección del módulo demanda laboral - ENESEM 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.25
50	EJECUCIÓN: Levantamiento de la encuesta de demanda laboral dirigida a grandes y medianas empresas realizado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2021	01/06/2021			No	10.0
51	EJECUCIÓN: Análisis de la información derivada de registros administrativos provenientes de IESS, SRI, SENESCYT, MEF y MDT, y el estudio de la demanda laboral realizado.	5-Entregables Intermedios	01/08/2021	01/08/2021			No	10.0
52	EJECUCIÓN: Procesamiento de registros administrativos para alimentar el Sistema de Seguimiento a graduados realizado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2021	01/12/2021			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Tasa de Cobertura Operativa - EP		100.00 %	0	0	19/08/2019	Abr-Jun
2	Porcentaje de ejecución de crítica - EP		100.00 %	0	0	16/09/2019	Abr-Jun
3	Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO		71.59 %	0.85	0.6085	02/04/2019	Abr-Jun
4	Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO		100.00 %	1	1	08/04/2019	Abr-Jun
5	Porcentaje de avance de la construcción del Modelo Preliminar de Proyección de Demanda Laboral		100.00 %	1	1	01/01/2020	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,922,398.40 **
Costo Total:	684,732.06
Total Devengado:	1,623,059.22
% Costo Total Devengado:	237.04 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 237.04 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,445,193.63	625,164.75	0.00	3,070,358.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	684,732.06	504,735.45	0.00	1,189,467.51
Ppto. Codificado	1,992,280.05	625,164.75	0.00	2,617,444.80
Ppto. Comprometido	1,299,460.33	0.00	0.00	1,299,460.33
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	1,994,253.50	625,164.75	0.00	2,619,418.25
Ppto. Devengado	1,297,233.65	325,825.57	0.00	1,623,059.22
Pagado Real	1,259,721.46	0.00	0.00	1,259,721.46
Estimado a fin de año	* 1,297,233.65	0.00	0.00	1,297,233.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	697,019.85	625,164.75	0.00	1,322,184.60
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 65.05 %	52.12 %	0.00 %	61.96 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00





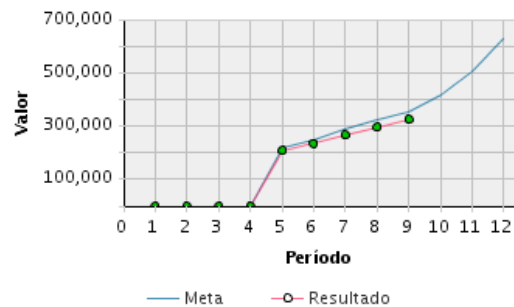




* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	218,202.93	208,864.37	218,202.93	208,864.37	95.72 %		33.41 %
Jun	27,420.18	25,779.38	245,623.11	234,643.75	95.53 %		37.53 %
Jul	41,467.75	31,143.28	287,090.86	265,787.03	92.58 %		42.51 %
Ago	37,479.98	31,434.91	324,570.84	297,221.94	91.57 %		47.54 %
Sep	31,071.07	28,603.63	355,641.91	325,825.57	91.62 %		52.12 %
Oct	63,796.94		419,438.85				
Nov	85,296.60		504,735.45				
Dic	120,429.30		625,164.75				
Total	625,164.75	325,825.57					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar mejoras en las distintas etapas de al producción estadística en el área de competencia de DEAN, MEDIANTE la generación de investigaciones científicas y metodológicas, e informes analíticos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Constitución PRETT	Acta_de_Constitución_PRETT.pdf	15/05/2019
2	ASOCIACIÓN HITO 1. Revisión y aprobación del Plan de Proyecto PRETT	A.1.pdf	22/05/2019
3	ASOCIACIÓN HITO 10. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO)	B.1.pdf	02/07/2019
4	ASOCIACIÓN HITO 11. Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas	B.2.pdf	08/07/2019
5	ASOCIACIÓN HITO 12. Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas	B.3.pdf	08/07/2019
6	ASOCIACIÓN HITO 13. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado	B.4.pdf	30/07/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 14. Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2017) actualizado y zonificado realizado	B.5.pdf	29/08/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 15. Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos Actualizado (2017)	B.6.pdf	29/08/2019
9	ASOCIACIÓN HITO 16. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de julio 2019	B.7.pdf	29/08/2019
10	ASOCIACIÓN HITO 17. Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	B.8.pdf	06/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACIÓN HITO 18: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada	B.9.pdf	06/10/2019
12	ASOCIACIÓN HITO 19. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de agosto 2019 ejecutado	C.1.pdf	01/10/2019
13	ASOCIACIÓN HITO 2. Autorización solicitud ejecución proceso costo de encuesta, suministros	A.2.pdf	22/05/2019
14	ASOCIACIÓN HITO 20: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de septiembre 2019 ejecutado	C.2.pdf	28/10/2019
15	ASOCIACIÓN HITO 21. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de octubre 2019	C.3.pdf	04/12/2019
16	ASOCIACIÓN HITO 22. Operativo de campo y critica-codificación del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas finalizado	C.4.pdf	05/12/2019
17	ASOCIACIÓN HITO 23. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de noviembre 2019	C.5.pdf	04/01/2020
18	ASOCIACIÓN HITO 24. Informe de gestión del Plan de Proyecto 2019 elaborado	C.6.pdf	07/02/2020
19	ASOCIACIÓN HITO 25. Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas	C.7.pdf	06/01/2020
20	ASOCIACIÓN HITO 26. Operativo de campo y critica-codificación FASE 1 de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas finalizado	C.8.pdf	06/01/2020
21	ASOCIACIÓN HITO 27. Planificación integral del proyecto realizada	C.9.pdf	04/05/2020
22	ASOCIACIÓN HITO 28. Validación de la BDD de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas FASE 1	D.1.pdf	06/01/2020
23	ASOCIACIÓN HITO 29. Validación de la BDD del Módulo de Encuesta Demanda Laboral a medianas y grandes empresas	D.2.pdf	06/01/2020
24	ASOCIACIÓN HITO 3. Informe de Avance de Preubicación y Preparación de material	A.3.pdf	22/05/2019
25	ASOCIACIÓN HITO 4. Informe de actividades PRETT	A.4.pdf	22/05/2019
26	ASOCIACIÓN HITO 5. Equipo de consultores para el proyecto PRETT contratados	A.5.pdf	22/05/2019
27	ASOCIACIÓN HITO 6. Plan de trabajo del proyecto PRETT para 2019	A.6.pdf	22/05/2019
28	ASOCIACIÓN HITO 7. Equipo de apoyo del proyecto PRETT contratado	A.7.pdf	22/05/2019
29	ASOCIACIÓN HITO 8. GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado	A.8.pdf	22/05/2019
30	ASOCIACIÓN HITO 9. Muestra a las Coordinaciones Zonales para asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas	A.9.pdf	31/05/2019
31	ASOCIACIÓN HITO N°30 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de diciembre 2019	D3_HITO30.pdf	22/05/2020
32	ASOCIACIÓN HITO N°31 - Proyecto o plan de trabajo del proyecto para 2020	D4_HITO31.pdf	26/05/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
33	ASOCIACIÓN HITO N°32 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de enero 2020	D5_HITO32.pdf	26/05/2020
34	ASOCIACIÓN HITO N°33 - Entrega a través de acta a muestreo de base DICE 2018 con información actualizada para factores de expansión - EG	D6_HITO33.pdf	26/05/2020
35	ASOCIACIÓN HITO N°34 - Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas	D7_HITO34.pdf	26/05/2020
36	ASOCIACIÓN HITO N°35 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de febrero 2020	D8_HITO35.pdf	26/05/2020
37	ASOCIACIÓN HITO N°36 - Reporte de validaciones de BDD de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas	D9_HITO36.pdf	26/05/2020
38	ASOCIACIÓN HITO N°37 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de marzo 2020	E1_HITO37.pdf	26/05/2020
39	ASOCIACIÓN HITO N°38 - Entrega a través de acta a muestreo de base DICE 2018 con información actualizada para factores de expansión - EP	E2_HITO38.rar	26/05/2020
40	ASOCIACIÓN HITO N°39 - Informe de análisis de la consistencia y coherencia de la base de datos final de la ENESEM 2018 (Módulo de Demanda Laboral a medianas y grandes empresas)	E3_HITO39.pdf	26/05/2020
41	ASOCIACIÓN HITO N°40 - Informe de entrega de la base de datos final de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas	E4_HITO40.pdf	26/05/2020
42	ASOCIACIÓN HITO N°41 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de abril 2020	E5_HITO41.pdf	07/06/2020
43	ASOCIACIÓN HITO N°42 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de mayo 2020	E6_HITO42.pdf	25/06/2020
44	ASOCIACIÓN HITO N°43 - Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2020	E7_HITO43.pdf	04/08/2020
45	ASOCIACIÓN HITO N°44 - Entrega de bases de datos procesadas y pseudonimizadas solicitadas por las productoras requirientes	E8_HITO44.rar	07/09/2020
46	ASOCIACIÓN HITO N°45 - Sintaxis preliminar del modelo de estimación de demanda laboral	E9_HITO45.rar	07/10/2020
47	Expediente de 2da Reestructuración de Hitos	2DA_REESTRUCTURACION_HITOS_PRETT.pdf	07/11/2019
48	Expediente Reestructuración de Hitos 2020	Reestructuración_Hitos_2020_PRETT.rar	05/06/2020
49	Expedientes de Reestructura de Hitos	Expedientes_de_Reestructura_de_Hitos.pdf	14/05/2019
50	GP001_PA001_INFORMES DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS SECTORIALES	GP001_PA001.rar	07/10/2020
51	GP002_PA001_Autorización de la elaboración de la orden de servicio del costo de encuesta correspondiente al servicio de alquiler de computadoras del proyecto PRETT año 2020 Memorando Nro. INEC-CGAF-2020-0733-M	GP002_PA001.rar	07/10/2020
52	GR001_PA001_Autorización de la orden de servicio 001-2020 con memorando INEC-CGAF-DIFI-2020-0733-M	GR001_PA001.pdf	07/07/2020
53	GR002_PA001_Correo de solicitud de acceso remoto para los analistas técnicos DEAN	GR002_PA001.pdf	07/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	GR003_PA001_Autorización de la orden de servicio del costo de la encuesta correspondiente al servicio de alquiler de computadoras para el Proyecto PRETT con Memorando Nro. INEC-CGAF-2019-2739-M	GR003_PA001.pdf	07/07/2020
55	GR004_PA001_2020 Oficio de aprobación POA y memorando aprobación 1er Adendum PRETT 2020	GR004_PA001_2020.pdf	07/10/2020
56	GR004_PA001_Calendario investigación SIPRO 2020, correo asignación de cargas IPIM, IPT,IH,IR y correo Sin.selectiva IPIM, IPT,IH e IR _mayo2020 y junio2020	GR004_PA001.pdf	07/07/2020
57	GR006_PA001_Informe de Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de la Encuesta de Demanda Laboral 2018 a pequeñas empresas.	GR006_PA001.pdf	07/07/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
García Mosquera, María Isabel	Miembro de equipo	Coordinadora General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información Encargada	mariaisabel_garcia@inec.gob.ec	
González, Sandra Gabriela	Lider del Proyecto	Responsable Nacional del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador"	sandra_gonzalez@inec.gob.ec	2544326
