

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K006 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382709	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,867,361.10
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/05/2018 - 31/07/2021
Fecha de última actualización:	07/10/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto:

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una operación estadística que pretende obtener información que identifique la situación de salud reproductiva, materna e infantil, estado nutricional acceso a programas de complementación alimentaria y suplementación profiláctica, entre otros temas de salud de la población. Además esta información permitirá evaluar y dar seguimiento al Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, el cual establece: "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas".

Producto:

Información de alrededor de 46392 viviendas contenida en bases de datos.

Línea de base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde el 16 de julio al 15 de diciembre del 2012, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Objetivo general:

Generar indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana con el fin de evaluar y generar las políticas públicas para la erradicación de la desnutrición crónica en menores de 2 años.

Objetivos específicos:

.Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENSANUT 2018-2019.

.Levantar la información de campo.

.Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información.

.Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta.

Beneficios Cualitativos

Levantar información de campo permitirá obtener indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana, indicadores que dan cuenta del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen el fin de evaluar y generar políticas públicas que sirvan para disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años.

Tipo de Beneficiario

- Población de referencia:

Considerando que el área de influencia del presente proyecto es nacional, la población de referencia es equivalente al total de habitantes de la República que según el censo nacional de población y vivienda 2010, elaborado por el INEC es de 14'483.499 personas, con una tasa de crecimiento anual estimada de 1,48%, la proyección estimada para el año 2018 es de 17'023.408 habitantes.

- Población demandante potencial:

Serán el Gobierno Nacional, 23 Gobiernos Provinciales, 27 Ministerios que forman parte del Gobierno Nacional; catedráticos, estudiantes, periodistas, científicos e investigadores sociales, y usuarios en general.

Tipo de Beneficiario


- Población demandante efectiva:
Serán Instituciones del Sector público: Ministerio de Salud Pública e Instituciones involucradas en el seguimiento del Plan de Nutrición (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Planificación).

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 15/05/2018 Fecha de Fin: 31/07/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

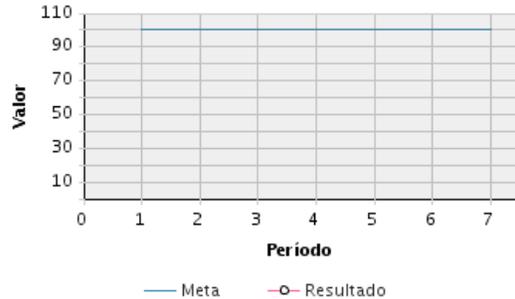

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %				
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>PERIODO JULIO A OCTUBRE 2021</p> <p>Con fecha 22 de marzo de 2021 la Coordinación Administrativa Financiera del INEC mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2021-0287-M informa a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística que no procede la certificación del proyecto de inversión "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018", ya que tiene valores pendientes en la Coordinación Zonal 6 y mantiene saldos en inventarios y bienes en Planta Central.</p> <p>Inmediatamente se tomaron las acciones del caso para solventar estos inconvenientes y es así que se identificó que el proveedor no presentó la factura a pesar de la insistencia del administrador de la orden de servicio, además el señor Luis Antonio Rivera Rodas, con fecha 05 de noviembre de 2019, envía un oficio en donde informa que la factura a entregar a la institución por el servicio de alquiler de sillas del mes de julio será a nombre de Rodas Ulloa Bertha Teresa como representante legal de La casa del banquete y no a nombre de Rivera Rodas Luis Antonio quien por motivos personales se vio obligado a cerrar el RUC. Cabe mencionar que la orden de servicio N° INF-INEC-CZ6-014-2019 fue adjudicada a una persona natural siendo Rivera Rodas Luis Antonio con RUC N° 0104391107001, por lo cual se requería de un documento legal de sesión de derecho entre los antes mencionados y no de cambio de representante legal.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPPE-2021-0320-M de fecha 27 de mayo de 2021 la Coordinación General Técnica de Producción Estadística solicita a la Dirección de Planificación y Gestión estratégica realizar la gestión pertinente ante la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a fin de obtener la autorización de modificaciones internas entre proyectos de inversión "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" y "VIII Censo de Población y VII de Vivienda - CPV" para realizar el pago de los valores pendientes.</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	07/10/2021 - 02:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0427-M de 11 de junio de 2021, se emite la socialización de modificación presupuestaria aprobada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador de los proyectos: "Actualización del Registro Social" y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT. La Dirección Financiera el 17 de junio de 2021 procedió con el planteamiento de las modificaciones presupuestarias INTRA CO2 No. 71 y 72 en el sistema de administración financiera e-SIGEF, para redistribución de recursos entre proyectos de inversión del INEC, por el valor de USD USD 3.349,10 y USD 562,46 respectivamente.</p> <p>Con fecha 22 de junio de 2021 desde el Ministerio de Economía y Finanzas se procedió con la aprobación de los comprobantes de modificación presupuestaria INTRA CO2 No. 71 y 72</p> <p>En el mes de julio se solicitó el pago al proveedor y a inicios del mes de agosto se registró el comprobante de pago del mismo, mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2021-0454-M enviado a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística se solicita la revisión del expediente final para el proceso de cierre en el sistema Gobierno por Resultados - GPR del Proyecto de Inversión: "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018", con CUP: 131210000.0000.382709, ejecutado por la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas desde el 15/05/2018 hasta el 31/07/2021.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-2021-0521-M de fecha 10 de septiembre de 2021 la Coordinación General Técnica de Producción Estadística solicita a la Dirección Ejecutiva en su calidad de "Patrocinador Ejecutivo" aprobar el cierre del proyecto "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" y así proceder con el cambio en el Sistema GPR a fase de "COMPLETADO".</p> <p>El 06 de octubre de 2021 mediante memorando Nro. INEC-INEC-2021-0453-M la Dirección Ejecutiva autoriza el requerimiento y dispone continuar con los trámites respectivos.</p>		
<p>PERIODO ENERO A JUNIO 2021</p> <p>Con fecha 06 de junio de 2019, se suscribe la Orden de Servicio entre la Coordinación Zonal 6 y el señor Luis Antonio Rivera Rodas cuyo nombre comercial es la Casa del Banquete, para la prestación del servicio de alquiler de mobiliario (sillas) necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019-ENSANUT-Operativo de Campo" de la Coordinación Zonal 6 del INEC.</p> <p>Orden de servicio contratada bajo el procedimiento de ínfima cuantía por la prestación del servicio durante los meses de junio y julio de 2019 y cuyo valor total adjudicado fue de \$ 1.106,78 incluido IVA, correspondiente a \$486,00 más IVA (\$544,32) en el mes de junio y 502,20 más IVA (562,46) en el mes de julio.</p> <p>Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibe un correo electrónico de parte del proveedor, en el que informa que no se ha procedido a enviar la factura por el servicio prestado con respecto al mes de julio de 2019, debido a que hubo un cambio de Representante Legal de la empresa.</p> <p>Con fecha 28 de octubre de 2019 la Casa del Banquete envió un correo solicitando el nombre de la persona a quien debe dirigir el oficio por el motivo del cambio de representante legal para la aceptación de la factura.</p> <p>El proveedor no presentó la factura a pesar de la insistencia del administrador de la orden de servicio, además el señor Luis Antonio Rivera Rodas, con fecha 05 de noviembre de 2019, envía un oficio en donde informa que la factura a entregar a la institución por el servicio de alquiler de sillas del mes de julio será a nombre de Rodas Ulloa Bertha Teresa como representante legal de La casa del banquete y no a nombre de Rivera Rodas Luis Antonio quien por motivos personales se vio obligado a cerrar el RUC. Cabe mencionar que la orden de servicio N° INF-INEC-CZ6-014-2019 fue adjudicada a una persona natural siendo Rivera Rodas Luis Antonio con RUC N° 0104391107001, por lo cual se requería de un documento legal de sesión de derecho entre los antes mencionados y no de cambio de representante legal.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-2021-0320-M de fecha 27 de mayo de 2021 la Coordinación General Técnica de Producción Estadística solicita a la Dirección de Planificación y Gestión estratégica realizar la gestión pertinente ante la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a fin de obtener la autorización de modificaciones internas entre proyectos de inversión "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" y "VIII Censo de Población y VII de Vivienda - CPV" para realizar el pago de los valores pendientes.</p>	<p>Mendoza Moreira, Virginia Natali</p>	<p>07/10/2021 - 02:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0427-M de 11 de junio de 2021, se emite la socialización de modificación presupuestaria aprobada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador de los proyectos: "Actualización del Registro Social" y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT. La Dirección Financiera el 17 de junio de 2021 procedió con el planteamiento de las modificaciones presupuestarias INTRA CO2 No. 71 y 72 en el sistema de administración financiera e-SIGEF, para redistribución de recursos entre proyectos de inversión del INEC, por el valor de USD USD 3.349,10 y USD 562,46 respectivamente.</p> <p>Con fecha 22 de junio de 2021 desde el Ministerio de Economía y Finanzas se procedió con la aprobación de los comprobantes de modificación presupuestaria INTRA CO2 No. 71 y 72</p>		
<p>PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2020</p> <p>Mediante Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0412-OF, de fecha 15 de junio de 2020, la Mgs. Mónica García, Subsecretaria de Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos para el proyecto "Encuesta de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" de CUP No. 31210000.0000.382709 a fin de cubrir la obligación pendiente de pago al proveedor COMSUPPLIES S.A por "Adquisición de Suministros de Impresión".</p> <p>La Dirección Financiera ha gestionado el trámite respectivo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, obteniendo que el ente rector de las finanzas públicas proceda a crear en el presupuesto institucional a nivel nacional la estructura programática No. 55 00 027 001.</p> <p>Con este dictamen se realizó la actualización al cronograma valorado de ENSANUT y la Dirección Financiero creo la estructura para que dicho rubro sea incluido en el presupuesto de la Coordinación Zonal Litoral para su pago en el mes de julio del presente año.</p> <p>En el mes de julio de 2020 se efectuó el pago pendiente al proveedor COMSUPPLIES S.A por "Adquisición de Suministros de Impresión" y se inició la gestión para completar informes y actas de cierre del proyecto.</p> <p>Se realizó la gestión para elaborar los informes y actas de cierre del proyecto y el 31 de diciembre de 2020 el Director Ejecutivo autorizó el mismo mediante memorando Nro. INEC-INEC-2020-0742-M; con base a lo cual, se inició con la elaboración de informes de cierre preliminares y obtención de certificaciones (internas y externas) conforme lo establecido en el Acuerdo N° 025 SNP.</p>	<p>Mendoza Moreira, Virginia Natali</p>	<p>22/01/2021 - 02:22 PM</p>
<p>PERIODO ENERO A JULIO 2020</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-DIFI-2020-0613-M de fecha 9 de abril de 2020, la Dirección Financiera remite un informe detallado de todos los procesos de pago relacionados con el proyecto "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" (...) correspondientes al año 2019, con su debida justificación. Mediante memorando Nro. INEC-DIJU-2020-0174-M de 11 de abril de 2020 la Dirección Jurídica emite criterio y concluye lo siguiente: "Esta Dirección de Asesoría Jurídica considera pertinente incluir en el presupuesto del año 2020, de los proyectos "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018", los pagos no realizados, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de las certificaciones atadas a la fuente de financiamiento 202 organismo 5093 correlativo 0001 a nivel nacional. Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2020-0135-M de 13 de abril de 2020 se remite la información antes mencionada a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica para dar continuidad al trámite respectivo, quienes a su vez mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2020-0380-M solicitan autorización de la máxima autoridad para la inclusión en el PAP del rubro \$950,32. Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2020-0166-M de fecha 15 de abril de 2020, el Director ejecutivo indica lo siguiente: "Me refiero a su memorando Nro. INEC-DIPLA-2020-0380-M mediante el cual se informó a este Despacho la necesidad de realizar el ajuste a la programación anual de la planificación 2020 - PAP. Al respecto, y considerando los informes técnicos y jurídicos emitidos sobre el particular y en concordancia con lo establecido en el Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el Art. 124 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se acoge su recomendación y se autoriza realizar el ajuste a la programación anual de la planificación 2020 - PAP " y se dispone a la Coordinación General Administrativa Financiera que continúe con los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)". Con estos antecedentes y dando la debida continuidad en el trámite, se remite a usted Señor Coordinador los documentos habilitantes para que se realice la gestión ante la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica para la inclusión de ENSANUT 2018 en el Plan Anual de Inversiones - PAI 2020.</p>	<p>Mendoza Moreira, Virginia Natali</p>	<p>04/08/2020 - 03:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0412-OF, de fecha 15 de junio de 2020, la Mgs. Mónica García, Subsecretaria de Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos para el proyecto "Encuesta de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018" de CUP No. 31210000.0000.382709 a fin de cubrir la obligación pendiente de pago al proveedor COMSUPPLIES S.A por "Adquisición de Suministros de Impresión".</p> <p>La Dirección Financiera ha gestionado el trámite respectivo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, obteniendo que el ente rector de las finanzas públicas proceda a crear en el presupuesto institucional a nivel nacional la estructura programática No. 55 00 027 001.</p> <p>Con este dictamen se realizó la actualización al cronograma valorado de ENSANUT y la Dirección Financiero creo la estructura para que dicho rubro sea incluido en el presupuesto de la Coordinación Zonal Litoral para su pago en el mes de julio del presente año.</p>		
<p>PERIODO: DICIEMBRE 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se publicaron los resultados de ENSANUT el 28 de diciembre de 2019. (HITO 15 CUMPLIDO) 2.- En cuanto al cumplimiento del HITO 16, corresponde al proceso de evaluación de la operación estadística que es un proceso institucional interno y no compromete presupuestos adicionales, se trabajará con personal de la institución, este HITO se cumplirá en el mes de enero de 2020 sin comprometer el cierre del proyecto. (HITO 16 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	16/01/2020 - 12:56 PM
<p>PERIODO: NOVIEMBRE 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se elaboraron los productos mínimos preliminares (HITO 14 CUMPLIDO) 1.- Los productos de publicación se revisarán y aprobarán durante la semana del 24 de diciembre (HITO 15 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/01/2020 - 08:24 AM
<p>PERIODO: OCTUBRE 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se cuenta con una base de datos validada (HITO 13 CUMPLIDO) 2.- Por retrasos inherentes al proceso de validación aún no se culmina el proceso de elaboración de productos mínimos (HITO 14 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/12/2019 - 11:15 AM
<p>PERIODO: SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se están ejecutando actividades de validación de la Encuesta para dejar las bases de datos limpias en su totalidad, sin embargo por retrasos inherentes al proceso de contratación aún no se culmina el proceso de verificación de algunas boletas como control adicional de calidad, por ende aún no se cierra el proceso de validación (HITO 13 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	22/10/2019 - 12:39 PM
<p>PERIODO: AGOSTO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta sin embargo por sugerencia del experto en Encuestas de Demografía y Salud Jon Pederson se verificará información de algunas boletas como control adicional de calidad, por ende aún no se cierra el proceso de validación y el riesgo asociado se cumplió (HITO 13 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	03/10/2019 - 12:19 PM
<p>PERIODO: JULIO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta (HITO 13 ASOCIADO) 2.- Se finalizaron los procesos de recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente (HITO 12 CUMPLIDO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	03/09/2019 - 05:33 PM
<p>PERIODO: JUNIO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta (HITO 13 ASOCIADO) 2.- Se iniciaron los procesos de recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente (HITO 12 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/08/2019 - 03:10 PM
<p>PERIODO: MAYO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se continuó realizando las actividades de validación de la Encuesta</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	03/07/2019 - 03:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Se capacitó al personal que trabajará a partir del mes de junio en la recolección, crítica y digitación de la información de la fase pendiente		
<p>PERÍODO: ABRIL 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se retomaron las actividades de validación de la Encuesta y se inició la ejecución presupuestaria 2.- Se Autoriza mediante memorando INEC-INEC-2019-0436-M la reestructuración de HITOS y Fecha Fin del proyecto</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	04/06/2019 - 09:43 AM
<p>PERÍODO: MARZO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Se cuenta con el incremento de techo presupuestario, se está gestionando la reestructuración de HITOS y cambio de fecha fin</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/05/2019 - 03:01 PM
<p>PERÍODO: FEBRERO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Las actividades pendientes no han podido ser ejecutadas, puesto que aún no se cuenta con el financiamiento para el operativo restante</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:02 PM
<p>PERÍODO: ENERO 2019</p> <p>Descripción: 1.- Las actividades pendientes no han sido posible de ejecutarse, puesto que aún no se cuenta con el financiamiento para el operativo restante</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:02 PM
<p>PERÍODO: DICIEMBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Procesos administrativos finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido) 8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido) 9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviembre (HITO 9 en proceso) 10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso) 11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso) 12. Crítica, codificación y digitación en proceso (HITO 12 en proceso) 13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:01 PM
<p>PERÍODO: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 cumplido) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido) 8. Se capacitó al personal en el sistema de ingresos ENSANUT Encuesta (HITO 8 cumplido) 9. Inició el levantamiento de información el 15 de noviembre (HITO 9 en proceso) 10. Resumen de cobertura de los primeros periodos (HITO 10 en proceso) 11. Muestra seleccionada para la mayoría de las provincias (HITO 11 en proceso) 12. Crítica, codificación y digitación (HITO 12 en proceso) 13. Validación en proceso (HITO 13 en proceso)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>PERIODO: OCTUBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) 6. Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 en proceso) 7. Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:00 PM
<p>PERIODO: SEPTIEMBRE 2018</p> <p>Descripción: 1.- Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) 2.- Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) 3. Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) 4. Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) 5. Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	01/04/2019 - 04:00 PM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	HITO 1:DEFINICIÓN- Formularios aprobados	4-Inicio de Trabajo	04/07/2018		04/07/2018		Sí	2.0
2	HITO 2: PLANEACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2018		31/07/2018		Sí	5.0
3	HITO 3: DEFINICIÓN- Manuales aprobados	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		28/09/2018		Sí	2.0
4	HITO 4: DEFINICIÓN- Mallas de validación aprobadas	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		31/08/2018		Sí	2.0
5	HITO 5: EJECUCIÓN- Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados	4-Inicio de Trabajo	01/09/2018		03/09/2018		Sí	25.0
6	HITO 6: DEFINICIÓN- Sistema de producción probado	4-Inicio de Trabajo	30/09/2018		29/10/2018		Sí	2.0
7	HITO 7: EJECUCIÓN- Capacitación del personal seleccionado	4-Inicio de Trabajo	27/10/2018		27/10/2018		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	HITO 8: DEFINICIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales	4-Inicio de Trabajo	30/10/2018		30/10/2018		Sí	2.0
9	HITO 9: EJECUCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta	4-Inicio de Trabajo	01/11/2018		05/11/2018		Sí	10.0
10	HITO 10: EJECUCIÓN - Reporte de cobertura elaborado	4-Inicio de Trabajo	30/11/2018		30/11/2018		Sí	15.0
11	HITO 11: EJECUCIÓN - Muestra seleccionada	4-Inicio de Trabajo	28/12/2018		28/11/2018		Sí	5.0
12	HITO 12: EJECUCIÓN - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada	4-Inicio de Trabajo	17/07/2019		17/07/2019		Sí	10.0
13	HITO 13: EJECUCIÓN- Validación y consistencia de la información	4-Inicio de Trabajo	30/08/2019		31/10/2019		Sí	6.0
14	HITO 14: EJECUCIÓN - Productos mínimos elaborados	9-Entregables Formales	31/10/2019		29/11/2019		Sí	3.0
15	HITO 15: EJECUCIÓN - Productos publicados	9-Entregables Formales	29/11/2019		28/12/2019		Sí	3.0
16	HITO 16: CIERRE - Productos y procesos evaluados	9-Entregables Formales	20/12/2019		28/12/2019		Sí	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,867,361.10 **
Costo Total:	6,118,016.39
Total Devengado:	5,867,361.10
% Costo Total Devengado:	95.90 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 95.90 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,331,224.56	562.46	0.00	2,331,787.02
Ppto. Externo Planeado	5,466,304.76	0.00	0.00	5,466,304.76
Ppto. Aprobado Inicial	7,114,920.60	0.00	0.00	7,114,920.60
Ppto. Codificado	7,651,955.47	562.46	0.00	7,652,517.93
Ppto. Comprometido	6,104,072.25	0.00	0.00	6,104,072.25
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	7,585,683.81	562.46	0.00	7,586,246.27
Ppto. Devengado	5,866,798.64	562.46	0.00	5,867,361.10
Pagado Real	4,936,759.53	0.00	0.00	4,936,759.53
Estimado a fin de año	* 5,866,798.64	0.00	0.00	5,866,798.64
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,718,885.17	562.46	0.00	1,719,447.63
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 77.34 %	100.00 %	0.00 %	77.34 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	562.46	562.46	562.46	562.46	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00		562.46				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	562.46	562.46					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ENSANUT 2018	Acta_de_constitución_ENSANUT_2018.pdf	21/12/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 1.- DEFINICIÓN - Formularios aprobados	A1.rar	09/05/2019
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- EJECUCIÓN - Reporte de cobertura elaborado	B1.rar	15/05/2019
4	ASOCIACIÓN HITO 11.- EJECUCIÓN -Muestra seleccionada	B2.rar	15/05/2019
5	ASOCIACIÓN HITO 12.- EJECUCIÓN - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada	B3.rar	29/07/2019
6	ASOCIACIÓN HITO 13.- EJECUCIÓN- Validación y consistencia de la información	B4.rar	06/11/2019
7	ASOCIACIÓN HITO 14.- EJECUCIÓN- Productos mínimos elaborados	B5.rar	05/12/2019
8	ASOCIACIÓN HITO 15.- EJECUCIÓN - Productos publicados	B6.rar	11/01/2020
9	ASOCIACIÓN HITO 16.- CIERRE- Productos y procesos evaluados	B7.rar	09/03/2020
10	ASOCIACIÓN HITO 2.- PLANEACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado	A2.rar	09/05/2019
11	ASOCIACIÓN HITO 3.- DEFINICIÓN- Manuales aprobados	A3.7z	09/05/2019
12	ASOCIACIÓN HITO 4.- DEFINICIÓN- Mallas de validación aprobadas	A4.rar	09/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACIÓN HITO 5.- EJECUCIÓN- Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados	A5.rar	09/05/2019
14	ASOCIACIÓN HITO 6.- DEFINICIÓN- Sistema de producción probado	A6.rar	09/05/2019
15	ASOCIACIÓN HITO 7.- EJECUCIÓN- Capacitación del personal seleccionado	A7.rar	15/05/2019
16	ASOCIACIÓN HITO 8.- DEFINICIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales	A8.rar	15/05/2019
17	ASOCIACIÓN HITO 9.- EJECUCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta	A9.rar	15/05/2019
18	ASOCIACIÓN PRESUPUESTO 2020 (Memorando de Inclusión de presupuesto 2020 para pago de arrastre 2019)	INEC-DIPLA-2020-0527-M.pdf	04/08/2020
19	CIERRE DE PROBLEMA 001	P1.rar	06/11/2019
20	CIERRE DE RIESGO 001	R1.rar	29/07/2019
21	CIERRE DE RIESGO 002	R2.rar	06/09/2019
22	CIERRE DE RIESGO 003	R3.rar	22/10/2019
23	CIERRE DE RIESGO 004	R4.rar	05/12/2019
24	CIERRE INDICADOR 2	I2.rar	13/01/2020
25	CIERRE INDICADOR 3	I3.rar	13/01/2020
26	CIERRE INDICADOR 4	I4.rar	13/01/2020
27	EXP RESTHITOS ENSANUT 2018	Reestructura_y_modificación_de_fecha_fin_ENSANUT_GPR.pdf	02/02/2019
28	EXP RESTHITOS ENSANUT 2019	Reestructura_de_hitos_y_fecha_fin_ensanut_042019.rar	04/07/2019
29	EXPEDIENTE DE CIERRE GPR ENSANUT PARTE_1	Exp_cierre_GPR_ENSANUT.part1.rar	22/01/2021
30	EXPEDIENTE DE CIERRE GPR ENSANUT PARTE_1_2021	Exp_cierre_GPR_ENSANUT_.part1.rar	07/10/2021
31	EXPEDIENTE DE CIERRE GPR ENSANUT PARTE_2	Exp_cierre_GPR_ENSANUT.part2.rar	22/01/2021
32	EXPEDIENTE DE CIERRE GPR ENSANUT PARTE_2_2021	Exp_cierre_GPR_ENSANUT_.part2.rar	07/10/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Artieda Espinoza, Carmita Elizabeth	Técnica	Miembro de equipo	carmita_artieda@inec.gob.ec	
Herrera Jacome, Margoth Rocio	Técnica	Miembro de equipo	margoth_herrera@inec.gob.ec	
Hidalgo, Norma	Técnica	Miembro de equipo	norma_hidalgo@ine.gob.ec	
Mendoza Moreira, Virginia Natali	Líder de proyecto	Analista de Estadísticas Sociodemográficas	natali_mendoza@inec.gob.ec	
