

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K007 Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

Líder del Proyecto:	Rivas Villalba, Edwin Patricio (Patricio_Rivas@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382902	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,336,787.50
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	04/09/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/11/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Rivas Villalba, Edwin Patricio	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2021

DATOS GENERALES

Descripción

La Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, es una operación estadística, que proporciona información para la evaluación y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A partir de EPSPND, se garantiza la sostenibilidad y comparabilidad de información con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, que antes se utilizaba como instrumento de monitoreo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

Productos:

Los productos que se entregarán al finalizar el proyecto, permitirán monitorear los 33 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo:

- Presentación de Resultados
- Base de datos
- Formulario
- Sintaxis.
- Tabulados Marco conceptual vigente
- Metodología
- Informe ejecutivo

Línea base del proyecto

En los últimos diez años, debido a la frecuencia anual y población objetivo de investigación, la ENEMDU ha sido el instrumento de medición de los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, surge la necesidad de disponer una encuesta específica multitemática, diseñada para la medición de los 35 indicadores del PND; de los cuales 19 fueron considerados para el diseño; 14 se encuentran en construcción y 2 no son factibles de investigar. A partir de lo mencionado, se establece que la línea base son los 19 indicadores de diseño, con una medición actualizada en la ENEMDU de diciembre 2017.

Objetivo general:

Generar información que permita el cálculo y seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 a través de una operación estadística, alineada al modelo de producción establecido.

Objetivos específicos

- . Planificar, diseñar, construir y validar la operación estadística para la realización de la encuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021.
- . Recolectar la Información por medio de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo ESPND 2017-2022.

Beneficios Cualitativos

- La información estadística a partir de la EPSPND, constituye el principal insumo para el monitoreo y evaluación de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de perfiles de la población: sociodemográfico, económico y social, permitirá integrar información básica, relevante y necesaria, para los procesos de planificación y toma de decisiones de los actores de política pública.

- Al ser un proyecto de inversión pública y por la naturaleza de actuar del INEC, que es producir, analizar y difundir información estadística oficial y oportuna. El proyecto genera insumos que son utilizados por los encargados de generar políticas encaminadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

Beneficios Cualitativos

- Generar indicadores e información actualizada de temas de educación, vivienda hogar, calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, entre otros. A fin de garantizar el seguimiento y evaluación a los múltiples objetivos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios que utilizaran la información son las siguientes instituciones:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL)
- Ministerio del interior
- Fiscalía General del Estado
- Consejo de la Judicatura
- Población Estudiantil

Las mismas que se beneficiaran las siguientes temáticas:

- Educación, Datos de la Vivienda y El Hogar, TICS, Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Corrupción y transparencia.
- Educación
- Datos de la Vivienda y El Hogar
- TICS
- Seguridad Ciudadana
- Seguridad Ciudadana
- Corrupción y Transparencia

Restricciones

No disponer de capital humano especializado en encuestas, para ejecutar el proyecto.

No contar a tiempo con una marco de muestreo actualizado, para la selección de las viviendas de la encuesta.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 95.56 %

Fecha de Inicio: 04/09/2018

Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

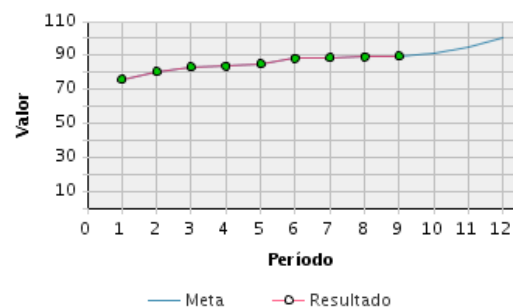

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	76 %	80 %	83 %	84 %	85 %	88 %	89 %	89 %	90 %	91 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	76 %	80 %	83 %	84 %	85 %	88 %	89 %	89 %	90 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO OCTUBRE 2021	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/11/2021 - 02:19 PM
Descripción		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0456-M, de fecha 06 de octubre de 2021, la Dirección Ejecutiva en base a la recomendación emitida en el Informe de Avance de Resultados No. SNP-SGYSI-DSI-0031, elaborado por la Subsecretaría de Gestión y Seguimiento a la Implementación de la Secretaría Nacional de Planificación, sobre la negación de la solicitud de actualización del dictamen de prioridad del proyecto, solicita al INEC proceder con el proceso de baja del mismo. Por la antes mencionado, el equipo técnico elaboró el informe técnico sobre las acciones y recursos necesarios para iniciar el proceso de baja del proyecto. Además, se efectúan las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de baja del proyecto, conforme a la normativa establecida por la Secretaría Nacional de Planificación.		
PERIODO SEPTIEMBRE 2021 Descripción En este mes se elaboró el documento correspondiente al encuesta de satisfacción a usuarios de la ESPND cumpliendo con el Híto 108. Definición: Definición: Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborada 2021	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/11/2021 - 01:53 PM
PERIODO AGOSTO 2021 Descripción En este mes se elaboró el documento correspondiente al Diccionario de Variables de la ESPND cumpliendo con el Híto 107. Definición: Diccionario de variables diseñado 2021.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	07/10/2021 - 10:31 AM
PERIODO JULIO 2021 Descripción En este mes se elaboró el documento correspondiente al plan de acción con oportunidades de mejora de la ESPND cumpliendo con el Híto 106. Cierre: Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado 2021	Rivas Villalba, Edwin Patricio	27/08/2021 - 03:25 PM
PERIODO JUNIO 2021 Descripción En este mes se elaboró el informe de evaluación cumpliendo con el Híto 100. Cierre: Informe de evaluación elaborado 2020. Se elaboro la Matriz de resultados de control de calidad cumpliendo con el Hito 101. Cierre: Matriz de resultados de indicadores de calidad/ controles de calidad elaborado 2021. La estrategia de comunicación y evaluación de satisfacción de usuarios fue diseñada cumpliendo con el Hito 102. La estrategia de comunicación y evaluación de satisfacción de usuarios fue diseñada. También la metodología de prueba piloto fue elaborada cumpliendo con el Hito 103. Definición: Metodología de prueba piloto elaborada 2021 Las encuestas de satisfacción de usuarios fueron elaboradas cumpliendo con el Hito 104. Ejecución: Encuestas de satisfacción de usuarios elaborado 2021. Y Adicionalmente Los medios de difusión fueron activados cumpliendo con el Hito 105. Ejecución: Medios de difusión activados 2021.	Rivas Villalba, Edwin Patricio	05/08/2021 - 08:09 AM
PERIODO MAYO 2021 Descripción HITO ASOCIADO 97. Planeación: Se cuenta con la ficha metodológica de la operación estadística elaborada 2021 HITO ASOCIADO 98. Planeación: Se cuenta con el documento de Historia de la operación estadística elaborado 2021 HITO ASOCIADO 99. Planeación: Se cuenta con la serie histórica de indicadores de seguimiento al PND elaborada 2021	Herrera Cruz, Lisseth Alexandra	02/06/2021 - 07:43 PM
PERIODO ABRIL 2021 Descripción HITO CUMPLIDO 96. Cierre: Se cuenta con los formularios físicos archivados en almacenes zonales (respaldos de formularios digitales en pdf) 2020	Herrera Cruz, Lisseth Alexandra	02/06/2021 - 02:51 PM
PERIODO MARZO 2021 Descripción	Herrera Cruz, Lisseth Alexandra	07/04/2021 - 11:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
HITO ASOCIADO 91. Ejecución: Se cuenta con el documento de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados 2020 elaborado. HITO ASOCIADO 92. Ejecución: Se cuenta con los productos mínimos 2020 en formato (.zip) recopilados para difundir en la página web del INEC. HITO ASOCIADO 93. Ejecución: Se cuenta con los productos mínimos revisados y aprobados por CGTPE y DIREJ. HITO ASOCIADO 94. Ejecución: Se cuenta con la aprobación de carga de productos en el RIBD para la publicación de resultados de la ESPND 2020. HITO ASOCIADO 95. Ejecución: Se informa a los usuarios sobre la disponibilidad de la información de los resultados obtenidos por la ESPND 2020.		
PERIODO FEBRERO 2021 Descripción HITO ASOCIADO 82: Ejecución: Se cuenta con la base de datos con factores de expansión consolidada 2020 HITO ASOCIADO 83: Cierre: Se cuenta con la matriz de indicadores de calidad para la OE elaborado 2021 HITO ASOCIADO 84: Ejecución: Se cuenta con el check list para verificar el cumplimiento de los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial elaborado 2020 HITO ASOCIADO 85: Ejecución: Se cuenta con el plan de tabulados elaborado 2020 HITO ASOCIADO 86: Ejecución: Se cuenta con la presentación de principales resultados elaborado 2020 HITO ASOCIADO 87: Ejecución: Se cuenta con los productos estadísticos compilados 2020 HITO ASOCIADO 88: Ejecución: Se cuenta con los productos mínimos consolidados para publicar 2020 HITO ASOCIADO 89: Planeación: Se cuenta con la matriz de identificación de usuarios elaborado 2021 HITO ASOCIADO 90: Planeación: Se cuenta con el memorando de inclusión de información en operaciones estadísticas elaborado 2021	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	05/03/2021 - 08:22 AM
PERIODO ENERO 2021 Descripción HITO ASOCIADO 80: Ejecución: Se cuenta con la Base de datos con identificadores consolidada 2020. HITO ASOCIADO 81: Planeación: Se cuenta con el Plan de dirección de proyecto ESPND 2021 elaborado y aprobado por la Dirección Ejecutiva	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/03/2021 - 08:07 AM
PERIODO DICIEMBRE 2020 Descripción HITO ASOCIADO 70: Definición.- Manual del encuestador y supervisor elaborado. HITO ASOCIADO 71: Ejecución.- Matriz de control de cobertura elaborada. HITO ASOCIADO 72: Definición.- Manual del sistema de ingreso de información elaborado. HITO ASOCIADO 73: Definición.- Manual de crítica, codificación y validación elaborado. HITO ASOCIADO 74: Ejecución.- Base de datos macro consolidada. HITO ASOCIADO 75: Ejecución.- Base de datos micro consolidada. HITO ASOCIADO 76: Ejecución.- Base de datos micro validada. HITO ASOCIADO 77: Ejecución.- Presentación de cobertura elaborada. HITO ASOCIADO 78: Definición.- Metodología de prueba piloto elaborada. HITO ASOCIADO 79: Definición.- Plan de inconsistencias elaborado.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/01/2021 - 10:47 AM
PERIODO NOVIEMBRE 2020 Descripción HITO ASOCIADO 63: Ejecución.- Correo de confirmación de carga de muestra seleccionada en el sistema de digitación HITO ASOCIADO 64: Definición .- Informe de prueba piloto elaborado HITO ASOCIADO 65: Ejecución.- Plan de recolección elaborado HITO ASOCIADO 66: Definición .- Sistema informático entregado HITO ASOCIADO 67: Ejecución .- Muestra georreferenciada y revisada HITO ASOCIADO 68: Definición .- Formulario de recolección de información diseñado HITO ASOCIADO 69: Definición .- Manual de procesos y flujos de trabajo que detalle todas las fases del MPE elaborado	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/01/2021 - 08:42 PM
PERIODO OCTUBRE 2020 Descripción HITO ASOCIADO 61: Definición .- Sintaxis para la selección de la muestra elaborada. HITO ASOCIADO 62: Definición .- Formato para generación de mapas, planos, croquis elaborado.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/12/2020 - 12:45 PM
PERIODO SEPTIEMBRE 2020 Descripción HITO ASOCIADO 60: Definición.- Encuesta de satisfacción a usuarios elaborado.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	02/10/2020 - 09:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO AGOSTO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 59: Definición.- Diccionario de variables de la OE elaborado.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/09/2020 - 01:31 PM
PERIODO JULIO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 58: Cierre.- Se cuenta con el plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/08/2020 - 09:05 AM
PERIODO JUNIO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 52: Cierre.- Se cuenta con el reporte de indicadores de calidad de la ESPND elaborado HITO ASOCIADO 53: Cierre.- Se cuenta con el Informe de evaluación de los indicadores de calidad elaborado HITO ASOCIADO 54: Definición.- Se cuenta con el Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado. HITO ASOCIADO 55: Definición.- Se cuenta con los productos estadísticos diseñados, formularios ESPND 1 y 2 HITO ASOCIADO 56: Ejecución.- Se cuenta con el registro de respuesta a los requerimientos de información de usuarios HITO ASOCIADO 57: Ejecución.- Se cuenta con los medios de difusión de la ESPND habilitados	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/07/2020 - 11:49 AM
PERIODO: MAYO 2020 HITO ASOCIADO 49: Planeación.- Se cuenta con el documento de comparabilidad entre la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y ENEMDU elaborado. HITO ASOCIADO 50: Planeación.- Se cuenta con el documento metodológico de la operación estadística ESPND 2020 elaborado. HITO ASOCIADO 51: Planeación.- Se cuenta con el Plan de Dirección de Proyecto ESPND 2020 elaborado y aprobado con memo Nro. INEC-INEC-2019-1728-M	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	05/06/2020 - 12:47 PM
PERIODO: ABRIL 2020 Descripción HITO ASOCIADO 48: Cierre .- Se archivaron los formularios físicos.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/05/2020 - 03:38 PM
PERIODO: MARZO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 43: Ejecución.- Se cuenta con los productos mínimos de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo finalizados. HITO ASOCIADO 44: Ejecución.- Se cuenta con el documento elaborado de análisis de consistencia y coherencia de resultados. HITO ASOCIADO 45: Ejecución.- Se enviaron los productos mínimos por correo electrónico para aprobación. HITO ASOCIADO 46: Ejecución.- Productos mínimos cargados en el Repositorios Institucional de Bases de Datos, listos para publicar. HITO ASOCIADO 47: Ejecución.- Comunicación de disponibilidad de información de la Encuesta de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo en la página web institucional.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/04/2020 - 04:57 PM
PERIODO: FEBRERO 2020 Descripción HITO ASOCIADO 34 Ejecución.- Se elaboró el plan de muestreo. HITO ASOCIADO 35 Cierre.- Se elaboró la matriz de indicadores de calidad para la ESPND. HITO ASOCIADO 36 Ejecución.- Se elaboró el Boletín Técnico. HITO ASOCIADO 37 Ejecución.- Se elaboró el documento de acuerdo de confidencial HITO ASOCIADO 38 Ejecución.- Se elaboró el plan de tabulados. HITO ASOCIADO 39 Ejecución.- Se elaboraron los productos estadísticos para publicar HITO ASOCIADO 40 Ejecución.- Se consolidaron los productos mínimos HITO ASOCIADO 41 Planeación.- Se elaboró el documento de continuidad de la operación estadística. HITO ASOCIADO 42 Planeación.- Se elaboró la matriz de identificación de usuarios.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/03/2020 - 11:29 AM
PERIODO: ENERO 2020 Descripción HITO CUMPLIDO 32 Ejecución.- Se descargo y generó las variables auxiliares en la base de datos ESPND HITO CUMPLIDO 33 Planeación .- Se alcanzó la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto ESPND 2020	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	07/02/2020 - 10:42 AM
PERIODO: DICIEMBRE 2019 Descripción:	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 04:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
HITO CUMPLIDO 30 EJECUCIÓN: Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) HITO CUMPLIDO 31 PLANEACIÓN: Se diseño Instrumentos de análisis y procesamiento		
PERIODO: NOVIEMBRE 2019 Descripción: ANTEPROYECTO: Aprobación del Plan de Proyecto de la ESPND. EJECUCIÓN: Materiales necesarios y personal capacitado para ejecución del operativo de campo	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 09:21 AM
PERIODO: OCTUBRE 2019 Descripción: EJECUCIÓN : Se probó el sistema INFOCAPT y formulario ESPND 2019	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2020 - 09:21 AM
SEPTIEMBRE 2019.- 22 EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable 26 PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/10/2019 - 02:28 PM
AGOSTO 2019.- PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/08/2019 - 08:26 AM
JULIO 2019.- PLANEACIÓN : Construir formularios para la recolección, manuales, presentaciones y plan de inconsistencias.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
JUNIO 2019 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
MAYO 2019.- PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:16 AM
ABRIL 2019 PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	04/07/2019 - 10:14 AM
PERIODO MARZO -2019 16.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito cumplido 16).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	06/05/2019 - 10:30 AM
PERIODO FEBRERO -2019 15.- Se elaboró la ficha metodológica de la operación estadística (Hito 15).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:44 PM
PERIODO ENERO -2019 14.-Se definieron los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ESPND (Hito 14).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	18/03/2019 - 04:04 PM
PERIODO: DICIEMBRE 2018 12.- Se elaboró Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados (HITO 12) 13.- Se recolectó Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc. (HITO 13)	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	11/02/2019 - 08:43 AM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:34 PM
PERIODO: NOVIEMBRE 2018 8.- Se elaboró el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada. 9.- Se capacitó al personal aspirante y posterior selección de encuestadores, supervisores , y revisores de control de calidad.	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	03/01/2019 - 02:33 PM
PERIODO: OCTUBRE 2018 5.- Se elaboraron los informes de los resultados de las pruebas piloto del formulario ESPND. (HITO CUMPLIDO 5) 6.- Se diseñó los acuerdos de confidencialidad y autenticación. (HITO CUMPLIDO 6) 7.- Se actualizó el material cartográfico que se utilizará en el proyecto ESPND. (HITO CUMPLIDO 7)		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: 1.- Se elaboró el informe de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente ENEMDU. (HITO CUMPLIDO 1) 2.- Se elaboró el documento habilitante aprobado por el director ejecutivo, cronograma de trabajo, el presupuesto para el año 2018 (HITO CUMPLIDO 2) 3.- Se diseñó el formulario y el manual de capacitación del encuestador (HITO CUMPLIDO 4) 4. Se identificó los dos clasificadores que se utilizaran dentro del proyecto EPSPND y se diseñó la malla de validación (HITO CUMPLIDO 5).	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	14/11/2018 - 01:44 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN : Plan de proyecto de la ESPND aprobado.	9-Entregables Formales	04/09/2018		04/09/2018		Sí	1.92
2	PLANEACIÓN : Indicadores del plan nacional de desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	07/09/2018		07/09/2018		Sí	1.92
3	PLANEACIÓN : Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.92
4	PLANEACIÓN : Instrumentos de análisis y procesamiento diseñados	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.92
5	EJECUCIÓN : Prueba piloto ejecutada	5-Entregables Intermedios	12/10/2018		12/10/2018		Sí	1.92
6	EJECUCIÓN:Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad construidos	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	1.92
7	EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.92
8	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	5-Entregables Intermedios	06/11/2018		06/11/2018		Sí	1.92
9	EJECUCIÓN:Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación construidos	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	1.92
10	EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.92
11	EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	9-Entregables Formales	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.92

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	PLANEACIÓN: Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	1.92
13	CIERRE: Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) recolectada	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.96
14	PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/01/2019		30/01/2019		Sí	1.39
15	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.39
16	PLANEACIÓN : Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	5-Entregables Intermedios	30/03/2019		30/03/2019		Sí	1.39
17	PLANEACIÓN : Elaborar Documento Metodológico	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.39
18	PLANEACIÓN : Elaborar Glosario de Términos	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	1.39
19	EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.39
20	PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación co	5-Entregables Intermedios	30/07/2019		30/07/2019		Sí	1.39
21	PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.39
22	EJECUCIÓN : Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.39
23	EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.39
24	EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.39
25	PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.39
26	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.39
27	EJECUCIÓN : Probar Sistema INFOCAPT y formulario	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		30/10/2019		Sí	1.39
28	ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSPND.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.39
29	EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.39
30	EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.39
31	PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.37

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	Ejecución.- Base de datos consolidada	5-Entregables Intermedios	10/01/2020		10/01/2020		Sí	0.52
33	Planeación.- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	5-Entregables Intermedios	20/01/2020		20/01/2020		Sí	0.52
34	Ejecución.- Plan de muestreo elaborado.	5-Entregables Intermedios	03/02/2020		03/02/2020		Sí	0.52
35	Cierre.- Matriz de indicadores de calidad para la OE elaborada	5-Entregables Intermedios	27/02/2020		27/02/2020		Sí	0.52
36	Ejecución.- Boletín Técnico elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
37	Ejecución.- Check list de los procedimientos de control y acceso a la información confidencial elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
38	Ejecución.- Plan de tabulados elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
39	Ejecución.- Productos estadísticos compilados para el análisis .	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
40	Ejecución.- Productos mínimos consolidados listos para publicar.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
41	Planeación.- Documento de continuidad de la operación estadística presentado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
42	Planeación.- Matriz de identificación de usuarios elaborada	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.52
43	Ejecución.- Productos mínimos publicados.	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.52
44	Ejecución.- Documento de análisis de consistencia y coherencia de resultados elaborado	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.52
45	Ejecución.- Productos mínimos aprobados.	5-Entregables Intermedios	24/03/2020		24/03/2020		Sí	0.52
46	Ejecución.- Reporte de aprobación de productos para la publicación elaborado	5-Entregables Intermedios	27/03/2020		27/03/2020		Sí	0.52
47	Ejecución.- Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.52
48	Cierre.- Formularios físicos archivados	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.52
49	Planeación.- Documento de comparabilidad elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.52
50	Planeación.- Documento metodológico de la OE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.52
51	Planeación.- Plan de Dirección de Proyecto elaborado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/05/2020		30/05/2020		Sí	0.52
52	Cierre.- Documento de resultados de indicadores de calidad elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52
53	Cierre.- Informe de evaluación elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	Definición.- Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52
55	Definición.- Productos estadísticos diseñados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52
56	Ejecución.- Registros de respuesta a requerimientos de usuarios consolidados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52
57	Ejecución.- Medios de difusión habilitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.52
58	Cierre.- Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado .	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.52
59	Definición .- Diccionario de variables de la OE elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2020		30/08/2020		Sí	0.52
60	Definición.- Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.52
61	Definición .- Sintaxis para la selección de la muestra elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020		30/10/2020		Sí	0.52
62	Definición .- Formato para generación de mapas, planos, croquis elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020		30/10/2020		Sí	0.52
63	Ejecución.- Correo de confirmación de carga de muestra seleccionada en el sistema de digitación	5-Entregables Intermedios	23/11/2020		23/11/2020		Sí	0.52
64	Definición .- Informe de prueba piloto elaborado	5-Entregables Intermedios	25/11/2020		25/11/2020		Sí	0.52
65	Ejecución.- Plan de recolección elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2020		27/11/2020		Sí	0.52
66	Definición .- Sistema informático entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2020		28/11/2020		Sí	0.52
67	Ejecución .- Muestra georreferenciada y revisada	5-Entregables Intermedios	28/11/2020		28/11/2020		Sí	0.52
68	Definición .- Formulario de recolección de información diseñado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.52
69	Definición .- Manual de procesos y flujos de trabajo que detalle todas las fases del MPE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.52
70	Definición.- Manual de supervisor y encuestador y demás manuales elaborados	5-Entregables Intermedios	28/12/2020		28/12/2020		Sí	0.52
71	Ejecución.- Matriz de control de cobertura diseñada	5-Entregables Intermedios	28/12/2020		28/12/2020		Sí	0.52
72	Definición.- Manuales técnicos: de instalación, configuración y administración del sistema y manual de usuarios elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52
73	Definición.- Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para el procesamiento, crítica, codificación, validación, imputación, integración	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y tratamiento de errores elaborados.							
74	Ejecución.- Base de datos macro consolidada y validada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52
75	Ejecución.- Base de datos micro consolidada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52
76	Ejecución.- Base de datos micro validada	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52
77	Ejecución.- Informe final de control de cobertura elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.52
78	Definición.- Metodología de prueba piloto diseñada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.52
79	Definición.- Plan de inconsistencias elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.56
80	Ejecución: Base de datos con identificadores consolidada 2020.	5-Entregables Intermedios	10/01/2021		10/01/2021		Sí	0.57
81	Planeación: Plan de dirección de proyecto elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	20/01/2021		20/01/2021		Sí	0.45
82	Ejecución: Base de datos con factores de expansión consolidada 2020	5-Entregables Intermedios	03/02/2021		03/02/2021		Sí	0.57
83	Cierre: Matriz de indicadores de calidad para la OE elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	27/02/2021		27/02/2021		Sí	0.45
84	Ejecución: Check list para verificar el cumplimiento de los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial elaborado 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.23
85	Ejecución: Plan de tabulados elaborado 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.23
86	Ejecución: Presentación de principales resultados elaborado 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.57
87	Ejecución: Productos estadísticos compilados 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.57
88	Ejecución: Productos mínimos consolidados para publicar 2020	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.57
89	Planeación: Matriz de identificación de usuarios elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.57
90	Planeación: Memorando de inclusión de información en operaciones estadísticas elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.57
91	Ejecución: Documentación de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados elaborado 2020	5-Entregables Intermedios	24/03/2021		24/03/2021		Sí	0.57
92	Ejecución: Productos a difundir recopilados (.zip) 2020	5-Entregables Intermedios	24/03/2021		24/03/2021		Sí	0.57
93	Ejecución: Productos mínimos revisados y aprobados 2020	5-Entregables Intermedios	24/03/2021		24/03/2021		Sí	0.57
94	Ejecución: Reporte en donde se evidencia la aprobación de todos los productos	5-Entregables Intermedios	27/03/2021		27/03/2021		Sí	0.57

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para la publicación (correos electrónicos RIBD) enviados 2020							
95	Ejecución: Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información 2020	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.57
96	Cierre: Formularios físicos archivados (respaldos de formularios digitales en pdf) 2020	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.45
97	Planeación: Ficha metodológica de la OE elaborada 2021	5-Entregables Intermedios	30/05/2021		30/05/2021		Sí	0.45
98	Planeación: Historia de la OE elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	30/05/2021		30/05/2021		Sí	0.45
99	Planeación: Serie histórica de indicadores de seguimiento al PND elaborada 2021	5-Entregables Intermedios	30/05/2021		30/05/2021		Sí	0.45
100	Cierre: Informe de evaluación elaborado 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.57
101	Cierre: Matriz de resultados de indicadores de calidad/ controles de calidad elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.57
102	Definición: Estrategia de comunicación y evaluación de satisfacción de usuarios diseñada 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.57
103	Definición: Metodología de prueba piloto elaborada 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.57
104	Ejecución: Encuestas de satisfacción de usuarios elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.45
105	Ejecución: Medios de difusión activados 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.45
106	Cierre: Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.45
107	Definición: Diccionario de variables diseñado 2021	5-Entregables Intermedios	30/08/2021		30/08/2021		Sí	0.57
108	Definición: Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborada 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.57
109	Definición: Formatos de reportes de cobertura del sistema de ingreso diseñados 2021	5-Entregables Intermedios	30/10/2021	30/10/2021			No	0.57
110	Definición: MyC y anexos diseñados 2021	5-Entregables Intermedios	30/10/2021	30/10/2021			No	0.57
111	Ejecución: Correo de aprobación de la muestra enviado 2021	5-Entregables Intermedios	23/11/2021	23/11/2021			No	0.57
112	Definición: Informe de prueba piloto elaborado 2021 a	5-Entregables Intermedios	25/11/2021	25/11/2021			No	0.57
113	Ejecución: Plan de recolección elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	27/11/2021	27/11/2021			No	0.57

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
114	Definición: Correo de puesta en producción del sistema enviado 2021	5-Entregables Intermedios	28/11/2021	28/11/2021			No	0.57
115	Ejecución: Muestra revisada 2021	5-Entregables Intermedios	28/11/2021	28/11/2021			No	0.57
116	Definición: Cronograma de actividades de recolección diseñado 2021	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	0.57
117	Definición: Manual de procesos y flujos de trabajo que detalle todas las fases del MPE elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	0.57
118	Definición: Manual de supervisor y encuestador y demás manuales elaborados 2021	5-Entregables Intermedios	28/12/2021	28/12/2021			No	0.57
119	Ejecución: Informe de estado de situación para el inicio de la recolección elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	28/12/2021	28/12/2021			No	0.57
120	Definición: Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para el procesamiento, crítica, codificación, validación, imputación, integración y tratamiento de errores elaborados. 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.57
121	Ejecución: Base de datos de entrada consolidada 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.57
122	Ejecución: Base de datos macro consolidada 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.57
123	Ejecución: Base de datos micro consolidada 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.57
124	Ejecución: Informe de crítica elaborado 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.57
125	Definición: Plan de inconsistencias diseñados 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.57
126	Definición: Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema diseñados 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.54

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1. Número de instrumentos elaborados		100.00 %	6	6	04/09/2018	Jul-Sep
2	C2. Número de viviendas efectivas de la encuesta sobre la muestra teórica (12060 viviendas) durante el operativo		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep
3	C3. Número de inconsistencias detectadas en validación sobre el numero total de variables de la encuesta (aproximado 450 variables).		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep
4	C4. Número de productos (4 tabulados, 4 presentaciones, 4 formularios, 4 base de datos) al fin de proyecto.		100.00 %	0	0	04/09/2018	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,336,787.50 **
Costo Total:	5,916,646.53
Total Devengado:	2,950,844.21
% Costo Total Devengado:	49.87 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 49.87 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,608,466.71	631,867.88	0.00	4,240,334.59
Ppto. Externo Planeado	1,334,274.92	0.00	0.00	1,334,274.92
Ppto. Aprobado Inicial	3,133,115.06	635,216.99	0.00	3,768,332.05
Ppto. Codificado	3,119,948.60	631,867.88	0.00	3,751,816.48
Ppto. Comprometido	1,257,727.44	0.00	0.00	1,257,727.44
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	3,230,090.92	631,867.88	0.00	3,861,958.80
Ppto. Devengado	2,704,919.62	245,924.59	0.00	2,950,844.21
Pagado Real	768,907.22	0.00	0.00	768,907.22
Estimado a fin de año	* 2,704,919.62	0.00	0.00	2,704,919.62
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	525,171.30	631,867.88	0.00	1,157,039.18
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 83.74 %	38.92 %	0.00 %	76.41 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

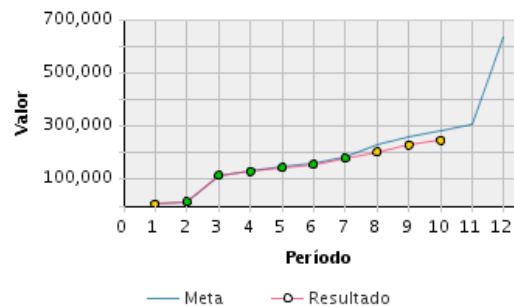

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	7,941.57	7,132.78	7,941.57	7,132.78	89.82 %	▼	1.13 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	8,483.46	7,710.32	16,425.03	14,843.10	90.37 %		2.35 %
Mar	99,238.56	99,339.01	115,663.59	114,182.11	98.72 %		18.07 %
Abr	15,911.40	15,465.46	131,574.99	129,647.57	98.54 %		20.52 %
May	14,488.90	15,382.98	146,063.89	145,030.55	99.29 %		22.95 %
Jun	12,611.78	12,274.55	158,675.67	157,305.10	99.14 %		24.90 %
Jul	27,907.67	23,142.68	186,583.34	180,447.78	96.71 %		28.56 %
Ago	46,582.68	23,179.18	233,166.02	203,626.96	87.33 %		32.23 %
Sep	27,388.86	26,476.85	260,554.88	230,103.81	88.31 %		36.42 %
Oct	24,641.72	15,820.78	285,196.60	245,924.59	86.23 %		38.92 %
Nov	23,003.14		308,199.74				
Dic	323,668.14		631,867.88				
Total	631,867.88	245,924.59					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.
17	Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 35 Matriz de indicadores de calidad para la operación estadística	D8_HITO_35.rar	03/03/2020
2	ASOCIACIÓN HITO 36 Boletín Técnico	D9_HITO_36.rar	03/03/2020
3	ASOCIACIÓN HITO 41 Documento de continuidad de la operación estadística	E5_HITO_41.rar	03/03/2020
4	ASOCIADO HITO 33 Planeación .- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	D6.rar	05/02/2020
5	HITO ASOCIADO 72: Definición.- Manual del sistema de ingreso de información elaborado.	H9_HITO_72.rar	06/01/2021
6	ASOCIACION HITO 1.- PLAN DE PROYECTO DE LA ESPND APROBADO.	A1.pdf	09/01/2019
7	ASOCIACION HITO 2.- INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ODS CON FUENTE EPSPND.	A2.pdf	09/01/2019
8	ASOCIACION HITO 3.- BASES DE DATOS, INFORMES, PRESENTACIONES Y SINTAXIS DISEÑADOS	A3.pdf	09/01/2019
9	ASOCIACION HITO 4.- INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DISEÑADOS	A4.pdf	09/01/2019
10	ASOCIACION HITO 5: PRUEBA PILOTO EJECUTADA	A5.pdf	09/01/2019
11	ASOCIACION HITO 6: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROLES DE CONFIDENCIALIDAD CONSTRUIDOS	A6.pdf	09/01/2019
12	ASOCIACION HITO 7: EJECUCIÓN: Cartografía determinada y verificada	A7.pdf	09/01/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACION HITO 8: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse cargada.	A8.pdf	09/01/2019
14	ASOCIACIÓN HITO 107: Definición: Diccionario de variables diseñado 2021	L8_HITO_107.rar	31/08/2021
15	ASOCIACIÓN HITO 108: Definición: Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborada 2021	L9_HITO_108.rar	07/10/2021
16	ASOCIACIÓN HITO 34 Plan de muestreo	D7_HITO_34.rar	03/03/2020
17	ASOCIACIÓN HITO 37 Check list de los procedimientos de control y acceso a la información confidencial	E1_HITO_37.rar	03/03/2020
18	ASOCIACIÓN HITO 38 Plan de tabulados	E2_HITO_38.rar	03/03/2020
19	ASOCIACIÓN HITO 39 Productos estadísticos compilados para el análisis.	E3_HITO_39.rar	03/03/2020
20	ASOCIACIÓN HITO 40 Productos mínimos consolidados	E4_HITO_40.rar	03/03/2020
21	ASOCIACIÓN HITO 42 Matriz de identificación de usuarios	E6_HITO_42.rar	03/03/2020
22	ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación contruidos	A9.pdf	09/01/2019
23	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 43: Ejecución.- Productos mínimos finalizados	E7_HITO_43.rar	10/07/2020
24	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 44: Ejecución.- Documento de análisis de consistencia y coherencia de resultados elaborado	E8_HITO_44.rar	10/07/2020
25	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 45: Ejecución.- Productos mínimos aprobados	E9_HITO_45.rar	10/07/2020
26	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 46: Ejecución.- Reporte de aprobación de productos para la publicación elaborado	F1_HITO_46.rar	10/07/2020
27	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 47: Ejecución.- Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información	F2_HITO_47.rar	10/07/2020
28	ASOCIACIÓN HITO ASOCIADO 48: Cierre.- Se archivaron los formularios físicos.	F3_HITO_48.rar	10/07/2020
29	ASOCIADO HITO 10 :EJECUCIÓN: Materiales disponibles y personal capacitado	B1.pdf	04/04/2019
30	ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Sistema INFOCAPT y formulario ajustados y finalizados	B2.pdf	09/01/2019
31	ASOCIADO HITO 12: EJECUCIÓN bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis diseñados	B3.pdf	09/01/2019
32	ASOCIADO HITO 13 CIERRE información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.) Recolectada.	B4.pdf	09/01/2019
33	ASOCIADO HITO 14 PLANEACIÓN : Definir los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y ODS con fuente EPSPND.	B5.pdf	11/02/2019
34	ASOCIADO HITO 15 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B6.pdf	18/03/2019
35	ASOCIADO HITO 16 PLANEACIÓN: Elaborar Ficha metodológica de la operación estadística	B7.pdf	01/04/2019
36	ASOCIADO HITO 17 PLANEACIÓN: Elaborar Documento Metodológico	B8.pdf	03/06/2019
37	ASOCIADO HITO 18 PLANEACIÓN: Elaborar Glosario de Términos	B9.pdf	03/06/2019
38	ASOCIADO HITO 19 EJECUCIÓN : Ejecutar Prueba piloto	C1.pdf	06/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
39	ASOCIADO HITO 20 PLANEACIÓN : Construir Formularios, manuales, presentaciones y mallas de validación	C2.pdf	07/08/2019
40	ASOCIADO HITO 21 PLANEACIÓN : Diseñar Manuales, formularios, Bases de datos, informes, presentaciones y sintaxis	C3.pdf	05/09/2019
41	ASOCIADO HITO 22 EJECUCIÓN: Cargar el Sistema INFOCAPT con la muestra de viviendas a investigarse	C4.pdf	07/10/2019
42	ASOCIADO HITO 23 EJECUCIÓN : Construir Estrategias de comunicación y controles de confidencialidad	C5.pdf	07/10/2019
43	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN : Verificar Cartografía	C6.pdf	07/10/2019
44	ASOCIADO HITO 25 PLANEACIÓN : Diseñar Diccionario de variable	C7.pdf	07/10/2019
45	ASOCIADO HITO 26 PLANEACIÓN: Diseñar Instrumentos de recolección (formularios y manuales).	C8.pdf	07/10/2019
46	ASOCIADO HITO 27 EJECUCIÓN: Probar Sistema INFOCAPT y formulario	C9.pdf	06/11/2019
47	ASOCIADO HITO 28 ANTEPROYECTO : Hacer aprobar el Plan de Proyecto de la EPSND.	D1.rar	04/01/2020
48	ASOCIADO HITO 29 EJECUCIÓN : Disponer de Materiales necesarios y personal capacitado	D2.rar	04/01/2020
49	ASOCIADO HITO 30 EJECUCIÓN : Recolectar Información multitemática (educación, tic, vivienda, etc.)	D3.rar	03/01/2020
50	ASOCIADO HITO 31 PLANEACIÓN : Diseñar Instrumentos de análisis y procesamiento	D4.rar	03/01/2020
51	ASOCIADO HITO 32 Ejecución.- Base de datos consolidada	D5.rar	05/02/2020
52	Ficha de re estructuración de hitos y ampliación de fecha fin 2021	Ficha_Reestructuración_de_Hitos_y_Ampliación_de_Fecha_Fin_2021.pdf	06/02/2021
53	Ficha de reestructuración de hitos y ampliación de fecha fin 2020	Ficha_Reestructuración_de_Hitos_y_Ampliación_de_Fecha_Fin_2020.pdf	04/01/2020
54	HITO ASOCIADO 106. Cierre: Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado 2021	L7_HITO_106.rar	05/08/2021
55	HITO ASOCIADO 100. Cierre: Informe de evaluación elaborado 2020	L1_HITO_100.rar	14/07/2021
56	HITO ASOCIADO 101. Cierre: Matriz de resultados de indicadores de calidad/ controles de calidad elaborado 2021	L2_HITO_101.rar	14/07/2021
57	HITO ASOCIADO 102. Definición: Estrategia de comunicación y evaluación de satisfacción de usuarios diseñada 2021	L3_HITO_102.rar	14/07/2021
58	HITO ASOCIADO 103. Definición: Metodología de prueba piloto elaborada 2021	L4_HITO_103.rar	14/07/2021
59	HITO ASOCIADO 104. Ejecución: Encuestas de satisfacción de usuarios elaborado 2021	L5_HITO_104.rar	14/07/2021
60	HITO ASOCIADO 105. Ejecución: Medios de difusión activados 2021	L6_HITO_105.rar	14/07/2021
61	HITO ASOCIADO 49: Planeación.- Documento de comparabilidad	F4_HITO_49.rar	10/07/2020
62	HITO ASOCIADO 50: Planeación.- Documento metodológico de la OE elaborado	F5_HITO_50.rar	10/07/2020
63	HITO ASOCIADO 51: Planeación.- Plan de Dirección de Proyecto elaborado	F6_HITO_51.rar	10/07/2020
64	HITO ASOCIADO 52: Cierre.- Documento de resultados de indicadores de calidad elaborado	F7_HITO_52.rar	06/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	HITO ASOCIADO 53: Cierre.- Informe de evaluación elaborado	F8_HITO_53.rar	06/07/2020
66	HITO ASOCIADO 54: Definición.- Informe de pruebas de funcionalidad, estrés (Calidad QA), y carga elaborado.	F9_HITO_54.rar	06/07/2020
67	HITO ASOCIADO 55: Definición.- Productos estadísticos diseñados	G1_HITO_55.rar	06/07/2020
68	HITO ASOCIADO 56: Ejecución.- Registros de respuesta a requerimientos de usuarios consolidados	G2_HITO_56.rar	06/07/2020
69	HITO ASOCIADO 57: Ejecución.- Medios de difusión habilitados	G3_HITO_57.rar	06/07/2020
70	HITO ASOCIADO 58: Cierre.- Plan de acción con oportunidades de mejora y fechas de ejecución elaborado.	G4_HITO_58.rar	04/08/2020
71	HITO ASOCIADO 59: Definición.- Diccionario de variables de la OE elaborado.	G5_HITO_59.rar	04/09/2020
72	HITO ASOCIADO 60: Definición.- Reporte de encuesta de satisfacción a usuarios elaborado	G6_HITO_60.rar	05/10/2020
73	HITO ASOCIADO 61 Definición . - Sintaxis para la selección de la muestra elaborada	G7_HITO_61.rar	09/11/2020
74	HITO ASOCIADO 62 Definición .- Formato para generación de mapas, planos, croquis elaborado.	G8_HITO_62.rar	05/11/2020
75	HITO ASOCIADO 63 Ejecución.- Correo de confirmación de carga de muestra seleccionada en el sistema de digitación	G9_HITO_63.rar	04/12/2020
76	HITO ASOCIADO 64 Definición .- Informe de prueba piloto elaborado	H1_HITO_64.rar	04/12/2020
77	HITO ASOCIADO 65 Ejecución.- Plan de recolección elaborado	H2_HITO_65.rar	04/12/2020
78	HITO ASOCIADO 66 Definición .- Sistema informático entregado	H3_HITO_66.rar	04/12/2020
79	HITO ASOCIADO 67 Ejecución .- Muestra georreferenciada y revisada	H4_HITO_67.rar	04/12/2020
80	HITO ASOCIADO 68 Definición .- Formulario de recolección de información diseñado	H5_HITO_68.rar	04/12/2020
81	HITO ASOCIADO 69 Definición .- Manual de procesos y flujos de trabajo que detalle todas las fases del MPE elaborado	H6_HITO_69.rar	04/12/2020
82	HITO ASOCIADO 70: Definición.- Manual del encuestador y supervisor elaborado.	H7_HITO_70.rar	06/01/2021
83	HITO ASOCIADO 71: Ejecución.- Matriz de control de cobertura elaborada	H8_HITO_71.rar	06/01/2021
84	HITO ASOCIADO 73: Definición.- Manual de crítica, codificación y validación elaborado.	I1_HITO_73.rar	06/01/2021
85	HITO ASOCIADO 74: Ejecución.- Base de datos macro consolidada.	I2_HITO_74.rar	06/01/2021
86	HITO ASOCIADO 75: Ejecución.- Base de datos micro consolidada.	I3_HITO_75.rar	06/01/2021
87	HITO ASOCIADO 76: Ejecución.- Base de datos micro validada.	I4_HITO_76.rar	06/01/2021
88	HITO ASOCIADO 77: Ejecución.- Presentación de cobertura elaborada.	I5_HITO_77.rar	06/01/2021
89	HITO ASOCIADO 78: Definición.- Metodología de prueba piloto elaborada.	I6_HITO_78.rar	06/01/2021
90	HITO ASOCIADO 79: Definición.- Plan de inconsistencias elaborado.	I7_HITO_79.rar	06/01/2021
91	HITO ASOCIADO 80: Ejecución: Base de datos con identificadores consolidada 2020.	I8_HITO_80.rar	02/02/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	HITO ASOCIADO 81 Planeación: Plan de dirección de proyecto elaborado 2021.	I9_HITO_81.rar	02/02/2021
93	HITO ASOCIADO 82 Ejecución: Base de datos con factores de expansión consolidada 2020	J1_HITO_82.rar	05/03/2021
94	HITO ASOCIADO 83 Cierre: Matriz de indicadores de calidad para la OE elaborado 2021	J2_HITO_83.rar	05/03/2021
95	HITO ASOCIADO 84 Ejecución: Check list para verificar el cumplimiento de los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial elaborado 2020	J3_HITO_84.rar	05/03/2021
96	HITO ASOCIADO 85 Ejecución: Plan de tabulados elaborado 2020	J4_HITO_85.rar	05/03/2021
97	HITO ASOCIADO 86 Ejecución: Presentación de principales resultados elaborado 2020	J5_HITO_86.rar	05/03/2021
98	HITO ASOCIADO 87 Ejecución: Productos estadísticos compilados 2020	J6_HITO_87.rar	05/03/2021
99	HITO ASOCIADO 88 Ejecución: Productos mínimos consolidados para publicar 2020	J7_HITO_88.rar	05/03/2021
100	HITO ASOCIADO 89 Planeación: Matriz de identificación de usuarios elaborado 2021	J8_HITO_89.rar	05/03/2021
101	HITO ASOCIADO 90 Planeación: Memorando de inclusión de información en operaciones estadísticas elaborado 2021	J9_HITO_90.rar	05/03/2021
102	HITO ASOCIADO 91. Ejecución: Documentación de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados elaborado 2020.	K1_HITO_91.rar	07/04/2021
103	HITO ASOCIADO 92. Ejecución: Productos a difundir recopilados (.zip) 2020.	K2_HITO_92.rar	07/04/2021
104	HITO ASOCIADO 93. Ejecución: Productos mínimos revisados y aprobados 2020	K3_HITO_93.rar	07/04/2021
105	HITO ASOCIADO 94. Ejecución: Reporte en donde se evidencia la aprobación de todos los productos para la publicación (correos electrónicos RIBD) enviados 2020.	K4_HITO_94.rar	07/04/2021
106	HITO ASOCIADO 95. Ejecución: Usuarios (especializados) informados sobre la disponibilidad de la información 2020.	K5_HITO_95.rar	07/04/2021
107	HITO ASOCIADO 96. Cierre: Formularios físicos archivados (respaldos de formularios digitales en pdf) 2020	K6_HITO_96.rar	05/05/2021
108	HITO ASOCIADO 97. Planeación: Ficha metodológica de la OE elaborada 2021	K7_HITO_97.rar	04/06/2021
109	HITO ASOCIADO 98. Planeación: Historia de la OE elaborado 2021	K8_HITO_98.rar	04/06/2021
110	HITO ASOCIADO 99. Planeación: Serie histórica de indicadores de seguimiento al PND elaborada 2021	K9_HITO_99.rar	04/06/2021
111	P001 La oportuna respuesta al pedido de priorización de procesos de compra de insumos y materiales para análisis de agua, garantizaría la importación y entrega de los insumos y materiales para el cumplimiento del operativo de campo.	P001.pdf	29/10/2020
112	R001 El recorte presupuestario CAUSARÍA que no se ejecute parte de las operaciones planificadas para el presente periodo fiscal, afectando así, a la consecución de los objetivos del proyecto.	R001.pdf	15/01/2020
113	R002 Deserción del personal a vísperas del inicio de la etapa de recolección de información CAUSARÍA retraso en los tiempos planificados para iniciar del operativo de recolección de información	R002.pdf	15/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
114	R003 No contar con los materiales y suministros para la ejecución del test de calidad de agua, en el tiempo planificado, CAUSARÍA la imposibilidad de recolectar información necesaria para el reporte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo	R003.pdf	15/01/2020
115	R004 No contar con los materiales y suministros para la ejecución del test de calidad de agua, en el tiempo planificado CAUSARÍA la imposibilidad de recolectar información necesaria para el reporte de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo	R004.pdf	15/01/2020
116	R005 Retraso en la entrega de formularios y manuales para la capacitación causaría el retraso en el inicio del proceso de capacitación al personal	R005.pdf	15/01/2020
117	R006 la falta de respuesta a la priorización de procesos de compra, CAUSARÍA que los tiempos de importación de reactivos para análisis de agua y botellas para muestras de agua de extiendan y pongan en riesgo el operativo	R006.pdf	29/10/2020
118	R007 Retraso en la entrega de formularios y manuales para la capacitación, CAUSARÍA que los aspirantes a encuestadores y supervisores no tengan el conocimiento suficiente de la metodología de recolección de la información.	R007.pdf	09/11/2020
119	R008 Deserción del personal a vísperas del inicio de la etapa de recolección de información CAUSARÍA retraso en los tiempos planificados para iniciar del operativo de recolección de información	R008-signed.pdf	04/12/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivas Villalba, Edwin Patricio	Responsable Nacional del Proyecto	Responsable del proyecto Encuesta Nacional Multipropósito	Patricio_Rivas@inec.go.b.ec	0994495809
