

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K012 Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

Líder del Proyecto:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline (estefania_encalada@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.388017	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	61,984.04
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/10/2022 - 31/12/2026
Fecha de última actualización:	08/12/2022	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Martínez Velasco, Andrea Elizabeth	Fecha del siguiente Hito:	12/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

Beneficios Cualitativos

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - dic 2026

Presupuesto: \$ 23.515.045,48


Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 3.57 %

Fecha de Inicio: 15/10/2022

Fecha de Fin: 31/12/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

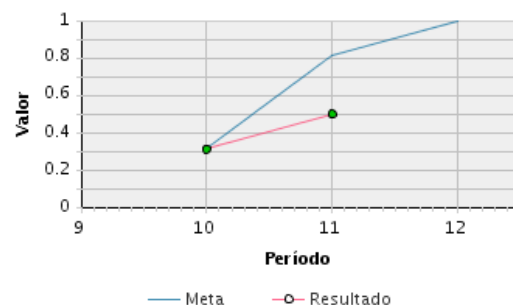

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
										0 %	1 %	1 %
	Avance real acumulado											
										0 %	0 %	
2022	Estado											
										●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 3 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO)	Martínez Velasco, Andrea Elizabeth	08/12/2022 - 05:45 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Alcance. La falta de perfiles adecuados para la conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto CAUSARÍA un retraso en la ejecución de las actividades de monitoreo programadas	18/11/2022	Estefania Jacqueline Encalada Sandoval	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Plan de adquisiciones aprobado	4-Inicio de Trabajo	28/10/2022		28/10/2022		Sí	0.31
2	Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	01/11/2022		09/11/2022		Sí	0.19
3	Especialista de proyecto contratados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022	12/12/2022			No	0.31
4	Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado	4-Inicio de Trabajo	15/12/2022	30/12/2022			No	0.19
5	sdsd	4-Inicio de Trabajo	31/01/2023	30/12/2023			No	39.0
6	sdsdsd	1-Solicitud de Información	30/01/2024	27/12/2024			No	20.0
7	sdsdsdsd	4-Inicio de Trabajo	03/03/2025	30/12/2025			No	30.0
8	Informe de cierre de proyecto aprobados	9-Entregables Formales	31/08/2026	31/12/2026			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de informes de monitoreo, auditoría externa y cierre del proyecto al 2022		-	-	-	01/11/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	61,984.04 **
Costo Total:	23,515,045.47
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
Ppto. Externo Planeado	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
Ppto. Codificado	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	61,984.04	0.00	61,984.04
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	30,992.02	0.00	30,992.02	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	30,992.02		61,984.04				
Total	61,984.04	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.
