

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K008** VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV.

Líder del Proyecto:	Lara Bolaños, Luis Bayardo (Luis_Lara@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382700	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	10	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	84,637,858.21
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2018 - 29/12/2023
Fecha de última actualización:	04/12/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Lara Bolaños, Luis Bayardo	Fecha del siguiente Hito:	06/11/2023

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

<p><b>Descripción</b></p> <p>La información censal es prioritaria para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la población ya que a través de ella es posible obtener diagnósticos de la situación demográfica y socioeconómica del país, de cada provincia, municipio o localidad; sino se disponen de cifras precisas, oportunas y de calidad se podría incurrir en un deficiente uso de recursos públicos, equivocar las decisiones de política y finalmente no adoptar las acciones necesarias para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Línea Base:La última información censal disponible corresponde al censo 2010, sus principales resultados a nivel nacional son los siguientes Población Total 14.483.499 Área geográfica: Urbana 9.090.786 - Rural 5.392.713 Sexo: Hombres 7.177.683 - Mujeres 7.305.816 Grandes grupos de edad: 0-14 4.528.425 - 15-64 9.014.169 - 65 y más 940.905 Auto identificación según su cultura y costumbres: Indígena 1.018.176 - Afroecuatoriano/afrodescendiente/ negro/ mulato 1.041.559 - Montubio 1.070.728 - Mestizo 10.417.299 - Blanco 882.383 - Otro 53.354 Estado civil o conyugal: Casado 3.521.424 - Unido 2.214.067 - Separado 526.860 - Divorciado 203.393 - Viudo 413.296 - Soltero 3.960.653 Condición de alfabetismo: Alfabeto 9.282.978 - Analfabeto 672.096 Condición de actividad económica: PEA 6.023.679 - PEI 3.931.395 Discapacidad: Si tiene 816.156 - No tiene 12.546.802 *Pobreza por NBI*: Pobres 8.605.803 - No pobres 5.723.803 Producto: Componente 1: Base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada, del 63,7% de sectores censales del país Componente 2: Informe técnico con información que permita comprobar la planificación del operativo censal, mediante el 100% de ejecución del Censo Experimental, al mes de diciembre de 2019. Componente 3: Reuniones interinstitucionales realizadas y cuestionario censal aprobado en diciembre 2019 Componente 4: Informe de resultados de la Prueba Piloto de la Encuesta Post Censal, al mes de diciembre de 2019. Componente 5: Ejecución del 20% de los costos operativos y la adquisición de bienes y servicios conforme los procesos de contratación respectivos durante la ejecución del proyecto; además se aplicará de manera periódica el proceso de seguimiento y control (ejecución física y presupuestaria); y se asegurará el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. Objetivo General: Proporcionar información actualizada sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas; así como, establecer el volumen y características de las viviendas en que habita la población, y los servicios básicos que disponen, al mayor nivel de desagregación territorial. Objetivos Específicos: "1. Disponer de una base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada a nivel nacional, que sirva para la organización y ejecución del empadronamiento, y como insumo para otros procesos asociados a la información cartográfica y pre censal. 2. Comprobar la adecuada planificación del operativo censal en cuanto a sus instrumentos, métodos, sistemas informáticos e infraestructura tecnológica requerida; a través, de un Censo Experimental. 3. Proporcionar una base de datos actualizada a nivel nacional con información sobre las características de la población, los hogares y de las viviendas que ellos ocupan, mediante entrevista a los hogares a través de un cuestionario censal. 4. Generar información que permita evaluar directamente la cobertura y calidad de los resultados del censo, a través de una Encuesta Post Censal realizada a una muestra representativa de la población objetivo del empadronamiento. 5. Coordinar la gestión operativa y logística de las actividades, así como realizar procesos de monitoreo y seguimiento del proyecto; y el aseguramiento de su calidad."</p>
<p><b>Beneficios Cualitativos</b></p> <p>Información base de 50.561 sectores censales amanzanados y dispersos. 5056 sectores censales amanzanados y dispersos actualizados, supervisados, revisados, digitados y digitalizados, durante el año 2018</p>
<p><b>Tipo de Beneficiario</b></p> <p>Instituciones del Sistema Estadístico Nacional Instituto Nacional de Estadística y Censos</p>


**Restricciones**

Tiempo: La demora en la adquisición (suministros, equipos de oficina, equipos tecnológicos, etc.) De acuerdo al cronograma planificado ocasionaría un retraso para el inicio de las actividades del proceso de preparación de material. Costo: El recorte de presupuesto del proyecto, causaría retraso o suspensión de actividades planificadas. Alcance: Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos, y la realización de investigaciones en el ámbito geográfico que fortalezcan la producción estadística del INEC.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.95 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2018      Fecha de Fin: 29/12/2023

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

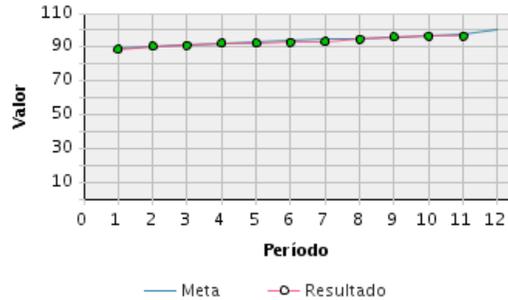

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	89 %	91 %	91 %	92 %	92 %	93 %	93 %	95 %	96 %	96 %	97 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2023</p> <p>Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad.</p> <p>Actualización de información a nivel de hitos de acuerdo con los memorandos Nro. INEC-CPV-GNT-2023-0241-M, INEC-CPV-2023-0732-M e INEC-INEC-2023-0947M y los documentos que los respaldan</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	20/11/2023 - 01:14 PM
<p>Octubre 2023</p> <p>Procesamiento</p> <p>Se realizó la solicitud de cambios del sistema de control de cobertura por la actualización de la base microbertura y del módulo de descarga ASCII para la información de V+1.</p> <p>Se entregó la documentación técnica solicitada por el equipo evaluador del censo.</p> <p>Proyecciones</p> <p>Se actualizó el documento "Propuesta Metodológica para le recuperación de la población mediante las Viviendas con Personas Ocupadas Ausentes".</p> <p>Se complementó el documento metodológico de conciliación demográfica.</p> <p>Se socializó a diferentes instituciones sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de construcción de las proyecciones de población.</p>		
<p>Septiembre 2023</p> <p>Empadronamiento</p>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se ejecutaron procesos metodológicos de validación y la revisión de las novedades presentadas durante los talleres de validación e imputación. Se revisó la base de hogar y contraste entre la base de micro cobertura y la validada y se validó los conteos de población, hogar y vivienda. Se elaboró, reviso y presentó la documentación para la primera entrega de resultados censales.</p> <p>Procesamiento Se ejecutó el control de cobertura del 3er y 4to ciclo a nivel nacional respectivamente. Se procedió con la validación e imputación 3er y 4to ciclo a nivel nacional respectivamente.</p> <p>Proyecciones Se elaboró la propuesta metodológica para la estimación de VOPAS Se revisó las diferentes fuentes de información para la elaboración de la conciliación de fecundidad, mortalidad y migración. Se realizó el análisis de variables de la base censal a ser usadas en las Proyecciones Poblacionales</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Empadronamiento Se actualizó y suscribió el informe de ejecución de la cooperación interinstitucional MIDENA-INEC. Se revisaron los informes de entrega a procesamiento - cuestionarios diligenciados y el informe de gestión cuestionarios físicos no diligenciados y utilizados de las CZ. Litoral, Sur y AC Campo. Se realizó el taller de validación imputación (V+I) a nivel Nacional y se revisó las bases tratadas y entregadas por Procesamiento.</p> <p>Procesamiento Se actualizó el documento plan de validación e imputación del Proyecto CPV. Se realizó el control de cobertura 2da corrida a nivel nacional de las bases generadas.</p>		
<p>Julio 2023</p> <p>Empadronamiento 1.- Se realizó en control de microcobertura de la base censal en conjunto con las Coordinaciones Zonales. 2.- Se realizó la unificación de las fuentes de información censal así como la integración con RRAA incluyendo a los menores de edad.</p> <p>Metodología y Análisis 1.- Se generó el repositorio de Indicadores de Resultados de la primera entrega: que incluye la elaboración de fichas adicionales 2.- Se coordinó la generación de productos comunicacionales: Infografías, propuestas temáticas y analíticas para artes gráficas, presentación de resultados nacionales. 3.- Se elaboró la propuesta de contenidos y esquema para la implementación en power bi de la pantalla de perfiles territoriales y la propuesta de contenidos para visualizador geográfico</p> <p>Procesamiento 1.- Se realizó el control de cobertura fase 1 a nivel de provincia de la Base CPV 2.- Se realizó la codificación automática y asistida de los cuestionarios censales, a nivel nacional 3.- Se ejecutaron las jornadas 1 y 2 de la validación e imputación de las provincias del Ecuador con cada Coordinación Zonal y Planta Central.</p> <p>Junio 2023</p> <p>Actualización Cartográfica 1.- Revisión de la metodología para la implementación de la fase de micro cobertura censal. 2.- Se realizó ajustes al documento metodológico de Actualización Cartográfica. 3.- Elaboración del Reporte Censo 2022, con respecto a Actualización Cartográfica</p> <p>Empadronamiento 1.- Se realizó la verificación de las reglas de integración (Bases SUSO, SIPE y ANEXO) y se generaron las reglas para control de duplicidad en la base censal. 2.- Se generaron los reportes de la base: vivenda_comp_final.csv (integrada preliminar).</p> <p>Procesamiento 1.- Se realizó la codificación automática en un 70% a nivel nacional</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>01/11/2023 - 01:40 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Se realizó la codificación asistida en un 30% a nivel nacional 3.- Se realizó la validación e imputación en un 5% a nivel nacional		
Mayo 2023  <b>EMPADRONAMIENTO</b> 1.- Se elaboró y revisó el informe de ejecución del apoyo de seguridad MIDENA al operativo censal de las Coordinaciones Zonales y AC Campo. 2.- Se gestionó la suscripción del acta de cierre al convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos Nro. 0021-2019 3.- Se realizó el 2do taller de Integración de las bases y se entregó la base Integrada para las siguientes fases de Procesamiento.  <b>PROCESAMIENTO</b> 1.- Se realizó la capacitación a los postulantes a codificadores a nivel nacional 2.- Se realizó la reinstucción al personal seleccionado en el cargo de codificadores a nivel nacional  <b>METODOLOGÍA y ANÁLISIS</b> 1.- Se desarrollaron secciones adicionales del Boletín de Resultados Nacionales y se realizó la revisión, ajustes y actualización tanto en el contenido como en la programación y redacción de todo el Boletín, adicional se envió la información a DICOS y se solicitó la generación de plantillas para productos de resultados: Boletín y Presentación Nacional y los diagramas de líneas de tiempo del proyecto para la presentación de resultados 2.- Se realizó la actualización de 9 fichas de indicadores de las temáticas de ambiente y educación a partir de observaciones de DIES, Empadronamiento y DIPSEN	Bahamonde Mora, Adriana Fernanda	05/07/2023 - 03:03 PM
Abril 2023  <b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b> 1.- Se realizó la asignación de códigos para los registros con ID erróneos 2.- Se realizó la asignación de códigos para los registros del censo en línea.  <b>EMPADRONAMIENTO</b> 1.- Se realizó análisis de información de encuestas de satisfacción a través de grupos focales. 2.- Se realizó la verificación de los cuestionarios físicos llenados en campo y que fueron digitados en el SUSO, que si consta la información en el sistema. 3.- Se realizó el primer taller de integración de la base de datos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda 4.- Se realizó la Integración parcial-cero de las bases SUSO, SIPE, ANEXO, PPL´s.  <b>PROCESAMIENTO</b> 1.- Se entregó un informe de la cobertura sobre un corte de la base censal, a SUGEN y GNT. 2.- Se socializó a DITIC y DIDAD la arquitectura necesaria para construir el centro de validación e imputación.		
Marzo 2023 <b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b> 1.- Se realizó los ajuste de la memoria técnica preliminar del componente de Actualización Cartográfica 2.- Se realizó el ajuste de procedimiento para asignación de códigos para los registros mal codificados y registros de nuevas viviendas. 3.- Se elaboró la metodología para los registros mal codificados y registros de nuevas viviendas  <b>EMPADRONAMIENTO</b> 1.- Se apoyó al personal provincial/distrital para el control y monitoreo de la cobertura en campo del VIII Censo de Población y VII de Vivienda. 2.-Se elaboró la nota conceptual y metodológica para ejecución de grupos focales del VIII Censo de Población y VII de Vivienda. 3.- Se elaboró el informe copilado de resultados de prueba piloto.  <b>PROCESAMIENTO</b> 1.-Se realizó la pre crítica y digitación de 180.890 formularios censales, en las coordinaciones zonales		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.-Se realizó un ejercicio de control de cobertura y se elaboró un reporte con el total de id erróneas y viviendas duplicados.                      3.-Se elaboró el nuevo cronograma para la ejecución de la fase de procesamiento de acuerdo a la fecha de cierre del operativo de control de calidad y cobertura y entrega de base cero.</p>		
<p>Febrero 2023</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b>                      1.- Se realizó la correspondencia a nivel de manzanas y localidades del censo 2010 y censo 2022.                      2.- Se realizó la reunión de trabajo sobre la codificación para los registros mal codificados y registros de nuevas viviendas.                      3.- Se realizó el análisis espacial, codificación y categorización de la información de los registros mal codificados y nuevas viviendas.                      4.- Se realizó un visualizador para identificar afrodescendientes en las ciudades de Guayaquil y Quito en el censo 2010 y censo 2022.                      5.- Se realizó la elaboración y ajuste de memoria técnica preliminar del componente de Actualización Cartográfica.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Se realizó la validación de muestra de cargas para el operativo CC1 de las Coordinaciones Zonales.                      2.- Se realizó la supervisión y apoyó en el levantamiento de información en campo del operativo censal de control de calidad y cobertura.                      3.- Se revisó de matriz de asignación de viviendas para el proceso de digitación de formularios en físico.                      4.- Se elaboró reportes de anexo de personas ausentes                      5.- Se realizó la inclusión de preguntas en anexo de personas ausentes referente auto identificación de etnias</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b>                      1.- Se contrató personal civil en la Coordinación zonal Litoral para realizar la pre crítica y digitación                      2.- Se digitaron 45.977 viviendas, llegando a un total de 168.039 formularios a nivel nacional digitados.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>08/06/2023 - 11:52 AM</p>
<p>Enero 2023</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b>                      1. Análisis espacial y categorización de la información enviada del censo en línea del 3 al 10 de enero                      2. Revisión y asignación manual de codificación de la información que no se pudo asignar automáticamente en el proceso elaborado para el censo en línea del 10 al 24 de enero                      3. Análisis espacial y categorización de la información enviada de los registros nuevos y mal codificados del 6 al 17 de enero</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO/LOGÍSTICA</b>                      1. Inicio operativo de control de calidad y cobertura                      2- Gestión del robot suso rechazos                      3. Se elaboró el informe de integración fuentes de operativos censales</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b>                      1. Se contrató personal civil para validación e imputación, RRAA y el backup del responsable zonal norte de procesamiento                      2. Se digitaron 115.355 cuestionarios físicos en las cuatro coordinaciones zonales.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>04/05/2023 - 10:43 AM</p>
<p>Diciembre 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b>                      1. Se realizó el ajuste al cronograma de actualización cartográfica 2023.                      2. Se realizó la revisión de metodologías para codificación de censo en línea y viviendas nuevas.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO/LOGÍSTICA</b>                      1. Se empadronaron el 91% de las viviendas planificadas a nivel nacional, con cobertura al 31 de diciembre de 5'670.651 de viviendas y 737.245 Censo en Línea.                      2. Se controló la ejecución de la verificación/recuperación de viviendas, mediante el monitoreo a través de las herramientas establecidas para el efecto (SUSO WEB y panel).</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>13/03/2023 - 09:56 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>PROCESAMIENTO</b></p> <p>1. Se contrató personal civil (236 personas a nivel nacional) para archivo, precritica y digitación en la Zona Norte, Litoral y Centro</p> <p>2. Se recibieron los formularios físicos en un 50% de lo planificado inicial, en las Coordinaciones Zonales</p> <p>3. Se realizó la producción de los siguientes sistemas: Control de Cobertura/Procesamiento - Censo Nacional, Codificación automática para producción, Codificación asistida para producción, Panel de Control - Control de Cobertura, Panel de Control - Codificación automática, Panel de Control - Codificación Asistida.</p> <p><b>METODOLOGÍA Y ANÁLISIS</b></p> <p>1. Se socializó, retroalimentó, revisó y actualizó las fichas de indicadores. (Las fichas incluyen la construcción de sintaxis en R del cálculo de los indicadores)</p>		
<p>Noviembre 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b></p> <p>1.- Se elaboró la cartografía temática del censo en línea.</p> <p>2.- Revisión de la información y elaboración del visualizador de sedes operativas.</p> <p>3.- Reunión técnica con el consejo provincial del Azuay sobre límites de la parroquia Molleturo.</p> <p><b>RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN</b></p> <p>1.- Capacitación presencial a Supervisores de Censistas y Censistas.</p> <p>2.- Reinstrucción a los equipos de Sedes Operativas y Supervisores sobre cuestionario censal, Censo en Línea controlado, autoidentificación étnica y protocolo en casos de violencia basada en género.</p> <p>3.- Se envió infografías y documentos de reinstrucción para los equipos de Sedes Operativas y Operativo de Campo sobre: Censo en Línea controlado, línea violeta, autoidentificación étnica, preguntas sobre variables sexogenéricas del cuestionario censal.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO/ LOGISTICA</b></p> <p>1.- Se ejecutó la asignación de cargas masiva para el personal de campo para el operativo censal.</p> <p>2.- Inició el operativo censal a nivel nacional de las viviendas particulares y colectivas en áreas amanzanadas y dispersa.</p> <p>3.- Inició el operativo de forma parcial sobre la verificación/recuperación de viviendas no censadas: área amanzanada, área dispersa y viviendas colectivas.</p> <p><b>METODOLOGÍA Y ANÁLISIS</b></p> <p>1.- Se socializó el informe de retroalimentación al Plan de Validación e Imputación.</p> <p>2.- Se elaboró la presentación de resultados del tercer censo piloto, está para firma de aprobación, las cuales son la base para las ppts provinciales del censo nacional.</p> <p>3.- Se elaboró el documento "Estrategia de producción y difusión de resultados censales" (Portafolio de Resultados) versión final para firma de aprobación.</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b></p> <p>1.- Se capacitó a los responsables zonales en archivo, precritica y digitación.</p> <p>2.- Se actualizó el manual de gestión de archivo, precritica y de digitación.</p> <p>3.- Se actualizó el aplicativo web de ingreso (por digitación).</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>13/02/2023 - 04:12 PM</p>
<p>Octubre 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b></p> <p>1. Entrega de productos cartográficos (QFIELD, PDFS,) a nivel nacional al componente de empadronamiento;</p> <p>2. Revisión de proceso para asignación de codificación;</p> <p>3. Elaboración de visualizador de áreas de empadronamiento.</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b></p> <p>1. Taller nacional con responsables zonales de procesamiento y el equipo de planta central, para definición de cargas de trabajo, fechas, cantidad de recurso humano, logística.</p> <p><b>METODOLOGÍA</b></p> <p>1. Ejecución de validación e imputación de información censal y tabulados del 3er piloto;</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>01/02/2023 - 12:29 PM</p>
<p>Septiembre 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b></p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>09/12/2022 - 03:21 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Validación de Base Geográfica del 1 al 30 de septiembre                      2.- Validación de Base Pre censal del 1 al 30 de septiembre                      3.- Revisión de proyectos Qfield de las sedes operativas a nivel nacional del 12 al 30 de septiembre                      4.- Lanzamiento de Geo portal Institucional (Información Cartográfica 2021) 14 de septiembre</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Revisión y ajustes sistemas de captura de información: censo en línea, móvil                      2.- Elaboración requerimiento integración de bases de datos                      3.- Revisión y ajuste censo piloto base 0                      4.- Elaboración presentación censo en línea, capacitación                      5.- Instalación de las sedes operativas y juntas promotoras con sus comisiones</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b>                      1.- Elaboración del informe técnico de archivo, pre crítica y digitación del piloto                      2.- Elaboración del informe técnico de control de cobertura del piloto                      3.- Elaboración del informe técnico de codificación del piloto</p> <p><b>RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN</b>                      1.- Revisión pedagógica de manuales. Activación de Grupo de Tarea de todos los manuales. Ajuste de manuales conforme a cambios de preguntas sobre variables sexo genéricas.                      2.- Entró en producción Sistema de Reclutamiento, las áreas de Reclutamiento y Capacitación y DARH enviaron la solicitud de cambios o mejoras para los ajustes por parte de DIRAD y se suscribió el informe de pruebas.                      3.- Se realizó la capacitación presencial al personal de Instructores 1 y al personal de Sedes Operativas.                      4.- Se realizó la capacitación virtual al personal de Supervisores de Cobertura Censal (Instructores 2).</p>		
<p>Agosto 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA</b>                      1.- Supervisión del proceso de digitalización cartográfica y de áreas de empadronamiento.                      2.- Revisión y Ajuste de la base precensal                      3.- Revisión y ajuste de áreas de empadronamiento.                      4.- Revisión, ajuste y consolidación de la base geográfica.                      5.- Análisis y elaboración de metodología para obtención de códigos (dpa) del censo en línea.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Actualización de requerimientos de sistemas informáticos para el operativo.                      2.- Ajuste a diccionarios, mallas de validación, requerimiento de la integración de bases.                      3.- Revisión integración con RRAA de base 0 de 3er censo piloto                      4.- Impartir capacitación de responsables provinciales y zonales.                      5.- Elaborar material de capacitación en temas específicos y de sensibilización.                      6.- Ajuste a cuestionario variables sexo - genéricas y variables del censo en línea.</p> <p><b>RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN</b>                      1.- Aprobar el Plan de Reclutamiento para el personal de sede, supervisores y censistas.                      2.- Aprobar el Plan de Capacitación.                      3.- Capacitación de Formadores e Instructores.                      4.- Capacitación Responsables Zonales y Provinciales en Santo Domingo.                      5.- Elaboración y aprobación de TDR de personal de Sedes Operativas.</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b>                      1.- Se culminó la digitación del 3er piloto, en las 4 zonales                      2.- Se culminó la cobertura del 3er piloto                      3.- Se culminó la validación con registros administrativos en el 3er piloto                      4.- Se culminó la codificación, en el 3er piloto</p> <p><b>METODOLOGÍA Y ANÁLISIS</b>                      1.- Plan de tabulados entregado y socializado para retroalimentación.                      2.- Plan de indicadores entregado y socializado para retroalimentación.                      3.- Se realizó la actualización Propuestas metodológica del Indicador de Déficit Habitacional.                      4.- Se elaboró el documento de Requerimientos funcionales para visualizador de resultados.                      5.- Se elaboró y aprobó el documento de Agenda de Investigación.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>10/11/2022 - 09:33 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Realización de la cuarta y quinta jornadas del operativo de verificación de crecimientos a nivel nacional.                      2.-Realización de taller con las coordinaciones Zonales sobre la Generación de Áreas de Empadronamiento.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.-Envió de manuales a nivel técnico: censista, supervisión y sedes operativas.                      2.- Finalizó el documento justificación de inclusión de variables sexo genéricas.</p> <p>Abril 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Realizar la segunda y tercera jornadas del operativo de verificación de crecimientos a nivel nacional.                      2.- Realización de la IX Prueba Piloto del Cuestionario Censal.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.-Consolidación y ajuste de la Memoria Técnica del Censo Piloto.                      2.- Presentación de procesos censales por parte del INEC y retroalimentación por parte del DANE. Presentación de productos del equipo de proyecciones poblacionales y del CELADE.</p> <p>Marzo 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Identificación de crecimiento de sectores por parte de Coordinaciones Zonales y revisión por parte de DICA por medio de imágenes satelitales y Google Engine.                      2.- Revisión de la base geográfica nacional por parte de DICA.                      3.- Iniciar el operativo de campo para verificación de crecimiento de sectores a nivel nacional. (17 de marzo de 2022)</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Talleres de información y sensibilización del cuestionario censal con actores externos (Instituciones públicas, privadas, GADS y colectivos).                      2.- Se realizó la codificación de la base de datos del Censo Piloto.                      3.- Validar e imputar base de datos del Censo Piloto</p> <p>Febrero 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Identificación de crecimientos por parte de Coordinaciones Zonales y revisión por parte de la Dirección de Cartografía                      2.-Revisión de la base geográfica nacional por parte de a Dirección de Cartografía</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Realización de talleres de información y sensibilización del cuestionario censal con actores externos del 7 al 25 de febrero.                      2.- Codificación de la base de datos del Censo Piloto</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>05/08/2022 - 10:45 AM</p>
<p>Julio 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA:</b>                      1.- Se realizó la supervisión del proceso de digitalización cartográfica y de áreas de empadronamiento.                      2.- se realizó la capacitación de cartografía al personal de DIES para la post censal.                      3.- se realizó la revisión preliminar de la base pre censal.                      4.- Se realizó la supervisión de observación al censo piloto en Pimampiro y Mocha.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO / LOGÍSTICA:</b>                      1.- Se adjudicó el contrato de adquisición de dispositivos móviles-Tabletas Censo Nacional 2022.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>05/08/2022 - 10:41 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Se realizó la instalación de las sedes operativas Censo Piloto 2022.                      3.- Se realizó la instalación de las juntas promotoras y sus comisiones Censo Piloto 2022.                      4.- Se realizó la distribución del material de imprenta y vestimenta a cada una de las zonales Censo Piloto 2022.                      5.- Se realizó la ejecución de los operativos censales del Censo Piloto 2022 en cada una de la sede operativa a nivel nacional.                      6.-Se presentó el instructivo de armado de material censal.</p> <p><b>RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN:</b>                      1.- Se realizó la revisión pedagógica de manuales. Activación de Grupo de Tarea de todos los manuales.                      2.-Se realizaron las pruebas y afinamientos al sistema en conjunto con DIRAD, DARH y Coordinaciones Zonales.                      3.-Se realizaron las pruebas y compendio de observaciones al sistema.                      4.- Se realizaron los ajustes al Plan de Reclutamiento conforme a las observaciones de Coordinaciones Zonales, DARH, DIFI y DIJU.                      5.- Se supervisaron los procesos de reclutamiento y capacitación en los 4 lugares a nivel nacional del Tercer Censo Piloto.</p> <p><b>PROCESAMIENTO:</b>                      1.-se actualizó el manual de pre crítica para el 3er piloto.                      2.- Se ejecutó la asistencia técnica: Capacitar al equipo de procesamiento CPV en el uso de CSPro.                      3.- Se capacitó en archivo, precrítica y digitación de planta central a responsables zonales, como parte del 3er piloto.                      4.- Se capacitó en codificación de planta central a responsables zonales, como parte del 3er piloto.                      5.- Se capacitó en archivo, pre crítica y digitación de responsables zonales a personal de archivo, pre crítica y digitación, en zonales, como parte del 3er piloto.</p> <p><b>METODOLOGÍA Y ANÁLISIS:</b>                      1.-Se finalizó con el diseño del plan de tabulados.                      2.- Se finalizó con el informe de revisión técnica de replicabilidad del indicador de Déficit habitacional.                      3.- Se cuenta con un avance</p> <p>Junio 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Realización de la sexta jornada del operativo de verificación de crecimientos a nivel nacional.                      2.-Realización de capacitación a instructores 1 sobre el uso de cartografía y capacitación al personal de encuesta postcensal.                      3.- Se inició el proceso de generación de áreas de empadronamiento.</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b>                      1.- Planificación 3er censo piloto- microcronograma.                      2.- Capacitación del censo piloto a nivel de instructores 1 y supervisor de censistas.                      3.-Revisión de guiones para plataforma virtual capacitación; plan de operativos de campo; plan de seguridad.</p> <p><b>PROCESAMIENTO</b>                      1.- Adquisición de licencias para edición de textos                      2.- Desarrollo de requerimientos para actualización del aplicativo de codificación para el Censo Piloto.</p> <p><b>METODOLOGÍA Y ANÁLISIS</b>                      1.- Finalizó la matriz de indicadores censales; documento de evaluación y retroalimentación al plan de validación e imputación;                      2.- Realización de reunión para la socialización de resultados de la evaluación al plan de validación e imputación.                      3.- Se realizó el documento y la presentación del diagnóstico cantonal de Limón Indanza;                      4.- Se finalizó el documento guía para la visualización de indicadores censales.</p>		
<p>Enero 2022</p> <p><b>ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y PRECENSO DE VIVIENDAS</b>                      1.- Finalización de actividades en gabinete u oficina, específicamente en la generación de mapas y planos en formato geopdf. Actualmente se está revisando la base geográfica nacional.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>07/06/2022 - 03:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Generación de reporte de indicadores de la calidad #43, correspondiente a la finalización de actividades de oficina .</p> <p><b>EMPADRONAMIENTO</b></p> <p>1.- Avance de la Memoria Técnica del Censo Piloto en Limón Indanza.</p> <p>2.- Realización del Taller Interno sobre el Cuestionario Censal .</p> <p>3.- Elaboración de Informe Técnico sobre el Censo de Derecho para el CONEC.</p> <p>Diciembre 2021 Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Continuación de actividades en gabinete u oficina, específicamente en la generación de mapas y planos en formato geopdf, con un avance del 97%; el avance de bases geográficas a nivel de provincia es del 100%, el avance de las bases geográficas zonales es del 71%, y el de la base geográfica nacional es del 35%.</p> <p>2.- Generación de reporte de indicadores de la calidad #42, correspondiente a la continuación de actividades de oficina.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Finalización del operativo de campo del Censo Piloto en Limón Indanza. Se reportó una cobertura del 98%</p> <p>2.- Realización del Taller de Evaluación del Censo Piloto .</p> <p>Noviembre 2021 Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se generaron mapas y planos en formato geopdf, con un avance del 89%; el avance de bases geográficas a nivel de provincia es del 100%, mientras que el avance de las bases geográficas zonales es del 50% .</p> <p>2.- Generación de reporte de indicadores de la calidad #41, correspondiente a la continuación de actividades de oficina.</p> <p>3.- Envío de memorias técnicas zonales a DICA .</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Capacitación para censistas y supervisores de censistas del 15 al 19/11/2021.</p> <p>2.- Inicio del operativo de campo del Censo Piloto en Limón Indanza , se reportó una cobertura del 70% hasta el 30/11/2021.</p>		
<p>Octubre 2021 Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Continuación de actividades en gabinete u oficina, específicamente en la generación de mapas y planos en formato geopdf con un avance del 75% en mapas y del 74,9% en planos a nivel de parroquias; y de bases geográficas, cuyo avance es del 95,83%, a nivel de provincias, en todo el país .</p> <p>2.- Se generó el reporte de indicadores de la calidad #40, correspondiente a la continuación de actividades de oficina.</p> <p>3.- Se ejecutó el taller de memoria técnica.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Planificación de Censo Piloto en el cantón Limón Indanza</p> <p>Septiembre 2021 Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Continuación de actividades en gabinete u oficina, específicamente en la generación de mapas y planos en formato geopdf, con un avance del 70,4% en mapas y del 71,3% en planos, y de bases geográficas, cuyo avance es del 87,2%, a nivel de parroquias, en todo el país.</p> <p>2.- Generación de reportes de indicadores de la calidad #38 y #39, correspondientes a la continuación de actividades de oficina.</p> <p>Empadronamiento</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>04/03/2022 - 01:08 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Realización de taller con INEGI sobre operativo de campo mediante metodología de derecho. 2.- Aprobación del cuestionario censal para el Censo Piloto por parte del Comité Estratégico Institucional del Censo</p>		
<p>Agosto 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Continuación de actividades en gabinete u oficina de los procesos de revisión, digitación, re enumeración que están finalizados . 2.- Proceso de digitalización, avance a nivel de sectores terminado, el personal contratado está generando las bases geográficas provinciales cuyo avance es del 54,16% en todo el país. 3.- Generación de reportes de indicadores de la calidad #36 y #37, correspondientes a la jornada 39 y a la continuación de actividades de oficina, respectivamente.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Elaboración de informe técnico de inclusión de variables de identidad de género y orientación sexual . 2.-Elaboración de presentaciones para la Comisión Especial Estadística de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y Montubios.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>04/12/2021 - 10:40 AM</p>
<p>Julio 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se realizó el levantamiento de información en campo de la jornada 38 (con un avance real del 98,8%) y de la jornada 39 . 2.- Se aplicó una estrategia de comunicación en redes sociales para verificación de actualizadores cartográficos en la página web institucional 2.- Se publicó una cuña radial a manera de cadena rotativa para informar sobre el operativo de campo de Actualización Cartográfica y Pre Censo de Viviendas (durante julio).</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Se planificó y ejecutó una prueba cognitiva para variables de identidad de género y orientación sexual.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>04/12/2021 - 10:40 AM</p>
<p>Junio 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Levantamiento de información en campo de la jornada 35 (con un avance real del 97,7%) y jornada 37 (cuyo avance se está calculando) 2.-Aplicación de estrategia de comunicación en redes sociales para verificación de actualizadores cartográficos en la página web institucional (del 06/06/2021 al 30/06/2021). 3.- Publicación de cuña radial a manera de cadena rotativa para informar sobre el operativo de campo de Actualización Cartográfica y Pre Censo de Viviendas (durante junio). 4.- Presentación ante SUGEN del estado de situación del componente Actualiza</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Presentación ante SUGEN del estado de situación de los componentes Censo Experimental y Empadronamiento. 2.- Elaboración de presupuesto del piloto y el Censo Nacional con metodología de derecho.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>04/12/2021 - 10:39 AM</p>
<p>Mayo 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se levanto información en campo de la jornada 34 (con un avance real del 94,2%) y jornada 35 (cuyo avance se está calculando). 2.- Aplicación de estrategia de comunicación en redes sociales para verificación de actualizadores cartográficos en la página web institucional. 3.- Publicación de cuña radial a manera de cadena rotativa para informar sobre el operativo de campo de Actualización Cartográfica y Pre Censo de Viviendas.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>05/10/2021 - 03:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- Coordinación con SUGEN y DICOS para el Seminario Web "Actualizamos el mapa del Ecuador"</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Elaboración de resumen ejecutivo del proyecto censal . 2.-Actualización del cronograma y el Plan de Dirección de Proyecto para el 2022, conforme a las resoluciones del CONEC.</p> <p>Generales</p> <p>1.- Presentación del estado de situación del proyecto censal al Consejo Nacional de Estadística y Censos (CONEC) .</p>		
<p>Abril 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se realizó la capacitación, re instrucción y evaluación de proceso de contratación del personal civil para operativo de campo y oficina. 2.- Se gestionó la contratación del personal para el reinicio del operativo de campo.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Se envió el informe consolidado a nivel nacional de prueba de la generación de áreas de empadronamiento, luego de su aprobación. 2.-Se envió la respuesta al requerimiento de información para el Anuario de Demografía de las Naciones Unidas.</p> <p>Generales:</p> <p>1.- Se realizaron reuniones con UNFPA, CELADE y ONE's de la región para discusión sobre metodologías censales y estrategias frente a la pandemia por COVID-19. 2.- Se presentó el informe de análisis de riesgos ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, organismo que resolvió "Solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, postergar hasta el año 2022, la realización de las fases de logística, capacitación y empadronamiento del VIII Censo de Población y VII de Vivienda - CPV, una vez que existan las condiciones epidemiológicas favorables para su desarrollo, debiendo realizarse un nuevo análisis en el mes de enero de 2022"</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	06/09/2021 - 10:52 AM
<p>Marzo 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se realizó el levantamiento de información en campo de la jornada 33 (con un avance del 91,9%) y aplicación de estrategia de comunicación en redes sociales para verificación de actualizadores cartográficos en la página web institucional. 2.- Se publicó la cuña radial a manera de cadena rotativa para informar sobre el operativo de campo de Actualización Cartográfica y Pre Censo de Viviendas. 3.- Se generó el reporte de indicadores de la calidad de la jornada 31 , la jornada 32 y jornada 33</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.- Se envió el cuestionario diagramado a Gerencia para revisión y aprobación a través de Memorando Nro. INEC-CPV-EMP-2021-0011-M. En base a las resoluciones del Acta Resolutiva de la Sesión Extraordinaria No. 001-2021 del CONEC, se debe analizar un posible cambio de metodología censal, con lo cual el cuestionario pasaría a un nuevo rediseño para posterior aprobación.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	02/07/2021 - 06:47 PM
<p>Febrero 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se realizó el levantamiento de información en campo de la jornada 31 (con un avance real del 87,5%) y jornada 32 (con un avance estimado del 89,8%) . 2.- Se aplicó la estrategia de comunicación en redes sociales para verificación de actualizadores cartográficos en la página web institucional.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	02/07/2021 - 04:58 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Se publicó la cuña radial a manera de cadena rotativa para informar sobre el operativo de campo de Actualización Cartográfica y Pre Censo de Viviendas.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se envió el cuestionario diagramado a Gerencia para posterior revisión y aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.</p>		
<p>Enero 2021</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.-Se realizo la re instrucción al personal civil. 2.-Se realizo el levantamiento de información en campo de la jornada 30 (85,2%) y aplicación de estrategia de comunicaci3n en redes sociales. 3.-Reinicio de actividades en las siguientes fases del proceso: digitaci3n, revisi3n, re enumeraci3n y digitalizaci3n. 4.-Se envi3 oficios al Ministerio del Interior y al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 para coordinar seguridad y vigilancia durante el operativo de campo en el 20</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1.-Se envi3 requerimientos de desarrollo de software: autocenso, salvoconductos, y call center. 2.-Se realiz3 la diagramaci3n del cuestionario censal ajustado.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1.- Se envi3 requerimientos de desarrollo de software: gesti3n de archivo y control de cobertura.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	01/06/2021 - 11:52 AM
<p>Diciembre 2020</p> <p>Actualizaci3n Cartogr3fica y Precenso de Viviendas</p> <p>1.- Se realiz3 el Levantamiento de informaci3n en campo de la jornada de recuperaci3n (84,5%). 2. Se revis3 en un 83,8% y digitaci3n en un 83,5% hasta la jornada 29. 3. Se elabor3 el reporte de indicadores de la calidad de la jornada 29 y un reporte extra correspondiente a la jornada de recuperaci3n.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se aprob3 la Memoria T3cnica del Censo Experimental en Sesi3n del Comit3 Estrat3gico Institucional. 2. Se aprob3 el Plan del Proyecto 2021 en Sesi3n del Comit3 Estrat3gico Institucional. 3. Se realiz3 la revisi3n t3cnica del formulario censal.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Defini3n de proceso para la utilizaci3n de variables de registros administrativos en el Censo Nacional.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	06/05/2021 - 04:54 PM
<p>Noviembre 2020</p> <p>Actualizaci3n Cartogr3fica y Precenso de Viviendas</p> <p>1. Levantamiento de informaci3n en campo de las jornadas 28 y 29 (83,5%). 2. Revisi3n (79,5%) y digitaci3n (79%) hasta la jornada 28. 3. Reporte de indicadores de la calidad de la jornada 28</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Finalizaci3n de la capacitaci3n en Sparklyr en el marco del Plan de Asistencia T3cnica 2020 entre el INEC y el UNFPA</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Defini3n de variables de registros administrativos a utilizar en la codificaci3n.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	06/05/2021 - 04:36 PM
<p>Octubre 2020</p> <p>Actualizaci3n Cartogr3fica y Precenso de Viviendas</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	03/03/2021 - 04:14 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se cumplió con el levantamiento de información en campo de las jornadas 26 y 27 (79,6%).</p> <p>2. Se revisó (75,6%) y digitalizó (74%) hasta la jornada 26.</p> <p>3. Se preparó el reporte de indicadores de la calidad de la jornada 26</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se aprobó la Memoria Técnica del Censo Experimental por parte de la Gerencia.</p> <p>2. Se revisó la Memoria Técnica del Censo Experimental en Sesión de la Comisión Técnica Administrativa del Censo.</p> <p>3. Ejecución de prueba de laboratorio (42 participantes del INEC) del cuestionario censal.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Se definió los formatos para la actualización del plan de validación e imputación.</p>		
<p>Septiembre 2020</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1. Se realizó el levantamiento de información en campo de las jornadas 24 y 25.</p> <p>2. Se revisó y digitalizó la información de las jornadas 23 y 24.</p> <p>3. Se elaboró el reporte de indicadores de la calidad de la jornada 24.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se definió las variables del cuestionario censal en consenso con el equipo técnico del proyecto censal.</p> <p>2. Se elaboró la matriz de requerimientos en desarrollos.</p> <p>3. Se envió la Memoria Técnica del Censo Experimental con observaciones de DITIC resueltas.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Se elaboró los formatos para la actualización del plan de validación e imputación.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	12/01/2021 - 01:16 PM
<p>Agosto 2020</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1. Se realizó la capacitación de personal civil.</p> <p>2. Se elaboró la planificación de la jornada 24.</p> <p>3. Se crearon nuevos equipos en el aplicativo SIPE.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se presentó la propuesta de reingeniería del proyecto censal bajo una metodología de derecho.</p> <p>2. Se presentó y aprobó la planificación del plan de tabulados y construcción de indicadores para el Censo Nacional.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Se presentó y aprobó la planificación de codificación, validación e imputación, y registros administrativos para el Censo Nacional.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	12/01/2021 - 01:15 PM
<p>Julio 2020</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <p>1. Se elaboró los TDR para la contratación de personal civil.</p> <p>2. Se elaboró los instrumentos de capacitación o re instrucción del personal civil.</p> <p>3. Se elaboró agenda de cooperación 2020-2021 de Actualización Cartográfica.</p> <p>4. Se validó el estado de sectores en el aplicativo SIPE.</p> <p>Empadronamiento</p> <p>1. Se elaboró agenda de cooperación 2020-2021 de Empadronamiento.</p> <p>2. Archivo en repositorio de productos mínimos del Censo Experimental que están finalizados.</p> <p>Procesamiento</p> <p>1. Se finalizó los productos mínimos de procesamiento del Censo Experimental.</p> <p>2. Se finalizó el proceso de validación e imputación del Censo Experimental.</p> <p>3. Se elaboró la agenda de cooperación 2020-2021 de Procesamiento.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	04/12/2020 - 03:28 PM
<p>Junio 2020</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	10/11/2020 - 03:00 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se aprobó el protocolo de levantamiento de información en campo por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.</li> <li>2. Sincronización de la información de la jornada 23 desde los dispositivos móviles (tablets).</li> <li>3. Actualización de informe de reinicio de operativo de campo en el formato remitido por DIFI (justificación de contratación de personal civil).</li> </ol> <p>Empadronamiento</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de productos mínimos del Censo Experimental de acuerdo al Modelo de Producción Estadística.</li> <li>2. Elaboración de sintaxis y construcción de principales tabulados e indicadores socio económicos. Ejecución de sintaxis para los 4 cantones del Censo Experimental.</li> <li>3. Revisión de productos de la re ingeniería del proyecto censal.</li> </ol> <p>Procesamiento</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Se continúa con la revisión del plan de validación e imputación.</li> </ol>		
<p>Mayo 2020</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Se elaboró documentos para la actualización de la postulación del proyecto.</li> <li>2.-Se elaboró el protocolo de seguridad institucional en el marco del COVID-19 para el levantamiento de información en campo.</li> </ol> <p>Estrategia para continuación de operativo de campo de Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas.</p> <p>Empadronamiento. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se elaboró el cronograma, presupuesto (requerimientos de personal, bienes y servicios) y documento de planificación del proyecto para el levantamiento censal en el 2021.</li> </ol> <p>Procesamiento. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Finalización del plan de control de cobertura.</li> </ol>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>05/11/2020 - 07:50 PM</p>
<p>Abril 2020</p> <p>Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la reprogramación de las actividades en todas las fases de Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas.</li> <li>2. Se avanzó con el análisis de las propuestas referentes a la actualización cartográfica continua y a la infraestructura de datos espaciales.</li> </ol> <p>Empadronamiento. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó el ajuste de las estimaciones de personas y viviendas para la reingeniería del proyecto censal.</li> <li>2. Se elaboró la matriz de especificaciones técnicas y riesgos para la reingeniería del proyecto censal.</li> </ol> <p>Procesamiento. -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Se continuó con la revisión del plan de control de cobertura.</li> </ol> <p>Hito 41: Actualmente, el personal del proyecto censal está realizando la reprogramación de actividades de acuerdo a la coyuntura nacional e internacional; además; está planteando la propuesta de la reingeniería del proyecto. Si bien el requerimiento de la colaboración del MIDENA tiene que ver con actividades para el empadronamiento, también se plantea su apoyo en la actualización cartográfica en la zona de la frontera norte. En este sentido, las reuniones con dicha institución se van a retomar una vez que se tenga establecida la fecha del reinicio del operativo de campo. Este apoyo se concretaría a través de un convenio específico.</p> <p>Hito 42: El documento del Plan de Capacitación y Sensibilización se encuentra en una versión preliminar y actualmente se encuentra en estado pendiente, hasta que se defina el camino que seguirá el Proyecto Censo de Población y Vivienda.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>03/08/2020 - 05:42 PM</p>
<p>Marzo 2020</p> <p>1. Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas. -</p> <p>Se realizó el operativo de campo de la jornada 23.</p> <p>Se realizaron los reportes de indicadores de calidad de las jornadas 22 y 23.</p> <p>2. Empadronamiento. -</p> <p>Se finalizó el informe de la VIII prueba piloto del cuestionario censal.</p> <p>Se ajustó y envió el requerimiento de áreas de empadronamiento con cambio de metodología.</p> <p>Se elaboró la hoja de ruta para el planteamiento de la re ingeniería del proyecto censal.</p>	<p>Lara Bolaños, Luis Bayardo</p>	<p>07/07/2020 - 06:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Procesamiento. - Se finalizó la codificación automática de cuestionarios censales del Censo Experimental 2019.</p> <p>Febrero 2020</p> <p>1.- Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas.- Se realizó el operativo de campo de la jornada número 22.</p> <p>2.- Empadronamiento.- Se finalizó el informe de la VII prueba piloto del cuestionario censal. Se llevó a cabo la capacitación de funcionarios del INEC y de estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Luis Calero y el operativo de campo de la VIII prueba piloto del cuestionario censal en la parroquia rural Zámbez. Se envió al Ministerio de Educación el Informe de Requerimientos sobre número y disponibilidad de tiempo de docentes y estudiantes para el Censo Nacional.</p> <p>3. Procesamiento.- Se finalizó la codificación asistida de cuestionarios censales del Censo Experimental 2019.</p> <p>4.-Planeación: Informe para presidencia sobre construcción del cuestionario censal aún no se encuentra finalizado, se reportará en la fecha real de ejecución (hito 36)</p> <p>5.- Planeación: Se encuentra pendiente el cuestionario aprobado por Presidencia, documento que será reportado en la fecha real de aprobación (hito 38)</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	05/06/2020 - 12:57 PM
<p>Enero 2020</p> <p>1. Actualización Cartográfica y Precenso de Viviendas: Se realizó la prueba piloto de los formularios Ca04 (sector amanzanado) y Ca06 (sector disperso) para evaluar el levantamiento de la Cédula de Identidad (CI) de otro miembro del hogar diferente al jefe o representante y la eliminación de la variable Código Único Eléctrico Nacional (CUEN) para aumentar las cargas de trabajo de encuestadores.</p> <p>2. Empadronamiento: Se ejecutó la VII Prueba Piloto del Cuestionario Censal para evaluar su contenido y diseño con las modificaciones consensuadas luego del Censo Experimental 2019.</p> <p>3. Procesamiento: Se finalizó la digitación y el control de cobertura de cuestionarios censales del Censo Experimental 2019.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	05/06/2020 - 12:51 PM
<p>1. Planificación técnica financiera del CPV 2020 (PDP)</p> <p>2. Procesamiento de los formularios del Censo Experimental</p> <p>3. Se realizó el levantamiento de información en campo (Actualización Cartográfica) de las jornadas 17 y 18.</p> <p>4. Informe de la estrategia de comunicación del Censo Experimental</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	15/01/2020 - 03:06 PM
<p>Noviembre 2019</p> <p>1. Capacitación a Funcionarios INEC, Profesores y Estudiantes para el Censo Experimental.</p> <p>2. Logística para el Censo Experimental</p> <p>3. Ordenes de servicio en las FF.AA. y Policía Nacional para el operativo del Censo Experimental.</p> <p>4. Ejecución del Censo Experimental el 24 de noviembre en los cantos Pedro Vicente Maldonado, Perto López, Cumanda y Celica, en las áreas amanzadas.</p> <p>5. Recuperación del operativo censal.</p> <p>6. Desarrollo del Censo Experimental en las áreas dispersas.</p> <p>7. Se realizó el levantamiento de información en campo (Actualización Cartográfica) de las jornadas 15 y 16.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	09/12/2019 - 01:01 PM
<p>Octubre 2019</p> <p>1. Generación de Áreas de Empadronamiento para Censo Experimental</p> <p>2. Capacitación y evaluación a formador de instructores e Instructores 1 Y 2</p> <p>3. Entrega de material de capacitación</p> <p>4. Se realizó el levantamiento de información en campo de las jornadas 13 y 14 (Actualización Cartográfica).</p> <p>5. Revisión preliminar del diseño del aplicativo de codificación asistida</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	14/11/2019 - 12:59 PM
<p>Septiembre 2019</p> <p>1. Se realizó el levantamiento de información en campo de las jornadas 11 y 12 (Actualización Cartográfica).</p> <p>2. Se desarrollaron los instructivos de áreas de empadronamiento</p> <p>3. Suscripción de convenios con la Universidad Politécnica del Carchi, ECU 911 y F.F.A.A.</p> <p>4. Manuales para empadronadores, instructores y jefes de área para el Censo experimental</p> <p>5. Construcción del cuestionario censal para el Censo Experimental</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	14/11/2019 - 12:58 PM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1. Se realizó el levantamiento de información en campo de las jornadas 9 y 10 (Actualización Cartográfica)</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	14/11/2019 - 12:57 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Avance en la construcción del sistema de codificación automática y asistida y del sistema de áreas de empadronamiento (Censo Experimental).</p> <p>3. Ajuste en el diseño del operativo de campo del Censo Experimental en función a los resultados de la Actualización Cartográfica 2020. (Censo Experimental).</p> <p>4. Reuniones en mesas temáticas con Organizaciones Sociales, Academia y Organismos Internacionales, además de reuniones internas con la Gerencia del Proyecto y la Dirección Ejecutiva del INEC, para realizar ajustes en el cuestionario censal. (Empadronamiento).</p> <p>5. Elaboración de manuales e instructivos preliminares (Post Censal).</p> <p>6. Se realizó Talleres "Rumbo al Censo 2020" para la construcción del cuestionario censal.</p>		
<p>Julio 2019</p> <p>1.- Reuniones en mesas temáticas (Comisión Especial de Estadística CPV2020) otras reuniones con Organizaciones Sociales, Academia y Organismos Internacionales.</p> <p>2.-Ajuste en el diseño de manuales e instructivos a utilizar en el Censo Experimental.</p> <p>3.-Ajuste al cuestionario censal con observaciones de la piloto y las mesas temáticas Empadronamiento.</p> <p>4.-Avance en la construcción del sistema de codificación automática y asistida Actualización Cartográfica.</p> <p>5.-La Presidencia de la República aprobó el uso del logo Censo independiente a la imagen gubernamental.</p> <p>6.-Se generó el reporte de indicadores de calidad para actualización cartográfica en función de la última actualización de los indicadores solicitada por la gerencia del proyecto.</p> <p>7.-Se trabajó en la propuesta de indicadores de calidad para el censo experimental.</p>	Lara Bolaños, Luis Bayardo	20/08/2019 - 10:34 AM
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Capacitación de Digitalización Cartográfica</li> <li>. Actualización de sectores censales en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</li> <li>. Preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</li> <li>. Cumpliendo con el cronograma establecido de la Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020, se solicitó a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional presenten sus necesidades de información para el análisis de las mismas, además se incluyó solicitudes de varias entidades públicas y privadas, que realizaron oportunamente sus requerimientos, en total se receptaron en total 320 requerimientos.</li> <li>. En base a las observaciones realizadas en la tercera prueba piloto, y a las propuestas presentadas por las instituciones del Sistema Estadístico Nacional, se realizaron reuniones de trabajo interinstitucionales para la definición del cuestionario censal para la IV prueba piloto.</li> <li>. Ejecución de la IV prueba piloto del Cuestionario Censal - en 4 dominios seleccionados en área urbana y rural-. Se evaluaron las variables de discapacidad de acuerdo a recomendaciones internacionales, estado civil o conyugal, reciclaje, mascotas, la nueva metodología de las preguntas de trabajo, otras modificaciones en diseño y contenido; además de tiempos de diligenciamiento.</li> </ul>	Naranjo Orozco, María Lorena	15/07/2019 - 04:43 PM
<p>MAYO 2019</p> <p>1. Reuniones de mesas temáticas (Comisión Especial de Estadística), otras reuniones con Sociedad Civil y Academia para construir el cuestionario</p> <p>2. Reuniones internas para ajustes a los instrumentos censales.</p> <p>3. Ajuste al diseño de manuales conforme se avanza en la construcción del cuestionario</p> <p>4. Se construyeron los manuales de sectores homogéneos para Administración Central Campo y Coordinaciones Zonales</p> <p>5. Criticar e integrar la base de datos de Sectores Revisados en Administración Central Campo y Coordinaciones Zonales</p>	Naranjo Orozco, María Lorena	12/06/2019 - 03:50 PM
<p>ABRIL 2019</p> <p>1. Reuniones de mesas temáticas con instituciones públicas y II Taller de Planificación del Empadronamiento</p> <p>2. Ejecución de la III Prueba Piloto del cuestionario censal</p> <p>3. Preparación de material para campo</p> <p>4. Levantamiento de Campo (Actualización Cartográfica)</p> <p>5. Elaboración de video de lanzamiento, coberturas de las pruebas piloto y de la CEE, Caja de mensajes para Voceros INEC</p> <p>6. Se cuenta con el primer borrador de las actividades del MPE definidas para los cuatros componentes, además se inició con el reporte de los indicadores de calidad para actualización cartográfica, cuyo primeros resultados se generarán en el siguiente mes.</p>	Naranjo Orozco, María Lorena	12/06/2019 - 03:45 PM
<p>MARZO 2019:</p> <p>1. Se realizó la capacitación del personal civil para Actualización cartográfica.</p>	Carrera, Soledad	04/04/2019 - 02:43 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Ajustes al sistema SIPE</p> <p>3. Se remitieron los instrumentos para la capacitación y actualización cartográfica (formulario, manuales, instructivos, videos).</p> <p>4. Preparación de material y generación de tiles (jornada 1).</p> <p>5. Se realizaron talleres internos de definición del cuestionario censal para discusión en la Comisión Especial de Estadística 2020.</p> <p>6. Elaboración de matriz de comparación del cuestionario 2020 con los censos de la Región.</p> <p>7. Planificación y Organización de la III Prueba Piloto, ajuste al cuestionario y documentos de capacitación.</p> <p>8. Elaboración de hoja de ruta, insumos, designación de delegados y funciones para la activación de la Comisión Especial de Estadística 2020 y los grupos temáticos de discusión del cuestionario censal 2020.</p> <p>9. Avance de 43.272 descripciones y códigos ingresados de imágenes del censo 2010 para el sistema de codificación automática y asistida.</p>		
<p><b>FEBRERO 2019:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de Coordinación del CPV para el componente de actualización cartográfica</p> <p>2.- Elaboración y revisión de instrumentos para el componente de actualización cartográfica.</p> <p>3.- Preparación de material para capacitación en actualización cartográfica</p> <p>6.- Se realizó curso a personal técnico del INEC sobre el proceso de actualización cartográfica</p> <p>7.- Capacitación al personal que realizará las actividades de preparación de material para el objetivo Campo</p> <p>7.- Se realizó prueba de funcionalidad del aplicativo para el levantamiento de la información en campo en el cantón Cevallos</p> <p>8.- Se realizó el cuestionario preliminar para la Comisión especial de estadística</p> <p>9.- Se desarrolló el plan de trabajo para la Comisión especial de estadística</p> <p>10. Digitación de los formularios cpv para la codificación automática cpv 2020</p>	Carrera, Soledad	04/04/2019 - 02:43 PM
<p><b>ENERO 2019:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de Coordinación del CPV para el componente de actualización cartográfica</p> <p>2.- Elaboración y revisión de instrumentos para el componente de actualización cartográfica.</p> <p>3.- Se realizaron pruebas al aplicativo del Precenso.</p> <p>4.- Elaboración de Adendum al Plan de Dirección de Proyecto CPV 2020.</p> <p>5.- Preparación de material para capacitación en actualización cartográfica</p> <p>6.- Elaboración del Informe consolidado a nivel nacional de la 2da prueba piloto del cuestionario censal</p> <p>7.- Construcción del Sistema de ingreso de datos de cuestionarios de pruebas piloto</p> <p>8.- Ingreso y base de datos de cuestionarios de 2da prueba piloto</p> <p>9.- Ajuste al cuestionario preliminar para discusión interinstitucional en base a prueba piloto y observaciones de Coordinaciones Zonales.</p> <p>10.- Documentos de planificación: matriz de personal ocasional, matriz de desarrollos informáticos, información para el 1er adendum del proyecto, asignación de responsabilidades, elaboración de matriz de necesidades de espacio físico, revisión y corrección de partidas, objetos de contratación y grupos de gasto.</p> <p>11.- Elaboración de hoja de ruta, mapeo de instituciones, conformación de grupos temáticos, revisión de resolución de la Comisión Especial de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2020.</p> <p>12.- Participación de prueba en campo del formulario del pre censo y en pruebas del sistema informático.</p>	Carrera, Soledad	07/02/2019 - 04:09 PM
<p><b>DICIEMBRE 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 12 cumplido).</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 13 cumplido).</p> <p>4.- Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>5.- Se realizó el plan del proyecto del CPV-2020 para el año 2019.</p> <p>6.- Se realizó la reunión de evaluación y planificación del CPV-2020.</p> <p>7.- Se realizó la prueba piloto del aplicativo de ingreso del precenso en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>8.- Ajuste de coberturas censales a los límites del CONALI, en Administración Central y las Coordinaciones Zonales.</p>	Carrera, Soledad	07/02/2019 - 04:09 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 11 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	03/01/2019 - 11:56 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.-Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>4.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p> <p>5.- Se atiende las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>6.- Se realiza reuniones de seguimiento para revisar el Sistema de Precenso.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2. Informe de avance (Hito 10 cumplido).</p> <p>3.-Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>4.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p> <p>5.- Se atiende las observaciones emitidas por SENPLADES.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	02/12/2018 - 08:45 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 9 cumplido).</p> <p>4.-Se realizó la capacitación del proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central</p> <p>5.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	04/10/2018 - 08:25 AM
<p><b>AGOSTO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 8 cumplido).</p> <p>4.-Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	03/10/2018 - 08:51 AM
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 7 cumplido).</p> <p>4.- Se realizó la prueba piloto del sistema de ingreso en tablets en la ciudad de Santo Domingo</p> <p>5.- Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	04/09/2018 - 02:38 PM
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Informe de avance (Hito 6 cumplido).</p> <p>4.- Se realizo la prueba del formulario para el Censo 2020</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	20/08/2018 - 09:13 AM
<p><b>MAYO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.- Se realizó el 2do adendum del proyecto para realiar la replanificación dle</p> <p>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>4.- Informe de avance (Hito5 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	04/06/2018 - 08:20 AM
<p><b>ABRIL 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020</p> <p>2.- Se realizó el taller de Cartografía para definir metodologías para el proceso de Actualización Cartográfica</p> <p>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica</p> <p>4.- Informe de avance (Hito4 cumplido).</p>		
<p><b>MARZO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para definir las metodologías a desarrollar para la preparación de material para el operativo de campo.</p> <p>2.- Se asistió al taller del Censo 2020 para identificación de necesidades</p> <p>3.- Informe de avance (Hito3 cumplido).</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	27/04/2018 - 08:10 AM
<p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <p>1.- Se realizaron reuniones de trabajo con algunas Instituciones (Agencia de Regulación Postal, Senplades, Instituto Geográfico Militar) con el objetivo de obtener información estandarizadas para el diseño de Cartografía.</p> <p>2.- Se revisó las imágenes satélites de la empresa "Digital Globe" que nos proporcionaron una cuenta de pruebas para poder evaluar estas imágenes para su adquisición.</p>	Meza Moreno, Aldana Geomara	29/03/2018 - 08:49 AM

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Informe de avance del diseño del formulario (Hito 2 cumplido).</p> <p>ENERO 2018:</p> <p>1.- Se realizó el requerimiento inicial par la generación del sistema de ingreso de información.</p> <p>2.- Se mantuvo un taller para planificación y definición de actividades del VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020. (Hito 1 cumplido).</p> <p>3.- Se realizó reuniones de trabajo para la definición del Formulario al año anterior con las áreas de Sociodemográficas y Muestreo.</p> <p>4.- Se realizó la planificación a mas detalle para el proyecto CPV-2020</p>		

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La extensión del período de integración de las bases y el procesamiento causarían retraso en la entrega del informe de la evaluación de la consistencia interna de la base censal	26/10/2023	Ana Lorena Parreño Espinosa	90	90	81	0/1

Problemas cerrados: 13, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 0

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Actas de reuniones realizadas para identificar necesidades y aprobación del Plan de Proyecto.	1-Solicitud de Información	24/01/2018		24/01/2018		Sí	0.21
2	Ejecución: Avance de diseño de formularios Ca-04 y Ca-06.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.16
3	Ejecución: Avance de diseño de documentos metodológicos.	4-Inicio de Trabajo	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.11
4	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - abril	4-Inicio de Trabajo	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.16
5	Ejecución: Reporte de cobertura de investigación en el período de enero a mayo 2018.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.16
6	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - junio	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.21
7	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.16
8	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.16

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.11
10	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.11
11	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.16
12	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre final	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.16
13	Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.16
14	Ejecución: Aplicativo elaborado y entregado (ACT CARTOGRAFICA)	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		17/04/2019		Sí	1.25
15	Ejecución: Documento de metodología censal elaborado (EMPADRONAMIENTO)	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.83
16	Ejecución: Portafolio de imagen gráfica inicial del censo elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		01/04/2019		Sí	1.67
17	Ejecución: Material cartográfico para el operativo de campo preparado (ACT CARTOGRAFICA)	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	2.08
18	Ejecución: Cuestionario preliminar ajustado para encuesta post censal elaborado (POST CENSAL)	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		28/06/2019		Sí	0.83
19	Ejecución: Instrumentos necesarios para el proceso de actualización cartográfica elaborados (ACT CARTOGRÁFICA)	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.67
20	Ejecución: Manuales e instructivos preliminares para encuesta post censal elaborados (POST CENSAL)	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.25
21	Definición: Cuestionario censal para pruebas y censo experimental elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	17/09/2019		26/09/2019		Sí	1.25
22	Definición: Concertaciones interinstitucionales para construir el cuestionario censal realizadas (EMPADRONAMIENTO)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.08
23	Ejecución: Estrategia comunicacional para el censo experimental elaborada (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.67
24	Ejecución: Informes técnicos de pruebas pilotos elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.25
25	Planeación: Documentos para el censo experimental:	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	manuales e instructivos elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)							
26	Planeación: Documentos para el procesamiento: manuales y planes elaborados (POST CENSAL)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.08
27	Ejecución: Documentos para el procesamiento: manuales y planes elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	2.08
28	Ejecución: Material cartográfico (mapas, planos, ca04 y ca06) digitalizados (ACT CARTOGRAFICA)	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.67
29	Ejecución: Base de datos de resultados preliminares aprobada (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	05/12/2019		05/12/2019		Sí	1.67
30	Ejecución: Informes técnicos de prueba piloto elaborados (POST CENSAL)	5-Entregables Intermedios	13/12/2019		13/12/2019		Sí	1.67
31	Definición: Plan de dirección del proyecto CPV 2020 aprobado (periodo 2020)	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.25
32	Ejecución: Información cartográfica y listados de jefes de hogar actualizados (ACT CARTOGRAFICA)	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.67
33	Ejecución: Informe de evaluación de la aplicación del plan de comunicación elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.08
34	Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA)	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.25
35	Ejecución: Operativo de campo año 2020 Planificado (ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA)	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
36	Ejecución: Plan de trabajo VII Operativo Piloto del Cuestionario Censal (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.6
37	Ejecución: Informe técnico del Censo Experimental consolidado (CENSO EXPERIMENTAL)	5-Entregables Intermedios	20/02/2020		20/02/2020		Sí	0.6
38	Ejecución: Plan de trabajo VIII Operativo Piloto del Cuestionario Censal (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	1.0
39	Definición: Diseño y Construcción de Formularios Resumen (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	15/03/2020		15/03/2020		Sí	0.6
40	Ejecución: Matriz de avance, Campo, Revisión, Digitación, Remuneración y	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Digitalización. Jornada 23 elaborada (ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA)							
41	Definición: Ajuste al requerimiento de Áreas de Empadronamiento (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.4
42	Ejecución: Reporte de Evaluación: CPV2020 AL 30 de abril 2020 -Programación Mayo 2020 (DIPLA)	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.6
43	Definición: Elaborar Dashboard de Evaluación al proceso de capacitación del Censo Experimental (Capacitación y Sensibilización)	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
44	Ejecución: Reporte de Evaluación: CPV2020 AL 31 de mayo 2020 -Programación Junio 2020 (DIPLA)	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.8
45	Definición: Estrategia de comunicación ajustada (DICOS)	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.6
46	Definición: Reunión del Consejo Nacional de Estadística y Censos CONEC- Aprobación de reprogramación Proyecto CPV (DIPSEN)	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.6
47	Ejecución: Memoria Técnica del Censo Experimental Consolidado (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	15/07/2020		15/07/2020		Sí	0.8
48	Ejecución:Ficha Metodológica Operación Estadística (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	15/07/2020		15/07/2020		Sí	1.0
49	Cierre: Reporte de Indicadores de Calidad de Censo Experimental (DINCE)	5-Entregables Intermedios	20/08/2020		20/08/2020		Sí	0.6
50	Ejecución: Matriz de Programación jornada 24 (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	20/08/2020		20/08/2020		Sí	0.8
51	Ejecución: Matriz de programación de la jornada 25 (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	10/09/2020		10/09/2020		Sí	0.6
52	Definición: Proceso de Migración e Integración de la base de datos geográfica DICA (DIRAD)	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.4
53	Ejecución: Informe de Supervisión Nacional al proceso de digitalización cartográfica (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.8
54	Ejecución: Matriz de programación de la jornada 27 (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	07/10/2020		07/10/2020		Sí	0.4
55	Cierre: Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica N° J25/ R21 (DINCE)	5-Entregables Intermedios	12/10/2020		12/10/2020		Sí	0.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
56	Cierre: Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica N° J28/ R24 (DINCE)	5-Entregables Intermedios	17/11/2020		26/11/2020		Sí	0.8
57	Ejecución: Informe de Supervisión Nacional al proceso de digitalización cartográfica (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.8
58	Ejecución: Informe para presidencia sobre construcción del cuestionario censal finalizado (DIPSEN)	5-Entregables Intermedios	15/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
59	Ejecución: Formato para asignación de cargas de trabajo para recuperación de viviendas (Logística y Operaciones de Campo )	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.6
60	Definición: Informe Técnico del análisis de la base de datos del Censo Experimental para definir nuevas reglas de codificación en base a la información, revisada (Procesamiento)	9-Entregables Formales	29/01/2021		29/01/2021		Sí	0.61
61	Definición: Plan de indicadores (matriz listado de indicadores a generarse), finalizado (Metodología y Análisis)	9-Entregables Formales	31/01/2021		31/01/2021		Sí	1.53
62	Cierre: Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J31 /R27, aprobado (DINCE)	5-Entregables Intermedios	02/03/2021		02/03/2021		Sí	0.92
63	Definición: Informe de prueba piloto tiempo de entrevista y Áreas de Empadronamiento, elaborado (Empadronamiento)	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.25
64	Ejecución: Matriz de programación Jornada 34, programada (Actualización Cartográfica)	9-Entregables Formales	30/04/2021		30/04/2021		Sí	1.22
65	Ejecución: Campaña de actualización cartográfica de redes/ cuña radial/ batería de mensajes, realizada, (DICOS)	5-Entregables Intermedios	28/05/2021		28/05/2021		Sí	1.53
66	Cierre: Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J36 /R33, aprobado (Dince)	9-Entregables Formales	29/06/2021		29/06/2021		Sí	0.61
67	Definición: Informe mensual de avance de los aplicativos correspondiente al mes de junio, aprobado(DIRAD)	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	1.22
68	Ejecución: Informe final de supervisión zonal y nacional, elaborado (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	05/07/2021		05/07/2021		Sí	0.92
69	Cierre: Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J38 /R35, aprobado(DINCE)	9-Entregables Formales	29/07/2021		29/07/2021		Sí	1.22

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
70	Ejecución: Informe final de supervisión zonal y nacional, elaborado, Jornada 39 (Actualización Cartográfica)	5-Entregables Intermedios	04/08/2021		04/08/2021		Sí	0.92
71	Planeación: Instrumento firmado/Enmienda UNFPA 2021 (DIPLA)	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		17/08/2021		Sí	1.53
72	Ejecución: Matriz de Avance Digitalización, Jornada 41, Cierre (Actualización Cartográfica)	9-Entregables Formales	03/09/2021		03/09/2021		Sí	1.22
73	Definición: Informe mensual de avance de los aplicativos correspondiente al mes de Agosto aprobado(DIRAD)	5-Entregables Intermedios	15/10/2021		15/10/2021		Sí	0.61
74	Ejecución: Documento de finalización y cierre de base precensal, aprobado (Actualización cartográfica)	5-Entregables Intermedios	31/10/2021		31/10/2021		Sí	1.53
75	Cierre: Informe de la reunión de evaluación, aprobado (Actualización cartográfica)	5-Entregables Intermedios	09/11/2021		09/11/2021		Sí	1.22
76	Planeación: Informe del proceso de socialización realizado a los actores involucrados en el desarrollo del cuestionario Censal. (Articulación)	9-Entregables Formales	12/11/2021		18/11/2021		Sí	0.92
77	Planeación: Compilación de informes del proceso de ejecución de la Prueba de campo (Censo Piloto 2021) presentados por los integrantes de la Misión de Observación Censal. (Articulación)	5-Entregables Intermedios	12/12/2021		12/12/2021		Sí	1.22
78	Ejecución: Informe de generación de Base Geográfica Nacional elaborada (Actualización Cartográfica)	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	1.53
79	Cierre: Reporte documentación MPE Actualización cartográfica 9, aprobado CPV_C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad.	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		21/01/2022		Sí	0.57
80	Definición: Informe de la implementación de los aplicativos de los sistemas solicitados y aprobados para el Censo de Población y Vivienda mes de Enero, aprobado CPV_C3. Empadronamiento	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		28/02/2022		Sí	0.36
81	Definición: Informe de la implementación de los aplicativos de los sistemas solicitados y aprobados para el Censo de Población y Vivienda mes de Febrero, aprobado CPV_C3. Empadronamiento	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	0.36
82	Ejecución: Proceso del validación, imputación y tabulación para el Censo	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	0.36

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Piloto, ejecutado CPV_C2. Censo Experimental							
83	Ejecución: Matriz programación jornada crecimientos , aprobada CPV_C1. Actualización Cartográfica y Pre censo de viviendas	5-Entregables Intermedios	15/03/2022		15/03/2022		Sí	0.57
84	Definición: Revisión y actualización del documento de consideraciones de variables del Formulario CPV, elaborado CPV_C3. Empadronamiento	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		30/03/2022		Sí	0.36
85	Cierre: Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (actualización cartográfica) 10, aprobado CPV_C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad.	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.57
86	Planeación: Documentos necesarios para el proceso de adquisición de bienes e inmuebles para procesamiento, elaborado CPV_C3. Empadronamiento	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.36
87	Definición: PPT para los distintos niveles de capacitación, aprobado CPV_C3. Empadronamiento	5-Entregables Intermedios	21/05/2022		21/05/2022		Sí	1.0
88	Definición: Pruebas de algoritmos de codificación con diferentes sets de datos, ejecutado	5-Entregables Intermedios	01/06/2022		30/06/2022		Sí	0.79
89	Definición: Socialización de propuestas metodológicas del indicador de Déficit Habitacional, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.36
90	Definición: Instrumentos de capacitación ajustados a nivel didáctico, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/07/2022		16/09/2022		Sí	1.0
91	Definición: Clasificaciones y nomenclaturas a utilizarse en el Censo Nacional, actualizado	5-Entregables Intermedios	29/07/2022		29/07/2022		Sí	0.36
92	Definición: Manual de procesos y procedimientos entregado	5-Entregables Intermedios	15/08/2022		13/09/2022		Sí	0.57
93	Definición: Informe de cierre bases zonal, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.0
94	Ejecución: Reconocimiento censal	5-Entregables Intermedios	15/09/2022		07/11/2022		Sí	0.36
95	Definición: Revisión técnica de insumos metodológicos/ analíticos para la planificación y ejecución del censo , terminada	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.85
96	Ejecución: Proceso de distribución de material para el reconocimiento censal, elaborado	5-Entregables Intermedios	01/10/2022		05/10/2022		Sí	0.85

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
97	Definición: Ficha de integración del Registro Base de Población noviembre 2022, conforme actualización de la metodología del RBP, desarrollada	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.85
98	Definición: Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (actualización cartográfica) 12, elaborado	5-Entregables Intermedios	01/11/2022		01/11/2022		Sí	0.62
99	Definición: Reporte de indicadores de calidad de censo nacional Nro. 4, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	0.85
100	Cierre: Informe de cierre de actividades nacional y actualización de memoria técnica, finalizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.4
101	Cierre: Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (Censo Nacional) 2, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.85
102	Ejecución: Planeación: Revisión de la batería de indicadores, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.62
103	Definición: Ficha de productos de resultados censales, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		03/02/2023		Sí	0.39
104	Ejecución: Informe de la integración de fuentes de operativos censales elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		16/02/2023		Sí	0.4
105	Cierre: Informe de reporte de indicadores de calidad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.39
106	Ejecución: Informe de generación de insumos analíticos para el diseño del Plan de promoción y difusión de resultados, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		06/03/2023		Sí	0.26
107	Ejecución: Informe de digitación de datos censales a nivel nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.27
108	Ejecución: Informe de justificación para la ejecución de los operativos de control de calidad y cobertura, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		24/02/2023		Sí	0.52
109	Definición: Ficha de integración de REBPE, elaborado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		13/04/2023		Sí	0.39
110	Cierre: Informe de la organización del Empadronamiento nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.52
111	Definición: Informe de acuerdos con las organizaciones de los pueblos afroecuatoriano, montubio, cholo y pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador - etapa 1, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		15/04/2023		Sí	0.39

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
112	Ejecución: Informe de la logística de los operativos de campo del CPV, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		30/09/2023		Sí	0.39
113	Ejecución: Informe de entrega de material censal no diligenciado a nivel de coordinación zonal, elaborado	5-Entregables Intermedios	12/06/2023		15/08/2023		Sí	0.39
114	Definición: Informe de acuerdos con las organizaciones de los pueblos afroecuatoriano, montubio, cholo y pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador - etapa 2, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.39
115	Ejecución: Informe de validación de la información censal con registros administrativos, revisado.	5-Entregables Intermedios	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.39
116	Ejecución: Informe de la socialización y talleres realizados a grupos prioritarios, sector privado y academia, elaborado.	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		07/08/2023		Sí	0.52
117	Ejecución: Publicación de visualizador temático de la primera entrega de información censal, aprobado.	5-Entregables Intermedios	04/08/2023		04/08/2023		Sí	0.39
118	Ejecución: Informe de la primera entrega de los resultados del Censo Nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	21/09/2023		21/09/2023		Sí	0.39
119	Ejecución: Informe de ejecución de validación e imputación de los datos censales, revisado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.65
120	Ejecución: Propuesta de metodología de viviendas con personas ausentes, elaborado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		10/11/2023		Sí	0.35
121	Ejecución: Reporte de cumplimiento de los productos del modelo de producción estadística Censo Nacional, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.34
122	Ejecución: Informe de la evaluación de la consistencia interna de la base censal, revisado.	5-Entregables Intermedios	06/11/2023	06/11/2023			No	0.39
123	Ejecución: Informe de la segunda entrega de los resultados del Censo Nacional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	24/11/2023	24/11/2023			No	0.39
124	Ejecución: Informe de codificación automática y asistida de datos censales	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.39
125	Definición: Publicación de Resultados de omisión censal, aprobado	5-Entregables Intermedios	01/12/2023	01/12/2023			No	0.5
126	Definición: Plan de Validación e imputación censal, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023	15/12/2023			No	0.39
127	Definición: Documento de hipótesis de comportamiento	5-Entregables Intermedios	20/12/2023	20/12/2023			No	0.4

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	futuro de los componentes demográficos, elaborado							
128	Cierre: Informe de sesiones realizadas por el Comité Técnico y de Gestión, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.41
129	Cierre: Reporte de la principales acciones del Censo 2022, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.5

### INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes del avance de empadronamiento realizados		96.00 %	0.125	0.12	01/01/2019	Jul-Sep
2	Porcentaje de informes de avance de la Encuesta post censal realizados		11.54 %	0.52	0.06	01/01/2019	Jul-Sep
3	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto y actividades del proyecto ejecutados		100.00 %	0.15	0.15	01/01/2019	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	84,637,858.21 **
Costo Total:	72,397,330.62
Total Devengado:	81,897,338.64
% Costo Total Devengado:	113.12 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 113.12 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	79,323,608.76	22,228,749.20	0.00	<b>101,552,357.96</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	39,991,177.82	22,228,749.20	0.00	<b>62,219,927.02</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	94,926,271.52	16,821,099.88	0.00	<b>111,747,371.40</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	76,805,398.58	22,228,749.20	0.00	<b>99,034,147.78</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	37,169,629.99	20,131,623.68	0.00	<b>57,301,253.67</b>
<b>Planeado - Codificado (2023)</b>		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	78,576,250.11	22,228,749.20	0.00	<b>100,804,999.31</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	62,409,109.01	19,488,229.63	0.00	<b>81,897,338.64</b>
<b>Pagado Real</b>	31,951,071.65	19,465,572.45	0.00	<b>51,416,644.10</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 62,409,109.01	0.00	0.00	<b>62,409,109.01</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	16,167,141.10	22,228,749.20	0.00	<b>38,395,890.30</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 79.42 %	87.67 %	0.00 %	<b>81.24 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

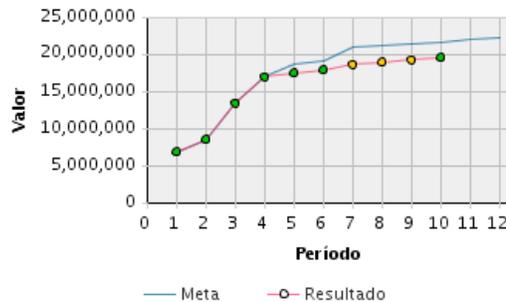

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	6,781,375.00	6,781,375.00	6,781,375.00	6,781,375.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	30.51 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,693,583.59	1,693,583.59	8,474,958.59	8,474,958.59	100.00 %		38.13 %
Mar	4,947,532.24	4,947,532.24	13,422,490.83	13,422,490.83	100.00 %		60.38 %
Abr	3,458,441.19	3,458,441.19	16,880,932.02	16,880,932.02	100.00 %		75.94 %
May	1,710,816.06	526,504.98	18,591,748.08	17,407,437.00	93.63 %		78.31 %
Jun	417,885.23	429,909.45	19,009,633.31	17,837,346.45	93.83 %		80.24 %
Jul	1,849,358.73	708,910.80	20,858,992.04	18,546,257.25	88.91 %		83.43 %
Ago	341,463.47	329,048.37	21,200,455.51	18,875,305.62	89.03 %		84.91 %
Sep	205,644.62	320,106.46	21,406,100.13	19,195,412.08	89.67 %		86.35 %
Oct	200,081.67	292,817.55	21,606,181.80	19,488,229.63	90.20 %		87.67 %
Nov	397,294.70		22,003,476.50				
Dic	225,272.70		22,228,749.20				
<b>Total</b>	<b>22,228,749.20</b>	<b>19,488,229.63</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.
21	OO3. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de Estadísticas Sociodemográficas en los visualizadores.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)	
15	OO11. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de los productos cartográficos que genera el INEC
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)	
14	OO7. Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos.
15	OO8. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las estadísticas agropecuarias y ambientales MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.
16	OO9. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de estadísticas agropecuarias y ambientales en los visualizadores.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)	
6	OO12. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación MEDIANTE la automatización y actualización de procesos de infraestructura estadística
7	OO13. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE el desarrollo de visualizaciones, talleres y webinar sobre la infraestructura estadística.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)	
6	OO10. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación y socialización de la información estadística a partir de registros administrativos que genera el INEC.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Variaciones_logo2_Censo_25_Marzo_2019_HITO16.pdf	14/06/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
2	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	A3.PDF	29/03/2018
3	ASOCIACION HITO 1.- ACTA DE REUNION	A1.pdf	06/03/2018
4	ASOCIACION HITO 2.- INFORME DE AVANCE DEL DISEÑO DEL FORMULARIO	A2.pdf	06/03/2018
5	Asociacion Hito 36 Plan de Trabajo	Hito_36.pdf	03/08/2020
6	Asociacion Hito 37 informe técnico censo experimental consolidado	HITO-37.pdf	09/03/2020
7	Asociacion Hito 38 Plan de Trabajo Operativo Piloto	Hito_38.pdf	03/08/2020
8	ASOCIACION HITO 38 Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA)	Hito_38_ASCAL.pdf	15/01/2020
9	ASOCIACION HITO 38 Ejecución: Procesos y documentación del Modelo de producción estadística identificada (CALIDAD ESTADÍSTICA)	HITO_38_Reporte_N2_MPE_Actualización_Cartográfica.pdf	15/01/2020
10	Asociacion Hito 39 Formularios Resumen	Hito_39.pdf	03/08/2020
11	Asociacion Hito 41 Solicitud de nuevos requerimientos o mejoras	Hito_41.pdf	03/08/2020
12	Asociacion Hito 42 Reporte de Evaluación	Hito_42.pdf	03/08/2020
13	Asociacion Hito 43 Dashboar de Evaluación e Informe	Hito_43...pdf	03/08/2020
14	Asociacion Hito 44 Reporte de Evaluación	Hito_44.pdf	03/08/2020
15	Asociacion Hito 45 Estrategia de Comunicación	Hito_45.pdf	03/08/2020
16	Asociacion Hito 46 Acta Resolutiva CONEC	Hito_46.pdf	03/08/2020
17	Asociacion Hito 47 Memoria Técnica	Hito_47.pdf	06/08/2020
18	Asociacion Hito 48 Síntesis Metodológica	Hito_48.pdf	13/08/2020
19	Asociacion Hito 50 Programación jornada 24	Hito_50.pdf	03/09/2020
20	Asociacion Hito 51 Programación Jornada 25-Ficha Técnica	Hito_51.pdf	22/10/2020
21	Asociacion Hito 53 Informe de Supervisión Nacional al proceso de digitalización cartográfica-Ficha Técnica	Hito_53.pdf	22/10/2020
22	ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	B2.pdf	03/11/2018
23	Asociación Hito 100 - Informe de cierre de actividades nacional y actualización de memoria técnica, finalizado	A100_Hito_100.pdf	17/01/2023
24	Asociación Hito 101 - Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (Censo Nacional) 2, aprobado	A101_Hito_101.pdf	03/01/2023
25	Asociación Hito 102 - Revisión de la batería de indicadores, elaborado	A102_Hito_102.pdf	04/01/2023
26	Asociación Hito 102 - Revisión de la batería de indicadores, elaborado	A102_Hito_102.pdf	04/01/2023
27	Asociación Hito 103 Ficha Técnica- Ficha de productos de resultados censales, elaborada.	A103_Hito_103.pdf	15/05/2023
28	Asociación Hito 104 Informe de la integración de fuentes de operativos censales elaborado-Ficha Técnica	A104_Hito_104.pdf	24/03/2023
29	Asociación Hito 105 Ficha Técnica-Reporte de indicadores de calidad, elaborado y entregado.	A105_Hito_105.pdf	03/05/2023
30	Asociación Hito 106 Ficha Técnica-Informe de generación de insumos analíticos para el diseño del Plan de promoción y difusión de resultados, elaborado	A106_Hito_106.pdf	15/05/2023
31	Asociación Hito 107 Ficha Técnica/ Informe de digitación de datos censales a nivel nacional, elaborado	A107_Hito_107.pdf	11/05/2023
32	Asociación Hito 108 Ficha Técnica-Informe de justificación para la ejecución de los operativos de control de calidad y cobertura, elaborado.	A108_Hito_108.pdf	15/05/2023

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
33	Asociación Hito 109 Ficha Técnica-Informe de acuerdos con las organizaciones de los pueblos afroecuatoriano, montubio, cholo y pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador - etapa 1, elaborado.	A109_Hito_109.pdf	03/05/2023
34	ASOCIACIÓN HITO 11.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	B3.pdf	16/01/2019
35	Asociación Hito 110 Ficha Técnica-Informe de ejecución del Empadronamiento nacional, elaborado.	A110_Hito_110.pdf	15/05/2023
36	Asociación Hito 111 Ficha Técnica-Ficha de integración de REBPE, elaborado.	A111_Hito_111.pdf	20/06/2023
37	Asociación Hito 112 Informe de la logística de los operativos de campo CPV	A112_Hito_112.pdf	06/10/2023
38	Asociación Hito 113 Informe de entrega de material censal no diligenciado a nivel de coordinación zonal, elaborado-Ficha Técnica	A113_Hito_113_compressed.pdf	15/08/2023
39	Asociación Hito 114 Informe de acuerdos con las organizaciones de los pueblos afroecuatoriano, montubio, cholo y pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador - etapa 2 / ficha técnica	A114_Hito_114.pdf	17/07/2023
40	Asociación Hito 115 Ficha Técnica/Informe de validación de la información censal con registros administrativos, revisado.	A115_Hito_115.pdf	31/07/2023
41	Asociación Hito 116 Informe de la socialización y talleres realizados a grupos prioritarios, sector privado y academia, elaborado.-Ficha Técnica	A116_Hito_116.pdf	18/08/2023
42	Asociación Hito 118 Publicación de visualizador temático de la primera entrega de información censal, aprobado.- Ficha Técnica	A118_Hito_118.pdf	28/09/2023
43	Asociación Hito 119 Ficha Técnica-Informe de la primera entrega de los resultados del Censo Nacional, aprobado	A119_Hito_119.pdf	09/11/2023
44	ASOCIACIÓN HITO 12.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	B4.pdf	11/01/2019
45	Asociación Hito 120_ Ficha Técnica y Propuesta de metodología de viviendas con personas ausentes, elaborado	A120_Hito_120.pdf	04/12/2023
46	Asociación Hito 121 Ficha Técnica-Informe de ejecución de validación e imputación de los datos censales, revisado.	A121_Hito_121.pdf	12/10/2023
47	Asociación Hito 121_ Ficha Técnica y Reporte de cumplimiento de los productos del modelo de producción estadística Censo Nacional, aprobado	A121_Hito_121.pdf	30/11/2023
48	ASOCIACIÓN HITO 13.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	B5.pdf	03/01/2019
49	ASOCIACIÓN HITO 14.- Aplicativo elaborado y entregado (ACT CARTOGRAFICA)	B6.HITO_14_APLICATIVO.pdf	28/06/2019
50	ASOCIACIÓN HITO 15.- DOCUMENTO DE METODOLOGÍA CENSAL ELABORADO	B7.HITO_15_METODOLOGIA_CENSAL.rar	28/06/2019
51	ASOCIACIÓN HITO 16.- PORTAFOLIO DE IMAGEN GRAFICA INICIAL DEL CENSO ELABORADO	HITO_16_PORTAFOLIO_DE_IMAGEN_GRAFICA.pdf	07/05/2019
52	ASOCIACIÓN HITO 16.- PORTAFOLIO DE IMAGEN GRAFICA INICIAL DEL CENSO ELABORADO v2	hITO16.rar	14/06/2019
53	ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	Hito_17.pdf	17/06/2019
54	ASOCIACIÓN HITO 17.- INFORME MATERIAL CARTOGRAFICO	HITO_17_MATERIAL_CARTOGRAFICO.pdf	07/05/2019
55	ASOCIACIÓN HITO 18: Cuestionario aprobado ajustado	B9.pdf	16/09/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
56	ASOCIACIÓN HITO 18: Instrumentos necesarios para el proceso de actualización cartográfica elaborados (ACT CARTOGRÁFICA)	C2_.pdf.pdf	05/08/2019
57	ASOCIACIÓN HITO 20: Manuales e instructivos aprobados	C2.pdf	16/09/2019
58	ASOCIACIÓN HITO 21.- Formulario Censo Experimental	Cuestionarios_Censo_Experimental.rar	08/11/2019
59	ASOCIACIÓN HITO 22.- Concertaciones interinstitucionales para construir el cuestionario censal realizadas (EMPADRONAMIENTO)	Concertaciones_Interinstitucionales.rar	08/11/2019
60	ASOCIACIÓN HITO 24.- INFORME DE PRUEBAS PILOTOS DEL CENSO EXPERIMENTAL	CPV2020_ResultadosPruebasPiloto.docx	08/11/2019
61	ASOCIACIÓN HITO 25. Documentos para el censo experimental: manuales e instructivos elaborados (CENSO EXPERIMENTAL)	Manuales_e_Instructivos_Censo_Experimental.rar	08/11/2019
62	ASOCIACIÓN HITO 3.- INFORME DE AVANCE METODOLÓGICO	A4.PDF	24/04/2018
63	ASOCIACIÓN HITO 35 Ejecución: Operativo de campo año 2020 Planificado (ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA)	Informe_prueba_piloto_enero_2020_v2.pdf	13/02/2020
64	ASOCIACIÓN HITO 4.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A5.PDF	09/05/2018
65	Asociación Hito 40,. Jornada 23 elaborada (ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA)	Hito_40.pdf	06/04/2020
66	Asociación Hito 49 Reporte de Indicadores de Calidad de Censo Experimental (DINCE) y Ficha Técnica	Hito_49.pdf	10/11/2020
67	ASOCIACIÓN HITO 5.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A6.pdf	03/07/2018
68	Asociación Hito 52_ Proceso de Migración e Integración de la base de datos geográfica DICA (DIRAD)- Ficha Técnica	Hito_52.pdf	21/10/2020
69	Asociación Hito 55 Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica N° J25/ R21 (DINCE)-Ficha Técnica	Hito_55.pdf	22/10/2020
70	Asociación Hito 56- Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica N° J28/ R24 (DINCE)	Hito_56.pdf	28/11/2020
71	Asociación Hito 57 Informe de Supervisión Nacional al proceso de digitalización cartográfica (Actualización Cartográfica) y Ficha Técnica	Hito_57.pdf	10/12/2020
72	Asociación Hito 58 Informe para presidencia sobre construcción del cuestionario censal finalizado (DIPSEN)-Ficha técnica	Hito_58.pdf	05/01/2021
73	ASOCIACIÓN HITO 6.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A7.PDF	03/08/2018
74	Asociación Hito 60 Ficha Técnica e Informe Técnico del análisis de la base de datos del Censo Experimental para definir nuevas reglas de codificación en base a la información, revisada (Empadronamiento)	Hito_60.pdf	09/02/2021
75	Asociación Hito 61 Plan de indicadores (matriz listado de indicadores a generarse), finalizado-Ficha técnica	Hito_61.pdf	18/02/2021
76	Asociación Hito 62 Informe de prueba piloto tiempo de entrevista y Áreas de Empadronamiento, elaborado - Ficha técnica	Hito_62.pdf	02/07/2021
77	Asociación Hito 63 Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J31 /R27, aprobado-Ficha Técnica	Hito_63.pdf	05/03/2021
78	Asociación Hito 64 Matriz de la Jornada 34 programada (Actualización Cartográfica)-Ficha técnica	Hito_64.pdf	26/08/2021

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
79	Asociación Hito 65 Ficha Técnica y Memorandos de respaldo Campaña de actualización cartográfica en redes / cuña radial / Batería de mensajes, realizada (DICOS)	Hito_65.pdf	27/08/2021
80	Asociación Hito 66 Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J36 /R33, aprobado(DINCE)-Ficha técnica	Hito_66.pdf	26/08/2021
81	Asociación Hito 67 Informe mensual de avance de los aplicativos correspondiente al mes de junio, aprobado(DIRAD)-Ficha técnica	Hito_67.pdf	27/08/2021
82	Asociación Hito 68 Informe final de supervisión zonal y nacional, elaborado (Actualización Cartográfica)-Ficha técnica	Hito_68.pdf	26/08/2021
83	Asociación Hito 69 Reporte de indicadores de calidad de actualización cartográfica Nro. J38 /R35, aprobado(DINCE)-Ficha técnica	Hito_69.pdf	26/08/2021
84	ASOCIACIÓN HITO 7.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A8.pdf	03/08/2018
85	Asociación Hito 70 Informe final de supervisión zonal y nacional, elaborado, Jornada 39 (Actualización Cartográfica)-Ficha técnica	Hito_70.pdf	27/08/2021
86	Asociación Hito 71 Instrumento firmado/Enmienda UNFPA 2021 (DIPLA) y Ficha Técnica	Hito_71.pdf	13/09/2021
87	Asociación Hito 72 Matriz de Avance Digitalización, Jornada 41, Cierre (Actualización Cartográfica)-Ficha técnica	Hito_72.pdf	07/09/2021
88	Asociación Hito 73 Ficha Técnica e Informe mensual de avance de los aplicativos correspondiente al mes de Agosto aprobado(DIRAD)	Hito_73.pdf	10/11/2021
89	Asociación Hito 74 Ficha Técnica y Documento de finalización y cierre de base precensal, aprobado (Actualización cartográfica)	Hito_74.pdf	09/11/2021
90	Asociación Hito 75 Ficha Técnica e Informe de la reunión de evaluación, aprobado (Actualización cartográfica)	Hito_75.pdf	19/11/2021
91	Asociación Hito 76 Ficha Técnica e Informe del proceso de socialización realizado a los actores involucrados en el desarrollo del cuestionario Censal.(Articulación)	Hito_76.pdf	23/12/2021
92	Asociación Hito 77 Ficha Técnica e Informes del proceso de ejecución de la Prueba de campo (Censo Piloto 2021) presentados por los integrantes de la Misión de Observación Censal. (Articulación)	Hito_77.pdf	26/01/2022
93	Asociación Hito 78 Informe de generación de Base Geográfica Nacional elaborada (Actualización Cartográfica)-Ficha Técnica	Hito_78.pdf	20/01/2022
94	Asociación Hito 79 - Reporte documentación MPE Actualización cartográfica 9, aprobado CPV_C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad.	A79_Hito79.rar	23/01/2023
95	ASOCIACIÓN HITO 8.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	A9.PDF	04/10/2018
96	Asociación Hito 82 - Proceso del validación, imputación y tabulación para el Censo Piloto	A82_Hito_82.zip	05/04/2022
97	Asociación Hito 83 - Matriz programación jornada crecimientos	A83_Hito_83.zip	05/04/2022
98	Asociación Hito 84 - Revisión y actualización del documento de consideraciones de variables del Formulario CPV.	A84_Hito_84.zip	05/04/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
99	Asociación Hito 85 - Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (actualización cartográfica) 10	A85_Hito_85..pdf	06/05/2022
100	Asociación Hito 86 - Documentos necesarios para el proceso de adquisición de bienes e inmuebles para procesamiento, elaborado	A86_Hito_86.pdf	09/05/2022
101	Asociación Hito 87 - PPT para los distintos niveles de capacitación.	A87_Hito_87.pdf	02/06/2022
102	Asociación Hito 89 - Pruebas de algoritmos de codificación con diferentes sets de datos.	A89_Hito_89.pdf	06/07/2022
103	ASOCIACIÓN HITO 9.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	B1.PDF	04/10/2018
104	Asociación Hito 90 - Socialización de propuestas metodológicas del indicador de Déficit Habitacional	A90_Hito_90.pdf	07/07/2022
105	Asociación Hito 91 - Instrumentos de capacitación ajustados a nivel didáctico, aprobado	A91_Hito_91.pdf	22/09/2022
106	Asociación Hito 92 - Clasificaciones y nomenclaturas a utilizarse en el Censo Nacional, actualizado	A92_Hito_92.pdf	05/08/2022
107	Asociación Hito 93 - Manual de procesos y procedimientos entregado CPV	A93_Hito_93.pdf	14/09/2022
108	Asociación Hito 94 - Informe de cierre bases zonal, aprobado	A94_Hito_94.pdf	07/09/2022
109	Asociación Hito 94 - Reconocimiento censal	A94_Hito_94.pdf	14/11/2022
110	Asociación Hito 95 - Proceso de distribución de material para el reconocimiento censal, elaborado	A95_Hito_95.pdf	07/10/2022
111	Asociación Hito 96 - Revisión técnica de insumos metodológicos/analíticos para la planificación y ejecución del censo , terminado	A96_Hito_96.pdf	07/10/2022
112	Asociación Hito 97 - Ficha de integración del Registro Base de Población noviembre 2022, conforme actualización de la metodología del RBP, desarrollada	A97_Hito_97.pdf	02/11/2022
113	Asociación Hito 98 - Reporte de cumplimiento a productos del modelo de producción estadística (actualización cartográfica) 12, elaborado	A98_Hito_98.pdf	01/11/2022
114	Asociación Hito 99 - Reporte de indicadores de calidad de censo nacional Nro. 4, aprobado	A99_Hito_99.pdf	07/12/2022
115	Asociación Hito_59 Formato para asignación de cargas de trabajo para recuperación de viviendas (Logística y Operaciones de Campo ) y Ficha Técnica	Hito_59.pdf	07/01/2021
116	Asociación Hito 81 - Informe de la implementación de los aplicativos de los sistemas solicitados y aprobados para el Censo de Población y Vivienda mes de Febrero	A81_Hito_81.zip	05/04/2022
117	Asociación Hito 54_ Matriz de programación de la jornada 27 y Ficha Técnica	Hito_54.pdf	26/10/2020
118	Dictamen de Prioridad del Proyecto CPV	Dictamen_de_prioridad_Proyecto_CPV.pdf	06/02/2019
119	Expediente de Actualización de Hitos - Proyecto CPV - Abril 2023	Exp_Actualización_Hitos_Proyecto_CPV_Abril_2023.pdf	25/04/2023
120	Expediente de Reestructura de Hitos - Proyecto CPV	Exp_Reestructura_Hitos_Proyecto_CPV.rar	13/10/2022
121	Expediente de Reestructura de Hitos - Proyecto CPV - 2023	Exp_Reestructura_Hitos_Proyecto_CPV_2023.rar	19/01/2023
122	Expediente de Reestructura de Hitos - Proyecto CPV Noviembre	Exp_Reestructura_hitos_CPV_2023.rar	28/11/2023
123	Expediente de Reestructura de Hitos- Proyecto CPV	Exp_Reestructura_de_hitos_Proyecto_CPV.pdf	25/08/2021
124	Expediente de Reestructura del Proyecto CPV 2020	Exp_Reestruct_proyecto_CPV.pdf	06/02/2019
125	GP001_PA001_Informe Sobre la Reestructura Presupuestaria	GP001_PA001.pdf	07/07/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
126	GP002_PA001_Memorandos	GP002_PA001.pdf	07/07/2020
127	GP003_PA001_Resolución Extraordinaria CONEC	GP003_PA001.pdf	08/06/2020
128	GP005_PA001_ Reprogramación de actividades /ficha técnica	GP005_PA001.pdf	09/07/2021
129	GP005_PA001_Ficha Técnica Gestión de Problemas/ Anexos	GP005_PA001.pdf	09/11/2023
130	GP006_PA001 Informe de prueba piloto tiempo de entrevista y Áreas de Empadronamiento, elaborado	GP006_PA001.pdf	08/04/2021
131	GP007_PA001_Ficha Técnica Gestión de Problemas/ Anexos	GP007_PA001.pdf	28/04/2023
132	GP008_PA001_Ficha Técnica Gestión de Problemas/ Anexos	GP008_PA001.rar	04/05/2023
133	GP08_PA001_Ficha Técnica Gestión de Riesgos/ Informe	GP08_PA001.pdf	06/10/2023
134	GP_001_PA001_Informe de Avance Sistemas Informáticos CPV Enero	GP_001_PA_001.rar	16/12/2022
135	GPROB_002_PA001_Actas de aprobación de manuales de capacitación.	GPROB02_001.pdf	22/09/2022
136	GPROB_003_PA001_Comunicar oficialmente el inicio del reconocimiento censal	GPROB03_001.pdf	14/11/2022
137	GR001_PA001_Memorando de aprobación III Adendum	GR001_PA001.pdf	07/07/2020
138	GR002_PA001_Ficha Técnica Gestión de Riesgos/ Anexos	GR002_PA001.pdf	12/04/2023
139	GR004_PA001_Ficha Técnica Gestión de Problemas/ Informe de reprogramación de jornadas/ Matriz de la jornada 34	GP004_PA001.pdf	19/05/2021
140	GR004_SPA_Ficha Técnica Gestión de Riesgos	GR004_SPA.pdf	08/01/2021
141	GR004_SPA_Ficha Técnica Gestión de Riesgos	GR004_SPA..pdf	12/08/2021
142	GR006_SPA_Ficha Técnica Gestión de Riesgos	GR006_SPA.pdf	12/11/2020
143	GR007_PA001_Ficha Técnica Gestión de Riesgos/ Anexos	GR007_PA001.pdf	26/01/2022
144	HITO 23 INFORME DE ACCIONES COMUNICACIONALES CENSO EXPERIMENTAL	INFORME_DE_ACCIONES_COMUNICACIONALES_CENSO_EXPERIMENTAL_SEPTIEMBRE	
145	Hito 26 ficha	hito_26.pdf	15/11/2019
146	hito 26 formulario	Formulario_Post_censal.pdf	15/11/2019
147	hito 26 Manual del encuestador	Manual_del_Encuestador_EPC-2020_Preliminar_(2).pdf	15/11/2019
148	Hito 29_Informe Base de datos de resultados preliminares	Informe_bbd_resultados_preliminares.pdf	14/01/2020
149	HITO 30 Ejecución: Informes técnicos de prueba piloto elaborados (POST CENSAL)	HITO_30__Informes_técnicos_de_prueba_piloto_elaborados_POST_CENSAL.docx	15/01/2020
150	HITO 32: Plan de dirección del proyecto CPV 2020 aprobado (periodo 2020)	INEC-INEC-2020-0003-M_H_32.pdf	11/01/2020
151	HITO 36 Ejecución: Informe de evaluación de la aplicación del plan de comunicación elaborado (CENSO EXPERIMENTAL)	HITO_36_Informe_de_evaluación_estrategia_de_difusión_censo_experimental.docx	15/01/2020
152	REEST_HITOS_CPV_JUL2020	SOL_AUT_JUS_PR.pdf	04/08/2020
153	Reestructuración de Hitos 1	INEC-SUGEN-2020-0020-M_Solicitud.pdf	07/02/2020
154	Reestructuración de Hitos 2	INEC-INEC-2020-0044-M_Autorización.pdf	07/02/2020
155	Reestructuración de Hitos 3	Ficha_técnica_GPR_reestructuración_de_Hitos.pdf	07/02/2020
156	Reestructuración de Hitos 3	Ficha_técnica_GPR_reestructuración_de_Hitos.pdf	18/01/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lara Bolaños, Luis Bayardo	Líder del Proyecto	Gerente del Proyecto CPV	Luis_Lara@inec.gob.ec	
Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	Miembro de Equipo	Jefa de la Unidad de gestión de estadísticas estructurales, sociales y demográficas	cecilia_valdivia@inec.gob.ec	
