

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K012 Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

Líder del Proyecto:	Pinto Aguirre, José Bernardo (jose_pinto@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.388017	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	7	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,803,111.75
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/10/2022 - 31/12/2026
Fecha de última actualización:	19/09/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2026
Modificado por:	Pinto Aguirre, José Bernardo	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2023

[Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales](#)

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base

Beneficios Cualitativos

del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - dic 2026

Presupuesto: \$ 23.515.045,48


Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 25.34 %

Fecha de Inicio: 15/10/2022

Fecha de Fin: 31/12/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

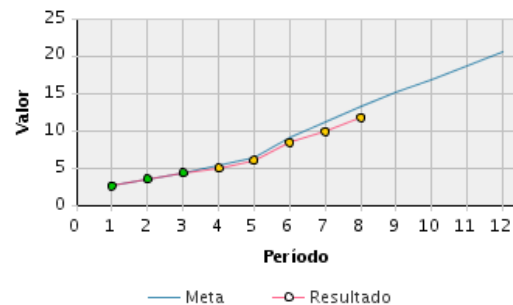

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	3 %	4 %	4 %	5 %	6 %	9 %	11 %	13 %	15 %	17 %	19 %	21 %
	Avance real acumulado											
	3 %	4 %	4 %	5 %	6 %	8 %	10 %	12 %				
	Estado											
	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2023	Pinto Aguirre,	12/09/2023 -
C1: ENIGHUR	José Bernardo	12:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Formularios Finales elaborados (HITO 52 CUMPLIDO) Los formularios finales se encuentran elaborados, tras actualización de los formularios de la ENIGHUR del 2012, solicitudes y requerimientos de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Económicas y Productivas, reuniones y definiciones técnicas y asesoramiento de consultora internacional (CEPAL). Estos formularios han sido validados en la prueba experimental de metodología e instrumentos de la ENIGHUR de julio 2023 *Manual de actualización cartográfica diseñado (HITO 57 CUMPLIDO) Se mantuvo reuniones con el equipo de trabajo para realizar la actualización del Manual de actualización cartográfica diseñado para la encuesta ENIGHUR *Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos elaborado (HITO 61 CUMPLIDO) Se elaboraron los informes de la Prueba Piloto de metodología y de instrumentos de la ENIGHUR, recopilando todas las novedades presentadas a nivel nacional C2: ENCIET *Manual de Cartografía de la ENCIET 2023 actualizado (HITO 58 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del encuestador con la cartografía actualizada de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo *Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado (HITO 62 CUMPLIDO) Se elaboró la Ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo correspondiente al avance del mes de julio 2023 *Metodología ENCIET avance julio 2023 elaborado (HITO 63 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo correspondiente al avance del mes de julio 2023 C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023) elaborado (HITO 53 CUMPLIDO) Se construyó el informe de evaluación del proceso de producción de la operación estadística correspondiente al primer semestre del 2023 cuyo fin es evaluar cada una de las fases del Modelo de Producción Estadística del Cambio de Año Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) en el periodo enero - junio 2023 *Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido (HITO 64 CUMPLIDO) Se trabajó en la solicitud de asistencias técnicas por parte del Fondo Monetario Internacional-FMI, en donde se construyó un TDR y se ha mantenido reuniones con los delegados del FMI C5: ESPAC *Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental (HITO 59 CUMPLIDO) C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS * RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas (HITO 60 CUMPLIDO) 1. Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Matrimonios (estandarización y precisión) 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Divorcios (estandarización y precisión) 3. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Matrimonios 4. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Divorcios 5. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Matrimonios 6. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Divorcios C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado (HITO 54 CUMPLIDO) *Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado (HITO 55 CUMPLIDO) Se coordinó la entrega de información sobre las gestiones realizadas en el Gabinete de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad, para el cierre de éstos espacios, que fueron puestos en garantía de la ejecución del Censo de Población y Vivienda. Esta información fue facilitada por la Coordinación de Planificación, Normativas y Calidad Estadística, instancia que representó al INEC en este espacio de articulación interinstitucional *Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado (HITO 56 CUMPLIDO) Mediante la gestión de salvaguardas ambientales y sociales, se diseñó 4 cuestionarios para el levantamiento de la información y evidencia necesaria sobre la aplicación de los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) aplicables en el Proyecto, específicamente lo que respecta la aplicación del instrumento ambiental y social respectivo (A&S)		
JUNIO 2023 C1: ENIGHUR Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0494-M de 16 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C1 *Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas (HITO 36 CUMPLIDO) Tras las reuniones bilaterales que se mantuvieron con las Instituciones que forman parte de la Comisión Especial de Cuentas Económicas y Productivas, se elaboraron actas como constancia del trabajo interinstitucional que se realizó en torno de la ENIGHUR 2024 - 2025.	Pinto Aguirre, José Bernardo	12/09/2023 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado (HITO 40 CUMPLIDO) Se trabajó en la actualización de los formularios de recolección de información para levantamiento de campo de la ENIGHUR, con base a la información recolectada en la Comisión de Cuentas Económicas y Productivas, con base a la Nueva Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y diferentes revisiones del equipo técnico y directivo de la ENIGHUR y autoridades competentes. C2: ENCIET Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0460-M de 08 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C2 *Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado (HITO 44 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado (HITO 45 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados (HITO 46 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 47 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 48 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023 C3: CAB-SIPP Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0489-M de 15 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C3 *Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 49 CUMPLIDO) Se elaboró el cronograma para la investigación en campo del CAB-SIPP C5: ESPAC Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0498-M de 19 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C5 *Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 50 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del Encuestador, Supervisor, y Digitador para la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental *Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado (HITO 52 CUMPLIDO) Se prepara, y aprueba el Plan de validación para el Proyecto Robustecimiento C5- ESPAC 2023 impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (11%) construido (HITO 27 CUMPLIDO) Desarrollo de componentes de difusión, creación de tablas y campos con base al diseño. Establecimiento de formatos y medios de presentación. Creación de algunos componentes de difusión en Power BI. *RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas (HITO 29 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Cedulados y Discapacidades (estandarización y precisión). Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Personal de Equipo Coordinador contratado (HITO 51 CUMPLIDO) Proceso administrativo de solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria. Elaboración revisión y aprobación de Informes. Memorandos de solicitud de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de Consultor/a Individual Coordinador, Especialistas y Analistas de PMU.		
MAYO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR ** Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborados (HITO 36 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que el hito Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, está planificado para trabajar desde en las fechas del 1/08/2023 al 15/09/2023 ** Manuales metodológicos para recolección en campo elaborados (HITO 38 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la elaboración del Manual del Encuestador para las fechas del 1/08/2023 al 31/08/2023 ** Formularios a utilizarse en el operativo probados (HITO 39 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la aprobación de los Formularios Finales para las fechas del 21/08/2023 al 31/08/2023 *Componente N° 2: ENCIET	Pinto Aguirre, José Bernardo	19/07/2023 - 12:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
**1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance mayo 2023 elaborado (HITO 41 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual al 100% **2.3_Formulariode recolección de información mayo 2023 diseñado (HITO 42 CUMPLIDO) Diseñar el Formulario de recolección de información del mes de mayo 2023 *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado (HITO 43 CUMPLIDO) Se realizó la investigación de metodologías del Índice de Precios al Productor de países de la región Latinoamericana para la elaboración de una propuesta que concilie criterios metodológicos y técnicos para el proceso de cambio de año base del IPP en Ecuador **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en mayo 2023, elaborado (HITO 44 NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador del Proyecto de Robustecimiento, no se pudo realizar el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023) por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos, esta actividad se traslada a julio de 2023. *Componente N° 5: Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC **Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 37 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe de entrega de la selección de la muestra para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental (HITO 40 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo MA actualizado para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Reporte de avance de adquisiciones elaborado (HITO 35 CUMPLIDO) 1. Revisión de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación 3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos 5. Elaboración de Reporte de avance de adquisiciones		
ABRIL 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR **Formulario para la recolección de información diseñad (HITO 29 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció el hito Diseñar manuales e instructivos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 - Formulario para la recolección de información diseñado, se lo va a diseñar en las fechas del 15/05/2023 al 31/05/2023. **Muestra en espacio y tiempo diseñada (HITO 33 - NO CUMPLIDO) Por cambio en las fechas de cierre de la etapa de empadronamiento del CPV, aún no se cuenta con el Marco Muestral, que servirá para el diseño de muestra en espacio y tiempo. En torno a la reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que la muestra estará disponible para el 31/08/2023. *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance abril 2023 elaborado (HITO 30 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en abril 2023, elaborado (HITO 31 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha realizado el	Pinto Aguirre, José Bernardo	13/06/2023 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta actividad se traslada a julio de 2023). **Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías suscrito (HITO 32 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone financiamiento, no se ha podido iniciar los procesos para la cooperación interinstitucional (Asistencia Técnica con CEPAL); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta Hito se traslada a julio de 2023). *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 34 - CUMPLIDO) **Plan de mejora con DIGERCIC elaborado 1. Selección y revisión de Fuentes Bibliográficas (Modelos de Plan de Mejora y Metodología para el diagnóstico de calidad de los datos) 2. Planteamiento de los objetivos del Plan de mejoras. 3. Definición de las Actuaciones, Recursos, Tiempo y Metodología de trabajo. 4. Evaluación del Registro de Cedulados a nivel de microdato, para los indicadores de Validez, Completitud y Comparabilidad. 5. Redacción del documento. *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado (HITO 27 - NO CUMPLIDO) No se cumple con el hito debido a proceso de Terminación de Mutuo Acuerdo a los Contratos de los Consultores Individuales de: Especialista en Monitoreo y Evaluación Código No. EC-INEC-322167-CS-IND y del Especialista en Gestión Financiera Código No. EC-INEC-321907-CS-IND, lo cual ha retrasado en el normal desenvolvimiento de las actividades del Componente 7. **Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado (HITO 28 - CUMPLIDO) 1. Análisis del Plan de Seguridad para el Censo de Población y Vivienda, instrumento social y ambiental A&S del EAS 4 sobre salud y seguridad del Marco Ambiental y Social MAS. 2. Elaboración del cuestionario para levantamiento de acciones y evidencia para el cumplimiento del "EAS 4", Análisis de respuestas y elaboración del Especialista Social y Amb		
MARZO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR (HITO 21 CUMPLIDO) **Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 21 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 21 se ha identificado el problema: Se realizó la actualización del cronograma de planificación por la determinación de la fecha de la entrega de la muestra por parte de DIMEN, por lo que se ajustó la fecha del inicio del operativo y la entrega del verificable del documento metodológico de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 estará para el 30 de junio de 2023. *Componente N° 2: ENCIET (HITO 22 e HITO 23 CUMPLIDO) **1.4 Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance marzo 2023 elaborado (HITO 22 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Delimitación de la operación Estadística. **2.1 Correo electrónico control y acceso informació confidencial marzo 2022 informado (HITO 23 CUMPLIDO) Identificar los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en el proceso de producción estadística *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Manuales de recolección/capacitación aprobados (HITO 24 CUMPLIDO) 1. Se elaboró, los manuales de recolección de la operación estadística: supervisor e investigador de campo; así como, manual del analista y cálculo. 2. Se elaboró, el manual del plan de capacitación. **Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 25 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 25 se ha identificado el problema: Desfinanciamiento del componente 3; actualmente se está realizando el proceso para la reprogramación de actividades e Hitos. Por ende, la entrega del verificable del Hito 25 "Cronograma de investigación de la OE, elaborado" se traslada para reportarse en junio del 2023. *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 26 CUMPLIDO) **Documento de escenarios de transferencia trabajados	Pinto Aguirre, José Bernardo	05/05/2023 - 02:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Revisión de la metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos (Documento interno INEC) 2. Revisión de convenios que mantiene el INEC con otras instituciones 3. Revisión y actualización de medios y modos de transferencia 4. Redacción del documento del informe de diseño de medios y modos de transferencia 5. Envío del documento para revisión y aprobación *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (HITO 20 CUMPLIDO) **Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado Para proceder a determinar el flujo de desembolsos su utilizó como insumo la PAP del proyecto, en la cual se identifican las necesidades tanto presentes como futuras, cabe mencionar que se realizó un adelanto del desembolso sobre la base de la temporalidad, debido a que previo a iniciar un proceso de contratación es necesario contar con la respectiva certificación presupuestaria, de conformidad con la normativa legal vigente.		
FEBRERO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR **Manuales y programación de trabajo en campo elaborados (HITO 14 CUMPLIDO) Se elaboró el calendario ENIGHUR 2023 que se seguirá para el levantamiento de la información en campo. De la misma manera se actualizó el manual del Supervisor por el equipo técnico de ENIGHUR, el cual servirá para monitorear al equipo de recolección de campo. *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023 elaborado (HITO 15 CUMPLIDO) Diseñar los objetivos de la Operación Estadística como parte de la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. **2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023 diseñado (HITO 16 CUMPLIDO) Determinar los métodos para la recolección de información como parte del Manual del encuestador de la operación Estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito (HITO 17 CUMPLIDO) 1. Se realizó reuniones con los responsables de DIRAD para la definición y desarrollo del requerimiento para la construcción del Sistema Informático del CAB-SIPP. 2. Se elaboró y entregó la matriz de historias de usuarios a DIRAD para la construcción y desarrollo del Sistema Informático para la producción del CAB-SIPP. **Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado (HITO 18 CUMPLIDO) 1. Se realizó la revisión del actual formulario de levantamiento de precios del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), y se identificó mejoras que han sido incluidas en la construcción del formulario de recolección de precios del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). *Componente N° 5: ESPAC Con Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0147-M de 01 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo, Subrogante, autorizó la actualización en el cronograma de actividades del Proyecto de Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC Componente 5", que incorporan el módulo ambiental en los instrumentos de recolección de la ESPAC 2023. *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados (HITO 19 CUMPLIDO) 1. Actualización de los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI, con respecto a las observaciones emitidas desde las distintas áreas de la DINARP 2. Envío de los informes de excepcionalidad, incluida la matriz de variables y conceptos disponibles de las instituciones (IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI), para su correspondiente revisión y aprobación 3. Seguimiento a los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada (HITO 13 CUMPLIDO) *Revisar en conjunto con DIPLA los instrumentos que el INEC ejecuta el proceso de seguimiento y control de planes, programas y proyectos a nivel institucional. *Definir los informes de seguimiento y evaluación que se elaborarán durante el proyecto, describiendo la audiencia, el contenido y los plazos; la principal fuente de datos para alimentar las actividades de seguimiento y evaluación; la estructura de las bases de datos para integrar	Pinto Aguirre, José Bernardo	06/04/2023 - 04:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la información; el cuadro de mando para seguir el progreso, las funciones de los miembros del equipo del PMU y de los directores del INEC en el proyecto, etc. *Establecer los niveles en los que centrará el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto a diferentes niveles. Nivel 1) indicadores del proyecto DOP; 2) indicadores intermedios o de resultados y 3) indicadores de productos y actividades.		
ENERO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR **Requerimientos y necesidades institucionales identificadas (HITO 6 CUMPLIDO) Se mantuvo una primera reunión con la analista de Planificación del Sistema Estadístico Nacional, para previamente mapear las Instituciones que deberían activarse en la comisión interinstitucional. Seguido se pidió por memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0029-M, la Reunión para definición de la comisión Interinstitucional y finalmente mediante correo electrónico, se pide la activación de la comisión Interinstitucional con las entidades previamente mapeadas entre el equipo DIES y DIPSEN. *Componente N° 2: ENCIET **Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance enero 2023 elaborado (HITO 7 CUMPLIDO) Se diseñó la Historia de la Operación estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET 2023-2024, como parte de la metodología de la operación estadística. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado (HITO 8 CUMPLIDO) Se realizó las gestiones pertinentes, con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA); con los especialistas de adquisiciones del Proyecto de Robustecimiento; así como, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de conocer los mecanismos para recibir las asesorías técnicas de organismos internacionales para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor. Se elaboró el informe de avance para el desarrollo de los instrumentos de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías. **Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado (HITO 9 CUMPLIDO) Se revisó y analizó la Ley estadística, la Ley de Defensa al Consumidor, el Estatuto Orgánico INEC y otra normativa que ampara la producción de la operación estadística Cambio de Bases del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). Se elaboró el Informe de revisión de instrumentos normativos para el desarrollo del CAB-SIPP. *Componente N° 5: ESPAC **Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023 preparado (HITO 5 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado (HITO 10 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos digitalizadas de la ESPAC 2022 **Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado (HITO 11 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos provinciales de la ESPAC 2022 *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Ficha de indicadores y variables identificadas (HITO 12 CUMPLIDO) 1. Elección de las Fuentes Administrativas 2. Clasificación de cada Registro Administrativo, en base a la propuesta Metodológica para la construcción del REBPE, de acuerdo a las categorías de utilidad (Stock, Entradas, Salidas, Temático). 3. Detalle de las variables que aportan al REBPE con el nombre y la descripción, para clasificarlas de acuerdo al propósito, ya sea de identificación, demográfico, de ubicación o técnico. *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Personal del proyecto capacitado (HITO 13 CUMPLIDO) Preparar una presentación en Microsoft PowerPoint acerca el "Marco Ambiental y Social (MAS)" y capacitar al personal INEC, llevada a cabo por parte del Especialista Social y Ambiental de Banco Mundial.	Pinto Aguirre, José Bernardo	13/03/2023 - 12:45 PM
DICIEMBRE 2022	Pinto Aguirre, José Bernardo	09/02/2023 - 10:11 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado (HITO 4 CUMPLIDO) Monitoreo y seguimiento de las actividades ejecutadas para la elaboración del Informe de Monitoreo de ejecución Proyecto al 2022.		
DICIEMBRE 2022 Especialista de proyecto contratado (HITO 3 CUMPLIDO) Se realizó el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto y los 5 Especialistas de Proyecto conforme los requerimientos del Banco Mundial para la contratación de Consultores Individuales que cumplan con el perfil de: 1)Consultor Coordinador de Proyecto signado con Código: SDO N. °: EC-INEC-322186-CS-IND. 2)Especialista en Monitoreo y Evaluación signado con Código: EC-INEC-322167-CS-INDV, 3)Especialista Técnico signado con Código: EC-INEC-322161-CS-INDV, 4)Especialista en Salvaguardas signado con Código: EC-INEC-322164-CS-INDV, 5)Especialista en Gestión Financiera signado con Código: EC-INEC-321907-CS-INDV, y 6)Especialista de Adquisiciones signado con Código: EC-INEC-321908-CS-INDV.	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:38 AM
NOVIEMBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1084-M, de fecha 09 de noviembre de 2022, "Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C7 -Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto" 2022".	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:37 AM
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del personal del Banco Mundial conforme correo institucional de confirmación en la No objeción al Plan de Adquisiciones enviado por INEC para Ecuador - P178564 - Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project de fecha 28 de octubre de 2022.	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:36 AM
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX	Pinto Aguirre, José Bernardo	29/12/2022 - 01:11 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
El incumplimiento de hitos de los componentes del Proyecto	14/06/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La no suscripción de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP CAUSARÍA que las Operaciones Estadísticas no aprovechen la información para mejorar la calidad de los datos.	10/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	50 %	90	45	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto CAUSARIA la demora en el desembolso de los recursos financieros del proyecto	10/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	50 %	80	40	0/1
5- PROYECTO. Calidad. La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento CAUSARÍA dificultades en la construcción y generación del Índice de Precios al Productor e Índice de Exportación del CAB-SIPP.	09/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	40 %	80	32	0/1
5- PROYECTO. Técnico. Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la prueba piloto de la encuesta en el año 2023 CAUSARÍA que no se cuente con los instrumentos de recolección actualizados para el operativo de campo.	09/02/2023	Estefania Jacqueline Encalada Sandoval	30 %	100	30	0/1
5- PROYECTO. Técnico. Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional CAUSARÍA que no se cuente con la metodología diseñada en base a las recomendaciones de estadísticas laborales de forma oportuna.	09/02/2023	Estefania Jacqueline Encalada Sandoval	30 %	100	30	0/1
5- PROYECTO. * General. La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa CAUSARÍA el incumplimiento a los acuerdos financieros del proyecto	10/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	30 %	40	12	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. El conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías CAUSARÍA el retraso en la implementación y generación de productos estadísticos basados en registros administrativos.	10/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	20 %	40	8	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad CAUSARÍA la obtención de información errónea de la encuesta.	09/02/2023	Edwin Patricio Rivas Villalba	10 %	80	8	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. La demora en la adquisición de Tablets CAUSARÍA un desplazamiento en el inicio del operativo de campo para la ejecución de la encuesta.	09/02/2023	Edwin Patricio Rivas Villalba	10 %	80	8	0/1
5- PROYECTO. Calidad. La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse CAUSARÍA la pérdida de representatividad del CAB-SIPP.	09/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	50	5	0/1
5- PROYECTO. * General.	09/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	30	3	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista CAUSARÍA una sobrestimación de datos y baja calidad de los datos de la operación estadística						
5- PROYECTO. * General. El rechazo de las personas productoras para entregar información CAUSARÍA que los formularios no cuenten con datos confiables.	09/02/2023	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	20	2	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 12

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	28/10/2022		09/11/2022		Sí	0.31
2	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Adquisiciones aprobado	4-Inicio de Trabajo	01/11/2022		28/10/2022		Sí	0.19
3	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Especialista de proyecto contratados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		12/12/2022		Sí	0.31
4	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico/ administrativo-financiero aprobado	4-Inicio de Trabajo	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.19
5	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.45
6	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.34
7	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PLANEACIÓN: Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.07
8	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN:	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance enero_2023_elaborado							
9	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.14
10	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.09
11	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Ficha de indicadores y variables identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.37
12	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal del proyecto capacitado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.06
13	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: DEFINICIÓN: Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	5-Entregables Intermedios	15/02/2023		15/02/2023		Sí	0.11
14	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.05
15	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.06
16	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.05
17	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.19
18	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.14
19	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.37
20	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	03/03/2023		03/03/2023		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del responsable zonal elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	0.04
22	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Correo electrónico control y acceso información confidencial marzo 2023 solicitado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.06
23	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance marzo 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.05
24	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección/capacitación aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.27
25	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Documento de escenarios de transferencia trabajados	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.28
26	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		15/04/2023		Sí	0.08
27	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/04/2023		16/04/2023		Sí	0.08
28	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información borrador elaborado	5-Entregables Intermedios	28/04/2023	28/04/2023			No	0.09
29	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos diseñada	5-Entregables Intermedios	28/04/2023	28/04/2023			No	0.2
30	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023		30/04/2023		Sí	0.47
31	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones abril 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	01/05/2023		01/05/2023		Sí	0.03
32	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado	5-Entregables Intermedios	25/05/2023		25/05/2023		Sí	0.09
33	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	29/05/2023		29/05/2023		Sí	0.23
34	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
35	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de variables elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023			No	0.04
36	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance mayo_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.07
37	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.2
38	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador junio_2023_avance_elaborado	5-Entregables Intermedios	16/06/2023		16/06/2023		Sí	0.07
39	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	0.06
40	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	0.08
41	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil junio_2023_realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
42	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias desarrollados	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
43	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Marco metodológico Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
44	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Principales indicadores Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
45	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Cronograma de investigación de la OE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.27
46	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de ajuste del Plan de validación impacto ambiental actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.45
47	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC:	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DEFINICIÓN: Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental							
48	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Avance del Visualizador al (11%) construido	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
49	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
50	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	0.15
51	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal de Equipo Coordinador contratado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.15
52	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales elaborados.	5-Entregables Intermedios	14/07/2023	14/07/2023			No	0.08
53	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.14
54	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elabo	5-Entregables Intermedios	17/07/2023	17/07/2023			No	0.09
55	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	18/07/2023		18/07/2023		Sí	0.09
56	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	20/07/2023		20/07/2023		Sí	0.12
57	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de actualización cartográfica diseñado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023	28/07/2023			No	0.02
58	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_2023_actualizado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	0.07
59	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	29/07/2023	29/07/2023			No	0.45
60	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM:	5-Entregables Intermedios	30/07/2023		30/07/2023		Sí	0.47

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EJECUCIÓN: RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas							
61	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023		▼	No	0.08
62	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance julio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023	●	Sí	0.07
63	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance julio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023	●	Sí	0.07
64	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023	●	Sí	0.34
65	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023	●	Sí	0.12
66	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	04/08/2023		04/08/2023	●	Sí	0.23
67	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de auditoría financiera externa presentado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023	10/08/2023		▼	No	0.12
68	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023	●	Sí	0.03
69	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado	5-Entregables Intermedios	15/08/2023		15/08/2023	●	Sí	0.23
70	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	25/08/2023		25/08/2023	●	Sí	0.23
71	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Plan de mejora con IESS elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2023		30/08/2023	●	Sí	0.47
72	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023		▼	No	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
73	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Mallas de validación preliminar elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.08
74	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del encuestador elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.04
75	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.09
76	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
77	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
78	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
79	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.27
80	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2023	08/09/2023			No	0.23
81	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados	5-Entregables Intermedios	15/09/2023	15/09/2023			No	0.02
82	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023	15/09/2023			No	0.15
83	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Sistema de levantamiento de información - actualización cartográfica revisado y probado	5-Entregables Intermedios	22/09/2023	22/09/2023			No	0.04
84	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de la elaboración del Sistema de ingreso y procesamiento de datos revisado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/09/2023			No	0.08
85	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance septiembre 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/09/2023			No	0.07
86	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance septiembre 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/09/2023			No	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
87	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/09/2023		▼	No	0.27
88	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023		▼	No	0.11
89	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023		▼	No	0.11
90	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023		▼	No	0.11
91	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023		▼	No	0.11
92	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (22%) construido	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023		▼	No	0.47
93	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, elaborado	5-Entregables Intermedios	13/10/2023	13/10/2023		▼	No	0.09
94	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2023	15/10/2023		▼	No	0.09
95	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023	16/10/2023		▼	No	0.09
96	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento de Diseño Muestral octubre 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023	30/10/2023		▼	No	0.09
97	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología del Sistema y del proceso Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborada	5-Entregables Intermedios	30/10/2023	30/10/2023		▼	No	0.07
98	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN:	5-Entregables Intermedios	30/10/2023	30/10/2023		▼	No	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Sistema de captura de información Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado							
99	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023	30/10/2023		▼	No	0.11
100	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado octubre	5-Entregables Intermedios	30/10/2023	30/10/2023		▼	No	0.11
101	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Matrices de precios referenciales entregadas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.06
102	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores octubre 2023 final elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.07
103	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Muestra para la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo recibida	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.09
104	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de pruebas al sistema informático, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.27
105	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.27
106	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 octubre impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.11
107	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Plan de adquisiciones actualizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023		▼	No	0.12
108	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023 impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	27/11/2023	27/11/2023		●	No	0.11
109	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023	27/11/2023		●	No	0.11
110	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado noviembre	5-Entregables Intermedios	27/11/2023	27/11/2023		●	No	0.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
111	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023	27/11/2023			No	0.11
112	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico (revisión experiencias internacionales); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.04
113	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica final, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.04
114	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de crítica para el levantamiento de campo, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.04
115	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Actas de entrega - recepción de materiales necesarios (oficina, papelería, formularios, etc) entregados y distribuidos a las zonales, elaboradas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.04
116	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información_final_actualizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.09
117	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.07
118	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.09
119	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos ponderada	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.27
120	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.27
121	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.37
122	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/12/2023	10/12/2023			No	0.03
123	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe del	5-Entregables Intermedios	15/12/2023	15/12/2023			No	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	personal capacitado para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborado.							
124	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023	15/12/2023			No	0.23
125	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de las pruebas del Sistema de ingreso y procesamiento de datos elaborado.	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	0.06
126	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de personal capacitado para campo, elaborado.	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	0.06
127	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.06
128	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.07
129	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información web y móvil ajustado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.07
130	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.09
131	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.2
132	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.34
133	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023	29/12/2023			No	0.15
134	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora con MINEDUC elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.09
135	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (33%) construido	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.37

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
136	3 Informes de monitoreo de ejecución del proyecto y auditoría externa al 2024 aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	16.7
137	Informe de avance de la metodología de la encuesta Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET construida al 2024	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	16.7
138	Reporte de cobertura efectiva y de los precios levantados de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF) aprobado al 2024	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	16.7
139	3 Informes de monitoreo de ejecución del proyecto y auditoría externa al 2025 aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	9.42
140	Formulario de la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola con los 3 Módulos de: impacto ambiental levantado, económico levantado y de equipos y maquinarias levantado al 2025.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	9.42
141	Reporte de cobertura efectiva y de los precios levantados de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF) aprobado al 2025	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	9.42
142	Informe final de ejecución integral de la Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 2022-2026 elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2026	30/09/2026			No	1.13

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C7_Número de informes de monitoreo , auditoría externa y cierre del proyecto al 2026		100.00 %	0	0	15/10/2022	Abr-Jun
2	C1_1.1: 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2024.		-	-	-	01/10/2023	-
3	C1_1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2025		-	-	-	01/07/2023	-
4	C2_2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024.		100.00 %	0.15	0.15	01/01/2023	Abr-Jun
5	C3_3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024.		-	-	-	10/07/2023	-

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
6	C5_5.1: 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2025.		-	-	-	10/10/2023	-
7	C6_6.1: 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025		100.00 %	1	1	10/04/2023	Abr-Jun
8	C6_6.2: 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025		100.00 %	2	2	10/04/2023	Abr-Jun
9	C6_6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025		100.00 %	0.11	0.11	10/04/2023	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,803,111.75 **
Costo Total:	23,515,045.47
Total Devengado:	1,092,117.61
% Costo Total Devengado:	4.64 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 4.64 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Externo Planeado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Aprobado Inicial	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Codificado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	61,984.04	6,803,111.75	0.00	6,865,095.79
Ppto. Devengado	0.00	1,092,117.61	0.00	1,092,117.61
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	61,984.04	6,803,111.75	0.00	6,865,095.79
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	16.05 %	0.00 %	15.91 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

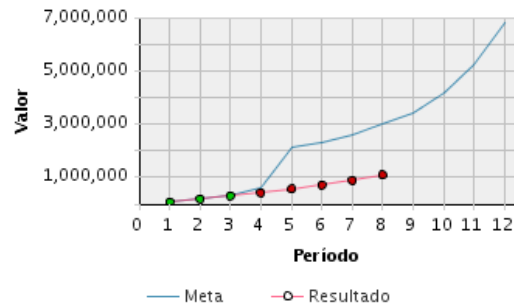

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	86,776.17	83,560.70	86,776.17	83,560.70	96.29 %	●	1.23 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	118,020.43	114,572.06	204,796.60	198,132.76	96.75 %		2.91 %
Mar	121,491.31	113,427.98	326,287.91	311,560.74	95.49 %		4.58 %
Abr	286,334.16	120,536.32	612,622.07	432,097.06	70.53 %		6.35 %
May	1,504,960.39	130,418.31	2,117,582.46	562,515.37	26.56 %		8.27 %
Jun	187,773.35	146,918.36	2,305,355.81	709,433.73	30.77 %		10.43 %
Jul	310,107.75	167,448.30	2,615,463.56	876,882.03	33.53 %		12.89 %
Ago	414,568.11	215,235.58	3,030,031.67	1,092,117.61	36.04 %		16.05 %
Sep	362,922.78		3,392,954.45				
Oct	805,850.95		4,198,805.40				
Nov	998,640.83		5,197,446.23				
Dic	1,605,665.52		6,803,111.75				
Total	6,803,111.75	1,092,117.61					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)	
15	OO11. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de los productos cartográficos que genera el INEC
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)	
14	OO7. Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)	
17	OO4. Incrementar la producción de estadísticas económicas oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros administrativos.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)	
6	OO12. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación MEDIANTE la automatización y actualización de procesos de infraestructura estadística
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)	
6	OO10. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación y socialización de la información estadística a partir de registros administrativos que genera el INEC.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION_HITO N° 10_Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_10_Informe_de_bases_de_datos_digitalizadas_ESPAC_2023....pdf	07/02/2023
2	ASOCIACION_HITO N° 11_Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_11_Informe_de_bases_de_datos_provinciales_ESPAC_2022_....pdf	07/02/2023
3	ASOCIACION_HITO N° 19_Documento de escenarios de transferencia trabajados	ASOCIACION_HITO_N °_26_Documento_de_escenarios_de_transferencia__trabajad....pdf	04/04/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIACION_HITO N° 21_Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_20_C7_Flujo_de_desembolsos_2DOT2023_elaborado-signed.pdf	06/04/2023
5	ASOCIACION_HITO N° 23_2.1_Correo electrónico control y acceso información 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_23_2.1_Correo_electronico_control_y_acceso_información_2023_elaborado-signed.pdf	04/04/2023
6	ASOCIACION_HITO N° 24_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_24_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborado-signed.pdf	04/04/2023
7	ASOCIACION_HITO N° 26_Manuales de recolección/capacitación aprobados	ASOCIACION_HITO_N °_24_Manuales_de_recoleccióncapacitación_aprobados.pdf	04/04/2023
8	ASOCIACION_HITO N° 27_Avance del Visualizador al (11%) construido	ASOCIACION_HITO_N °_27_Avance_del_Visualizador_al_(11%)_construido-sig.....pdf	18/07/2023
9	ASOCIACION_HITO N° 28_Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Plan_de_mejora_con_DIGERCIC_elaborado.pdf	05/05/2023
10	ASOCIACION_HITO N° 29_RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	ASOCIACION_HITO_N °_29_RRAA_de_DIGERCIC_y_Discapacidades_evaluadas-signed....pdf	18/07/2023
11	ASOCIACION_HITO N° 30_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborado-signed.pdf	04/05/2023
12	ASOCIACION_HITO N° 30_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_28_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto_1E.....pdf	05/05/2023
13	ASOCIACION_HITO N° 32_Diccionario de variables elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_32_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf	21/07/2023
14	ASOCIACION_HITO N° 34_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborado-signed.pdf	06/06/2023
15	ASOCIACION_HITO N° 34_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborado-signed.pdf	18/07/2023
16	ASOCIACION_HITO N° 35_Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_35_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_elaborado-signé....pdf	05/06/2023
17	ASOCIACION_HITO N° 36_Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	ASOCIACION_HITO_N °_36_Actas_de_las_comisiones_bilaterales_Interinstituci....pdf	21/07/2023
18	ASOCIACION_HITO N° 37_Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_37_C5_ESPAC_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA_actualiza....pdf	18/07/2023
19	ASOCIACION_HITO N° 38_C3_CAB-SIPP_Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_38_C3_CAB-SIPP_Documento_de_evidencias_internacionales....pdf	14/07/2023
20	ASOCIACION_HITO N° 39_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_39_C5_ESPAC_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_....pdf	18/07/2023
21	ASOCIACION_HITO N° 40_Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseño	ASOCIACION_HITO_N °_40_Formulario_de_recolección_de_información_para_leva....pdf	21/07/2023
22	ASOCIACION_HITO N° 41_Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_41_Capacitación_del_Equipo_técnico_Nueva_Encuesta_de_....pdf	18/07/2023
23	ASOCIACION_HITO N° 42_C2_2.3_Formulario de recolección de información 2023 diseñado	ASOCIACION_HITO_N °_42_C2_2.3_Formulario_de_recolección_de_información_may....pdf	06/06/2023
24	ASOCIACION_HITO N° 44_Informe de funcionamiento de sistema de captura de información web y móvil junio_2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_44_Informe_de_funcionamiento_de_sistema_de_captura_de....pdf	18/07/2023
25	ASOCIACION_HITO N° 45_Manual del Encuestador junio_2023 avance elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_45_Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado....pdf	18/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
26	ASOCIACION_HITO N° 46_Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados	ASOCIACION_HITO_N °_46_Módulos_del_sistema_informático_para_la_recolección....pdf	18/07/2023
27	ASOCIACION_HITO N° 47_Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_47_Metodología_Marco_metodológico_Nueva_Encuesta_de_F....pdf	18/07/2023
28	ASOCIACION_HITO N° 48_Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_48_Metodología_Principales_indicadores_Nueva_Encuesta....pdf	18/07/2023
29	ASOCIACION_HITO N° 49_C3_CAB-SIPP_Cronograma de investigación de la OE elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_49_C3_CAB-SIPP_Cronograma_de_investigación_de_la_OE_e....pdf	14/07/2023
30	ASOCIACION_HITO N° 50_C5_ESPAC_Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_50_C5_ESPAC_Informe_de_Manuales_actualizados_y_aproba...rar	18/07/2023
31	ASOCIACION_HITO N° 51_Personal de Equipo Coordinador contratado	ASOCIACION_HITO_N °_51_Personal_de_Equipo_Coordinador_contratado.pdf	21/07/2023
32	ASOCIACION_HITO N° 52_Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado	ASOCIACION_HITO_N °_52_C5_ESPAC_Informe_de_ajuste_del_Plan_de_validación_....pdf	18/07/2023
33	ASOCIACION_HITO N° 58_C6_RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas	ASOCIACION_HITO_58_RRAA_de_Matrimonios_y_Divorcios...signed-sig....pdf	07/08/2023
34	ASOCIACION_HITO N° 59_C7_Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	HITO_59_Informe_de_desempeño_ambiental_y_social_1ERSEM2023.rar	07/08/2023
35	ASOCIACION_HITO N° 60_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	HITO_60_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto2DOT2023.rar	07/08/2023
36	ASOCIACION_HITO N° 62_C7_ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado	HITO_62_ROBUS_PEE_C7_Servicio_de_Auditoría_externa...07/08/2023.rar	07/08/2023
37	ASOCIACION_HITO N° 64_C2_Ficha de indicadores_avance julio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_64_Ficha_de_indicadores_avance_julio2023...sign....pdf	07/08/2023
38	ASOCIACION_HITO N° 65_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_65_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanc....pd	07/08/2023
39	ASOCIACION_HITO N° 66_C3_Informe de evaluación semestral ene-jun 2023 elaborado	Hito_66.rar	07/08/2023
40	ASOCIACION_HITO N° 67_C3_Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido	Hito_67.rar	07/08/2023
41	ASOCIACION_HITO N° 69_C2_Manual de Cartografía de la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_actualizado	ASOCIACION_HITO_69_Manual_de_Cartografía_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_....pdf	07/08/2023
42	ASOCIACIÓN_HITO N° 01_C7_Plan de Dirección de Proyecto aprobado	A1_HITO1_Aprobacion_Plan_Direccion_Proyecto.pdf	30/12/2022
43	ASOCIACIÓN_HITO N° 02_C7_Plan de Adquisiciones aprobado	A2_HITO2_Aprobacion_Plan_Adquisiciones.pdf	30/12/2022
44	ASOCIACIÓN_HITO N° 03_C7_Especialista de proyecto contratados	A3_HITO3_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf	30/12/2022
45	ASOCIACIÓN_HITO N° 04_C7_Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado	A4_HITO4_Informe_de_monitoreo_de_ejecución_del_proyecto09/01/2023.pdf	09/01/2023
46	ASOCIACIÓN_HITO N° 05_C5_Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_06_C5_Informe_de_Matriz_de_usuarios_ESPAC_2023_impact....pdf	13/03/2023
47	ASOCIACIÓN_HITO N° 06_C6_Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_19_C6_Convenios_con_informe_de_excepcionalidad_inclu....pdf	13/03/2023
48	ASOCIACIÓN_HITO N° 07_C6_Ficha de indicadores y variables identificadas	ASOCIACIÓN_HITO_N °_11_C6_Ficha_de_indicadores_y_variables_identificadas.pdf	13/03/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	ASOCIACIÓN_HITO N° 08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023....pdf	07/02/2023
50	ASOCIACIÓN_HITO N° 09_C7_Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_13_C7_Estrategia_de_Seguimiento_y_Monitoreo_elaborada-signed.pdf	13/03/2023
51	ASOCIACIÓN_HITO N° 10_C5_Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_05_C5_Informe_del_Plan_de_trabajo_ESPAC_2023_impacto_....pdf	13/03/2023
52	ASOCIACIÓN_HITO N° 11_C1_Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	ASOCIACION_HITO_N °6_Requerimientos_y_necesidades_institucionales_identif....pdf	07/02/2023
53	ASOCIACIÓN_HITO N° 12_C3_Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_09_C3_Informe_avance_para_desarrollo_instrumento_cooperación_interinstitucional.pdf	13/03/2023
54	ASOCIACIÓN_HITO N° 13_C3_Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_10_C3_Marco_normativo_para_el_desarrollo_del_Cambio_d....pdf	13/03/2023
55	ASOCIACIÓN_HITO N° 14_C7_Personal del proyecto capacitado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_12_C7_Personal_del_proyecto_capacitado-signed.pdf	13/03/2023
56	ASOCIACIÓN_HITO N° 15_C1_Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_14_C1_Manuales_y_programación_de_trabajo_en_campo_el....pdf	13/03/2023
57	ASOCIACIÓN_HITO N° 16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023....pdf	13/03/2023
58	ASOCIACIÓN_HITO N° 17_C3_Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_18_C3_Formulario_de_recolección_de_precios_preliminar....pdf	13/03/2023
59	ASOCIACIÓN_HITO N° 18_C3_Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_17_C3_Requerimiento_de_desarrollo_del_sistema_informá....pdf	13/03/2023
60	ASOCIACIÓN_HITO N° 20_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023_....pdf	13/03/2023
61	GRISK_001_PA001_Especialista de proyecto contratados	GRISK_001_PA001_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf	30/12/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pinto Aguirre, José Bernardo	COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR	Coordinador del Proyecto	jose_pinto@inec.gob.ec	0999836628
