

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**  
**PROYECTO: K010 INEC: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI**

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Herrera Jacome, Margoth Rocio (margoth_herrera@inec.gob.ec)  |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                               | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline                      | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 102800000.0000.384446                                        | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 7,142,022.54            |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         | Organismo multilateral                                       | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 14/02/2022 - 31/12/2023 |
| Fecha de última actualización: | 03/10/2023                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2022              |
| Modificado por:                | Herrera Jacome, Margoth Rocio                                | Fecha del siguiente Hito:       | 02/10/2023              |

## DATOS GENERALES

### Descripción

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1211 suscrito el 15 de diciembre de 2020 se establece aprobar la implementación de la "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición", estableciéndose adicionalmente, en el calendario estadístico, la obligatoriedad de medición de la tasa de desnutrición crónica infantil mediante una operación estadística por muestreo y de forma anual misma que será ejecutada por la entidad responsable de Estadística y Censos a nivel nacional.

La Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil investigará información de niños menores de 5 años como su población objetivo, se ha planificado investigar 2.964 UPM, es decir alrededor de 23.712 viviendas donde se espera encontrar alrededor de 27.000 niños menores de 5 años.

Para el arranque de la operación estadística se contará con un presupuesto parcial de \$1.434.610,09 millones de dólares de los cuales serán transferidos USD \$1.345.118,48 (sin IVA) por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.

El presupuesto programado con la primera asignación de recursos permitirá el financiamiento del personal ocasional, y el inicio de las contrataciones de varios bienes y servicios asociados a la implementación del proyecto. El financiamiento cubre aproximadamente 4 meses de operativo de campo (cuyas fechas estimadas se programan entre abril y julio de 2022) mientras se gestiona la asignación adicional del presupuesto 2022-2023 para cubrir los 10 meses restantes de la operación.

### LINEA BASE:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante los años 2018 y 2019, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. La metodología utilizada corresponde a un muestreo probabilístico, donde la unidad primaria de selección es el conglomerado (UPM), la unidad secundaria es la vivienda (USM) y la última unidad es la población. Los resultados de esta investigación arrojan que el 23,0% de los menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica. El INEC, cuenta además con la información recopilada a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, cuya sexta ronda indagó medidas antropométricas en toda la población investigada desde noviembre del año 2013 hasta octubre del año 2014, guardando similitudes en cuanto a la metodología de muestreo utilizada y a partir de la cual se desprende que el 23,9% de los niños menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica.

### OBJETIVO GENERAL:

Generar una operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Construir los instrumentos para la realización de la ENDI  
 Recolectar la información en campo  
 Elaborar la programación de indicadores

### Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá generar información para la medición de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, a fin de reducir la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años.

### Tipo de Beneficiario

Ministerios y Secretarías encargados de la implementación y el seguimiento de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición

### Restricciones

TIEMPO: 11 MESES

PRESUPUESTO: \$ 1.434.610,09


RECURSOS: CONTRATOS OCASIONALES Y PERSONAL CIVIL, MATERIAL DE OFICINA, VEHÍCULOS, TABLETS, COMPUTADORES, SISTEMA INFORMÁTICO.

ALCANCE: NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.27 %

Fecha de Inicio: 14/02/2022

Fecha de Fin: 31/12/2023

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

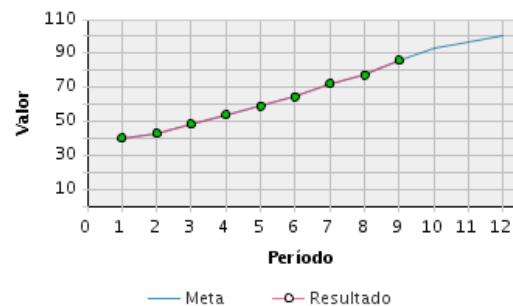

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2023                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 40 %                        | 43 % | 48 % | 54 % | 59 % | 64 % | 72 % | 77 % | 86 % | 93 % | 96 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 40 %                        | 43 % | 48 % | 54 % | 59 % | 64 % | 72 % | 77 % | 86 % |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>SEPTIEMBRE 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 2 del año 2 de encuesta | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 03/10/2023 - 12:40 PM         |
| <b>AGOSTO 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 1 del año 2 de encuesta     | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 05/09/2023 - 08:48 AM         |
| <b>JULIO 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 12 de encuesta               | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 02/08/2023 - 08:37 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>JUNIO 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 11 de encuesta<br>4.- Se reporta los resultados alcanzados para el cumplimiento de metas establecidas en los indicadores relacionados con el número de viviendas identificadas para la aplicación de la Encuesta y los indicadores definidos para la medición de la DCI y sus factores asociados.                                      | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 02/08/2023 - 08:37 AM         |
| <b>MAYO 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 10 de encuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 07/06/2023 - 01:20 PM         |
| <b>ABRIL 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 9 de encuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 03/05/2023 - 04:27 PM         |
| <b>MARZO 2023</b><br>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.<br>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 8 de encuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 03/04/2023 - 02:59 PM         |
| <b>FEBRERO 2023:</b><br>1.- Con fecha 10/02/2023 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre MIES e INEC para la transferencia de 4.9 millones de dólares para la implementación de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.<br>2.- Mediante memorando Nro.INEC-INEC-2023-0122-M de fecha 22/02/2023 la Dirección Ejecutiva aprueba el Plan de Dirección de Proyecto 2023 para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.<br>3.- Al 28/02/2023 se está gestionando con las áreas competentes la elaboración y validación de la reestructuración de hitos y ficha fin del proyecto para el año 2023. | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 21/03/2023 - 03:09 PM         |
| <b>DICIEMBRE 2022</b><br>Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>Se han generado resultados e indicadores preliminares relacionados a la desnutrición infantil a partir de la información recolectada en la ejecución del operativo diseñado para la ENDI<br>Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes quinto de encuesta<br>Se seleccionó la muestra a partir de la base de datos de enlistamiento para la ejecución del plan de operativo de campo en el sexto mes de encuesta                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 13/01/2023 - 09:06 AM         |
| <b>NOVIEMBRE 2022</b><br>Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.<br>Se han generado resultados e indicadores preliminares a partir de la información recolectada en el primer trimestre del operativo diseñado para la ENDI<br>Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes cuarto de encuesta                                                                                                                                                                                                                                                | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 09/12/2022 - 08:37 AM         |
| <b>OCTUBRE 2022</b><br>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado para el cierre del mes 3 e inicio del mes 4 de la Encuesta.<br>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el desarrollo de la Encuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 02/11/2022 - 11:28 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2022:</b><br>- Con fecha 13 de septiembre de 2022, mediante Oficio Nro.MIES-DISIES-2022-0077-O, el MIES aprueba la cuarta reforma a la planificación operativa del Proyecto para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, la misma que considera la segunda transferencia de recursos para la ejecución del Plan Operativo de Campo diseñado para la recolección, procesamiento y análisis de la información requerida en dicha encuesta.                                                                                                                                                                                        | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 06/10/2022 - 11:02 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0804-M de 15 de septiembre de 2022 el Patrocinador Ejecutivo del proyecto autoriza el IV Adendum al PDP del Proyecto, el cual incluye la reestructuración de hitos y metas del proyecto.</li> <li>- Con fecha 21 de septiembre, se procede a realizar la reestructura de hitos y metas del proyecto.</li> <li>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado</li> <li>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado</li> <li>- Se realiza el reporte de indicadores por el período julio - septiembre 2022</li> </ul> |                                        |                               |
| <b>AGOSTO 2022</b><br><br>Se inició la recolección de información del mes 2 de encuesta el 16 de agosto de 2022 (Hito 17 cumplido)<br>Se recolectó la información y se enlistaron los conglomerados del mes 3 (Hito 15 cumplido)<br>Se cuenta con base de datos del primer mes y medio de recolección de información, y la misma ha sido validada por parte de los revisores de calidad (Hito 16 cumplido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/09/2022 -<br>06:38 PM      |
| <b>JULIO 2022:</b><br><br>1.- Se generaron los indicadores que permitirán medir la calidad de la información levantada durante el primer trimestre.- (Hito 11 cumplido)<br>2.- Con fecha 23 de julio de 2022 culminó el período quinto de enlistamiento que corresponde al mes cuatro de trabajo. - (Hito 12 cumplido).<br>3.- Se generó la base de datos para el levantamiento de información la misma ha sido revisada y validada por las unidades correspondientes.. - (Hito 13 cumplido).<br>4.- Se ha dado inicio al proceso de recolección y levantamiento de datos a nivel nacional para la encuesta.- (Hito 14 cumplido)                                                                          | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/08/2022 -<br>04:02 PM      |
| <b>JUNIO 2022:</b><br><br>1.- La selección de la muestra del mes de mayo fue entregada el 09 de junio de 2022.- (Hito 7 cumplido)<br>2.- Los conglomerados del mes 2 correspondiente al mes de junio de 2022 fueron enlistados en su totalidad. - (Hito 10 cumplido).<br>3.- No se puede reportar los indicadores de calidad del inicio del operativo de campo de la encuesta dado que se solicitó reprogramación del mismo por movilizaciones de la CONAIE. - (Hito 11 en proceso).                                                                                                                                                                                                                      | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 04/07/2022 -<br>04:52 PM      |
| <b>MAYO 2022:</b><br><br>1.- Debido a que el material cartográfico (atado a la base de preselección de viviendas) se encuentra en construcción, se contará con la muestra seleccionada aproximadamente el 10 de junio de 2022. - (Hito 7 en proceso).<br>2.- Se realizó el proceso de preselección, capacitación y selección del personal necesario para arrancar con la fase de encuesta de la ENDI - (Hito 8 cumplido).<br>3.- Se cuenta con los conglomerados enlistados (Hito 9 cumplido).                                                                                                                                                                                                            | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 03/06/2022 -<br>03:01 PM      |
| <b>ABRIL 2022:</b><br><br>1.- Se seleccionó y contrató al personal (63 personas: 47 encuestadores y 16 Supervisores de operativo de campo) para la fase de enlistamiento de la ENDI (Hito 5 cumplido).<br>2.- Se elaboró la sintaxis de validación (para detectar errores en las bases de datos de la información levantada a través de programación en STATA) - (Hito 6 cumplido).<br>3.- Se elaboró la sintaxis de indicadores (a través de programación en "R STUDIO" para generar el resultado de los mismos) - (Hito 6 cumplido).                                                                                                                                                                    | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/05/2022 -<br>12:53 PM      |
| <b>MARZO 2022:</b><br><br>1.- Se elaboró el Informe de la prueba piloto (Hito 3 cumplido).<br>2.- Se elaboró el Manual del Encuestador (Hito 4 cumplido).<br>3.- Se elaboró el Formulario de la ENDI (Hito 4 cumplido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/04/2022 -<br>02:02 PM      |
| <b>FEBRERO 2022:</b><br><br>1.- Se elaboró, revisó, ajustó y aprobó el Plan de Dirección del Proyecto - PDP, así como la matriz de actividades y demás documentación habilitante referente al proyecto, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0127-M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 04/03/2022 -<br>10:08 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 2.- El Ministerio de Finanzas aprobó la modificación presupuestaria para la transferencia de recursos del MIES al INEC, incremento presupuestario valor de 1.434610,09 informado por la Coordinación General Administrativa Financiera mediante memorando INEC-CGAF-2022-0198-M.<br>3.- Se realizó la definición y selección de la primer etapa de muestreo. |                |                               |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                               | Fecha de última actualización | Responsable                  | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| La FALTA de recursos DETENDRÍA la ejecución y continuidad del proyecto | 05/09/2023                    | Margoth Rocio Herrera Jacome | 100      | 100     | 100          | 0/1                         |

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1*

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de última actualización | Responsable                  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>No contar con los recursos requeridos para la operación de la Encuesta CAUSARÍA un retraso en la ejecución de procesos de contratación y por ende del operativo de campo para la implementación de la encuesta. | 05/09/2023                    | Margoth Rocio Herrera Jacome | 80 %         | 100     | 80           | 0/1                         |
| <b>5- PROYECTO. Técnico.</b><br>No contar con el personal capacitado para la actualización del sistema de captura CAUSARÍA retraso en la ejecución del operativo de campo                                                                      | 08/08/2023                    | Margoth Rocio Herrera Jacome | 60 %         | 80      | 48           | 0/1                         |

*Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 2*

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto                                         |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|   | Hito                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Muestra de Unidades Primaria de Muestreo identificada                               | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022         |                | 28/02/2022 |  | Sí            | 1.31          |
| 2 | PLANIFICACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022         |                | 28/02/2022 |  | Sí            | 0.98          |
| 3 | PLANIFICACIÓN: Manuales de encuestador, supervisor, crítica y codificación elaborados           | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2022         |                | 30/03/2022 |  | Sí            | 0.98          |
| 4 | PLANIFICACIÓN: Informe de la prueba piloto presentado                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2022         |                | 31/03/2022 |  | Sí            | 0.98          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                 | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5  | EJECUCIÓN: Personal para enlistamiento seleccionado                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2022         |                | 15/04/2022 |    | Sí            | 1.31          |
| 6  | EJECUCIÓN: Sintaxis de validación y de indicadores elaboradas                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2022         |                | 30/04/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 7  | EJECUCIÓN: Muestra seleccionada                                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2022         |                | 09/06/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 8  | EJECUCIÓN: Personal capacitado y seleccionado                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2022         |                | 30/05/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 9  | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2022         |                | 31/05/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 10 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 14/06/2022         |                | 14/06/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 11 | EJECUCIÓN: Indicadores de calidad reportados en el primer trimestre de levantamiento                                                                                 | 9-Entregables Formales    | 30/06/2022         |                | 30/06/2022 |    | Sí            | 0.97          |
| 12 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 13 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |    | Sí            | 0.98          |
| 14 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 15 | EJECUCIÓN: Información del primer mes de encuesta en bases de datos ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.         | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 16 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |   | Sí            | 0.98          |
| 17 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 2 de encuesta ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |  | Sí            | 1.64          |
| 18 | Ejecución: Información en bases de datos validada mes 2 ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                     | 5-Entregables Intermedios | 10/09/2022         |                | 10/09/2022 |  | Sí            | 1.64          |
| 19 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados mes 4 ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                                   | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2022         |                | 15/09/2022 |  | Sí            | 1.64          |
| 20 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 3 ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.             | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2022         |                | 11/10/2022 |  | Sí            | 1.64          |
| 21 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 3 ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                     | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2022         |                | 15/10/2022 |  | Sí            | 0.98          |
| 22 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 14/11/2022         |                | 14/11/2022 |  | Sí            | 1.64          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | información iniciado mes 4 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                                           |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 23 | EJECUCIÓN: Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                   | 5-Entregables Intermedios | 18/11/2022         |                | 18/11/2022 |    | Sí            | 1.31          |
| 24 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                          | 5-Entregables Intermedios | 20/11/2022         |                | 20/11/2022 |    | Sí            | 0.98          |
| 25 | EJECUCIÓN: Productos de resultados entregados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022         |                | 30/11/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 26 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.      | 5-Entregables Intermedios | 14/12/2022         |                | 14/12/2022 |    | Sí            | 1.64          |
| 27 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 5ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                          | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2022         |                | 20/12/2022 |  | Sí            | 0.98          |
| 28 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.           | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 31/12/2022 |  | Sí            | 0.98          |
| 29 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.      | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 31/12/2022 |  | Sí            | 1.64          |
| 30 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Planeación: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados | 5-Entregables Intermedios | 22/02/2023         |                | 22/02/2023 |  | Sí            | 2.97          |
| 31 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9                                      | 5-Entregables Intermedios | 06/03/2023         |                | 06/03/2023 |  | Sí            | 1.78          |
| 32 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso                                                             | 5-Entregables Intermedios | 16/03/2023         |                | 16/03/2023 |  | Sí            | 2.38          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | de recolección de información iniciado mes 8                                                                                                               |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 33 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8          | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2023         |                | 29/03/2023 |    | Sí            | 1.19          |
| 34 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10                       | 5-Entregables Intermedios | 03/04/2023         |                | 03/04/2023 |    | Sí            | 1.78          |
| 35 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 9  | 5-Entregables Intermedios | 13/04/2023         |                | 13/04/2023 |    | Sí            | 2.38          |
| 36 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9          | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2023         |                | 26/04/2023 |    | Sí            | 1.19          |
| 37 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11                       | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2023         |                | 05/05/2023 |    | Sí            | 1.78          |
| 38 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10 | 5-Entregables Intermedios | 12/05/2023         |                | 12/05/2023 |  | Sí            | 2.38          |
| 39 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10         | 5-Entregables Intermedios | 24/05/2023         |                | 24/05/2023 |  | Sí            | 1.19          |
| 40 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12                       | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2023         |                | 02/06/2023 |  | Sí            | 1.78          |
| 41 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11 | 5-Entregables Intermedios | 11/06/2023         |                | 11/06/2023 |  | Sí            | 2.38          |
| 42 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11         | 5-Entregables Intermedios | 21/06/2023         |                | 21/06/2023 |  | Sí            | 1.19          |
| 43 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 1                  | 5-Entregables Intermedios | 02/07/2023         |                | 02/07/2023 |  | Sí            | 1.78          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 44 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 12      | 5-Entregables Intermedios | 10/07/2023         |                | 10/07/2023 |    | Sí            | 2.38          |
| 45 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 12              | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2023         |                | 26/07/2023 |    | Sí            | 1.19          |
| 46 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Factores elaborados base anual                             | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2023         |                | 30/07/2023 |    | Sí            | 2.38          |
| 47 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2                       | 5-Entregables Intermedios | 02/08/2023         |                | 02/08/2023 |    | Sí            | 1.78          |
| 48 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1 | 5-Entregables Intermedios | 11/08/2023         |                | 11/08/2023 |    | Sí            | 2.38          |
| 49 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1         | 5-Entregables Intermedios | 21/08/2023         |                | 21/08/2023 |  | Sí            | 1.19          |
| 50 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 3                       | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2023         |                | 02/09/2023 |  | Sí            | 1.78          |
| 51 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 2 | 5-Entregables Intermedios | 11/09/2023         |                | 11/09/2023 |  | Sí            | 2.38          |
| 52 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Productos elaborados información anual                     | 5-Entregables Intermedios | 20/09/2023         |                | 20/09/2023 |  | Sí            | 1.78          |
| 53 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 2         | 5-Entregables Intermedios | 21/09/2023         |                | 21/09/2023 |  | Sí            | 1.19          |
| 54 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Resultados publicados información anual                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |  | Sí            | 1.19          |
| 55 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 02/10/2023         | 02/10/2023     |            |  | No            | 1.78          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 4                                                                                 |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 56 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 5                       | 5-Entregables Intermedios | 02/10/2023         | 02/10/2023     |            |    | No            | 1.78          |
| 57 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 3 | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2023         | 11/10/2023     |            |    | No            | 2.38          |
| 58 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 3         | 5-Entregables Intermedios | 21/10/2023         | 21/10/2023     |            |    | No            | 1.19          |
| 59 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 4 | 5-Entregables Intermedios | 11/11/2023         | 11/11/2023     |            |    | No            | 2.38          |
| 60 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 4         | 5-Entregables Intermedios | 21/11/2023         | 21/11/2023     |            |    | No            | 1.19          |
| 61 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 5 | 5-Entregables Intermedios | 11/12/2023         | 11/12/2023     |            |  | No            | 2.38          |
| 62 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 5         | 5-Entregables Intermedios | 21/12/2023         | 21/12/2023     |            |  | No            | 1.19          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                       | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta   | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de viviendas identificadas para la ENDI  |  | 105.18 %          | 22,007 | 23,148                | 15/06/2022      | Abr-Jun                    |
| 2 | Número de indicadores antropométricos definidos |  | 100.00 %          | 1      | 1                     | 15/09/2022      | Jul-Sep                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 7,142,022.54 ** |
| Costo Total:                  | 1,434,610.09    |
| Total Devengado:              | 4,975,903.38    |
| % Costo Total Devengado:      | 346.85 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 346.85 %

### Perfil Económico 2023

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2023) | Años Futuros | Total        |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado                                          | 2,544,867.46   | 4,909,277.57      | 0.00         | 7,454,145.03 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 2,544,867.46   | 4,909,277.57      | 0.00         | 7,454,145.03 |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 1,434,610.09   | 4,909,277.57      | 0.00         | 6,343,887.66 |
| Ppto. Codificado                                        | 2,876,638.61   | 4,909,277.57      | 0.00         | 7,785,916.18 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Planeado - Codificado (2023)                            |                | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 2,544,867.46   | 4,909,277.57      | 0.00         | 7,454,145.03 |
| Ppto. Devengado                                         | 2,232,744.97   | 2,743,158.41      | 0.00         | 4,975,903.38 |
| Pagado Real                                             | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 2,232,744.97 | 0.00              | 0.00         | 2,232,744.97 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 312,122.49     | 4,909,277.57      | 0.00         | 5,221,400.06 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 87.74 %      | 55.88 %           | 0.00 %       | 66.75 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

### PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

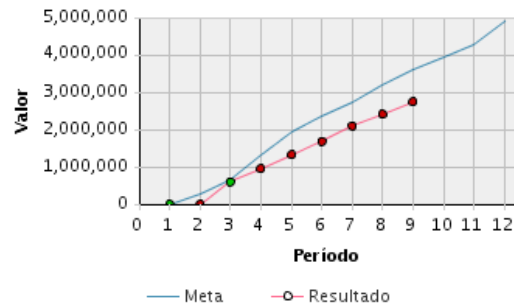

### Presupuesto Mensual 2023

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2023 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 283,798.50                 | 0.00                | 283,798.50                   | 0.00                  | 0.00 %           |  | 0.00 %       |
| Mar                      | 358,939.65                 | 596,381.64          | 642,738.15                   | 596,381.64            | 92.79 %          |  | 12.15 %      |
| Abr                      | 654,698.55                 | 353,872.36          | 1,297,436.70                 | 950,254.00            | 73.24 %          |  | 19.36 %      |
| May                      | 655,760.15                 | 370,615.20          | 1,953,196.85                 | 1,320,869.20          | 67.63 %          |  | 26.91 %      |
| Jun                      | 414,341.28                 | 363,449.90          | 2,367,538.13                 | 1,684,319.10          | 71.14 %          |  | 34.31 %      |
| Jul                      | 381,540.48                 | 401,495.85          | 2,749,078.61                 | 2,085,814.95          | 75.87 %          |  | 42.49 %      |
| Ago                      | 427,768.73                 | 325,262.35          | 3,176,847.34                 | 2,411,077.30          | 75.90 %          |  | 49.11 %      |
| Sep                      | 419,695.71                 | 332,081.11          | 3,596,543.05                 | 2,743,158.41          | 76.27 %          |  | 55.88 %      |
| Oct                      | 339,960.86                 |                     | 3,936,503.91                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 344,343.25                 |                     | 4,280,847.16                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 628,430.41                 |                     | 4,909,277.57                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>4,909,277.57</b>        | <b>2,743,158.41</b> |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                   | OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                     | Archivo         | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | AOSCIACIÓN_HITO_19.- Conglomerados enlistados mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social | B9_HITO_19.rar  | 06/10/2022    |
| 2  | ASOCIACIÓN HITO No. 24_ Información en bases de datos validada mes 4                                                                       | C5_HITO_24.rar  | 12/12/2022    |
| 3  | ASOCIACION HITO No. 22_Proceso de recolección de información                                                                               | C3_HITO_22.rar  | 12/12/2022    |
| 4  | ASOCIACION HITO No. 23_Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI                                                             | C4_HITO_23.rar  | 12/12/2022    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO No 1 - MUESTRA DE UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO                                                                              | A1_HITO_1.rar   | 07/03/2022    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO No 10 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | A11_HITO_10.rar | 06/07/2022    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO No 11 - INDICADORES DE CALIDAD REPORTADOS                                                                                  | B1_HITO_11.rar  | 05/08/2022    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO No 12 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | B2_HITO_12.rar  | 05/08/2022    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO No 13 - INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS VALIDADA                                                                             | B3_HITO_13.rar  | 05/08/2022    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO No 14 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO                                                                     | B4_HITO_14.rar  | 05/08/2022    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO No 15 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | B5_HITO_15.rar  | 06/09/2022    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO No 16 - INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS VALIDADA                                                                              | B6_HITO_16.rar  | 06/09/2022    |
| 13 | ASOCIACIÓN HITO No 17 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO                                                                     | B7_HITO_17.rar  | 06/09/2022    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                             | Archivo        | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 14 | ASOCIACIÓN HITO No 2 - APROBACIÓN PRESUPUESTO, PLAN DE PROYECTO Y MATRIZ ACTIVIDADES                                                                                               | A2_HITO_2.rar  | 07/03/2022    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO No 3 - INFORME DE LA PRUEBA PILOTO                                                                                                                                 | A3_HITO_3.rar  | 05/04/2022    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO No 4 - MANUAL DEL ENCUESTADOR Y FORMULARIOS                                                                                                                        | A4_HITO_4.rar  | 05/04/2022    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO No 5 - MATRIZ DE PERSONAL SELECCIONADO                                                                                                                             | A6_HITO_5.rar  | 05/05/2022    |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO No 6 - SINTAXIS DE VALIDACIÓN Y DE INDICADORES                                                                                                                     | A7_HITO_6.rar  | 05/05/2022    |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO No 7 - MUESTRA SELECCIONADA                                                                                                                                        | A10_HITO_7.rar | 06/07/2022    |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO No 8 - SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ENCUESTA                                                                                                                      | A8_HITO_8.rar  | 03/06/2022    |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO No 9 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                                                                    | A9_HITO_9.rar  | 03/06/2022    |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO No. 34.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10                      | D6_HITO_34.rar | 04/05/2023    |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO No. 18.- Información en bases de datos validada mes 2ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social                       | B8_HITO_18.rar | 06/10/2022    |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO No. 20.-Proceso de recolección de información iniciado mes 3ENDI                                                                                                   | C1_HITO_20.rar | 02/11/2022    |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO No. 21.- Información en bases de datos validada mes 3ENDI                                                                                                          | C2_HITO_21.rar | 02/11/2022    |
| 26 | ASOCIACIÓN HITO No. 25_Productos de resultados entregados primer trimestreEND                                                                                                      | C6_HITO_25.rar | 12/12/2022    |
| 27 | ASOCIACIÓN HITO No. 26 Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI                                                                                        | C7_HITO_26.rar | 17/01/2023    |
| 28 | ASOCIACIÓN HITO No. 27 Información en bases de datos validada mes 5ENDI                                                                                                            | C8_HITO_27.rar | 17/01/2023    |
| 29 | ASOCIACIÓN HITO No. 28 Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI                                                                                             | C9_HITO_28.rar | 17/01/2023    |
| 30 | ASOCIACIÓN HITO No. 29 Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de encuestaENDI                                                                                        | D1_HITO_29.rar | 17/01/2023    |
| 31 | ASOCIACIÓN HITO No. 30.- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados                                                                                        | D2_HITO_30.rar | 22/03/2023    |
| 32 | ASOCIACIÓN HITO No. 31.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9                                | D3_HITO_31.rar | 04/04/2023    |
| 33 | ASOCIACIÓN HITO No. 32.- Proceso de recolección de información iniciado mes 8                                                                                                      | D4_HITO_32.rar | 04/04/2023    |
| 34 | ASOCIACIÓN HITO No. 33.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8                  | D5_HITO_33.rar | 04/04/2023    |
| 35 | ASOCIACIÓN HITO No. 35.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 9 | D7_HITO_35.rar | 04/05/2023    |
| 36 | ASOCIACIÓN HITO No. 36.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9         | D8_HITO_36.rar | 04/05/2023    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                   | Archivo                    | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 37 | ASOCIACIÓN HITO No. 37.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11                            | D9_HITO_37.rar             | 23/06/2023    |
| 38 | ASOCIACIÓN HITO No. 38.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10      | E1_HITO_38.rar             | 23/06/2023    |
| 39 | ASOCIACIÓN HITO No. 39.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10              | E2_HITO_39.rar             | 23/06/2023    |
| 40 | ASOCIACIÓN HITO No. 40.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12                                      | E3_HITO_40.rar             | 29/06/2023    |
| 41 | ASOCIACIÓN HITO No. 41.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11                | E4_HITO_41.rar             | 29/06/2023    |
| 42 | ASOCIACIÓN HITO No. 42.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11                       | E5_HITO_42.rar             | 29/06/2023    |
| 43 | ASOCIACIÓN HITO No. 43.- Conglomerados enlistados año 2 mes 1                                                                                                                            | E6_HITO_43.rar             | 03/08/2023    |
| 44 | ASOCIACIÓN HITO No. 44.- Proceso de recolección de información iniciado mes 12                                                                                                           | E7_HITO_44.rar             | 03/08/2023    |
| 45 | ASOCIACIÓN HITO No. 45.- Información en bases de datos validada mes 12                                                                                                                   | E8_HITO_45.rar             | 03/08/2023    |
| 46 | ASOCIACIÓN HITO No. 46.- Factores elaborados base anual                                                                                                                                  | E9_HITO_46.rar             | 03/08/2023    |
| 47 | ASOCIACIÓN HITO No. 47.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2                       | F1_HITO_47.zip             | 03/10/2023    |
| 48 | ASOCIACIÓN HITO No. 48.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1 | F2_HITO_48.zip             | 03/10/2023    |
| 49 | ASOCIACIÓN HITO No. 49.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1         | F3_HITO_49.zip             | 03/10/2023    |
| 50 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN                                                                                                                                                           | Reestructuración.rar       | 21/09/2022    |
| 51 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS 2023                                                                                                                                                | Reestructuración_hitos.rar | 14/03/2023    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                        | Rol               | Puesto                                 | Correo Electrónico          | Teléfono(s) |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Herrera Jacome, Margoth Rocio | Lider de Proyecto | Responsable nacional del proyecto ENDI | margoth_herrera@inec.gob.ec |             |
