

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES)

Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN)

PROYECTO: K003 Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional

Líder del Proyecto:	Viteri Garcés, Inés Andrea (ines_viteri@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Romero Yonfá, Tania Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.387072	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	758,082.05
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	05/08/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Viteri Garcés, Inés Andrea	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2024

[Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales](#)

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto que busca, en el mediano y largo plazo, alcanzar una producción estadística nacional que cumpla con criterios de calidad y estandarización, conforme lo establecido en los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística. Para ello, se propone la creación y consolidación de instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística, que den respuesta a la carencia de información estadística de calidad, requerida para la toma de decisiones de política pública, así como al diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos nacionales. PRODUCTOS: Documento de la ENDE e informes de seguimiento de su implementación.. Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS.. Informes de implementación de la metodología para la formulación del Plan de Desarrollo Estadístico en 8 GAD priorizados. OBJETIVO GENERAL: Alcanzar una producción estadística nacional a mediano y largo plazo, que cumpla con los criterios de calidad homologados y estandarizados, dentro de los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1: Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico nacional y territorial. 2: Desarrollar el anteproyecto de Ley Estadística, generación de estándares e implementación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. 3: Automatizar los procesos y métodos de evaluación y desarrollo de una plataforma digital.

Beneficios Cualitativos

Entre los principales beneficios de la implementación de este proyecto están: 1. Fortalecimiento de la capacidad estadística del país, en especial de las entidades que conforman el sistema estadístico nacional; 2. Disponibilidad de información estadística generada bajo estándares de calidad; 3. Disponibilidad de datos de calidad para la toma de decisiones acertadas, tanto en el ámbito público como en el privado.

Tipo de Beneficiario

Los principales beneficiarios de los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística, son las entidades del sector público, los usuarios de información estadística, centros de conocimiento, sector privado, entre otros, pues emplean datos estadísticos para la toma de decisiones basada en evidencia, para el seguimiento y evaluación de las agendas de desarrollo, nacionales e internacionales.


Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años. COSTO (2022): USD. 336 867,0432 COSTO (2023): USD. 364 934,08 ALCANCE: Fortalecimiento de las capacidades estadísticas del país, así como también, la construcción e implementación de instrumentos de coordinación y rectoría - planificación estadística, normativa, estandarización y aseguramiento de la calidad- que apunten hacia el cierre de brechas de información y mejora en los procesos de producción para contar con información estadística de calidad. RECURSOS: para el desarrollo de las actividades previstas en este proyecto de inversión se requiere la contratación de 13 servidores públicos, equipos de computación, y, la contratación de servicios de consultoría.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 65.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

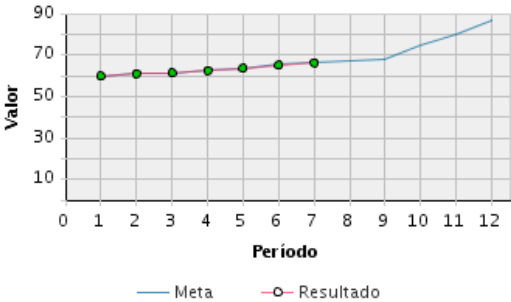

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	60 %	61 %	61 %	63 %	64 %	66 %	66 %	67 %	68 %	75 %	80 %	87 %
	Avance real acumulado											
	60 %	61 %	61 %	63 %	64 %	65 %	66 %					
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2024 1. En julio de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) revisado - CTPES; b) Normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2024 en versión inicial, generado; c) Documento de identificación de la producción de información (oferta estadística) en GAD Manabí, elaborado (Hitos 68,71 y 72, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	05/08/2024 - 02:48 PM
Junio 2024 1. En junio de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Acuerdos/compromisos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 1er semestre 2024, generados; b) Documento de identificación de la producción de información (oferta estadística) en GAD Ambato, elaborado; c) Documentos metodológicos de indicadores de los ODS_1er semestre 2024 actualizado; d) Documentos metodológicos de indicadores de los ODS_1er semestre 2024 actualizado; d) Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, elaborado. Se encuentra pendiente la generación del documento que contiene la oferta estadísticas del GAD de Manabí, que se la prevé ejecutarlo en el mes de julio. (Hitos 67,69 y 70, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	05/08/2024 - 02:47 PM
Mayo 2024 1. En mayo de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Presentación/es de socialización 1 de la normativa técnica y estándares emitidos previamente a las entidades del Sistema Estadístico Nacional, realizada/as; b) Propuesta estructura del contenido del documento del Plan Estadístico de los ODS, elaborada (Hitos 65 y 66, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	03/07/2024 - 11:21 AM
Abril 2024 1. En abril de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad (presentaciones o matrices), actualizados; b) Información de los indicadores ODS que cuentan con fichas homologadas de instituciones responsables, actualizadas (Hitos 63 y 64, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	04/06/2024 - 10:13 AM
Marzo 2024 1. En marzo de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Calendario de transferencia de información de indicadores de los ODS, actualizado; b) Cronograma e informe de generación de normativas y estándares para el año 2024, elaborado (Hitos 61 y 62, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	07/05/2024 - 10:44 AM
Febrero 2024	Viteri Garcés, Inés Andrea	02/04/2024 - 03:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. En febrero de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) propuesta de contenido del Plan Estadístico para reporte de los ODS (revisión bibliográfica), elaborada; b) informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2024, elaborado; y, c) pronunciamiento de apertura y/o interés para ejecutar la metodología del Plan Estadístico Territorial en los dos GAD prioritizados (Hitos 58,59 y 60, cumplidos)		
Enero 2024 1. En enero de 2024, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Hoja de ruta para construcción del Plan, actualizada; b) Informe de aplicación y conocimiento de la normativa técnica para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional para el 2024, generado (Hitos 56 y 57, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	06/03/2024 - 08:58 AM
Diciembre 2023 1. En diciembre de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_2do semestre 2023, actualizadas/ construidas y aprobadas; b) Documento con articulado para la reforma a la Ley de Estadística (anteproyecto de Ley), elaborado (Hitos 55 y 56, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	02/02/2024 - 05:52 PM
Noviembre 2023 1. En noviembre de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Plan Estadístico Territorial para los dos GAD prioritizados; b) Presentaciones de las normativas y/o estándares técnicos aprobados para socializar al Sistema Estadístico Nacional, realizadas (Hitos 53 y 54, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	05/01/2024 - 08:50 AM
Octubre 2023 1. En octubre de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento del siguiente hito: a) Informe 2023 sobre re categorización de indicadores aprobado (Hito 51 cumplido)	Viteri Garcés, Inés Andrea	05/12/2023 - 09:44 AM
Septiembre 2023 1. En septiembre de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Ejecución: Documento sobre el estado de aprobación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico a través del CONEC, elaborado; b) Retroalimentación y procesamiento de observaciones en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas (Hitos 49 y 50, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	07/11/2023 - 04:25 PM
Agosto 2023 1. En agosto de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Matriz de brechas de información sobre las temáticas prioritizadas por parte del segundo y tercer GAD seleccionado; b) Cronogramas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad generados (Hitos 47 y 48, cumplidos)	Viteri Garcés, Inés Andrea	04/10/2023 - 02:49 PM
Julio de 2023 1. En julio de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico, a aplicar por parte del Sistema Estadístico Nacional, elaborado, b) Versión inicial de la o las normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2023, elaborada (Hitos 45 y 46, cumplidos). Adicionalmente, en referencia a la actividad pendiente sobre el levantamiento de la oferta estadística del GAD de Rumiñahui para este mes ya fue realizada, con lo cual para julio ya se cuenta con el documento de producción de información (oferta estadística) del GAD de Quito y de Rumiñahui (Hito 42, cumplido)	Viteri Garcés, Inés Andrea	04/09/2023 - 11:20 AM
Junio de 2023: 1. En junio de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los siguientes hitos: a) Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_1er semestre 2023, actualizadas/ construidas y aprobadas; y, b) Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada. (Hitos 43 y 44, cumplidos). Para el hito 42, se cuenta con el documento de producción de información (oferta estadística) para el GAD de Quito, sin embargo se encuentra pendiente realizar el levantamiento de la oferta estadística del GAD de Rumiñahui, ya que las actividades se paralizaron por el cambio de autoridades locales.	Viteri Garcés, Inés Andrea	04/08/2023 - 11:09 AM
Mayo de 2023: 1. En mayo de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Propuesta de calendario de indicadores ODS construida; y, b) Cronograma de generación de normativas y estándares para el año 2023. (Hitos 40 y 41, cumplidos)	Romero Yonfá, Tania Gabriela	13/07/2023 - 12:10 PM
Abril de 2023: 1. En abril de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Actualización de las herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad; e, b) Construcción del informe de los indicadores ODS Tier II de corto plazo analizados.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	02/06/2023 - 09:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo de 2023: 1. En marzo de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Presentación para socialización de la normativa técnica y estándares emitidos a las entidades del Sistema Estadístico Nacional; y, b) Matriz de priorización de indicadores ODS Tier II de largo plazo para análisis y homologación.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	03/05/2023 - 08:36 AM
Febrero de 2023: 1. En febrero de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Oficio de respuesta para identificar apertura y/o interés para ejecutar construcción del Plan Estadístico Territorial en los GAD priorizados; e, b) Informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2023.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	04/04/2023 - 12:21 PM
Enero de 2023: 1. En enero de 2023, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Hoja de ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística; y, b) Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2022 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al SEN.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	06/03/2023 - 09:51 AM
Diciembre de 2022: 1. En diciembre de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de cinco hitos: a) Fichas metodológicas y/o informes de seguimiento de indicadores Tier II - corto plazo, actualizadas; b) Informe sobre re categorización de indicadores; c) Informe de finalización del proceso de implementación de la metodología del Plan Estadístico Territorial; d) Tomo I de la ENDE (versión para revisión); y, e) Propuesta técnica con investigación de leyes internacionales actuales, analizada y complementada.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	08/02/2023 - 04:57 PM
Noviembre de 2022: 1. En noviembre de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de tres hitos: a) Documento con el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas del GAD de Ibarra; b) Líneas de acción definidas y generación de estrategias para el cierre de brechas de información, costeadas en el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico; y, c) Taller relacionado a los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	05/01/2023 - 01:21 PM
Octubre de 2022: 1. En octubre de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de tres hitos: a) Diagnóstico de los planes de trabajo existentes para indicadores Tier II - largo plazo; b) Evidencia documental recolectada por la aplicación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad; e, c) Informe de las entrevistas semiestructuradas con actores clave en el marco del diseño y construcción de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	07/11/2022 - 08:54 AM
Septiembre de 2022: 1. En septiembre de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Documento de verificación de brechas de información en el GAD priorizado; y, b) Retroalimentación y procesamiento de observaciones de las áreas involucradas en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022.	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	06/10/2022 - 08:53 AM
Agosto de 2022: 1. Por medio de memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0570-M, de 25 de julio de 2022, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA) alertó a la Dirección de Planificación Estadística del SEN (DIPSEN) la necesidad de analizar y reestructurar los hitos del proyecto de inversión. A través de memorando Nro. INEC-CTPES-2022-0191-M, de 18 de agosto de 2022, las unidades ejecutoras del proyecto solicitaron a la Dirección Ejecutiva la autorización para la reestructuración de hitos del proyecto en mención, misma que fue aprobada por medio del memorando Nro. INEC-INEC-2022-0716-M. 2. En agosto de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de tres hitos: a) Fases preparatorias de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, iniciadas; b) Fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas; y, c) Consultor para desarrollo de la ENDE, contratado.	Proaño Verdezoto, María Gabriela	06/10/2022 - 08:51 AM
Julio de 2022: 1. En julio de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Series históricas de los indicadores Tier I, actualizadas; y, b) Normativa nacional relacionada con temas estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada.	Proaño Verdezoto, María Gabriela	06/10/2022 - 08:50 AM
Junio de 2022: 1. En junio de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de tres hitos: a) Formulación de fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas; b) Definición de contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE; y, c) Definición de contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas. (Hitos 12, 14 y 15, cumplidos)	Proaño Verdezoto, María Gabriela	06/10/2022 - 08:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo de 2022: 1. En mayo de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Construcción de la metodología para seguimiento de los planes de trabajo que se definan para los indicadores Tier II; y, b) Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas. (Hitos 10 y 11, cumplidos)	Proaño Verdezoto, Maria Gabriela	06/10/2022 - 08:50 AM
Abril de 2022: 1. En abril de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Actualización de las herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad; y, b) Preparación del informe del proceso técnico implementado con la finalidad de seleccionar el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) que será priorizado en el 2022, para implementar el Plan Estadístico Territorial. (Hitos 8 y 9, cumplidos)	Proaño Verdezoto, Maria Gabriela	06/10/2022 - 08:50 AM
Marzo de 2022: 1. En marzo de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de cuatro hitos: a) Definición y aprobación de la matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022; b) Análisis, construcción y definición del documento para priorizar los GAD en los que se implementará la metodología del Plan Estadístico territorial; y, c) Análisis de las posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa (hitos 5, 6 y 7, cumplidos).	Proaño Verdezoto, Maria Gabriela	06/10/2022 - 08:49 AM
Febrero de 2022: 1. En febrero de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los dos hitos: a) Definición de la propuesta de estructura de la ENDE, a partir de la revisión de referentes internacionales; y, b) Definición del listado de operaciones estadísticas priorizadas para pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad (hitos 3 y 4, cumplidos).	Proaño Verdezoto, Maria Gabriela	06/10/2022 - 08:49 AM
Enero de 2022: 1. En enero de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los dos hitos: elaboró el reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, además construyó las hojas de rutas para la construcción de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico - ENDE, Plan Estadístico Territorial y Plan Estadístico para los ODS (hitos 1 y 2, cumplidos).	Proaño Verdezoto, Maria Gabriela	06/10/2022 - 08:48 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Falta de participación activa en socialización/aplicación de métodos de evaluación de operaciones estadísticas y su normativa, por miembros del SEN y responsables de las operaciones estadísticas CAUSARIA dificultades para garantizar su calidad estadística	30/01/2024	Inés Andrea Viteri Garcés	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planeación: Hoja de Ruta para el desarrollo del instrumento	4-Inicio de Trabajo	30/01/2022		30/01/2022		Sí	0.44

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de planificación estadística aprobado							
2	Ejecución: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, generado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.31
3	Ejecución: Propuesta de estructura de la ENDE, elaborada	5-Entregables Intermedios	20/02/2022		20/02/2022		Sí	1.31
4	Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.74
5	Definición: Matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022, elaborada	5-Entregables Intermedios	15/03/2022		15/03/2022		Sí	1.3
6	Ejecución: Metodología para la priorización de un GAD, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	1.31
7	Ejecución: Posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa, analizadas	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.74
8	Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		30/04/2022		Sí	1.74
9	Ejecución: Informe de selección de GAD para aplicación de la metodología, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		28/04/2022		Sí	1.74
10	Ejecución: Metodología para seguimiento de los planes de trabajo de indicadores Tier II, construida	5-Entregables Intermedios	30/05/2022		30/05/2022		Sí	1.3
11	Ejecución: Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.3
12	Definición: Contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE, identificadas	5-Entregables Intermedios	13/06/2022		13/06/2022		Sí	0.87
13	Ejecución: Contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas, definidas	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.31
14	Ejecución: Series históricas de los indicadores Tier I, actualizadas	5-Entregables Intermedios	10/07/2022		10/07/2022		Sí	1.74
15	Ejecución: Normativa nacional relacionada con temas	5-Entregables Intermedios	31/07/2022		31/07/2022		Sí	1.31

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada							
16	Ejecución: Fases preparatorias de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, iniciadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.74
17	Ejecución: Fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.74
18	Planeación: Consultor para desarrollo de la ENDE, contratado	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.87
19	Ejecución: Documento de verificación de brechas de información en el GAD priorizado, entregado	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.74
20	Ejecución: Retroalimentación y procesamiento de observaciones de las áreas involucradas en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.31
21	Ejecución: Diagnóstico de los planes de trabajo existentes para indicadores Tier II -largo plazo (Primer Borrador), elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2022		30/10/2022		Sí	1.3
22	Ejecución: Evidencia documental recolectada por la aplicación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, analizada	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	1.74
23	Ejecución: Informe de las entrevistas semiestructuradas con actores clave, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	1.3
24	Ejecución: Documento con el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas del GAD, entregado	5-Entregables Intermedios	01/11/2022		01/11/2022		Sí	1.74
25	Ejecución: Líneas de acción definidas y generación de estrategias para el cierre de brechas de información, costeadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.74
26	Ejecución: Taller relacionado a los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.31
27	Ejecución: Fichas metodológicas y/o informes de seguimiento de indicadores Tier II- corto plazo, actualizadas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	10/12/2022		10/12/2022		Sí	1.74
28	Ejecución: Informe sobre re categorización de indicadores, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/12/2022		10/12/2022		Sí	1.74

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	Ejecución: Informe de finalización del proceso de implementación de la metodología del Plan Estadístico Territorial, entregado	5-Entregables Intermedios	28/12/2022		28/12/2022		Sí	1.74
30	Cierre: Tomo I de la ENDE (versión para revisión), elaborado y entregado	5-Entregables Intermedios	30/12/2022		30/12/2022		Sí	2.18
31	Ejecución: Propuesta técnica con investigación de leyes internacionales actuales, analizada y complementada	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.83
32	Ejecución: Hoja de ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística aprobado	5-Entregables Intermedios	30/01/2023		30/01/2023		Sí	0.52
33	Ejecución: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2022 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al SEN, generado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.23
34	Definición: Oficio de respuesta para identificar apertura y/o interés para ejecutar construcción del Plan Estadístico Territorial en los GAD priorizados	9-Entregables Formales	27/02/2023		27/02/2023		Sí	0.52
35	Cierre: Informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2023, generado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.52
36	Ejecución: Presentación para socialización de la normativa técnica y estándares emitidos a las entidades del Sistema Estadístico Nacional, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/03/2023		30/03/2023		Sí	0.8
37	Ejecución: Matriz de priorización de indicadores ODS Tier II de largo plazo para análisis y homologación, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.52
38	Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizada	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.52
39	Ejecución: Informe de los indicadores ODS Tier II de corto plazo analizados	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.23
40	Ejecución: Propuesta de calendario de indicadores ODS construida	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	0.8
41	Ejecución: Cronograma de generación de normativas y estándares para el año 2023, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.52
42	Ejecución: Documento de producción de información	5-Entregables Intermedios	29/06/2023		31/07/2023		Sí	0.52

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(oferta estadística) en los dos GAD priorizados							
43	Ejecución: Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_1er semestre 2023, actualizadas/construidas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.23
44	Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.8
45	Ejecución: Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico, a aplicar por parte del Sistema Estadístico Nacional, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		31/07/2023		Sí	0.8
46	Ejecución: Versión inicial de la o las normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2023, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.8
47	Definición: Matriz de brechas de información sobre las temáticas priorizadas por parte del segundo y tercer GAD seleccionado	5-Entregables Intermedios	30/08/2023		30/08/2023		Sí	0.52
48	Ejecución: Cronogramas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad generados	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.52
49	Ejecución: Documento sobre el estado de aprobación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico a través del CONEC, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.8
50	Ejecución: Retroalimentación y procesamiento de observaciones en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.52
51	Ejecución: Informe 2023 sobre re categorización de indicadores aprobado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.8
52	Ejecución: Plan Estadístico Territorial para los dos GAD priorizados	5-Entregables Intermedios	29/11/2023		29/11/2023		Sí	0.8
53	Ejecución: Presentaciones de las normativas y/o estándares técnicos aprobados para socializar al Sistema Estadístico Nacional, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.52
54	Ejecución: Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_2do semestre 2023, actualizadas/construidas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	22/12/2023		22/12/2023		Sí	0.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	Ejecución: Documento con articulado para la reforma a la Ley de Estadística (anteproyecto de Ley), elaborado	5-Entregables Intermedios	28/12/2023		28/12/2023		Sí	0.8
56	Planeación: Hoja de ruta para construcción del Plan, actualizada	5-Entregables Intermedios	15/01/2024		15/01/2024		Sí	0.34
57	Planeación: Informe de aplicación y conocimiento de la normativa técnica para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional para el 2024, generado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.35
58	Ejecución: Propuesta de contenido del Plan Estadístico para reporte de los ODS (revisión bibliográfica), elaborada	5-Entregables Intermedios	16/02/2024		16/02/2024		Sí	0.35
59	Cierre: Informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.35
60	Ejecución: Pronunciamiento de apertura y/o interés para ejecutar la metodología del Plan Estadístico Territorial en los dos GAD priorizados	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.35
61	Ejecución: Calendario de transferencia de información de indicadores de los ODS, actualizado	5-Entregables Intermedios	29/03/2024		29/03/2024		Sí	0.34
62	Planeación: Cronograma e informe de generación de normativas y estándares para el año 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2024		31/03/2024		Sí	0.34
63	Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad (presentaciones o matrices), actualizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.52
64	Ejecución: Información de los indicadores ODS que cuentan con fichas homologadas de instituciones responsables, actualizadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.52
65	Ejecución: Presentación/es de socialización 1 de la normativa técnica y estándares emitidos previamente a las entidades del Sistema Estadístico Nacional, realizada/as	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.52
66	Ejecución: Propuesta estructura del contenido del documento del Plan Estadístico de los ODS, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.52
67	Ejecución: Acuerdos/ compromisos sobre análisis y homologación de indicadores	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 1er semestre 2024, generados							
68	Ejecución: Documento de identificación de la producción de información (oferta estadística) en los dos GAD priorizados, elaborados	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		31/07/2024		Sí	0.51
69	Ejecución: Documentos metodológicos de indicadores de los ODS_1er semestre 2024 actualizados	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.52
70	Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	0.52
71	Ejecución: Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) revisado - CTPES	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.35
72	Ejecución: Normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2024 en versión inicial, generado	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.35
73	Ejecución: Matriz de brechas de información sobre las temáticas seleccionadas en los dos GAD priorizados, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/08/2024	30/08/2024			No	0.34
74	Ejecución: Matriz sobre los pedidos de información y proyectos relacionados a la generación de los indicadores de los ODS, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/08/2024	30/08/2024			No	0.35
75	Planeación: Cronogramas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generados	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.34
76	Ejecución: Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) aprobado - DIREJ	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.35
77	Ejecución: Normativas y/o estándares técnicos (planificados 2024) finalizados a nivel técnico, retroalimentados desde las áreas involucradas y con observaciones procesadas	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.34
78	Ejecución: Informes sobre las estrategias que se han realizado para el monitoreo de los ODS, elaborado	5-Entregables Intermedios	07/10/2024	07/10/2024			No	2.31
79	Ejecución: Métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, socializados	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	2.31
80	Ejecución: Pronunciamiento del CONEC sobre el documento de	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	2.33

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) presentado							
81	Ejecución: Plan Estadístico Territorial para los dos GAD priorizados, construidos	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	2.31
82	Ejecución: Presentación/es de socialización 2 de las normativas y/o estándares técnicos aprobados en el marco del fortalecimiento de capacidades, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2024	30/11/2024			No	2.31
83	Ejecución: Acuerdos/ compromisos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 2do semestre 2024, generados	5-Entregables Intermedios	27/12/2024	27/12/2024			No	2.31
84	Ejecución: Documentos metodológicos de indicadores de los ODS_2do semestre, actualizados	5-Entregables Intermedios	27/12/2024	27/12/2024			No	2.31
85	Ejecución: Informes/ reportes de resultados de la implementación de métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, generados	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	2.31
86	Ejecución: Implementación de instrumentos de planificación estadística	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	6.72
87	Ejecución: Implementación de métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	6.74

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1: Porcentaje de avance en la construcción de la ENDE		100.00 %	0.04	0.04	01/01/2022	Abr-Jun
2	C1: Porcentaje de avance en la implementación de la metodología para Planes de Desarrollo Estadístico: Territorial y ODS		83.33 %	0.03	0.025	01/01/2022	Abr-Jun
3	C2: Porcentaje de avance en la propuesta del Marco Legal actualizado desde una visión técnica y legal y normas técnicas y estándares estadísticos generados		100.00 %	0.05	0.05	01/01/2022	Abr-Jun
4	C2: Porcentaje de operaciones estadísticas con al menos un método de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad implementado		100.00 %	0.0034	0.0034	01/01/2022	Abr-Jun
5	C3: Porcentaje de procesos y métodos automatizados de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad		100.00 %	0.2	0.2	04/01/2023	Ene-Jun

INDICADORES DEL PROYECTO


	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
6	C1: Porcentaje de avance en la implementación de la ENDE		100.00 %	0	0	10/01/2023	Abr-Jun
7	C3: Plataforma digital en funcionamiento para capacitaciones virtuales		-	-	-	01/09/2023	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	758,082.05 **
Costo Total:	1,172,115.74
Total Devengado:	636,639.03
% Costo Total Devengado:	54.32 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.	


% COSTO TOTAL DEVENGADO



Perfil Económico 2024				
	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	562,387.87	259,384.96	0.00	821,772.83
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	486,054.79	284,554.30	0.00	770,609.09
Ppto. Codificado	562,387.87	259,384.96	0.00	821,772.83
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2024)		0.00		
Programado a Devengar	562,387.87	259,384.96	0.00	821,772.83
Ppto. Devengado	498,697.09	137,941.94	0.00	636,639.03
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 498,697.09	0.00	0.00	498,697.09
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	63,690.78	259,384.96	0.00	323,075.74
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.67 %	53.18 %	0.00 %	77.47 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024

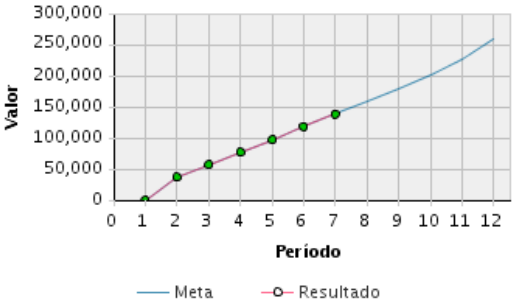

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	36,637.55	36,637.55	36,637.55	36,637.55	100.00 %		14.12 %
Mar	20,191.40	20,191.40	56,828.95	56,828.95	100.00 %		21.91 %
Abr	20,191.40	20,191.40	77,020.35	77,020.35	100.00 %		29.69 %
May	20,273.53	20,374.53	97,293.88	97,394.88	100.10 %		37.55 %
Jun	20,475.53	20,273.53	117,769.41	117,668.41	99.91 %		45.36 %
Jul	20,716.02	20,273.53	138,485.43	137,941.94	99.61 %		53.18 %
Ago	20,716.02		159,201.45				
Sep	20,716.02		179,917.47				
Oct	20,716.02		200,633.49				
Nov	24,916.02		225,549.51				
Dic	33,835.45		259,384.96				
Total	259,384.96	137,941.94					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar las capacidades estadísticas de los productores de información mediante el diseño e implementación de instrumentos de planificación estadística.
6	Incrementar el número de operaciones estadísticas difundidas de manera puntual mediante la identificación de las fuentes que presentan retraso continuo por dificultades técnicas que puedan solventarse en las comisiones especiales de estadística.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES) >Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE)	
19	Incrementar la implementación del Plan de Fortalecimiento Estadístico para el SEN MEDIANTE la asesoría externa, talleres sobre normativa técnica, estándares estadísticos y el marco de aseguramiento de calidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de constitución - PDP - Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional	Archivos_constitución.rar	07/03/2022
2	ASOCIACION HITO 01: Ejecución: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, generado.	A1_HITO1.rar	04/02/2022
3	ASOCIACION HITO 02: Planeación: Hoja de Ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística aprobado	A2_HITO2.rar	04/02/2022
4	ASOCIACION HITO 03: Ejecución: Propuesta de estructura de la ENDE, elaborada	A3_HITO_3.rar	04/03/2022
5	ASOCIACION HITO 04: Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada	A4_HITO4.rar	04/03/2022
6	ASOCIACION HITO 05: Definición: Matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022, elaborada	A5_HITO_5.rar	04/04/2022
7	ASOCIACION HITO 06: Ejecución: Metodología para la priorización de un GAD, elaborada	A6_HITO_6.rar	04/04/2022
8	ASOCIACION HITO 07: Ejecución: Posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica	A7_HITO_7.rar	04/04/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa, analizadas.		
9	ASOCIACION HITO 09: Ejecución: Informe de selección de GAD para aplicación de la metodología, aprobado.	A9_HITO_9.rar	29/04/2022
10	ASOCIACION HITO 12: Ejecución: Fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas	B3_HITO12.rar	06/07/2022
11	ASOCIACION HITO 14: Definición: Contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE, identificadas	B5_HITO14.rar	06/07/2022
12	ASOCIACION HITO 15: Ejecución: Contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas, definidas.	B6_HITO15.rar	06/07/2022
13	ASOCIACION HITO 16: Ejecución: Fases preparatorias de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, iniciadas.	B9_HITO16.rar	02/09/2022
14	ASOCIACION HITO 16: Ejecución: Series históricas de los indicadores Tier I, actualizadas	B7_HITO16.rar	09/08/2022
15	ASOCIACION HITO 17: Ejecución: Fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas.	C1_HITO17.rar	07/09/2022
16	ASOCIACION HITO 17: Ejecución: Normativa nacional relacionada con temas estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada	B8_HITO17.rar	03/08/2022
17	ASOCIACION HITO 18: Planeación: Consultor para desarrollo de la ENDE, contratado.	C2_HITO18.rar	02/09/2022
18	ASOCIACION HITO 19: Documento de verificación de brechas de información en el GAD priorizado, entregado	C3_HITO19.rar	06/10/2022
19	ASOCIACION HITO 20: Retroalimentación y procesamiento de observaciones de las áreas involucradas en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas	C4_HITO20.rar	05/10/2022
20	ASOCIACION HITO 21: Diagnóstico de los planes de trabajo existentes para indicadores Tier II -largo plazo (Primer Borrador), elaborado	C5_HITO21.rar	08/11/2022
21	ASOCIACION HITO 22: Evidencia documental recolectada por la aplicación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, analizada	C6_HITO_22.rar	08/11/2022
22	ASOCIACION HITO 23: Informe de las entrevistas semiestructuradas con actores clave, elaborado	C7_HITO23.rar	08/11/2022
23	ASOCIACION HITO 24: Documento con el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas del GAD	C8_HITO24.rar	07/12/2022
24	ASOCIACION HITO 25: Líneas de acción definidas y generación de estrategias para el cierre de brechas de información, costeadas	C9_HITO25.rar	07/12/2022
25	ASOCIACION HITO 26: Taller relacionado a los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, realizado	D1_HITO26.rar	07/12/2022
26	ASOCIACION HITO 27: Fichas metodológicas y/o informes de seguimiento de indicadores Tier II- corto plazo, actualizadas y aprobadas	D2_HITO27.rar	09/01/2023
27	ASOCIACION HITO 28: Informe sobre re categorización de indicadores, aprobado	D3_HITO28.rar	09/01/2023
28	ASOCIACION HITO 29: Informe de finalización del proceso de implementación de la metodología del Plan Estadístico Territorial, entregado	D4_HITO29.rar	09/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
29	ASOCIACION HITO 30: Tomo I de la ENDE (versión para revisión), elaborado y entregado	D5_HITO30.rar	09/01/2023
30	ASOCIACION HITO 31: Propuesta técnica con investigación de leyes internacionales actuales, analizada y complementada	D6_HITO31.rar	08/02/2023
31	ASOCIACION HITO 32: Hoja de ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística aprobado	D7_HITO32.rar	10/02/2023
32	ASOCIACION HITO 33: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2022 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al SEN, generado	D8_HITO33.rar	08/02/2023
33	ASOCIACION HITO 34: Oficio de respuesta para identificar apertura y/o interés para ejecutar construcción del Plan Estadístico Territorial en los GAD priorizados	D9_HITO34.rar	07/03/2023
34	ASOCIACION HITO 35: Informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2023, generado	E1_HITO35.rar	06/03/2023
35	ASOCIACION HITO 36: Presentación para socialización de la normativa técnica y estándares emitidos a las entidades del Sistema Estadístico Nacional, elaborada	E2_HITO36.rar	04/04/2023
36	ASOCIACION HITO 37: Matriz de priorización de indicadores ODS Tier II de largo plazo para análisis y homologación, elaborada	E3_HITO37.rar	10/04/2023
37	ASOCIACION HITO 38: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizada	E4_HITO38.rar	03/05/2023
38	ASOCIACION HITO 39: Informe de los indicadores ODS Tier II de corto plazo analizados	E5_HITO39.rar	09/05/2023
39	ASOCIACION HITO 40: Propuesta de calendario de indicadores ODS construida	E6_HITO40.rar	02/06/2023
40	ASOCIACION HITO 41: Cronograma de generación de normativas y estándares para el año 2023, elaborado	E7_HITO41.rar	02/06/2023
41	ASOCIACION HITO 68: Documento de identificación de la producción de información (oferta estadística) en los dos GAD priorizados, elaborados	H9_HITO68.rar	05/08/2024
42	ASOCIACION HITO 71: Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) revisado - CTPES	I3_HITO71.rar	05/08/2024
43	ASOCIACION HITO 72: Normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2024 en versión inicial, generado	I4_HITO72.rar	05/08/2024
44	ASOCIACIÓN HITO 08: Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizadas.	A8_HITO_8.rar	06/05/2022
45	ASOCIACIÓN HITO 10: Ejecución: Metodología para seguimiento de los planes de trabajo de indicadores Tier II, construida.	B1_HITO_10.rar	01/06/2022
46	ASOCIACIÓN HITO 11: Ejecución: Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas.	B2_HITO_11.rar	31/05/2022
47	ASOCIACIÓN HITO 42: Documento de producción de información (oferta estadística) en los dos GAD priorizados	E8_HITO_42.rar	04/08/2023
48	ASOCIACIÓN HITO 43: Ejecución: Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_1er semestre 2023, actualizadas/construidas y aprobadas	E9_HITO_43.rar	10/07/2023
49	ASOCIACIÓN HITO 44: Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los	F1_Hito_44.rar	05/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada		
50	ASOCIACIÓN HITO 45: Documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico, a aplicar por parte del Sistema Estadístico Nacional, elaborado	F2_HITO_45.rar	04/08/2023
51	ASOCIACIÓN HITO 46: Versión inicial de la o las normativas y/o estándares técnicos planificados para el 2023, elaborada	F3_HITO46.rar	04/08/2023
52	ASOCIACIÓN HITO 47: Matriz de brechas de información sobre las temáticas priorizadas por parte del segundo y tercer GAD seleccionado	F4_HITO_47.rar	05/09/2023
53	ASOCIACIÓN HITO 48: Cronogramas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad generados	F5_HITO_48.rar	04/09/2023
54	ASOCIACIÓN HITO 49: Documento sobre el estado de aprobación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico a través del CONEC, elaborado	F6_HITO_49.rar	05/10/2023
55	ASOCIACIÓN HITO 50: Retroalimentación y procesamiento de observaciones en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas	F7_HITO50.rar	04/10/2023
56	ASOCIACIÓN HITO 51: Informe 2023 sobre re categorización de indicadores aprobado	F8_Hito_51.rar	08/11/2023
57	ASOCIACIÓN HITO 52: Reporte de implementación de las actividades de automatización del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generado	F9_Hito_52.rar	07/11/2023
58	ASOCIACIÓN HITO 53: Plan Estadístico Territorial para los dos GAD priorizados	G1_HITO53.rar	05/12/2023
59	ASOCIACIÓN HITO 54: Presentaciones de las normativas y/o estándares técnicos aprobados para socializar al Sistema Estadístico Nacional, realizadas	G2_HITO54.rar	05/12/2023
60	ASOCIACIÓN HITO 55: Fichas metodológicas y planes de trabajo de indicadores ODS_2do semestre 2023, actualizadas/construidas y aprobadas	G3_HITO_55.rar	03/01/2024
61	ASOCIACIÓN HITO 56: Documento con articulado para la reforma a la Ley de Estadística (anteproyecto de Ley), elaborado	G4_HITO56.rar	03/01/2024
62	ASOCIACIÓN HITO 56: Hoja de ruta para construcción del Plan, actualizada	G6_HITO56.rar	05/02/2024
63	ASOCIACIÓN HITO 57: Evidencia documental recolectada por la aplicación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, analizada	G5_HITO57.rar	05/01/2024
64	ASOCIACIÓN HITO 57: Informe de aplicación y conocimiento de la normativa técnica para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional para el 2024, generado	G7_HITO57.rar	05/02/2024
65	ASOCIACIÓN HITO 58: Propuesta de contenido del Plan Estadístico para reporte de los ODS (revisión bibliográfica), elaborada	G8_HITO58.rar	06/03/2024
66	ASOCIACIÓN HITO 59: Informe de cierre de uno de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de calidad, para evidenciar mejoras en el 2024, elaborado	G9_HITO59.rar	06/03/2024
67	ASOCIACIÓN HITO 60: Pronunciamiento de apertura y/o interés para ejecutar la metodología del Plan Estadístico Territorial en los dos GAD priorizados	H1_HITO_60.rar	06/03/2024
68	ASOCIACIÓN HITO 61: Calendario de transferencia de información de indicadores de los ODS, actualizado	H2_HITO_61.rar	02/04/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
69	ASOCIACIÓN HITO 62: Cronograma e informe de generación de normativas y estándares para el año 2024, elaborado	H3_HITO62.rar	02/04/2024
70	ASOCIACIÓN HITO 63: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad (presentaciones o matrices), actualizados	H4_HITO63.rar	07/05/2024
71	ASOCIACIÓN HITO 64: Información de los indicadores ODS que cuentan con fichas homologadas de instituciones responsables, actualizadas	H5_HITO64.rar	07/05/2024
72	ASOCIACIÓN HITO 65: Presentación/es de socialización 1 de la normativa técnica y estándares emitidos previamente a las entidades del Sistema Estadístico Nacional, realizada/as	H6_HITO65.rar	04/06/2024
73	ASOCIACIÓN HITO 66: Propuesta estructura del contenido del documento del Plan Estadístico de los ODS, elaborada	H7_HITO66.rar	05/06/2024
74	ASOCIACIÓN HITO 67: Acuerdos/compromisos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 1er semestre 2024, generados	H8_HITO67.rar	03/07/2024
75	ASOCIACIÓN HITO 69: Documentos metodológicos de indicadores de los ODS_1er semestre 2024 actualizados	I1_HITO69.rar	03/07/2024
76	ASOCIACIÓN HITO 70: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, elaborado	I2_HITO70.rar	03/07/2024
77	GPROB_001_001: Ajustes en la planificación inicial prevista para la ejecución de actividades del Proyecto de Inversión	GPROB_001_001.rar	07/09/2022
78	GR01-OO1-Cierre: Falta de participación activa del SEN, en socialización y aplicación de métodos de evaluación de operaciones estadísticas y normativa, CAUSARIA dificultades para garantizar la calidad de la información estadística oficial	GR01-001.rar	11/01/2023
79	GR01-OO1: Falta de interés y participación activa en la planificación estadística por los miembros del SEN CAUSARIA dificultades para fortalecer las capacidades de los productores de información (2024)	GR01-OO1_2024.rar	05/08/2024
80	GR01-OO1: Falta de interés y participación activa en la planificación estadística por los miembros del SEN CAUSARIA dificultades para la actualización, formulación, y/o aplicación de instrumentos de planificación estadística	GR01-OO1.rar	05/01/2024
81	GR01-OO1: Falta de participación activa del SEN, en socialización y aplicación de métodos de evaluación de operaciones estadísticas y normativa, CAUSARIA dificultades para garantizar la calidad de la información estadística oficial.	GR01-001.rar	12/09/2022
82	GR02-OO1-Cierre: Falta de interés y participación activa en la planificación estadística por los miembros del SEN CAUSARIA dificultades para fortalecer las capacidades de los productores de información	GR02-OO1.rar	09/01/2023
83	GR02-OO1: Falta de infraestructura para automatizar los procesos y métodos de evaluación y la plataforma digital para la capacitación CAUSARIA dificultades en la ejecución de las actividades planificadas para el fortalecimiento del MAC	GR02-OO1.rar	05/01/2024
84	GR02-OO1: Falta de interés y participación activa en la planificación estadística por los miembros del SEN CAUSARIA dificultades para fortalecer las capacidades de los productores de información	GR02-OO1.rar	06/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
85	Reestructuración de hitos del proyecto - Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional	Reestructuración_de_hitos.rar	26/08/2022
86	Reestructuración de hitos del proyecto - Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional 2023	Reestructuracion_hitos_2023.rar	25/01/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivadeneira Lozano, Gloria Aracely	Colaboración en el desarrollo de actividades planificadas.	Analista de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional	gloria_rivadeneira@inec.gob.ec	
Romero Yonfá, Tania Gabriela	Coordinación y ejecución de actividades planificadas.	Directora de Planificación Estadística del SEN	Tania_Romero@inec.gob.ec	3827000
Torres Rosero, Mónica Alexandra	Colaboración en el desarrollo de actividades planificadas.	Responsable de gestión de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	monica_torres@inec.gob.ec	
