

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K013 INEC: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU**

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.389651	TIR:	16.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	155,265.79
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	430,735.59
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	29/06/2025 - 30/06/2026
Fecha de última actualización:	08/09/2025	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Fecha del siguiente Hito:	08/08/2025

## DATOS GENERALES

### Descripción

No disponer de datos que posibiliten la actualización de indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que se desarrollen en el país para tratar de prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.

El 29 de mayo de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación, la emisión del dictamen de prioridad e inclusión en el PAI 2025 del proyecto "Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU" con CUP 31210000.0000.389651, inicialmente se planificó recibir los recursos financieros en Junio de 2025, comenzar la ejecución de la Encuesta en Julio 2025 e iniciar el operativo de campo en noviembre 2025, considerando los tiempos operativos que implican cada uno de los procesos que involucran a la ENVIGMU. Sin embargo, al obtenerse el dictamen de prioridad el 29 de junio del 2025, fue necesario reprogramar todas las actividades en torno a la encuesta, es así que la ejecución del proyecto se replanteó desde septiembre de 2025, el inicio del operativo de campo a partir de enero 2026.

### Beneficios Cualitativos

Contar con datos estadísticos sobre violencia de género contra las mujeres

### Tipo de Beneficiario

Externos: Estudiantes, investigadores, Funcionarios Públicos, Mujeres de 15 años y más de edad.


### Restricciones

El tiempo de ejecución del proyecto es de 12 meses, en el cual se debe incluir y considerar las fases de evaluación y cierre

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO







Transcurrido: 19.62 %

Fecha de Inicio: 29/06/2025

Fecha de Fin: 30/06/2026
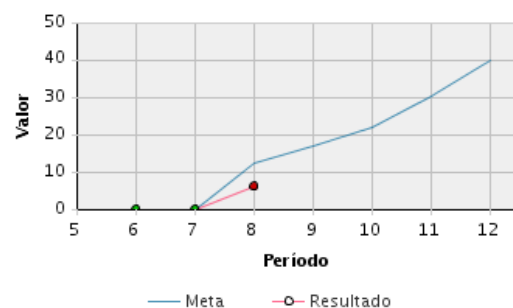
### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
						0 %	0 %	12 %	17 %	22 %	30 %	40 %
	Avance real acumulado											
						0 %	0 %	6 %				
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2025: La ENVIGMU investigará información en 23.160 viviendas a nivel nacional en las 24 provincias del Ecuador, viviendas en las cuales se espera seleccionar a una mujer de 15 años y más de edad para aplicar un formulario, sea de mujeres casadas o unidas, separadas, viudas o divorciadas o solteras. Se ha planificado efectuar la recolección en 3 meses, iniciando esta fase en enero de 2026, investigará alrededor de 7.720 viviendas cada mes de trabajo, hasta marzo de 2026.</p> <p>Es importante destacar que esta encuesta además de entregar resultados comparables con la línea de base de 2019 sobre violencia física, psicológica, sexual, económica/patrimonial y gineco/obstétrica, tanto en los ámbitos educativos, laboral, social, familia de origen y vida en pareja, incluirá variables que permitan determinar la violencia en el ámbito cibernético y digital, así como, nos dará un acercamiento al tipo de violencia vicaria.</p> <p>El 28 de mayo del 2025 la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas con el Oficio Nro. MEF-SP-2025-0614-O emite disponibilidad presupuestaria para gestionar el dictamen de prioridad del proyecto: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Genero contra las Mujer - ENVIGMU, inclusión en PAI 2025 e incremento de recursos para el proyecto ENVIGMU. El 29 de mayo de 2025 se postuló el proyecto ante la Secretaría Nacional de Planificación, obteniendo su dictamen de prioridad a través del oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0173-O de fecha 29 de junio de 2025.</p> <p>Además, con oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0571-OF de fecha 08 de julio de 2025 se autorizó el incremento al PAI institucional del año 2025. Finalmente, con el memorando Nro. INEC-CGAF-2025-1378-M de fecha 29 de julio de 2025 la Coordinación General Administrativa Financiera informa el incremento presupuestario en gasto de inversión del proyecto - ENVIGMU, según modificación presupuestaria AMP CO2 No. 084.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 1 (CUMPLIDO): El 08 de agosto de 2025 mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0746-M se aprobó el Plan de Dirección de Proyecto para la ejecución de esta actividad en 2025.</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	08/09/2025 - 01:07 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Retraso en el inicio de las capacitaciones al personal técnico CAUSARÍA afectación en la recolección de datos	08/09/2025	Virginia Natali Mendoza Moreira	70 %	60	42	0/1
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> La entrega a destiempo del requerimiento para el sistema de captura CAUSARÍA el retraso en el inicio del proceso de capacitación y recolección.	08/09/2025	Virginia Natali Mendoza Moreira	60 %	50	30	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Formulario de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	08/08/2025	08/08/2025			No	6.06
2	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	08/08/2025		08/08/2025		Sí	6.06
3	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Listado de productos que se generarán a partir de la encuesta	5-Entregables Intermedios	09/09/2025	09/09/2025			No	3.64
4	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la OE aprobada	5-Entregables Intermedios	26/09/2025	26/09/2025			No	1.21
5	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	14/10/2025	14/10/2025			No	2.42
6	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	24/10/2025	24/10/2025			No	2.42
7	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Informe de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	10/11/2025	10/11/2025			No	6.06
8	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	24/11/2025	24/11/2025			No	2.43
9	ENVIGMU_C2. LEV_INFORMACIÓN: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	05/12/2025	05/12/2025			No	4.85
10	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Sistema de captura de datos aprobado y recibido	9-Entregables Formales	19/12/2025	19/12/2025			No	4.85
11	ENVIGMU_C2. CONS_INSTRUMENTOS: EJECUCIÓN: Ejecutar la recolección y entrega de resultados	9-Entregables Formales	30/06/2026	30/06/2026			No	60.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de formularios previo al inicio de la recolección aprobados.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/08/2025	-
2	Numero de manuales previo a la capacitación elaborados.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/10/2025	-
3	Numero de protocolos de sensibilización previo a la capacitación elaborado.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/10/2025	-
4	Numero de sistema de captura de información previo al inicio de la recolección desarrollado	<input type="checkbox"/>	-	-	-	28/11/2025	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	430,735.59 **
Costo Total:	1,843,638.90
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Codificado	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	430,735.59	0.00	430,735.59
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	430,735.59	0.00	430,735.59
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025



### Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	68,874.80		68,874.80				
Oct	64,724.80		133,599.60				
Nov	220,728.19		354,327.79				
Dic	76,407.80		430,735.59				
Total	430,735.59						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	PLANT_HITOS_HITOS PROYECTOS_GPR 2025 HITO A2	PLANT_HITOS_PROYECTOS_GPR_2025_HITO_A2_fusionado.pdf	08/09/2025
