

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K013 INEC: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.389651	TIR:	16.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	155,265.79
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	430,735.59
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	29/06/2025 - 30/06/2026
Fecha de última actualización:	08/01/2026	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Fecha del siguiente Hito:	26/09/2025

DATOS GENERALES

Descripción

No disponer de datos que posibiliten la actualización de indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que se desarrollen en el país para tratar de prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.
 El 29 de mayo de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación, la emisión del dictamen de prioridad e inclusión en el PAI 2025 del proyecto "Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU" con CUP 31210000.0000.389651, inicialmente se planificó recibir los recursos financieros en Junio de 2025, comenzar la ejecución de la Encuesta en Julio 2025 e iniciar el operativo de campo en noviembre 2025, considerando los tiempos operativos que implican cada uno de los procesos que involucran a la ENVIGMU. Sin embargo, al obtenerse el dictamen de prioridad el 29 de junio del 2025, fue necesario reprogramar todas las actividades en torno a la encuesta, es así que la ejecución del proyecto se replanteó desde septiembre de 2025, el inicio del operativo de campo a partir de enero 2026.

Beneficios Cualitativos

Contar con datos estadísticos sobre violencia de género contra las mujeres

Tipo de Beneficiario

Externos: Estudiantes, investigadores, Funcionarios Públicos, Mujeres de 15 años y más de edad.


Restricciones

El tiempo de ejecución del proyecto es de 12 meses, en el cual se debe incluir y considerar las fases de evaluación y cierre

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 53.68 %
 Fecha de Inicio: 29/06/2025 Fecha de Fin: 30/06/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

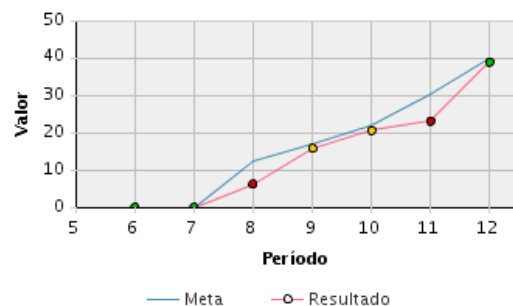

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
						0 %	0 %	12 %	17 %	22 %	30 %	40 %
	Avance real acumulado											
						0 %	0 %	6 %	16 %	21 %	23 %	39 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2025 1. El 16/12/2025 se aprobó el Informe de la Prueba Piloto mediante correo electrónico (HITO 7 CUMPLIDO) 2. El 22/12/2025 se aprobó el informe de la capacitación mediante correo electrónico (HITO 9 CUMPLIDO) 3. El 31/12/2025 mediante acta entrega recepción se compromete a la entrega del Sistema de Captura el 05/01/2026 (HITO 10 CUMPLIDO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/01/2026 - 09:04 AM
NOVIEMBRE 2025 1. El 25/11/2025 se aprobó el Plan de recolección mediante correo electrónico (HITO 8 CUMPLIDO) 2. Informe de Prueba Piloto aprobado (HITO7 ASOCIADO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	23/12/2025 - 04:27 PM
OCTUBRE 2025 1. El 08/10/2025 Plan de Prueba Piloto aprobado (HITO 5 CUMPLIDO) 2. El 24/10/2025 Plan de Capacitación aprobado (HITO 6 CUMPLIDO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	25/11/2025 - 10:47 AM
SEPTIEMBRE 2025 1. El 16/09/2025 Formulario de recolección aprobado por parte de CGTPE según Resolución Nro. 030-DIREJ-DIJU-NI-2022 mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-2025-0923-M (HITO 1 CUMPLIDO) 2. El 18/09/2025 se aprobó el Listado de productos que se generan a partir de la encuesta (HITO 3 CUMPLIDO) 3. Ficha metodológica de la OE aprobada para el periodo 2021-2025 (HITO 4 ASOCIADO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/11/2025 - 11:23 AM
AGOSTO 2025 1. El 08/08/2025 se mantuvo reunión de Comisión Especial de Estadísticas de Género y Grupos Vulnerables en la que se cerró el formulario de la ENVIGMU, misma que quedó registrada mediante Acta de Reunión. (HITO 1 ASOCIADO). 4. El 08 de agosto de 2025 mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0746-M se aprobó el Plan de Dirección de Proyecto para la ejecución de esta actividad en 2025, (HITO 2 CUMPLIDO).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	29/09/2025 - 02:16 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Ficha metodológica de la OE aprobada	10/12/2025	Virginia Natali Mendoza Moreira	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. La entrega a destiempo del requerimiento para el sistema de captura CAUSARÍA el retraso en el	11/12/2025	Virginia Natali Mendoza Moreira	60 %	50	30	2/2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
inicio del proceso de capacitación y recolección.						

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Formulario de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	08/08/2025		16/09/2025		Sí	6.06
2	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	08/08/2025		08/08/2025		Sí	6.06
3	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Listado de productos que se generarán a partir de la encuesta	5-Entregables Intermedios	09/09/2025		18/09/2025		Sí	3.64
4	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la OE aprobada	5-Entregables Intermedios	26/09/2025	26/09/2025			No	1.21
5	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	14/10/2025		08/10/2025		Sí	2.42
6	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	24/10/2025		24/10/2025		Sí	2.42
7	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Informe de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	10/11/2025		16/12/2025		Sí	6.06
8	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	24/11/2025		25/11/2025		Sí	2.43
9	ENVIGMU_C2. LEV_INFORMACIÓN: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	05/12/2025		26/12/2025		Sí	4.85
10	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Sistema de captura de datos aprobado y recibido	9-Entregables Formales	19/12/2025		31/12/2025		Sí	4.85
11	ENVIGMU_C2. CONS_INSTRUMENTOS:	9-Entregables Formales	30/06/2026	30/06/2026			No	60.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EJECUCIÓN: Ejecutar la recolección y entrega de resultados							

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	4 formularios aprobados previo al inicio de la recolección hasta el año 2025		100.00 %	0	0	15/08/2025	Oct-Dic
2	4 manuales elaborados previo a la capacitación hasta el año 2025		100.00 %	4	4	15/10/2025	Oct-Dic
3	1 protocolo de sensibilización elaborado previo a la capacitación hasta el año 2025.		100.00 %	1	1	15/10/2025	Oct-Dic
4	1 sistema de captura de información desarrollado previo al inicio de la recolección hasta el año 2025.		100.00 %	1	1	28/11/2025	Oct-Dic
5	Número de viviendas investigadas		0.00 %	15,440	0	30/12/2025	Oct-Dic
6	Número de viviendas investigadas, criticadas y codificadas.		0.00 %	15,440	0	30/12/2025	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	430,735.59 **
Costo Total:	1,843,638.90
Total Devengado:	104,516.99
% Costo Total Devengado:	5.67 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 5.67 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Codificado	0.00	1,141,152.58	0.00	1,141,152.58
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	430,735.59	0.00	430,735.59
Ppto. Devengado	0.00	104,516.99	0.00	104,516.99
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	430,735.59	0.00	430,735.59
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	24.26 %	0.00 %	24.26 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	47,832.16	0.00	47,832.16



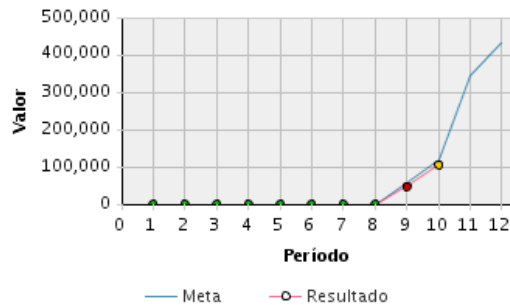


* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025



Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	57,450.85	47,832.16	57,450.85	47,832.16	83.26 %		11.10 %
Oct	61,108.17	56,684.83	118,559.02	104,516.99	88.16 %		24.26 %
Nov	226,458.55		345,017.57				
Dic	85,718.02		430,735.59				
Total	430,735.59	104,516.99					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO N° 10: Sistema de captura de datos aprobado y recibido	B1_HITO_10-signed-signed.pdf	07/01/2026
2	ASOCIACIÓN HITO N° 1: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN APROBADO	A2_HITO1.pdf	06/10/2025
3	ASOCIACIÓN HITO N° 2: PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO APROBADO	A1_HITO2.pdf	26/11/2025
4	ASOCIACIÓN HITO N° 3: LISTADO DE PRODUCTOS QUE SE GENERARÁN A PARTIR DE LA ENCUESTA	A3_HITO3.pdf	06/10/2025
5	ASOCIACIÓN HITO N° 6: PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO	A6_HITO6.pdf	27/11/2025
6	ASOCIACIÓN HITO N° 7: Informe de la prueba piloto aprobado	A8_HITO_7-signed-signed.pdf	07/01/2026
7	ASOCIACIÓN HITO N° 8: Plan de recolección aprobado	A7_HITO_8-signed-signed.pdf	07/01/2026
8	ASOCIACIÓN HITO N° 9: Informe de capacitación aprobado	A9_HITO_9-signed-signed.pdf	05/01/2026
9	ASOCIACIÓN HITO N° 5: PLAN DE LA PRUEBA PILOTO APROBADO	A5_HITO5.pdf	27/11/2025
10	GRISK001_PA002_Malla de validación actualizada	GRISK01_001.pdf	13/12/2025
