

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**  
**PROYECTO: K010 INEC: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI**

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Herrera Jacome, Margoth Rocio (margoth_herrera@inec.gob.ec)  |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Mera Intriago, Eva María                                     | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Villalva Jara, Roxana Piedad                                 | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 102800000.0000.384446                                        | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 11,594,460.64           |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         | Organismo multilateral                                       | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 14/02/2022 - 28/11/2025 |
| Fecha de última actualización: | 04/08/2025                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2022              |
| Modificado por:                | Herrera Jacome, Margoth Rocio                                | Fecha del siguiente Hito:       | 11/08/2025              |

## DATOS GENERALES

### Descripción

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1211 suscrito el 15 de diciembre de 2020 se establece aprobar la implementación de la "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición", estableciéndose adicionalmente, en el calendario estadístico, la obligatoriedad de medición de la tasa de desnutrición crónica infantil mediante una operación estadística por muestreo y de forma anual misma que será ejecutada por la entidad responsable de Estadística y Censos a nivel nacional.

La Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil investigará información de niños menores de 5 años como su población objetivo, se ha planificado investigar 2.964 UPM, es decir alrededor de 23.712 viviendas donde se espera encontrar alrededor de 27.000 niños menores de 5 años.

Para el arranque de la operación estadística se contará con un presupuesto parcial de \$1.434.610,09 millones de dólares de los cuales serán transferidos USD \$1.345.118,48 (sin IVA) por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.

El presupuesto programado con la primera asignación de recursos permitirá el financiamiento del personal ocasional, y el inicio de las contrataciones de varios bienes y servicios asociados a la implementación del proyecto. El financiamiento cubre aproximadamente 4 meses de operativo de campo (cuyas fechas estimadas se programan entre abril y julio de 2022) mientras se gestiona la asignación adicional del presupuesto 2022-2023 para cubrir los 10 meses restantes de la operación.

### LINEA BASE:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante los años 2018 y 2019, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. La metodología utilizada corresponde a un muestreo probabilístico, donde la unidad primaria de selección es el conglomerado (UPM), la unidad secundaria es la vivienda (USM) y la última unidad es la población. Los resultados de esta investigación arrojan que el 23,0% de los menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica. El INEC, cuenta además con la información recopilada a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, cuya sexta ronda indagó medidas antropométricas en toda la población investigada desde noviembre del año 2013 hasta octubre del año 2014, guardando similitudes en cuanto a la metodología de muestreo utilizada y a partir de la cual se desprende que el 23,9% de los niños menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica.

### OBJETIVO GENERAL:

Generar una operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI


### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Construir los instrumentos para la realización de la ENDI  
Recolectar la información en campo  
Elaborar la programación de indicadores

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficios Cualitativos                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La implementación del proyecto permitirá generar información para la medición de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, a fin de reducir la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años. |
| Tipo de Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ministerios y Secretarías encargados de la implementación y el seguimiento de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición                                                                                                                                          |
| Restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIEMPO: 11 MESES<br>PRESUPUESTO: \$ 1.434.610,09<br>RECURSOS: CONTRATOS OCASIONALES Y PERSONAL CIVIL, MATERIAL DE OFICINA, VEHÍCULOS, TABLETS, COMPUTADORES, SISTEMA INFORMÁTICO.<br>ALCANCE: NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL                                                    |

|              |              |            |            |           |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

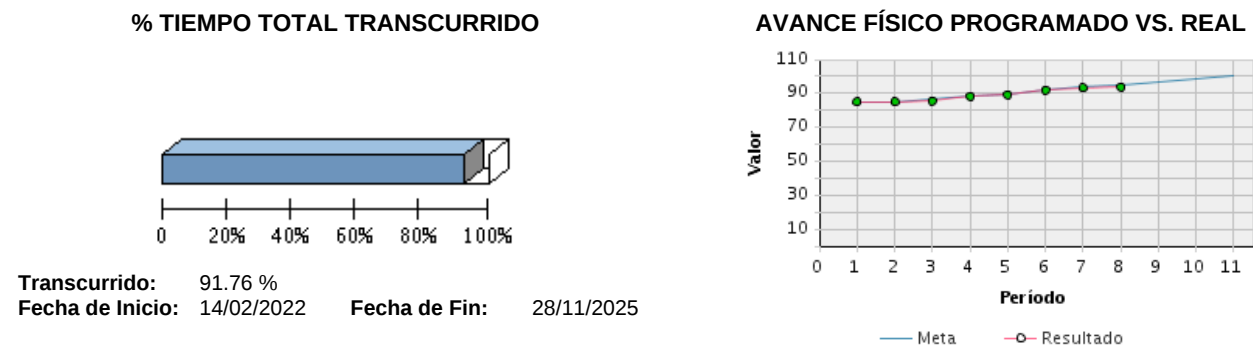

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov   | Dic |
| 2025                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|                      | 85 %                        | 85 % | 87 % | 88 % | 90 % | 92 % | 94 % | 95 % | 97 % | 98 % | 100 % |     |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|                      | 85 %                        | 85 % | 86 % | 88 % | 89 % | 92 % | 93 % | 94 % |      |      |       |     |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |       |     |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JULIO 2025</b></p> <p>1.- Se realizó la carga de la Base de muestra SIPE período 1 mes 1, (HITO 88 Cumplido)</p> <p>2.- Se realizó el "Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3" el cual tiene como objetivo de establecer las directrices, actividades y protocolos necesarios para el correcto levantamiento de información en la fase de encuesta del Plan de Dirección de Proyecto "Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI" 2025 (HITO 89 CUMPLIDO)</p> <p><b>JUNIO 2025</b></p> <p>1.- Se realizó el Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3 (HITO 86 CUMPLIDO)</p> <p>2.- Se realizó el Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 (HITO 87 CUMPLIDO)</p> <p>3.- Se actualizó la Metodología del Operativo de Campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI R3 (Actividad de junio que consta en el cronograma de actividades CUMPLIDO)</p> <p><b>MAYO 2025</b></p> <p>1.- Se solicitó la reprogramación del operativo de campo a nivel nacional para la ENDI mediante Memorandos Nro. INEC-CGTPE-DIES-2025-0457-M y INEC-CGTPE-2025-0415-M, la cual fue autorizada mediante el Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0421-M enviado por DIREJ.</p> | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 04/08/2025 - 03:59 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se solicitó la aprobación de la actualización del cronograma físico, re estructuración de hitos y la reprogramación del indicador 3 de la ENDI, mediante Memorandos Nro. INEC-CGTPE-DIES-2025-0556-M y INEC-CGTPE-2025-0495-M, la cual fue autorizada mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0481-M enviado por DIREJ.</p> <p>3.- Se elaboró el Plan de capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3. (HITO 84 CUMPLIDO)</p> <p>4.-Se elaboró el Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento. (HITO 85 CUMPLIDO)</p> <p>ABRIL 2025</p> <p>1. Se elaboró, revisó y aprobó el Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3er ronda, así como la matriz de actividades, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2025-0283-M. (HITO ASOCIADO 81).</p> <p>2. Se realizó el informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3,el cual describe los principales hallazgos que se evidenciaron en los formularios. (HITO 82 CUMPLIDO)</p> <p>3. Se realizó el informe de formularios de recolección "Bitácora de diseño y construcción del formulario ENDI R3", que tiene como objetivo consolidar y documentar los cambios o modificaciones de variables en los instrumentos de recolección de información de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, para la ronda 3. (HITO 83 CUMPLIDO)</p> <p>4. Se revisó, ajustó y actualizó los formularios 1 y 2, y manuales del encuestador y supervisor. (HITO 83 CUMPLIDO)</p> <p>MARZO 2025</p> <p>1. Durante el primer trimestre se gestionó la firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional MIES -INEC, suscrito el 26 de febrero de 2025, el cual permitió iniciar con la elaboración del PDP y las aprobaciones ante el MIES MEF y la Secretaría de Planificación. (HITO ASOCIADO 81).</p> <p>2. Se realizó la metodología para la ejecución de la prueba piloto ENDI R3, dicha prueba se realizó en la provincia de Imbabura en los sectores de Antonio Ante, Urcuquí, Pablo Arenas, Quiroga, Pimampiro y Ambuquí desde el 25 al 28 de marzo de 2025, y el objetivo fue probar en campo el instrumento de recolección de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI ronda 3. (HITO 80 CUMPLIDO).</p> |                               |                               |
| <p>DICIEMBRE 2024:</p> <p>1. Durante el mes de diciembre se desarrollaron actividades relacionadas con la planificación técnica, operativa, financiera y administrativa para el levantamiento de información de un nuevo año de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 08/01/2025 - 09:56 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2024:</p> <p>1. El 21/11/2024, se suscribió el Convenio Modificadorio al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC para la ampliación de los contratos ocasionales del personal de la ENDI</p> <p>2.- El 28/11/2024 mediante memorando No. INEC-CGAF-2024-2189-M, se notifica el incremento al techo plurianual del proyecto DISIES a través del cual se financia la ENDI.</p> <p>3.- El 29/11/2024 se suscribe el Convenio Modificadorio al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC del 14 de marzo de 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 04/12/2024 - 11:33 AM         |
| <p>OCTUBRE 2024:</p> <p>1) Se ha difundido en diferentes instancias los resultados obtenidos en el segundo año de Encuesta, incluido la provincia de Galápagos.</p> <p>2) Se presentó resultados de los dos años de levantamiento del Módulo de Desarrollo Infantil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 07/11/2024 - 03:55 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2024:</p> <p>1) Se concluyó el levantamiento de información de mes 12 de encuesta, incluido la provincia de Galápagos.</p> <p>2) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>3) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>4) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.</p> <p>5) Se presentó oficialmente resultados del segundo año de Encuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 30/09/2024 - 10:42 AM         |
| <p>AGOSTO 2024:</p> <p>1) Se levantó información deL mes 12 de encuesta.</p> <p>2) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>3) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 04/09/2024 - 12:47 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>4) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.</p> <p><b>JULIO 2024:</b></p> <p>1) Se levantó información de mes 11 y 12 de encuesta.</p> <p>2) Se continuo con pagos de personal civil, al 31/07/2024 se concluyó el pago hasta el mes de junio de 2024.</p> <p>3) Se continuo con pagos de vehículos, al 31/07/2024 se concluyó el pago hasta el mes de mayo de 2024.</p> <p>4) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>5) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>6) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 02/08/2024 - 11:58 AM         |
| <p><b>JUNIO 2024:</b></p> <p>1) El 15/06/2024 concluyó la fase de enlistamiento del segundo año de la ENDI.</p> <p>2) Se continuo con pagos de personal civil y vehículos, al 30/06/2024 se ha concluido el pago hasta el mes de marzo de 2024.</p> <p>3) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>4) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>5) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.</p> <p>6) Durante el segundo trimestre de la operación estadística se aplicó la encuesta en 3.236 viviendas investigadas, efectivas 2.885; y, 3.312 menores de 5 años que forman parte de la toma antropométrica; no se consideran las UPM de la provincia de Galápagos, ya que esta provincia se trabajará en el último semestre de investigación, se debe considerar que durante el mes de abril se suspendió el operativo de campo de la operación estadística, por demora en la asignación de recursos por parte del MIES como ejecutor del proyecto.</p> <p>7) En el segundo trimestre del año 2024 e definió un indicador relacionado a malnutrición en niños y niñas menores de 5 años.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 04/07/2024 - 12:50 PM         |
| <p><b>MAYO 2024:</b></p> <p>1) EL 06/05/2024 se retomó el operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p> <p>2) Se levantó información de mes 11 y 12 de enlistamiento.</p> <p>3) Se continuo con pagos de personal civil y vehículos, al 31/05/2024 se ha concluido el pago hasta el mes de febrero de 2024.</p> <p>4) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>5) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>6) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 05/06/2024 - 03:15 PM         |
| <p><b>ABRIL 2024:</b></p> <p>1) Con fecha 14 de marzo de 2023 se suscribió el Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC con el objeto de establecer los términos de la cooperación específica interinstitucional para la transferencia presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Instituto Nacional de Estadística y Censos para el cierre del segundo año período 2023 - 2024 de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, en el marco del contrato de préstamo 8946-BIRF, suscrito entre Ecuador y el Banco Mundial y la "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil".</p> <p>2) El 22 de marzo de 2024, mediante oficio No. MIES-DISIES-2024-0010-O, la Gerenta del Proyecto en el MIES socializa el oficio No. SNP-SGP-SPN-2024-0242-OF, a través del cual la Secretaría Nacional de Planificación emite el criterio favorable para la transferencia de recursos desde el MIES al INEC para financiar la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p> <p>3) Mediante Oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0018-O de 26 de marzo de 2024, la Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas, solicita la aprobación del Plan Anual Operativo - POA y la Reforma al Plan Anual de la Política Pública -PAPP para la ejecución de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil durante el ejercicio fiscal 2024.</p> <p>4) Mediante oficio No. MIES-DISIES-2024-0014-O de 08 de abril de 2024, la Gerencia del Proyecto en el MIES aprueba el POA y el PAPP.</p> <p>5) El 09 de mayo de 2024, el Director Ejecutivo del INEC aprueba el Plan de Dirección de Proyecto para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p> | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 08/05/2024 - 09:51 AM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocio | 28/12/2023 - 11:44 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 5 del año 2 de encuesta</p> <p>4.- Se generaron indicadores para el período octubre - diciembre 2023.</p> <p>5.- Se obtuvieron 8.502 viviendas efectivas durante el período octubre - diciembre 2023</p> <p>6.- Se definió un indicador relacionado con la DCI, sobre desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años.</p>                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| <p><b>NOVIEMBRE 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 4 del año 2 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 26/12/2023 - 09:05 AM         |
| <p><b>OCTUBRE 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 3 del año 2 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 09/11/2023 - 12:42 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 2 del año 2 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 03/10/2023 - 12:40 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 1 del año 2 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 05/09/2023 - 08:48 AM         |
| <p><b>JULIO 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 12 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 02/08/2023 - 08:37 AM         |
| <p><b>JUNIO 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 11 de encuesta</p> <p>4.- Se reporta los resultados alcanzados para el cumplimiento de metas establecidas en los indicadores relacionados con el número de viviendas identificadas para la aplicación de la Encuesta y los indicadores definidos para la medición de la DCI y sus factores asociados.</p> | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 02/08/2023 - 08:37 AM         |
| <p><b>MAYO 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 10 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 07/06/2023 - 01:20 PM         |
| <p><b>ABRIL 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 9 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 03/05/2023 - 04:27 PM         |
| <p><b>MARZO 2023</b></p> <p>1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta.</p> <p>3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 8 de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 03/04/2023 - 02:59 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2023:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herrera Jacome, Margoth Rocío | 21/03/2023 - 03:09 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>1.- Con fecha 10/02/2023 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre MIES e INEC para la transferencia de 4.9 millones de dólares para la implementación de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p> <p>2.- Mediante memorando Nro.INEC-INEC-2023-0122-M de fecha 22/02/2023 la Dirección Ejecutiva aprueba el Plan de Dirección de Proyecto 2023 para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.</p> <p>3.- Al 28/02/2023 se está gestionando con las áreas competentes la elaboración y validación de la reestructuración de hitos y ficha fin del proyecto para el año 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                               |
| <p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>Se han generado resultados e indicadores preliminares relacionados a la desnutrición infantil a partir de la información recolectada en la ejecución del operativo diseñado para la ENDI</p> <p>Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes quinto de encuesta</p> <p>Se seleccionó la muestra a partir de la base de datos de enlistamiento para la ejecución del plan de operativo de campo en el sexto mes de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 13/01/2023 - 09:06 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento.</p> <p>Se han generado resultados e indicadores preliminares a partir de la información recolectada en el primer trimestre del operativo diseñado para la ENDI</p> <p>Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes cuarto de encuesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herrera Jacome, Margoth Rocio    | 09/12/2022 - 08:37 AM         |
| <p>OCTUBRE 2022</p> <p>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado para el cierre del mes 3 e inicio del mes 4 de la Encuesta.</p> <p>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el desarrollo de la Encuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 02/11/2022 - 11:28 AM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>- Con fecha 13 de septiembre de 2022, mediante Oficio Nro.MIES-DISIES-2022-0077-O, el MIES aprueba la cuarta reforma a la planificación operativa del Proyecto para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, la misma que considera la segunda transferencia de recursos para la ejecución del Plan Operativo de Campo diseñado para la recolección, procesamiento y análisis de la información requerida en dicha encuesta.</p> <p>- Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0804-M de 15 de septiembre de 2022 el Patrocinador Ejecutivo del proyecto autoriza el IV Adendum al PDP del Proyecto, el cual incluye la reestructuración de hitos y metas del proyecto.</p> <p>- Con fecha 21 de septiembre, se procede a realizar la reestructura de hitos y metas del proyecto.</p> <p>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado</p> <p>- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado</p> <p>- Se realiza el reporte de indicadores por el período julio - septiembre 2022</p> | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 06/10/2022 - 11:02 AM         |
| <p>AGOSTO 2022</p> <p>Se inició la recolección de información del mes 2 de encuesta el 16 de agosto de 2022 (Hito 17 cumplido)</p> <p>Se recolectó la información y se enlistaron los conglomerados del mes 3 (Hito 15 cumplido)</p> <p>Se cuenta con base de datos del primer mes y medio de recolección de información, y la misma ha sido validada por parte de los revisores de calidad (Hito 16 cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 05/09/2022 - 06:38 PM         |
| <p>JULIO 2022:</p> <p>1.- Se generaron los indicadores que permitirán medir la calidad de la información levantada durante el primer trimestre.- (Hito 11 cumplido)</p> <p>2.- Con fecha 23 de julio de 2022 culminó el período quinto de enlistamiento que corresponde al mes cuatro de trabajo. - (Hito 12 cumplido).</p> <p>3.- Se generó la base de datos para el levantamiento de información la misma ha sido revisada y validada por las unidades correspondientes.. - (Hito 13 cumplido).</p> <p>4.- Se ha dado inicio al proceso de recolección y levantamiento de datos a nivel nacional para la encuesta.- (Hito 14 cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mendoza Moreira, Virginia Natali | 05/08/2022 - 04:02 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>JUNIO 2022:</b><br><br>1.- La selección de la muestra del mes de mayo fue entregada el 09 de junio de 2022.- (Hito 7 cumplido)<br>2.- Los conglomerados del mes 2 correspondiente al mes de junio de 2022 fueron enlistados en su totalidad. - (Hito 10 cumplido).<br>3.- No se puede reportarlos indicadores de calidad del inicio del operativo de campo de la encuesta dado que se solicitó reprogramación del mismo por movilizaciones de la CONAIE. - (Hito 11 en proceso).                                                                                                                                    | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 04/07/2022 -<br>04:52 PM      |
| <b>MAYO 2022:</b><br><br>1.- Debido a que el material cartográfico (atado a la base de preselección de viviendas) se encuentra en construcción, se contará con la muestra seleccionada aproximadamente el 10 de junio de 2022. - (Hito 7 en proceso).<br>2.- Se realizó el proceso de preselección, capacitación y selección del personal necesario para arrancar con la fase de encuesta de la ENDI - (Hito 8 cumplido).<br>3.- Se cuenta con los conglomerados enlistados (Hito 9 cumplido).                                                                                                                         | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 03/06/2022 -<br>03:01 PM      |
| <b>ABRIL 2022:</b><br><br>1.- Se seleccionó y contrató al personal (63 personas: 47 encuestadores y 16 Supervisores de operativo de campo) para la fase de enlistamiento de la ENDI (Hito 5 cumplido).<br>2.- Se elaboró la sintaxis de validación (para detectar errores en las bases de datos de la información levantada a través de programación en STATA) - (Hito 6 cumplido).<br>3.- Se elaboró la sintaxis de indicadores (a través de programación en "R STUDIO" para generar el resultado de los mismos) - (Hito 6 cumplido).                                                                                 | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/05/2022 -<br>12:53 PM      |
| <b>MARZO 2022:</b><br><br>1.- Se elaboró el Informe de la prueba piloto (Hito 3 cumplido).<br>2.- Se elaboró el Manual del Encuestador (Hito 4 cumplido).<br>3.- Se elaboró el Formulario de la ENDI (Hito 4 cumplido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 05/04/2022 -<br>02:02 PM      |
| <b>FEBRERO 2022:</b><br><br>1.- Se elaboró, revisó, ajustó y aprobó el Plan de Dirección del Proyecto - PDP, así como la matriz de actividades y demás documentación habilitante referente al proyecto, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0127-M.<br>2.- El Ministerio de Finanzas aprobó la modificación presupuestaria para la transferencia de recursos del MIES al INEC, incremento presupuestario valor de 1.434610,09 informado por la Coordinación General Administrativa Financiera mediante memorando INEC-CGAF-2022-0198-M.<br>3.- Se realizó la definición y selección de la primer etapa de muestreo. | Mendoza<br>Moreira, Virginia<br>Natali | 04/03/2022 -<br>10:08 PM      |

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                     | Fecha de última actualización | Responsable                     | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Recursos.</b><br>No contar con la actualización del proyecto operativo a través del cual se ejecuta la ENDI CAUSARÍA una paralización del operativo de campo del tercer año de la Encuesta | 06/05/2025                    | Margoth Rocio<br>Herrera Jacome | 60 %         | 100     | 60           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Muestra de Unidades Primaria de Muestreo identificada                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022         |                | 28/02/2022 |    | Sí            | 2.3           |
| 2  | PLANIFICACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022         |                | 28/02/2022 |    | Sí            | 1.8           |
| 3  | PLANIFICACIÓN: Manuales de encuestador, supervisor, crítica y codificación elaborados                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2022         |                | 30/03/2022 |    | Sí            | 2.0           |
| 4  | PLANIFICACIÓN: Informe de la prueba piloto presentado                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2022         |                | 31/03/2022 |    | Sí            | 1.9           |
| 5  | EJECUCIÓN: Personal para enlistamiento seleccionado                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2022         |                | 15/04/2022 |    | Sí            | 2.1           |
| 6  | EJECUCIÓN: Sintaxis de validación y de indicadores elaboradas                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2022         |                | 30/04/2022 |    | Sí            | 1.1           |
| 7  | EJECUCIÓN: Muestra seleccionada                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2022         |                | 09/06/2022 |    | Sí            | 1.1           |
| 8  | EJECUCIÓN: Personal capacitado y seleccionado                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2022         |                | 30/05/2022 |   | Sí            | 1.5           |
| 9  | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2022         |                | 31/05/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 10 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 14/06/2022         |                | 14/06/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 11 | EJECUCIÓN: Indicadores de calidad reportados en el primer trimestre de levantamiento                                                                                | 9-Entregables Formales    | 30/06/2022         |                | 30/06/2022 |  | Sí            | 1.75          |
| 12 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 13 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 14 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2022         |                | 14/07/2022 |  | Sí            | 1.5           |
| 15 | EJECUCIÓN: Información del primer mes de encuesta en bases de datosENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.         | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |  | Sí            | 1.1           |
| 16 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 17 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 2 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2022         |                | 14/08/2022 |  | Sí            | 1.1           |
| 18 | Ejecución: Información en bases de datos validada mes 2ENDI_C1. Diseñar y crear                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 10/09/2022         |                | 10/09/2022 |  | Sí            | 1.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                                                                                                     |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 19 | EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                                   | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2022         |                | 15/09/2022 |    | Sí            | 1.25          |
| 20 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 3ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.             | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2022         |                | 11/10/2022 |    | Sí            | 1.1           |
| 21 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 3ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                     | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2022         |                | 15/10/2022 |    | Sí            | 1.25          |
| 22 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 4 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 5-Entregables Intermedios | 14/11/2022         |                | 14/11/2022 |    | Sí            | 1.1           |
| 23 | EJECUCIÓN: Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.              | 5-Entregables Intermedios | 18/11/2022         |                | 18/11/2022 |    | Sí            | 1.3           |
| 24 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                     | 5-Entregables Intermedios | 20/11/2022         |                | 20/11/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 25 | EJECUCIÓN: Productos de resultados entregados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.              | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022         |                | 30/11/2022 |  | Sí            | 1.3           |
| 26 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | 5-Entregables Intermedios | 14/12/2022         |                | 14/12/2022 |  | Sí            | 1.1           |
| 27 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 5ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                     | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2022         |                | 20/12/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 28 | EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.      | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 31/12/2022 |  | Sí            | 1.25          |
| 29 | EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 31/12/2022 |  | Sí            | 1.1           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.                                                                         |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 30 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Planeación: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados | 5-Entregables Intermedios | 22/02/2023         |                | 22/02/2023 |    | Sí            | 1.7           |
| 31 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9                                      | 5-Entregables Intermedios | 06/03/2023         |                | 06/03/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 32 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 8                | 5-Entregables Intermedios | 16/03/2023         |                | 16/03/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 33 | ENDI_C1. ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8               | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2023         |                | 29/03/2023 |    | Sí            | 1.25          |
| 34 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10                                     | 5-Entregables Intermedios | 03/04/2023         |                | 03/04/2023 |   | Sí            | 1.2           |
| 35 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 9                | 5-Entregables Intermedios | 13/04/2023         |                | 13/04/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 36 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9                        | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2023         |                | 26/04/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 37 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11                                     | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2023         |                | 05/05/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 38 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10               | 5-Entregables Intermedios | 12/05/2023         |                | 12/05/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 39 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10                       | 5-Entregables Intermedios | 24/05/2023         |                | 24/05/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 40 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.:                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2023         |                | 02/06/2023 |  | Sí            | 1.2           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12                                                                                                                      |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 41 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11      | 5-Entregables Intermedios | 11/06/2023         |                | 11/06/2023 |    | Sí            | 1.25          |
| 42 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11              | 5-Entregables Intermedios | 21/06/2023         |                | 21/06/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 43 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 1                       | 5-Entregables Intermedios | 02/07/2023         |                | 02/07/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 44 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 12      | 5-Entregables Intermedios | 10/07/2023         |                | 10/07/2023 |    | Sí            | 1.25          |
| 45 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 12              | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2023         |                | 26/07/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 46 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Factores elaborados base anual                             | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2023         |                | 30/07/2023 |  | Sí            | 1.0           |
| 47 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2                       | 5-Entregables Intermedios | 02/08/2023         |                | 02/08/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 48 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1 | 5-Entregables Intermedios | 11/08/2023         |                | 11/08/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 49 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1         | 5-Entregables Intermedios | 21/08/2023         |                | 21/08/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 50 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 3                       | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2023         |                | 02/09/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 51 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso                                                    | 5-Entregables Intermedios | 11/09/2023         |                | 11/09/2023 |  | Sí            | 1.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | de recolección de información iniciado año 2 mes 2                                                                                                              |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 52 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Productos elaborados información anual                     | 5-Entregables Intermedios | 20/09/2023         |                | 20/09/2023 |    | Sí            | 1.0           |
| 53 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 2         | 5-Entregables Intermedios | 21/09/2023         |                | 21/09/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 54 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Resultados publicados información anual                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |    | Sí            | 1.0           |
| 55 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 4                       | 5-Entregables Intermedios | 02/10/2023         |                | 02/10/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 56 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 5                       | 5-Entregables Intermedios | 02/10/2023         |                | 02/10/2023 |    | Sí            | 1.2           |
| 57 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 3 | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2023         |                | 11/10/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 58 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 3         | 5-Entregables Intermedios | 21/10/2023         |                | 21/10/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 59 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 4 | 5-Entregables Intermedios | 11/11/2023         |                | 11/11/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 60 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 4         | 5-Entregables Intermedios | 21/11/2023         |                | 21/11/2023 |  | Sí            | 1.2           |
| 61 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 5 | 5-Entregables Intermedios | 11/12/2023         |                | 11/12/2023 |  | Sí            | 1.25          |
| 62 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en                                             | 5-Entregables Intermedios | 21/12/2023         |                | 21/12/2023 |  | Sí            | 1.2           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | bases de datos validada año 2 mes 5                                                                                                                                        |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 63 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades, aprobados | 5-Entregables Intermedios | 12/04/2024         |                | 12/04/2024 |    | Sí            | 0.36          |
| 64 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 9, actualizada                        | 5-Entregables Intermedios | 24/05/2024         |                | 24/05/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 65 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 9, actualizada                     | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2024         |                | 30/05/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 66 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 10, actualizada                       | 5-Entregables Intermedios | 19/06/2024         |                | 19/06/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 67 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 10, actualizada                    | 5-Entregables Intermedios | 26/06/2024         |                | 26/06/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 68 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 11, actualizada                       | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2024         |                | 19/07/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 69 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 11, actualizada                    | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2024         |                | 26/07/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 70 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 12, actualizada                       | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2024         |                | 15/08/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 71 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 12, actualizada                    | 5-Entregables Intermedios | 22/08/2024         |                | 22/08/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 72 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Tabulados de indicadores ENDI, actualizados                           | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2024         |                | 02/09/2024 |  | Sí            | 0.29          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                             | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 73 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Presentación de ENDI, actualizada                              | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2024         |                | 28/09/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 74 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe preliminar de cierre de convenio, elaborado            | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2024         |                | 29/09/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 75 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Informe de guía de base de datos ENDI ronda 2, elaborado    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         |                | 30/09/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 76 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe técnico financiero preliminar, elaborado               | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2024         |                | 15/10/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 77 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe de evaluación preliminar parte 1, realizado            | 9-Entregables Formales    | 29/10/2024         |                | 29/10/2024 |    | Sí            | 0.29          |
| 78 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe de evaluación preliminar parte 2, realizado            | 9-Entregables Formales    | 29/11/2024         |                | 29/11/2024 |   | Sí            | 0.29          |
| 79 | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Documentación de datos de la ENDI, iniciada                    | 9-Entregables Formales    | 31/12/2024         |                | 31/12/2024 |  | Sí            | 0.29          |
| 80 | ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Metodología de prueba piloto ENDI Ronda 3, desarrollada                                                       | 5-Entregables Intermedios | 22/03/2025         |                | 21/03/2025 |  | Sí            | 0.63          |
| 81 | "ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3era ronda aprobado "                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025         |                | 01/04/2025 |  | Sí            | 1.17          |
| 82 | ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3, elaborado                                                              | 5-Entregables Intermedios | 11/04/2025         |                | 09/04/2025 |  | Sí            | 0.63          |
| 83 | ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de encuesta, actualizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025         |                | 23/04/2025 |  | Sí            | 0.63          |
| 84 | "ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Plan de                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2025         |                | 29/05/2025 |  | Sí            | 1.15          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                        | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3, elaborado"                                                                                                                    |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 85 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento, actualizado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2025         |                | 11/06/2025 |    | Sí            | 0.58          |
| 86 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 elaborado                                               | 5-Entregables Intermedios | 20/06/2025         |                | 30/06/2025 |    | Sí            | 1.13          |
| 87 | "ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: DEFINICIÓN: Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3, elaborado "                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025         |                | 20/06/2025 |    | Sí            | 1.0           |
| 88 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Base de muestra SIPE período 1 mes 1, cargada                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 24/07/2025         |                | 01/08/2025 |    | Sí            | 0.58          |
| 89 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3, elaborado                                                    | 5-Entregables Intermedios | 25/07/2025         |                | 24/07/2025 |    | Sí            | 1.15          |
| 90 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, mes 1 elaborado                                                  | 5-Entregables Intermedios | 11/08/2025         | 11/08/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 91 | "ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de validación periodo 1 mes 1, elaborado"                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2025         | 29/08/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 92 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, mes 2 elaborado                                                  | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2025         | 08/09/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 93 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 1, construida                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 26/09/2025         | 26/09/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 94 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de validación período 1 mes 2, elaborado                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 26/09/2025         | 26/09/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 95 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 06/10/2025         | 06/10/2025     |            |  | No            | 0.58          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                            | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | de campo, ronda 3, mes 3 elaborado                                                                                                  |                           |                    |                |            |                                                                                     |               |               |
| 96  | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN:<br>Presentación de cobertura<br>ENDI mes 2, construida                      | 5-Entregables Intermedios | 24/10/2025         | 24/10/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 97  | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN:<br>Reporte de validación período<br>1 mes 3, elaborado                      | 5-Entregables Intermedios | 24/10/2025         | 24/10/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 98  | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN:<br>Informe de inicio del operativo<br>de campo, ronda 3, mes 4<br>elaborado | 5-Entregables Intermedios | 07/11/2025         | 07/11/2025     |            |  | No            | 0.58          |
| 99  | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN:<br>Reporte de validación período<br>1 mes 4, elaborado                      | 5-Entregables Intermedios | 21/11/2025         | 21/11/2025     |            |  | No            | 0.55          |
| 100 | ENDI_C1.<br>DISE_INSTR_SERV_INCLS<br>SOCIAL: EJECUCIÓN:<br>Presentación de cobertura<br>ENDI mes 3, construida                      | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2025         | 28/11/2025     |            |  | No            | 0.58          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                   | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de viviendas identificadas para la ENDI                              |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 15/06/2022      | Abr-Jun                    |
| 2 | Número de indicadores antropométricos definidos                             |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 15/09/2022      | Abr-Jun                    |
| 3 | Porcentaje de procesos contratados para el inicio del tercer año de la ENDI |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 01/04/2025      | Abr-Jun                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 11,594,460.64 ** |
| Costo Total:                  | 1,434,610.09     |
| Total Devengado:              | 9,310,826.18     |
| % Costo Total Devengado:      | 649.01 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 649.01 %

### Perfil Económico 2025

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2025) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 10,690,049.35  | 0.00              | 0.00         | 10,690,049.35 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 10,690,049.35  | 0.00              | 0.00         | 10,690,049.35 |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 10,006,120.37  | 0.00              | 0.00         | 10,006,120.37 |
| Ppto. Codificado                                        | 9,950,861.68   | 0.00              | 0.00         | 9,950,861.68  |
| Ppto. Comprometido                                      | 2,646,563.61   | 0.00              | 0.00         | 2,646,563.61  |
| Planeado - Codificado (2025)                            |                | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 9,619,090.53   | 2,588,385.78      | 0.00         | 12,207,476.31 |
| Ppto. Devengado                                         | 9,006,074.86   | 304,751.32        | 0.00         | 9,310,826.18  |
| Pagado Real                                             | 2,562,571.86   | 0.00              | 0.00         | 2,562,571.86  |
| Estimado a fin de año                                   | * 9,006,074.86 | 0.00              | 0.00         | 9,006,074.86  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 613,015.67     | 2,588,385.78      | 0.00         | 3,201,401.45  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 93.63 %      | 11.77 %           | 0.00 %       | 76.27 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

### PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

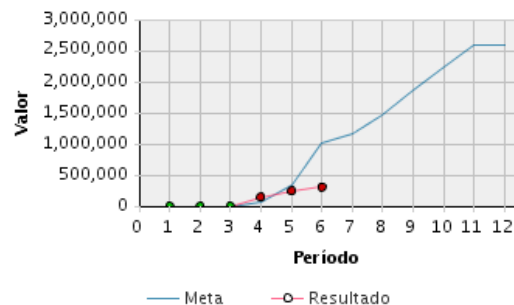

### Presupuesto Mensual 2025

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2025 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Mar                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Abr                      | 54,711.18                  | 146,337.60          | 54,711.18                    | 146,337.60            | 267.47 %         |  | 5.65 %       |
| May                      | 280,592.85                 | 98,343.41           | 335,304.03                   | 244,681.01            | 72.97 %          |  | 9.45 %       |
| Jun                      | 687,495.85                 | 60,070.31           | 1,022,799.88                 | 304,751.32            | 29.80 %          |  | 11.77 %      |
| Jul                      | 150,322.10                 |                     | 1,173,121.98                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Ago                      | 288,212.10                 |                     | 1,461,334.08                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Sep                      | 390,556.90                 |                     | 1,851,890.98                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Oct                      | 379,959.50                 |                     | 2,231,850.48                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 356,535.30                 |                     | 2,588,385.78                 |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>2,588,385.78</b>        | <b>304,751.32</b>   |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                   | OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                     | Archivo         | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | AOSCIACIÓN_HITO_19.- Conglomerados enlistados mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social | B9_HITO_19.rar  | 06/10/2022    |
| 2  | ASOCIACIÓN HITO No. 24_ Información en bases de datos validada mes 4                                                                       | C5_HITO_24.rar  | 12/12/2022    |
| 3  | ASOCIACION HITO No. 22_Proceso de recolección de información                                                                               | C3_HITO_22.rar  | 12/12/2022    |
| 4  | ASOCIACION HITO No. 23_Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI                                                             | C4_HITO_23.rar  | 12/12/2022    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO No 1 - MUESTRA DE UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO                                                                              | A1_HITO_1.rar   | 07/03/2022    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO No 10 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | A11_HITO_10.rar | 06/07/2022    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO No 11 - INDICADORES DE CALIDAD REPORTADOS                                                                                  | B1_HITO_11.rar  | 05/08/2022    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO No 12 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | B2_HITO_12.rar  | 05/08/2022    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO No 13 - INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS VALIDADA                                                                             | B3_HITO_13.rar  | 05/08/2022    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO No 14 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO                                                                     | B4_HITO_14.rar  | 05/08/2022    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO No 15 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                           | B5_HITO_15.rar  | 06/09/2022    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO No 16 - INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS VALIDADA                                                                              | B6_HITO_16.rar  | 06/09/2022    |
| 13 | ASOCIACIÓN HITO No 17 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO                                                                     | B7_HITO_17.rar  | 06/09/2022    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO No 2 - APROBACIÓN PRESUPUESTO, PLAN DE PROYECTO Y MATRIZ ACTIVIDADES                                                       | A2_HITO_2.rar   | 07/03/2022    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                             | Archivo        | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 15 | ASOCIACIÓN HITO No 3 - INFORME DE LA PRUEBA PILOTO                                                                                                                                 | A3_HITO_3.rar  | 05/04/2022    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO No 4 - MANUAL DEL ENCUESTADOR Y FORMULARIOS                                                                                                                        | A4_HITO_4.rar  | 05/04/2022    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO No 5 - MATRIZ DE PERSONAL SELECCIONADO                                                                                                                             | A6_HITO_5.rar  | 05/05/2022    |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO No 6 - SINTAXIS DE VALIDACIÓN Y DE INDICADORES                                                                                                                     | A7_HITO_6.rar  | 05/05/2022    |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO No 7 - MUESTRA SELECCIONADA                                                                                                                                        | A10_HITO_7.rar | 06/07/2022    |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO No 8 - SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ENCUESTA                                                                                                                      | A8_HITO_8.rar  | 03/06/2022    |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO No 9 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS                                                                                                                                    | A9_HITO_9.rar  | 03/06/2022    |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO No. 34.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10                      | D6_HITO_34.rar | 04/05/2023    |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO No. 18.- Información en bases de datos validada mes 2ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social                       | B8_HITO_18.rar | 06/10/2022    |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO No. 20.-Proceso de recolección de información iniciado mes 3ENDI                                                                                                   | C1_HITO_20.rar | 02/11/2022    |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO No. 21.- Información en bases de datos validada mes 3ENDI                                                                                                          | C2_HITO_21.rar | 02/11/2022    |
| 26 | ASOCIACIÓN HITO No. 25_Productos de resultados entregados primer trimestreEND                                                                                                      | C6_HITO_25.rar | 12/12/2022    |
| 27 | ASOCIACIÓN HITO No. 26 Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI                                                                                        | C7_HITO_26.rar | 17/01/2023    |
| 28 | ASOCIACIÓN HITO No. 27 Información en bases de datos validada mes 5ENDI                                                                                                            | C8_HITO_27.rar | 17/01/2023    |
| 29 | ASOCIACIÓN HITO No. 28 Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI                                                                                             | C9_HITO_28.rar | 17/01/2023    |
| 30 | ASOCIACIÓN HITO No. 29 Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de encuestaENDI                                                                                        | D1_HITO_29.rar | 17/01/2023    |
| 31 | ASOCIACIÓN HITO No. 30.- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados                                                                                        | D2_HITO_30.rar | 22/03/2023    |
| 32 | ASOCIACIÓN HITO No. 31.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9                                | D3_HITO_31.rar | 04/04/2023    |
| 33 | ASOCIACIÓN HITO No. 32.- Proceso de recolección de información iniciado mes 8                                                                                                      | D4_HITO_32.rar | 04/04/2023    |
| 34 | ASOCIACIÓN HITO No. 33.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8                  | D5_HITO_33.rar | 04/04/2023    |
| 35 | ASOCIACIÓN HITO No. 35.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 9 | D7_HITO_35.rar | 04/05/2023    |
| 36 | ASOCIACIÓN HITO No. 36.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9         | D8_HITO_36.rar | 04/05/2023    |
| 37 | ASOCIACIÓN HITO No. 37.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11                      | D9_HITO_37.rar | 23/06/2023    |
| 38 | ASOCIACIÓN HITO No. 38.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de                                                                                    | E1_HITO_38.rar | 23/06/2023    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                   | Archivo        | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    | inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10                                                                                                      |                |               |
| 39 | ASOCIACIÓN HITO No. 39.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10              | E2_HITO_39.rar | 23/06/2023    |
| 40 | ASOCIACIÓN HITO No. 40.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12                                      | E3_HITO_40.rar | 29/06/2023    |
| 41 | ASOCIACIÓN HITO No. 41.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11                | E4_HITO_41.rar | 29/06/2023    |
| 42 | ASOCIACIÓN HITO No. 42.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11                       | E5_HITO_42.rar | 29/06/2023    |
| 43 | ASOCIACIÓN HITO No. 43.- Conglomerados enlistados año 2 mes 1                                                                                                                            | E6_HITO_43.rar | 03/08/2023    |
| 44 | ASOCIACIÓN HITO No. 44.- Proceso de recolección de información iniciado mes 12                                                                                                           | E7_HITO_44.rar | 03/08/2023    |
| 45 | ASOCIACIÓN HITO No. 45.- Información en bases de datos validada mes 12                                                                                                                   | E8_HITO_45.rar | 03/08/2023    |
| 46 | ASOCIACIÓN HITO No. 46.- Factores elaborados base anual                                                                                                                                  | E9_HITO_46.rar | 03/08/2023    |
| 47 | ASOCIACIÓN HITO No. 47.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2                       | F1_HITO_47.zip | 03/10/2023    |
| 48 | ASOCIACIÓN HITO No. 48.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1 | F2_HITO_48.zip | 03/10/2023    |
| 49 | ASOCIACIÓN HITO No. 49.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1         | F3_HITO_49.zip | 03/10/2023    |
| 50 | ASOCIADO HITO No. 50.- Conglomerados enlistados año 2 mes 3                                                                                                                              | F4_HITO_50.zip | 03/01/2024    |
| 51 | ASOCIADO HITO No. 51.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 2                                                                                                        | F5_HITO_51.zip | 03/01/2024    |
| 52 | ASOCIADO HITO No. 52.- Productos elaborados información anual                                                                                                                            | F6_HITO_52.zip | 03/01/2024    |
| 53 | ASOCIADO HITO No. 53 Información en bases de datos validada año 2 mes 2                                                                                                                  | F7_HITO_53.zip | 03/01/2024    |
| 54 | ASOCIADO HITO No. 54.- Resultados publicados información anual                                                                                                                           | F8_HITO_54.zip | 03/01/2024    |
| 55 | ASOCIADO HITO No. 55.- Conglomerados enlistados año 2 mes 4                                                                                                                              | F9_HITO_55.zip | 03/01/2024    |
| 56 | ASOCIADO HITO No. 56.- Conglomerados enlistados año 2 mes 5                                                                                                                              | G1_HITO_56.zip | 03/01/2024    |
| 57 | ASOCIADO HITO No. 57.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 3                                                                                                        | G2_HITO_57.zip | 03/01/2024    |
| 58 | ASOCIADO HITO No. 58.- Información en bases de datos validada año 2 mes 3                                                                                                                | G3_HITO_58.zip | 03/01/2024    |
| 59 | ASOCIADO HITO No. 59.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 4                                                                                                        | G4_HITO_59.zip | 03/01/2024    |
| 60 | ASOCIADO HITO No. 60.- Información en bases de datos validada año 2 mes 4                                                                                                                | G5_HITO_60.zip | 03/01/2024    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                    | Archivo        | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 61 | ASOCIADO HITO No. 61.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 5                                                         | G6_HITO_61.zip | 03/01/2024    |
| 62 | ASOCIADO HITO No. 62.- Información en bases de datos validada año 2 mes 5                                                                 | G7_HITO_62.zip | 03/01/2024    |
| 63 | ASOCIADO HITO No. 63.- Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades, aprobados                                               | G8_HITO_63.rar | 05/07/2024    |
| 64 | ASOCIADO HITO No. 64.- Sintaxis de validación ENDI mes 9, actualizada                                                                     | G9_HITO_64.rar | 05/07/2024    |
| 65 | ASOCIADO HITO No. 65.- Presentación de cobertura ENDI mes 9, actualizada                                                                  | H1_HITO_65.rar | 05/07/2024    |
| 66 | ASOCIADO HITO No. 66.- Sintaxis de validación ENDI mes 10, actualizada                                                                    | H2_HITO_66.rar | 05/07/2024    |
| 67 | ASOCIADO HITO No. 67.- Presentación de cobertura ENDI mes 10, actualizada                                                                 | H2_HITO_67.rar | 05/07/2024    |
| 68 | ASOCIADO HITO No. 68.- Sintaxis de validación ENDI mes 11, actualizada                                                                    | H4_HITO_68.rar | 05/08/2024    |
| 69 | ASOCIADO HITO No. 69.- Presentación de cobertura ENDI mes 11, actualizada                                                                 | H5_HITO_69.rar | 05/09/2024    |
| 70 | ASOCIADO HITO No. 70.- Sintaxis de validación ENDI mes 12, actualizada                                                                    | H6_HITO_70.rar | 10/09/2024    |
| 71 | ASOCIADO HITO No. 71.- Presentación de cobertura ENDI mes 12, actualizada                                                                 | H7_HITO_71.rar | 10/09/2024    |
| 72 | ASOCIADO HITO No. 72.- Tabulados de indicadores ENDI, actualizados                                                                        | H8_HITO_72.rar | 03/10/2024    |
| 73 | ASOCIADO HITO No. 73.- Presentación de ENDI, actualizada                                                                                  | H9_HITO_73.rar | 03/10/2024    |
| 74 | ASOCIADO HITO No. 74.- Informe preliminar de cierre de convenio, elaborado                                                                | I1_HITO_74.rar | 03/10/2024    |
| 75 | ASOCIADO HITO No. 75.- Informe de guía de base de datos ENDI ronda 2, elaborado                                                           | I2_HITO_75.rar | 03/10/2024    |
| 76 | ASOCIADO HITO No. 76.- Informe técnico financiero preliminar, elaborado                                                                   | I3_HITO_76.rar | 27/11/2024    |
| 77 | ASOCIADO HITO No. 77.- Informe de evaluación preliminar parte 1, realizado                                                                | I4_HITO_77.rar | 27/11/2024    |
| 78 | ASOCIADO HITO No. 78 Informe de evaluación preliminar parte 2, realizado                                                                  | I4_HITO_78.rar | 16/12/2024    |
| 79 | ASOCIADO HITO No. 79.- Documentación de datos de la ENDI, iniciada                                                                        | I5_HITO_79.rar | 08/01/2025    |
| 80 | ASOCIADO HITO No. 80.- Metodología de prueba piloto ENDI Ronda 3, desarrollada                                                            | I6_HITO_80.rar | 07/05/2025    |
| 81 | ASOCIADO HITO No. 81.- Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3era ronda aprobado                                                            | I7_HITO_81.rar | 07/05/2025    |
| 82 | ASOCIADO HITO No. 82.- Informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3, elaborado                                                                   | I8_HITO_82.rar | 07/05/2025    |
| 83 | ASOCIADO HITO No. 83.- Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor, actualizado                  | I9_HITO_83.rar | 07/05/2025    |
| 84 | ASOCIADO HITO No. 84.- Plan de capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3, elaborado                                                    | J1_HITO_84.rar | 13/06/2025    |
| 85 | ASOCIADO HITO No. 85.- Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento, actualizado | J2_HITO_85.rar | 13/06/2025    |
| 86 | ASOCIADO HITO No. 86.- Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 elaborado                                              | J4_HITO_87.rar | 30/06/2025    |
| 87 | ASOCIADO HITO No. 87.- Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3, elaborado                                                         | J3_HITO_86.rar | 24/06/2025    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                  | Archivo                                             | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 88 | ASOCIADO HITO No. 88.- Base de muestra SIPE período 1 mes 1, cargada                    | J5_HITO_88.rar                                      | 04/08/2025    |
| 89 | ASOCIADO HITO No. 89.- Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3, elaborado | J6_HITO_89.rar                                      | 24/07/2025    |
| 90 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN                                                          | Reestructuración.rar                                | 21/09/2022    |
| 91 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS 2023                                               | Reestructuración_hitos.rar                          | 14/03/2023    |
| 92 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS 2025                                               | EXPEDIENTE_DE_REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2025.rar       | 07/05/2025    |
| 93 | EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS JUNIO 2025                                         | EXPEDIENTE_DE_REESTRUCTURACIÓN_HITOS_JUNIO_2025.rar | 23/06/2025    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                        | Rol               | Puesto                                 | Correo Electrónico          | Teléfono(s) |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Herrera Jacome, Margoth Rocio | Líder de Proyecto | Responsable nacional del proyecto ENDI | margoth_herrera@inec.gob.ec |             |
