

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K010 INEC: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI

Líder del Proyecto:	Pilaguano Vega, Mayra Alexandra (mayra_pilaguano@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,594,460.64
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/02/2022 - 28/11/2025
Fecha de última actualización:	01/12/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Pilaguano Vega, Mayra Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1211 suscrito el 15 de diciembre de 2020 se establece aprobar la implementación de la "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición", estableciéndose adicionalmente, en el calendario estadístico, la obligatoriedad de medición de la tasa de desnutrición crónica infantil mediante una operación estadística por muestreo y de forma anual misma que será ejecutada por la entidad responsable de Estadística y Censos a nivel nacional.

La Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil investigará información de niños menores de 5 años como su población objetivo, se ha planificado investigar 2.964 UPM, es decir alrededor de 23.712 viviendas donde se espera encontrar alrededor de 27.000 niños menores de 5 años.

Para el arranque de la operación estadística se contará con un presupuesto parcial de \$1.434.610,09 millones de dólares de los cuales serán transferidos USD \$1.345.118,48 (sin IVA) por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.

El presupuesto programado con la primera asignación de recursos permitirá el financiamiento del personal ocasional, y el inicio de las contrataciones de varios bienes y servicios asociados a la implementación del proyecto. El financiamiento cubre aproximadamente 4 meses de operativo de campo (cuyas fechas estimadas se programan entre abril y julio de 2022) mientras se gestiona la asignación adicional del presupuesto 2022-2023 para cubrir los 10 meses restantes de la operación.

LINEA BASE:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante los años 2018 y 2019, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. La metodología utilizada corresponde a un muestreo probabilístico, donde la unidad primaria de selección es el conglomerado (UPM), la unidad secundaria es la vivienda (USM) y la última unidad es la población. Los resultados de esta investigación arrojan que el 23,0% de los menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica. El INEC, cuenta además con la información recopilada a través de la Encuesta de Condiciones de Vida, cuya sexta ronda indagó medidas antropométricas en toda la población investigada desde noviembre del año 2013 hasta octubre del año 2014, guardando similitudes en cuanto a la metodología de muestreo utilizada y a partir de la cual se desprende que el 23,9% de los niños menores de 5 años en Ecuador tienen desnutrición crónica.

OBJETIVO GENERAL:

Generar una operación estadística para seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición: Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Construir los instrumentos para la realización de la ENDI
 Recolectar la información en campo
 Elaborar la programación de indicadores

Beneficios Cualitativos
La implementación del proyecto permitirá generar información para la medición de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, a fin de reducir la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años.
Tipo de Beneficiario
Ministerios y Secretarías encargados de la implementación y el seguimiento de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición
Restricciones
TIEMPO: 11 MESES PRESUPUESTO: \$ 1.434.610,09 RECURSOS: CONTRATOS OCASIONALES Y PERSONAL CIVIL, MATERIAL DE OFICINA, VEHÍCULOS, TABLETS, COMPUTADORES, SISTEMA INFORMÁTICO. ALCANCE: NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

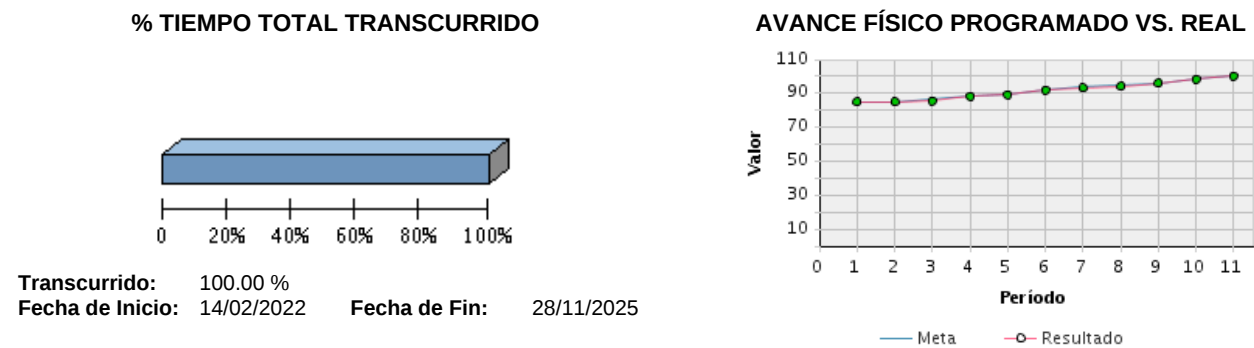

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	85 %	85 %	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %	95 %	96 %	98 %	100 %	
	Avance real acumulado											
	85 %	85 %	86 %	88 %	89 %	92 %	93 %	94 %	96 %	98 %	100 %	
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2025 1.- Se identificó las viviendas para el cuarto trimestre de 2025 para la ENDI, en el cual se ejecutó en un 95,94%. 2.- Se identificó un indicador antropométrico, el cual tuvo un 100% de cumplimiento. 3.- Se realizó el proceso de crítica de la información de encuesta del periodo 2 mes 3. (HITO 97) 4.- Se realizó la Presentación de cobertura ENDI mes 2. (HITO 98) 5.- Se ejecutó el inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 4. (HITO 99) 6.- Se realizó el cierre del riesgo para la ENDI del cuarto trimestre de 2025. OCTUBRE 2025 1.- Se realizó el Reporte de crítica periodo 1 mes 2 de la Encuesta ENDI, el cual consta como (HITO 94). 2.- Se realizó la Presentación de cobertura ENDI mes 1, la cual consta como (HITO 95) 3.- Se realizó el Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 3, el cual consta como (HITO 96) SEPTIEMBRE 2025	Pilaguano Vega, Mayra Alexandra	01/12/2025 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Se identificó las viviendas para el tercer trimestre de 2025 para la ENDI, en el cual se ejecutó en un 96%. 2.- Se identificó un indicador antropométrico, el cual tuvo un 100% de cumplimiento. 3.- Se ejecutaron los procesos de contratación pública, el cual tuvo una ejecución del 84.61% 4.- Se realizó el Reporte de crítica periodo 2 mes 1 a nivel nacional el cual consta como HITO 92 5.- Se realizó el Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 2, a nivel nacional, mismo que cuenta como HITO 93		
AGOSTO 2025 1.- Se realizó las acciones necesarias para la aprobación de la actualización del cronograma de actividades y la reestructuración de Hitos y mediante el Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0790-M del 26 de agosto de 2025, la Dirección Ejecutiva da la Aprobación de la 1era Adenda al Plan de Dirección de Proyecto - PDP del Proyecto "Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI 2025, en la cual se aprueba la actualización del cronograma de actividades y la reestructuración de Hitos. 2.- Se realizó el Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 1, elaborado, el cual fue reportado como Hito (HITO 90). 3.- Se realizó el Reporte de crítica periodo 1 mes 1, elaborado, el cual fue reportado como Hito (HITO 91). JULIO 2025 1.- Se realizó la carga de la Base de muestra SIPE período 1 mes 1, (HITO 88 Cumplido) 2.- Se realizo el "Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3" el cual tiene como objetivo de establecer las directrices, actividades y protocolos necesarios para el correcto levantamiento de información en la fase de encuesta del Plan de Dirección de Proyecto "Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI" 2025 (HITO 89 CUMPLIDO) JUNIO 2025 1.- Se realizó el Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3 (HITO 86 CUMPLIDO) 2.- Se realizó el Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 (HITO 87 CUMPLIDO) 3.- Se actualizó la Metodología del Operativo de Campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI R3 (Actividad de junio que consta en el cronograma de actividades CUMPLIDO) MAYO 2025 1.- Se solicitó la reprogramación del operativo de campo a nivel nacional para la ENDI mediante Memorandos Nro. INEC-CGTPE-DIES-2025-0457-M y INEC-CGTPE-2025-0415-M, la cual fue autorizada mediante el Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0421-M enviado por DIREJ. 2.- Se solicitó la aprobación de la actualización del cronograma físico, re estructuración de hitos y la reprogramación del indicador 3 de la ENDI, mediante Memorandos Nro. INEC-CGTPE-DIES-2025-0556-M y INEC-CGTPE-2025-0495-M, la cual fue autorizada mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0481-M enviado por DIREJ. 3.- Se elaboró el Plan de capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3. (HITO 84 CUMPLIDO) 4.-Se elaboró el Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento. (HITO 85 CUMPLIDO) ABRIL 2025 1. Se elaboró, revisó y aprobó el Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3er ronda, así como la matriz de actividades, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2025-0283-M. (HITO ASOCIADO 81). 2. Se realizó el informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3,el cual describe los principales hallazgos que se evidenciaron en los formularios. (HITO 82 CUMPLIDO) 3. Se realizó el informe de formularios de recolección "Bitácora de diseño y construcción del formulario ENDI R3", que tiene como objetivo consolidar y documentar los cambios o modificaciones de variables en los instrumentos de recolección de información de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, para la ronda 3. (HITO 83 CUMPLIDO) 4. Se revisó, ajustó y actualizó los formularios 1 y 2, y manuales del encuestador y supervisor. (HITO 83 CUMPLIDO) MARZO 2025 1. Durante el primer trimestre se gestionó la firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional MIES -INEC, suscrito el 26 de febrero de 2025, el cual permitió iniciar con la elaboración del PDP y las aprobaciones ante el MIES MEF y la Secretaría de Planificación. (HITO ASOCIADO 81). 2. Se realizó la metodología para la ejecución de la prueba piloto ENDI R3, dicha prueba se realizó en la provincia de Imbabura en los sectores de Antonio Ante, Urcuquí, Pablo Arenas, Quiroga, Pimampiro y Ambuquí desde el 25 al 28 de marzo de 2025, y el objetivo fue probar	Herrera Jacome, Margoth Rocio	06/10/2025 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en campo el instrumento de recolección de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI ronda 3. (HITO 80 CUMPLIDO).		
DICIEMBRE 2024: 1. Durante el mes de diciembre se desarrollaron actividades relacionadas con la planificación técnica, operativa, financiera y administrativa para el levantamiento de información de un nuevo año de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	08/01/2025 - 09:56 AM
NOVIEMBRE 2024: 1. El 21/11/2024, se suscribió el Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC para la ampliación de los contratos ocasionales del personal de la ENDI 2.- El 28/11/2024 mediante memorando No. INEC-CGAF-2024-2189-M, se notifica el incremento al techo plurianual del proyecto DISIES a través del cual se financia la ENDI. 3.- El 29/11/2024 se suscribe el Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC del 14 de marzo de 2024.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	04/12/2024 - 11:33 AM
OCTUBRE 2024: 1) Se ha difundido en diferentes instancias los resultados obtenidos en el segundo año de Encuesta, incluido la provincia de Galápagos. 2) Se presentó resultados de los dos años de levantamiento del Módulo de Desarrollo Infantil	Herrera Jacome, Margoth Rocio	07/11/2024 - 03:55 PM
SEPTIEMBRE 2024: 1) Se concluyó el levantamiento de información de mes 12 de encuesta, incluido la provincia de Galápagos. 2) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 3) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 4) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo. 5) Se presentó oficialmente resultados del segundo año de Encuesta.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	30/09/2024 - 10:42 AM
AGOSTO 2024: 1) Se levantó información deL mes 12 de encuesta. 2) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 3) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 4) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	04/09/2024 - 12:47 PM
JULIO 2024: 1) Se levantó información de mes 11 y 12 de encuesta. 2) Se continuo con pagos de personal civil, al 31/07/2024 se concluyó el pago hasta el mes de junio de 2024. 3) Se continuo con pagos de vehículos, al 31/07/2024 se concluyó el pago hasta el mes de mayo de 2024. 4) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 5) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 6) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	02/08/2024 - 11:58 AM
JUNIO 2024: 1) El 15/06/2024 concluyó la fase de enlistamiento del segundo año de la ENDI. 2) Se continuo con pagos de personal civil y vehículos, al 30/06/2024 se ha concluido el pago hasta el mes de marzo de 2024. 3) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 4) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 5) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo. 6) Durante el segundo trimestre de la operación estadística se aplicó la encuesta en 3.236 viviendas investigadas, efectivas 2.885; y, 3.312 menores de 5 años que forman parte de la toma antropométrica; no se consideran las UPM de la provincia de Galápagos, ya que esta provincia se trabajará en el último semestre de investigación, se debe considerar que durante el mes de abril se suspendió el operativo de campo de la operación estadística, por demora en la asignación de recursos por parte del MIES como ejecutor del proyecto.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	04/07/2024 - 12:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7) En el segundo trimestre del año 2024 e definió un indicador relacionado a malnutrición en niños y niñas menores de 5 años.		
MAYO 2024: 1) EL 06/05/2024 se retomó el operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI. 2) Se levantó información de mes 11 y 12 de enlistamiento. 3) Se continuo con pagos de personal civil y vehículos, al 31/05/2024 se ha concluido el pago hasta el mes de febrero de 2024. 4) Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 5) Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 6) Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento de información en campo.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	05/06/2024 - 03:15 PM
ABRIL 2024: 1) Con fecha 14 de marzo de 2023 se suscribió el Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y el INEC con el objeto de establecer los términos de la cooperación específica interinstitucional para la transferencia presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Instituto Nacional de Estadística y Censos para el cierre del segundo año período 2023 - 2024 de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, en el marco del contrato de préstamo 8946-BIRF, suscrito entre Ecuador y el Banco Mundial y la "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil". 2) El 22 de marzo de 2024, mediante oficio No. MIES-DISIES-2024-0010-O, la Gerenta del Proyecto en el MIES socializa el oficio No. SNP-SGP-SPN-2024-0242-OF, a través del cual la Secretaría Nacional de Planificación emite el criterio favorable para la transferencia de recursos desde el MIES al INEC para financiar la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI. 3) Mediante Oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0018-O de 26 de marzo de 2024, la Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas, solicita la aprobación del Plan Anual Operativo - POA y la Reforma al Plan Anual de la Política Pública -PAPP para la ejecución de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil durante el ejercicio fiscal 2024. 4) Mediante oficio No. MIES-DISIES-2024-0014-O de 08 de abril de 2024, la Gerencia del Proyecto en el MIES aprueba el POA y el PAPP. 5) El 09 de mayo de 2024, el Director Ejecutivo del INEC aprueba el Plan de Dirección de Proyecto para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	08/05/2024 - 09:51 AM
NOVIEMBRE 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 5 del año 2 de encuesta 4.- Se generaron indicadores para el período octubre - diciembre 2023. 5.- Se obtuvieron 8.502 viviendas efectivas durante el período octubre - diciembre 2023 6.- Se definió un indicador relacionado con la DCI, sobre desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años.	Herrera Jacome, Margoth Rocio	28/12/2023 - 11:44 AM
NOVIEMBRE 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 4 del año 2 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocio	26/12/2023 - 09:05 AM
OCTUBRE 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 3 del año 2 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocio	09/11/2023 - 12:42 PM
SEPTIEMBRE 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 2 del año 2 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocio	03/10/2023 - 12:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 1 del año 2 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	05/09/2023 - 08:48 AM
JULIO 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 12 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	02/08/2023 - 08:37 AM
JUNIO 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 11 de encuesta 4.- Se reporta los resultados alcanzados para el cumplimiento de metas establecidas en los indicadores relacionados con el número de viviendas identificadas para la aplicación de la Encuesta y los indicadores definidos para la medición de la DCI y sus factores asociados.	Herrera Jacome, Margoth Rocío	02/08/2023 - 08:37 AM
MAYO 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 10 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	07/06/2023 - 01:20 PM
ABRIL 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 9 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	03/05/2023 - 04:27 PM
MARZO 2023 1.- Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. 2.- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para la Encuesta. 3.- Se validó bases de datos generadas conforme el levantamiento del mes 8 de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	03/04/2023 - 02:59 PM
FEBRERO 2023: 1.- Con fecha 10/02/2023 se suscribió el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre MIES e INEC para la transferencia de 4.9 millones de dólares para la implementación de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI. 2.- Mediante memorando Nro.INEC-INEC-2023-0122-M de fecha 22/02/2023 la Dirección Ejecutiva aprueba el Plan de Dirección de Proyecto 2023 para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI. 3.- Al 28/02/2023 se está gestionando con las áreas competentes la elaboración y validación de la reestructuración de hitos y ficha fin del proyecto para el año 2023.	Herrera Jacome, Margoth Rocío	21/03/2023 - 03:09 PM
DICIEMBRE 2022 Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. Se han generado resultados e indicadores preliminares relacionados a la desnutrición infantil a partir de la información recolectada en la ejecución del operativo diseñado para la ENDI Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes quinto de encuesta Se seleccionó la muestra a partir de la base de datos de enlistamiento para la ejecución del plan de operativo de campo en el sexto mes de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	13/01/2023 - 09:06 AM
NOVIEMBRE 2022 Se seleccionó la muestra del mes a partir de la base de datos de enlistamiento. Se han generado resultados e indicadores preliminares a partir de la información recolectada en el primer trimestre del operativo diseñado para la ENDI Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el mes cuarto de encuesta	Herrera Jacome, Margoth Rocío	09/12/2022 - 08:37 AM
OCTUBRE 2022 - Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado para el cierre del mes 3 e inicio del mes 4 de la Encuesta.	Mendoza Moreira, Virginia Natali	02/11/2022 - 11:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado para el desarrollo de la Encuesta.		
SEPTIEMBRE 2022: - Con fecha 13 de septiembre de 2022, mediante Oficio Nro.MIES-DISIES-2022-0077-O, el MIES aprueba la cuarta reforma a la planificación operativa del Proyecto para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, la misma que considera la segunda transferencia de recursos para la ejecución del Plan Operativo de Campo diseñado para la recolección, procesamiento y análisis de la información requerida en dicha encuesta. - Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0804-M de 15 de septiembre de 2022 el Patrocinador Ejecutivo del proyecto autoriza el IV Adendum al PDP del Proyecto, el cual incluye la reestructuración de hitos y metas del proyecto. - Con fecha 21 de septiembre, se procede a realizar la reestructura de hitos y metas del proyecto. - Se recolectó la información y se generaron las bases de datos conforme lo planificado - Se recolectó la información y se generaron las bases de datos de conglomerados conforme lo planificado - Se realiza el reporte de indicadores por el período julio - septiembre 2022	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/10/2022 - 11:02 AM
AGOSTO 2022 Se inició la recolección de información del mes 2 de encuesta el 16 de agosto de 2022 (Hito 17 cumplido) Se recolectó la información y se enlistaron los conglomerados del mes 3 (Hito 15 cumplido) Se cuenta con base de datos del primer mes y medio de recolección de información, y la misma ha sido validada por parte de los revisores de calidad (Hito 16 cumplido)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/09/2022 - 06:38 PM
JULIO 2022: 1.- Se generaron los indicadores que permitirán medir la calidad de la información levantada durante el primer trimestre.- (Hito 11 cumplido) 2.- Con fecha 23 de julio de 2022 culminó el período quinto de enlistamiento que corresponde al mes cuatro de trabajo. - (Hito 12 cumplido). 3.- Se generó la base de datos para el levantamiento de información la misma ha sido revisada y validada por las unidades correspondientes.. - (Hito 13 cumplido). 4.- Se ha dado inicio al proceso de recolección y levantamiento de datos a nivel nacional para la encuesta.- (Hito 14 cumplido)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/08/2022 - 04:02 PM
JUNIO 2022: 1.- La selección de la muestra del mes de mayo fue entregada el 09 de junio de 2022.- (Hito 7 cumplido) 2.- Los conglomerados del mes 2 correspondiente al mes de junio de 2022 fueron enlistados en su totalidad. - (Hito 10 cumplido). 3.- No se puede reportar los indicadores de calidad del inicio del operativo de campo de la encuesta dado que se solicitó reprogramación del mismo por movilizaciones de la CONAIE. - (Hito 11 en proceso).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	04/07/2022 - 04:52 PM
MAYO 2022: 1.- Debido a que el material cartográfico (atado a la base de preselección de viviendas) se encuentra en construcción, se contará con la muestra seleccionada aproximadamente el 10 de junio de 2022. - (Hito 7 en proceso). 2.- Se realizó el proceso de preselección, capacitación y selección del personal necesario para arrancar con la fase de encuesta de la ENDI - (Hito 8 cumplido). 3.- Se cuenta con los conglomerados enlistados (Hito 9 cumplido).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	03/06/2022 - 03:01 PM
ABRIL 2022: 1.- Se seleccionó y contrató al personal (63 personas: 47 encuestadores y 16 Supervisores de operativo de campo) para la fase de enlistamiento de la ENDI (Hito 5 cumplido). 2.- Se elaboró la sintaxis de validación (para detectar errores en las bases de datos de la información levantada a través de programación en STATA) - (Hito 6 cumplido). 3.- Se elaboró la sintaxis de indicadores (a través de programación en "R STUDIO" para generar el resultado de los mismos) - (Hito 6 cumplido).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/05/2022 - 12:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2022: 1.- Se elaboró el Informe de la prueba piloto (Hito 3 cumplido). 2.- Se elaboró el Manual del Encuestador (Hito 4 cumplido). 3.- Se elaboró el Formulario de la ENDI (Hito 4 cumplido).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/04/2022 - 02:02 PM
FEBRERO 2022: 1.- Se elaboró, revisó, ajustó y aprobó el Plan de Dirección del Proyecto - PDP, así como la matriz de actividades y demás documentación habilitante referente al proyecto, mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0127-M. 2.- El Ministerio de Finanzas aprobó la modificación presupuestaria para la transferencia de recursos del MIES al INEC, incremento presupuestario valor de 1.434610,09 informado por la Coordinación General Administrativa Financiera mediante memorando INEC-CGAF-2022-0198-M. 3.- Se realizó la definición y selección de la primer etapa de muestreo.	Mendoza Moreira, Virginia Natali	04/03/2022 - 10:08 PM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Muestra de Unidades Primaria de Muestreo identificada	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	2.3
2	PLANIFICACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades y Presupuesto aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.8
3	PLANIFICACIÓN: Manuales de encuestador, supervisor, crítica y codificación elaborados	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	2.0
4	PLANIFICACIÓN: Informe de la prueba piloto presentado	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.9
5	EJECUCIÓN: Personal para enlistamiento seleccionado	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		15/04/2022		Sí	2.1
6	EJECUCIÓN: Sintaxis de validación y de indicadores elaboradas	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		30/04/2022		Sí	1.1
7	EJECUCIÓN: Muestra seleccionada	5-Entregables Intermedios	30/05/2022		09/06/2022		Sí	1.1
8	EJECUCIÓN: Personal capacitado y seleccionado	5-Entregables Intermedios	30/05/2022		30/05/2022		Sí	1.5
9	EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.25
10	EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados	5-Entregables Intermedios	14/06/2022		14/06/2022		Sí	1.25
11	EJECUCIÓN: Indicadores de calidad reportados en el primer trimestre de levantamiento	9-Entregables Formales	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados	5-Entregables Intermedios	14/07/2022		14/07/2022		Sí	1.25
13	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada	5-Entregables Intermedios	14/07/2022		14/07/2022		Sí	1.25
14	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado	5-Entregables Intermedios	14/07/2022		14/07/2022		Sí	1.5
15	EJECUCIÓN: Información del primer mes de encuesta en bases de datosENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	14/08/2022		14/08/2022		Sí	1.1
16	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada	5-Entregables Intermedios	14/08/2022		14/08/2022		Sí	1.25
17	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 2 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	14/08/2022		14/08/2022		Sí	1.1
18	Ejecución: Información en bases de datos validada mes 2ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	10/09/2022		10/09/2022		Sí	1.25
19	EJECUCIÓN: Conglomerados enlistados mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	15/09/2022		15/09/2022		Sí	1.25
20	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 3ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		11/10/2022		Sí	1.1
21	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 3ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		15/10/2022		Sí	1.25
22	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 4 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	14/11/2022		14/11/2022		Sí	1.1
23	EJECUCIÓN: Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	18/11/2022		18/11/2022		Sí	1.3
24	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	20/11/2022		20/11/2022		Sí	1.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Productos de resultados entregados primer trimestreENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.3
26	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	14/12/2022		14/12/2022		Sí	1.1
27	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada mes 5ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	20/12/2022		20/12/2022		Sí	1.25
28	EJECUCIÓN: Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.25
29	EJECUCIÓN: Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de encuestaENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	1.1
30	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Planeación: Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados	5-Entregables Intermedios	22/02/2023		22/02/2023		Sí	1.7
31	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9	5-Entregables Intermedios	06/03/2023		06/03/2023		Sí	1.2
32	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 8	5-Entregables Intermedios	16/03/2023		16/03/2023		Sí	1.2
33	ENDI_C1. ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8	5-Entregables Intermedios	29/03/2023		29/03/2023		Sí	1.25
34	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10	5-Entregables Intermedios	03/04/2023		03/04/2023		Sí	1.2
35	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso	5-Entregables Intermedios	13/04/2023		13/04/2023		Sí	1.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de recolección de información iniciado mes 9							
36	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9	5-Entregables Intermedios	26/04/2023		26/04/2023		Sí	1.2
37	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11	5-Entregables Intermedios	05/05/2023		05/05/2023		Sí	1.2
38	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10	5-Entregables Intermedios	12/05/2023		12/05/2023		Sí	1.25
39	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10	5-Entregables Intermedios	24/05/2023		24/05/2023		Sí	1.2
40	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12	5-Entregables Intermedios	02/06/2023		02/06/2023		Sí	1.2
41	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11	5-Entregables Intermedios	11/06/2023		11/06/2023		Sí	1.25
42	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11	5-Entregables Intermedios	21/06/2023		21/06/2023		Sí	1.2
43	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 1	5-Entregables Intermedios	02/07/2023		02/07/2023		Sí	1.2
44	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 12	5-Entregables Intermedios	10/07/2023		10/07/2023		Sí	1.25
45	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 12	5-Entregables Intermedios	26/07/2023		26/07/2023		Sí	1.2
46	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Factores elaborados base anual	5-Entregables Intermedios	30/07/2023		30/07/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
47	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2	5-Entregables Intermedios	02/08/2023		02/08/2023		Sí	1.2
48	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1	5-Entregables Intermedios	11/08/2023		11/08/2023		Sí	1.25
49	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1	5-Entregables Intermedios	21/08/2023		21/08/2023		Sí	1.2
50	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 3	5-Entregables Intermedios	02/09/2023		02/09/2023		Sí	1.2
51	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 2	5-Entregables Intermedios	11/09/2023		11/09/2023		Sí	1.25
52	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Productos elaborados información anual	5-Entregables Intermedios	20/09/2023		20/09/2023		Sí	1.0
53	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 2	5-Entregables Intermedios	21/09/2023		21/09/2023		Sí	1.2
54	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Resultados publicados información anual	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	1.0
55	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 4	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	1.2
56	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 5	5-Entregables Intermedios	02/10/2023		02/10/2023		Sí	1.2
57	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 3	5-Entregables Intermedios	11/10/2023		11/10/2023		Sí	1.25
58	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.:	5-Entregables Intermedios	21/10/2023		21/10/2023		Sí	1.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 3							
59	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 4	5-Entregables Intermedios	11/11/2023		11/11/2023		Sí	1.25
60	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 4	5-Entregables Intermedios	21/11/2023		21/11/2023		Sí	1.2
61	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 5	5-Entregables Intermedios	11/12/2023		11/12/2023		Sí	1.25
62	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 5	5-Entregables Intermedios	21/12/2023		21/12/2023		Sí	1.2
63	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades, aprobados	5-Entregables Intermedios	12/04/2024		12/04/2024		Sí	0.36
64	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 9, actualizada	5-Entregables Intermedios	24/05/2024		24/05/2024		Sí	0.29
65	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 9, actualizada	5-Entregables Intermedios	30/05/2024		30/05/2024		Sí	0.29
66	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 10, actualizada	5-Entregables Intermedios	19/06/2024		19/06/2024		Sí	0.29
67	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 10, actualizada	5-Entregables Intermedios	26/06/2024		26/06/2024		Sí	0.29
68	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis	5-Entregables Intermedios	19/07/2024		19/07/2024		Sí	0.29

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de validación ENDI mes 11, actualizada							
69	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 11, actualizada	5-Entregables Intermedios	26/07/2024		26/07/2024		Sí	0.29
70	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Sintaxis de validación ENDI mes 12, actualizada	5-Entregables Intermedios	15/08/2024		15/08/2024		Sí	0.29
71	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 12, actualizada	5-Entregables Intermedios	22/08/2024		22/08/2024		Sí	0.29
72	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Tabulados de indicadores ENDI, actualizados	5-Entregables Intermedios	02/09/2024		02/09/2024		Sí	0.29
73	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Presentación de ENDI, actualizada	5-Entregables Intermedios	28/09/2024		28/09/2024		Sí	0.29
74	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe preliminar de cierre de convenio, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2024		29/09/2024		Sí	0.29
75	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: EJECUCIÓN: Informe de guía de base de datos ENDI ronda 2, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.29
76	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe técnico financiero preliminar, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2024		15/10/2024		Sí	0.29
77	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe de evaluación preliminar parte 1, realizado	9-Entregables Formales	29/10/2024		29/10/2024		Sí	0.29
78	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Informe de evaluación preliminar parte 2, realizado	9-Entregables Formales	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.29
79	ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: CIERRE: Documentación de datos de la ENDI, iniciada	9-Entregables Formales	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.29

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
80	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Metodología de prueba piloto ENDI Ronda 3, desarrollada	5-Entregables Intermedios	22/03/2025		21/03/2025		Sí	0.63
81	"ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3era ronda aprobado "	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		01/04/2025		Sí	1.17
82	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3, elaborado	5-Entregables Intermedios	11/04/2025		09/04/2025		Sí	0.63
83	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de encuesta, actualizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		23/04/2025		Sí	0.63
84	"ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Plan de capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3, elaborado"	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		29/05/2025		Sí	1.15
85	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento, actualizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		11/06/2025		Sí	0.58
86	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 elaborado	5-Entregables Intermedios	20/06/2025		30/06/2025		Sí	1.13
87	"ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: DEFINICIÓN: Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3, elaborado "	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		20/06/2025		Sí	1.0
88	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Base de muestra SIPE período 1 mes 1, cargada	5-Entregables Intermedios	24/07/2025		01/08/2025		Sí	0.58
89	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3, elaborado	5-Entregables Intermedios	25/07/2025		24/07/2025		Sí	1.15
90	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 1, elaborado	5-Entregables Intermedios	25/08/2025		07/08/2025		Sí	0.69

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
91	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de crítica periodo 1 mes 1, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/08/2025		03/09/2025		Sí	0.6
92	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de crítica periodo 2 mes 1, elaborado	5-Entregables Intermedios	18/09/2025		18/09/2025		Sí	0.6
93	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 2, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/09/2025		18/09/2025		Sí	0.69
94	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de crítica periodo 1 mes 2, elaborado	5-Entregables Intermedios	03/10/2025		03/10/2025		Sí	0.6
95	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 1, construida	5-Entregables Intermedios	16/10/2025		14/10/2025		Sí	0.59
96	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 3 elaborado	5-Entregables Intermedios	22/10/2025		14/10/2025		Sí	0.69
97	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Reporte de crítica periodo 2 mes 3, elaborado	5-Entregables Intermedios	17/11/2025		24/11/2025		Sí	0.6
98	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Presentación de cobertura ENDI mes 2, construida	5-Entregables Intermedios	18/11/2025		19/11/2025		Sí	0.59
99	ENDI_C1. DISE_INSTR_SERV_INCLS SOCIAL: EJECUCIÓN: Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 4, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/11/2025		24/11/2025		Sí	0.7

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de viviendas identificadas para la ENDI		95.94 %	55,722	53,457	15/06/2022	Oct-Dic
2	Número de indicadores antropométricos definidos		100.00 %	1	1	15/09/2022	Oct-Dic
3	Porcentaje de procesos contratados para el inicio del tercer año de la ENDI		100.00 %	0	0	01/04/2025	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,594,460.64 **
Costo Total:	1,434,610.09
Total Devengado:	11,172,229.76
% Costo Total Devengado:	778.76 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 778.76 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,690,049.35	0.00	0.00	10,690,049.35
Ppto. Externo Planeado	10,690,049.35	0.00	0.00	10,690,049.35
Ppto. Aprobado Inicial	10,006,120.37	0.00	0.00	10,006,120.37
Ppto. Codificado	9,950,861.68	0.00	0.00	9,950,861.68
Ppto. Comprometido	2,646,563.61	0.00	0.00	2,646,563.61
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	9,619,090.53	2,588,385.78	0.00	12,207,476.31
Ppto. Devengado	9,006,074.86	2,166,154.90	0.00	11,172,229.76
Pagado Real	2,562,571.86	0.00	0.00	2,562,571.86
Estimado a fin de año	* 9,006,074.86	0.00	0.00	9,006,074.86
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	613,015.67	2,588,385.78	0.00	3,201,401.45
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.63 %	83.69 %	0.00 %	91.52 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

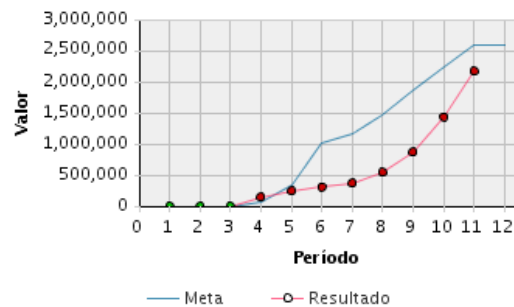

Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	54,711.18	146,337.60	54,711.18	146,337.60	267.47 %		5.65 %
May	280,592.85	98,343.41	335,304.03	244,681.01	72.97 %		9.45 %
Jun	687,495.85	60,070.31	1,022,799.88	304,751.32	29.80 %		11.77 %
Jul	150,322.10	65,038.00	1,173,121.98	369,789.32	31.52 %		14.29 %
Ago	288,212.10	168,274.66	1,461,334.08	538,063.98	36.82 %		20.79 %
Sep	390,556.90	329,006.49	1,851,890.98	867,070.47	46.82 %		33.50 %
Oct	379,959.50	568,108.11	2,231,850.48	1,435,178.58	64.30 %		55.45 %
Nov	356,535.30	730,976.32	2,588,385.78	2,166,154.90	83.69 %		83.69 %
Dic							
Total	2,588,385.78	2,166,154.90					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	AOSCIACIÓN_HITO_19.- Conglomerados enlistados mes 4ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social	B9_HITO_19.rar	06/10/2022
2	ASOCIACIÓN HITO No. 24_ Información en bases de datos validada mes 4	C5_HITO_24.rar	12/12/2022
3	ASOCIACION HITO No. 22_Proceso de recolección de información	C3_HITO_22.rar	12/12/2022
4	ASOCIACION HITO No. 23_Productos de resultados elaborados primer trimestreENDI	C4_HITO_23.rar	12/12/2022
5	ASOCIACIÓN HITO No 1 - MUESTRA DE UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO	A1_HITO_1.rar	07/03/2022
6	ASOCIACIÓN HITO No 10 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS	A11_HITO_10.rar	06/07/2022
7	ASOCIACIÓN HITO No 11 - INDICADORES DE CALIDAD REPORTADOS	B1_HITO_11.rar	05/08/2022
8	ASOCIACIÓN HITO No 12 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS	B2_HITO_12.rar	05/08/2022
9	ASOCIACIÓN HITO No 13 - INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS VALIDADA	B3_HITO_13.rar	05/08/2022
10	ASOCIACIÓN HITO No 14 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO	B4_HITO_14.rar	05/08/2022
11	ASOCIACIÓN HITO No 15 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS	B5_HITO_15.rar	06/09/2022
12	ASOCIACIÓN HITO No 16 - INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS VALIDADA	B6_HITO_16.rar	06/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACIÓN HITO No 17 - PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIADO	B7_HITO_17.rar	06/09/2022
14	ASOCIACIÓN HITO No 2 - APROBACIÓN PRESUPUESTO, PLAN DE PROYECTO Y MATRIZ ACTIVIDADES	A2_HITO_2.rar	07/03/2022
15	ASOCIACIÓN HITO No 3 - INFORME DE LA PRUEBA PILOTO	A3_HITO_3.rar	05/04/2022
16	ASOCIACIÓN HITO No 4 - MANUAL DEL ENCUESTADOR Y FORMULARIOS	A4_HITO_4.rar	05/04/2022
17	ASOCIACIÓN HITO No 5 - MATRIZ DE PERSONAL SELECCIONADO	A6_HITO_5.rar	05/05/2022
18	ASOCIACIÓN HITO No 6 - SINTAXIS DE VALIDACIÓN Y DE INDICADORES	A7_HITO_6.rar	05/05/2022
19	ASOCIACIÓN HITO No 7 - MUESTRA SELECCIONADA	A10_HITO_7.rar	06/07/2022
20	ASOCIACIÓN HITO No 8 - SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA ENCUESTA	A8_HITO_8.rar	03/06/2022
21	ASOCIACIÓN HITO No 9 - CONGLOMERADOS ENLISTADOS	A9_HITO_9.rar	03/06/2022
22	ASOCIACIÓN HITO No. 34.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 10	D6_HITO_34.rar	04/05/2023
23	ASOCIACIÓN HITO No. 18.- Información en bases de datos validada mes 2ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social	B8_HITO_18.rar	06/10/2022
24	ASOCIACIÓN HITO No. 20.-Proceso de recolección de información iniciado mes 3ENDI	C1_HITO_20.rar	02/11/2022
25	ASOCIACIÓN HITO No. 21.- Información en bases de datos validada mes 3ENDI	C2_HITO_21.rar	02/11/2022
26	ASOCIACIÓN HITO No. 25_Productos de resultados entregados primer trimestreEND	C6_HITO_25.rar	12/12/2022
27	ASOCIACIÓN HITO No. 26 Proceso de recolección de información iniciado mes 5 de encuestaENDI	C7_HITO_26.rar	17/01/2023
28	ASOCIACIÓN HITO No. 27 Información en bases de datos validada mes 5ENDI	C8_HITO_27.rar	17/01/2023
29	ASOCIACIÓN HITO No. 28 Información en bases de datos validada primer periodo mes 6ENDI	C9_HITO_28.rar	17/01/2023
30	ASOCIACIÓN HITO No. 29 Proceso de recolección de información iniciado mes 6 de encuestaENDI	D1_HITO_29.rar	17/01/2023
31	ASOCIACIÓN HITO No. 30.- Plan de Dirección de Proyecto, Cronograma de actividades aprobados	D2_HITO_30.rar	22/03/2023
32	ASOCIACIÓN HITO No. 31.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 9	D3_HITO_31.rar	04/04/2023
33	ASOCIACIÓN HITO No. 32.- Proceso de recolección de información iniciado mes 8	D4_HITO_32.rar	04/04/2023
34	ASOCIACIÓN HITO No. 33.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 8	D5_HITO_33.rar	04/04/2023
35	ASOCIACIÓN HITO No. 35.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 9	D7_HITO_35.rar	04/05/2023
36	ASOCIACIÓN HITO No. 36.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 9	D8_HITO_36.rar	04/05/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
37	ASOCIACIÓN HITO No. 37.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 11	D9_HITO_37.rar	23/06/2023
38	ASOCIACIÓN HITO No. 38.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 10	E1_HITO_38.rar	23/06/2023
39	ASOCIACIÓN HITO No. 39.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 10	E2_HITO_39.rar	23/06/2023
40	ASOCIACIÓN HITO No. 40.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados mes 12	E3_HITO_40.rar	29/06/2023
41	ASOCIACIÓN HITO No. 41.-Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado mes 11	E4_HITO_41.rar	29/06/2023
42	ASOCIACIÓN HITO No. 42.- Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada mes 11	E5_HITO_42.rar	29/06/2023
43	ASOCIACIÓN HITO No. 43.- Conglomerados enlistados año 2 mes 1	E6_HITO_43.rar	03/08/2023
44	ASOCIACIÓN HITO No. 44.- Proceso de recolección de información iniciado mes 12	E7_HITO_44.rar	03/08/2023
45	ASOCIACIÓN HITO No. 45.- Información en bases de datos validada mes 12	E8_HITO_45.rar	03/08/2023
46	ASOCIACIÓN HITO No. 46.- Factores elaborados base anual	E9_HITO_46.rar	03/08/2023
47	ASOCIACIÓN HITO No. 47.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Conglomerados enlistados año 2 mes 2	F1_HITO_47.zip	03/10/2023
48	ASOCIACIÓN HITO No. 48.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 1	F2_HITO_48.zip	03/10/2023
49	ASOCIACIÓN HITO No. 49.- ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.: Ejecución: Información en bases de datos validada año 2 mes 1	F3_HITO_49.zip	03/10/2023
50	ASOCIADO HITO No. 50.- Conglomerados enlistados año 2 mes 3	F4_HITO_50.zip	03/01/2024
51	ASOCIADO HITO No. 51.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 2	F5_HITO_51.zip	03/01/2024
52	ASOCIADO HITO No. 52.- Productos elaborados información anual	F6_HITO_52.zip	03/01/2024
53	ASOCIADO HITO No. 53 Información en bases de datos validada año 2 mes 2	F7_HITO_53.zip	03/01/2024
54	ASOCIADO HITO No. 54.- Resultados publicados información anual	F8_HITO_54.zip	03/01/2024
55	ASOCIADO HITO No. 55.- Conglomerados enlistados año 2 mes 4	F9_HITO_55.zip	03/01/2024
56	ASOCIADO HITO No. 56.- Conglomerados enlistados año 2 mes 5	G1_HITO_56.zip	03/01/2024
57	ASOCIADO HITO No. 57.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 3	G2_HITO_57.zip	03/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	ASOCIADO HITO No. 58.- Información en bases de datos validada año 2 mes 3	G3_HITO_58.zip	03/01/2024
59	ASOCIADO HITO No. 59.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 4	G4_HITO_59.zip	03/01/2024
60	ASOCIADO HITO No. 60.- Información en bases de datos validada año 2 mes 4	G5_HITO_60.zip	03/01/2024
61	ASOCIADO HITO No. 61.- Proceso de recolección de información iniciado año 2 mes 5	G6_HITO_61.zip	03/01/2024
62	ASOCIADO HITO No. 62.- Información en bases de datos validada año 2 mes 5	G7_HITO_62.zip	03/01/2024
63	ASOCIADO HITO No. 63.- Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades, aprobados	G8_HITO_63.rar	05/07/2024
64	ASOCIADO HITO No. 64.- Sintaxis de validación ENDI mes 9, actualizada	G9_HITO_64.rar	05/07/2024
65	ASOCIADO HITO No. 65.- Presentación de cobertura ENDI mes 9, actualizada	H1_HITO_65.rar	05/07/2024
66	ASOCIADO HITO No. 66.- Sintaxis de validación ENDI mes 10, actualizada	H2_HITO_66.rar	05/07/2024
67	ASOCIADO HITO No. 67.- Presentación de cobertura ENDI mes 10, actualizada	H2_HITO_67.rar	05/07/2024
68	ASOCIADO HITO No. 68.- Sintaxis de validación ENDI mes 11, actualizada	H4_HITO_68.rar	05/08/2024
69	ASOCIADO HITO No. 69.- Presentación de cobertura ENDI mes 11, actualizada	H5_HITO_69.rar	05/09/2024
70	ASOCIADO HITO No. 70.- Sintaxis de validación ENDI mes 12, actualizada	H6_HITO_70.rar	10/09/2024
71	ASOCIADO HITO No. 71.- Presentación de cobertura ENDI mes 12, actualizada	H7_HITO_71.rar	10/09/2024
72	ASOCIADO HITO No. 72.- Tabulados de indicadores ENDI, actualizados	H8_HITO_72.rar	03/10/2024
73	ASOCIADO HITO No. 73.- Presentación de ENDI, actualizada	H9_HITO_73.rar	03/10/2024
74	ASOCIADO HITO No. 74.- Informe preliminar de cierre de convenio, elaborado	I1_HITO_74.rar	03/10/2024
75	ASOCIADO HITO No. 75.- Informe de guía de base de datos ENDI ronda 2, elaborado	I2_HITO_75.rar	03/10/2024
76	ASOCIADO HITO No. 76.- Informe técnico financiero preliminar, elaborado	I3_HITO_76.rar	27/11/2024
77	ASOCIADO HITO No. 77.- Informe de evaluación preliminar parte 1, realizado	I4_HITO_77.rar	27/11/2024
78	ASOCIADO HITO No. 78 Informe de evaluación preliminar parte 2, realizado	I4_HITO_78.rar	16/12/2024
79	ASOCIADO HITO No. 79.- Documentación de datos de la ENDI, iniciada	I5_HITO_79.rar	08/01/2025
80	ASOCIADO HITO No. 80.- Metodología de prueba piloto ENDI Ronda 3, desarrollada	I6_HITO_80.rar	07/05/2025
81	ASOCIADO HITO No. 81.- Plan de Dirección de Proyecto ENDI, 3era ronda aprobado	I7_HITO_81.rar	07/05/2025
82	ASOCIADO HITO No. 82.- Informe de prueba Piloto ENDI Ronda 3, elaborado	I8_HITO_82.rar	07/05/2025
83	ASOCIADO HITO No. 83.- Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor, actualizado	I9_HITO_83.rar	07/05/2025
84	ASOCIADO HITO No. 84.- Plan de capacitación fase enlistamiento ENDI Ronda 3, elaborado	J1_HITO_84.rar	13/06/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
85	ASOCIADO HITO No. 85.- Informe de formularios de recolección, manual del encuestador, manual del supervisor de enlistamiento, actualizado	J2_HITO_85.rar	13/06/2025
86	ASOCIADO HITO No. 86.- Informe de capacitación de la fase de enlistamiento Ronda 3 elaborado	J4_HITO_87.rar	30/06/2025
87	ASOCIADO HITO No. 87.- Plan de capacitación fase encuesta ENDI Ronda 3, elaborado	J3_HITO_86.rar	24/06/2025
88	ASOCIADO HITO No. 88.- Base de muestra SIPE período 1 mes 1, cargada	J5_HITO_88.rar	04/08/2025
89	ASOCIADO HITO No. 89.- Informe de capacitación fase de encuesta ENDI Ronda 3, elaborado	J6_HITO_89.rar	24/07/2025
90	ASOCIADO HITO No. 90.- Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 1, elaborado	J7_HITO_90.rar	28/08/2025
91	ASOCIADO HITO No. 91.- Reporte de crítica periodo 1 mes 1, elaborado	J8_HITO_91.rar	04/09/2025
92	ASOCIADO HITO No. 92.- Reporte de crítica periodo 2 mes 1, elaborado	J9_HITO_92.rar	18/09/2025
93	ASOCIADO HITO No. 93.- Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 2, elaborado	K1_HITO_93.rar	18/09/2025
94	ASOCIADO HITO No. 94.- Reporte de crítica periodo 1 mes 2, elaborado	K2_HITO_94.rar	23/10/2025
95	ASOCIADO HITO No. 95.- Presentación de cobertura ENDI mes 1, construida	K3_HITO_95.rar	23/10/2025
96	ASOCIADO HITO No. 96.- Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 3 elaborado	K4_HITO_96.rar	23/10/2025
97	ASOCIADO HITO No. 97.- Reporte de crítica periodo 2 mes 3, elaborado	K5_HITO_97.rar	26/11/2025
98	ASOCIADO HITO No. 98.- Presentación de cobertura ENDI mes 2, construida	K6_HITO_98.rar	21/11/2025
99	ASOCIADO HITO No. 99.- Informe de inicio del operativo de campo, ronda 3, periodo 1 mes 4, elaborado	K7_HITO_99.rar	27/11/2025
100	EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN	Reestructuración.rar	21/09/2022
101	EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS 2023	Reestructuración_hitos.rar	14/03/2023
102	EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS 2025	EXPEDIENTE_DE_REESTRUCTURACIÓN_HITOS_2025.rar	07/05/2025
103	EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN HITOS JUNIO 2025	EXPEDIENTE_DE_REESTRUCTURACIÓN_HITOS_JUNIO_2025.rar	23/06/2025
104	EXPEDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN DE HITOS AGOSTO 2025	EXPEDIENTE_DE_REESTRUCTURACIÓN_DE_HITOS_AGO_2025.rar	27/08/2025
105	GESTIÓN DE RIESGOS GRISK01_001	GRISK01_001.rar	05/09/2025
106	GESTIÓN DE RIESGOS GRISK02_002	GRISK02_002.rar	27/11/2025

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Herrera Jacome, Margoth Rocio	Lider de Proyecto	Responsable nacional del proyecto ENDI	margoth_herrera@inec.gob.ec	
