

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

PROYECTO: K012 INEC: Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador

Líder del Proyecto:	Chaves Centeno, Stalin Roberto (roberto_chaves@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Barco Véliz, Diana Carolina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.390934	TIR:	36.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	5,088,577.16
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,474,656.52
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2026 - 31/12/2029
Fecha de última actualización:	06/02/2026	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Chaves Centeno, Stalin Roberto	Fecha del siguiente Hito:	10/02/2026

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El proyecto permitirá modernizar y fortalecer la producción de estadísticas económicas en el Ecuador integrando registros administrativos, adoptando nuevos marcos técnicos y automatizando procesos, generando datos más confiables, actualizados y comparables que respondan eficazmente a las necesidades de información de los sectores público, privado y académico para la toma de decisiones estratégicas.

***PRODUCTO / SERVICIO:**

1. Procesos implementados para la modernización de operaciones estadísticas económicas.
2. La investigación de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM).
3. Estadísticas de transporte (ESTRA) y Estadísticas de edificaciones (ESED).
4. Índice Nacional de Precios Productor (INPP); el nuevo Índice de Brechas de Intermediación y el Programa de Comparación Internacional (PCI).
5. Cambio de año base de las Cuentas Satélites oficiales integradas al Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS).

***LINEA BASE:**

La generación de estadísticas económicas se fundamenta actualmente en un modelo de captura directa de datos que requiere una alta intervención humana y procesos de supervisión manual. Actualmente se han generado procesos automatizados para mejorar la oportunidad de las estadísticas económicas, lo que refleja la intención de generar y establecer procesos modernizados. Con la finalidad de ejecutar mejoras se estima la ejecución de 12,5% de mejoras a partir de registros administrativos, nuevas tecnológicas y procesos automatizados.

***OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:**

Modernizar y fortalecer la producción de estadísticas económicas en el Ecuador integrando registros administrativos, adoptando nuevos marcos técnicos y automatizando procesos, generando datos más confiables, actualizados y comparables que respondan eficazmente a las necesidades de información de los sectores público, privado y académico para la toma de decisiones estratégicas.

***OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- i. Optimizar la gestión tecnológica y operativa de la producción de estadísticas económicas.
- ii. Ejecutar la investigación de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) contribuyendo a la construcción de economías innovadoras.
- iii. Producir estadísticas de Edificaciones (ESED) y Transporte (ESTRA) alineadas a las buenas prácticas internacionales y automatización.
- iv. Producir la encuesta para el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), el nuevo Índice de Brechas de Intermediación y Programa de Comparación Internacional (PCI) aportando a la generación de las cuentas nacionales.
- v. Generar el cambio de año base de las Cuentas Satélites oficiales integradas al Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS).

Beneficios Cualitativos

Modernizar y fortalecer la producción de estadísticas económicas en el Ecuador integrando registros administrativos, adoptando nuevos marcos técnicos y automatizando procesos, generando datos más confiables, actualizados y comparables que respondan eficazmente a las necesidades de información de los sectores público, privado y académico para la toma de decisiones estratégicas.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos.- Utilizando la proporción de población por sexo, se determina que, de estos beneficiarios directos, conforme a estimaciones dadas según el Censo 2022, el 55,7% son mujeres y el 44,3% son hombres. Para el año 2029 corresponde a un total de 2.040.229 (1.136.599 mujeres y 903.630 hombres).

Beneficiarios indirectos.- Los beneficiarios indirectos del proyecto serían las personas de 25 años en adelante que utilizan la información para fines académicos o de investigación, es decir para el año 2029 sería 5.827.569 mujeres y 5.505.054 hombres.

Restricciones

***TIEMPO:**

El proyecto tendrá una duración de 4 años.

***COSTO:**

Valor plurianual 2026-2029 de \$ 10.474.656,52

***ALCANCE:**

El proyecto tiene como alcance el fortalecimiento integral del proceso de producción estadística a nivel nacional, mediante la integración de registros administrativos y los respectivos operativos de campo, así como la adopción de nuevas metodologías la automatización de procesos y la optimización de la gestión operativa y tecnológica.

***RECURSOS:**

Humanos - 88 técnicos contratados como ocasionales a nivel nacional y 108 técnicos especializados y servicios profesionales mediante contratos civil.


Bienes y servicios - Contratación del servicio de transporte de camionetas, viáticos, combustible, suministros de oficina y otros gastos operativos .

La mayor restricción del proyecto es la deserción del personal que interviene en el proyecto o retrasos en la asignación de recursos presupuestarios.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 2.67 %

Fecha de Inicio: 01/01/2026

Fecha de Fin: 31/12/2029

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

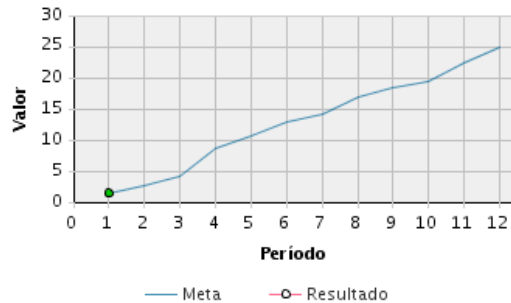

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	Avance programado acumulado											
	1 %	3 %	4 %	9 %	11 %	13 %	14 %	17 %	18 %	19 %	22 %	25 %
	Avance real acumulado											
	1 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2026</p> <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Índice Nacional de Precios Productor (INPP), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, visualizador de resultados, boletín técnico, históricos, cuadro resumen y comprobación de cálculo) de esta operación estadística. Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el INPP se publicó el 13 de enero de 2026. (Hito 1 cumplido).</p> <p>2.- Se elaboró el Plan de trabajo de las Cuentas Satélite de Educación (CSE), periodo de información 2025, en función de las actividades establecidas en el Modelo de Producción Estadística (MPE) del INEC. La publicación de resultados de las CSE está prevista para el 2 de octubre de 2026. (Hito 2 cumplido).</p> <p>3.-Se reporta la publicación documental de las Estadísticas de Transportes - ESTRA 2024 en el Archivo Nacional de Datos - ANDA, cumpliendo con lo establecido en el cronograma propuesto con la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo - DINEM. (Hito 3 cumplido).</p>	Chaves Centeno, Stalin Roberto	04/02/2026 - 03:16 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Calidad.</p> <p>La falta de entrega oportuna de información por parte de los informantes, CAUSARÍA retrasos en el proceso de producción y difusión de las estadísticas económicas.</p>	20/01/2026	Stalin Roberto Chaves Centeno	30 %	70	21	0/1
<p>5- PROYECTO. Calidad.</p> <p>El retraso en el desarrollo de los sistemas de producción de las estadísticas económicas CAUSARÍA una disminución en la calidad y oportunidad de la información generada.</p>	20/01/2026	Stalin Roberto Chaves Centeno	10 %	50	5	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en enero realizada.	9-Entregables Formales	13/01/2026		13/01/2026		Sí	0.63
2	MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUEN SATÉLITE: PLANEACIÓN: Plan de trabajo de las Cuentas Satélite de Educación 2025 aprobado	9-Entregables Formales	28/01/2026		26/01/2026		Sí	0.28
3	MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESTRA CIERRE: Archivo de la documentación ESTRA 2024 en el repositorio ANDA realizado.	9-Entregables Formales	30/01/2026		30/01/2026		Sí	0.5
4	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de	9-Entregables Formales	10/02/2026	10/02/2026			No	0.63

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	resultados del INPP en febrero realizada.							
5	MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESTADÍSTICA: EJECCIÓN: Publicación de resultados de ESTRA 2025 cuarto trimestre realizada.	Entregables Formales	27/02/2026	27/02/2026			No	0.5
6	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP: EJECCIÓN: Publicación de resultados del INPP en marzo realizada.	Entregables Formales	10/03/2026	10/03/2026			No	0.62
7	MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUENTAS SATELITES: PLANEACIÓN: Plan de trabajo de las Cuentas Satélite de Salud aprobado	Entregables Formales	18/03/2026	18/03/2026			No	0.28
8	MODERNIZACIÓN_EC_C5.2_REESS: EJECCIÓN: Publicación REESS I trimestre (enero, febrero, marzo), realizada.	Entregables Formales	27/03/2026	27/03/2026			No	0.28
9	MODERNIZACIÓN_EC_C3.2_ESTADÍSTICA: EJECCIÓN: Informe de cumplimiento de los requisitos mínimos para el inicio proyecto ESED 2026 elaborado.	Entregables Formales	31/03/2026	31/03/2026			No	0.5
10	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM: EJECCIÓN: Informe de la entrega de la muestra de la ENESEM 2025 realizado.	Entregables Formales	06/04/2026	06/04/2026			No	1.07
11	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM: EJECCIÓN: Informe de los productos difundidos de ENESEM 2024 realizado.	Entregables Formales	10/04/2026	10/04/2026			No	1.07
12	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP: EJECCIÓN: Publicación de resultados del INPP en abril realizada.	Entregables Formales	10/04/2026	10/04/2026			No	0.62
13	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM: DEFINICIÓN: Herramientas de recolección (Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para la recolección y el procesamiento) de la ENESEM 2025 aprobados	Entregables Formales	30/04/2026	30/04/2026			No	1.07
14	MODERNIZACIÓN_EC_C3.2_ESTADÍSTICA: DEFINICIÓN: Acta de entrega -recepción del sistema de recolección ESED 2026 suscrita.	Entregables Formales	30/04/2026	30/04/2026			No	0.5
15	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP: EJECCIÓN: Publicación de resultados del INPP en mayo realizada.	Entregables Formales	12/05/2026	12/05/2026			No	0.63
16	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM: EJECCIÓN: Informe de cumplimiento de los requisitos mínimos para el inicio del operativo de campo ENESEM 2025 elaborado.	Entregables Formales	15/05/2026	15/05/2026			No	1.07
17	MODERNIZACIÓN_EC_C3.2_ESTADÍSTICA: EJECCIÓN: Reporte de	Entregables Formales	15/05/2026	15/05/2026			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	validaciones de BDD ESED 2025 realizado.							
18	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en junio realizada.	9-Entregables Formales	09/06/2026	09/06/2026			No	0.63
19	MODERNIZACIÓN_EC_C3.2_ESSE EJECUCIÓN: Reporte de los productos difundidos de ESED 2025 realizado.	9-Entregables Formales	12/06/2026	12/06/2026			No	0.5
20	MODERNIZACIÓN_EC_C5.2_REESS EJECUCIÓN: Publicación REESS II trimestre (abril, mayo, junio), realizada.	9-Entregables Formales	26/06/2026	26/06/2026			No	0.28
21	MODERNIZACIÓN_EC_C1: DEFINICIÓN: Informe de implementación de desarrollos de sistemas informáticos para operaciones estadísticas priorizadas de la DECON (2T 2026), elaborado.	9-Entregables Formales	30/06/2026	30/06/2026			No	0.63
22	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en julio realizada.	9-Entregables Formales	09/07/2026	09/07/2026			No	0.62
23	MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESSE EJECUCIÓN: Reporte de validaciones de BDD, incluir los reportes de imputación - ESTRA 2025 realizado.	9-Entregables Formales	31/07/2026	31/07/2026			No	0.5
24	MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUBEN EJECUCIÓN: Informe de bases de datos recolectadas del sector público y privado CSE 2025	9-Entregables Formales	31/07/2026	31/07/2026			No	0.28
25	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en agosto realizada.	9-Entregables Formales	12/08/2026	12/08/2026			No	0.62
26	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM CIERRE: Archivo de la documentación de ENESEM 2024 en el repositorio ANDA realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2026	28/08/2026			No	1.1
27	MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESSE EJECUCIÓN: Informe de control de cobertura, novedades presentadas en el proceso de recolección - ESTRA 2025 realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2026	28/08/2026			No	0.5
28	MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESSE EJECUCIÓN: Reporte de los productos difundidos de ESTRA 2025 realizado.	9-Entregables Formales	31/08/2026	31/08/2026			No	0.5
29	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en septiembre realizada.	9-Entregables Formales	09/09/2026	09/09/2026			No	0.63
30	MODERNIZACIÓN_EC_C5.2_REESS EJECUCIÓN: Publicación REESS III trimestre	9-Entregables Formales	28/09/2026	28/09/2026			No	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(julio, agosto, septiembre), realizada.							
31	MODERNIZACIÓN_EC_C1: DEFINICIÓN: Informe de implementación de desarrollos de sistemas informáticos para operaciones estadísticas priorizadas de la DECON (3T 2026), elaborado.	9-Entregables Formales	30/09/2026	30/09/2026			No	0.63
32	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en octubre realizada.	9-Entregables Formales	12/10/2026	12/10/2026			No	0.63
33	MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUBENR SATÉLITE: EJECUCIÓN: Publicación de las Cuentas Satélite de Educación 2025	9-Entregables Formales	15/10/2026	15/10/2026			No	0.28
34	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en noviembre realizada.	9-Entregables Formales	12/11/2026	12/11/2026			No	0.62
35	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM DEFINICIÓN: Informe de la actualización del formulario de la ENESEM 2025 elaborado.	9-Entregables Formales	20/11/2026	20/11/2026			No	1.05
36	MODERNIZACIÓN_EC_C2_ENESEM EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de la ENESEM 2025 realizado.	9-Entregables Formales	30/11/2026	30/11/2026			No	1.07
37	MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUBENR SATÉLITE: EJECUCIÓN: Tabla de agregados económicos del año periodo de referencia actualizados acorde al cambio de año base de las CSS	9-Entregables Formales	30/11/2026	30/11/2026			No	0.28
38	MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en diciembre realizada.	9-Entregables Formales	09/12/2026	09/12/2026			No	0.62
39	MODERNIZACIÓN_EC_C3.2_ESED EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura consolidada ESED 2026 generado.	9-Entregables Formales	28/12/2026	28/12/2026			No	0.5
40	MODERNIZACIÓN_EC_C5.2_REESS EJECUCIÓN: Publicación REESS IV trimestre (octubre, noviembre, diciembre), realizada.	9-Entregables Formales	29/12/2026	29/12/2026			No	0.26
41	MODERNIZACIÓN_EC_C1: CIERRE: Informe de evaluación de los procesos de producción operaciones DECON priorizadas, elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2026	31/12/2026			No	0.61
42	MODERNIZACIÓN_EC_C1: DEFINICIÓN: Informe de implementación de desarrollos de sistemas informáticos para operaciones estadísticas priorizadas de la DECON (4T 2026), elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2026	31/12/2026			No	0.63

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	MODERNIZACIÓN_EC: DEFINICIÓN: Formulación del Plan de Proyecto MODERNIZACION 2027	1-Solicitud de Información	31/12/2027	31/12/2027			No	12.5
44	MODERNIZACIÓN_EC: EJECUCIÓN: Informe de operaciones estadísticas económicas oficiales	9-Entregables Formales	31/12/2027	31/12/2027			No	12.5
45	MODERNIZACIÓN_EC: DEFINICIÓN: Formulación del Plan de Proyecto MODERNIZACION 2028	9-Entregables Formales	31/12/2028	31/12/2028			No	12.5
46	MODERNIZACIÓN_EC: EJECUCIÓN: Informe de operaciones estadísticas económicas oficiales	9-Entregables Formales	31/12/2028	31/12/2028			No	12.5
47	MODERNIZACIÓN_EC: DEFINICIÓN: Formulación del Plan de Proyecto MODERNIZACION 2029	9-Entregables Formales	31/12/2029	31/12/2029			No	12.5
48	MODERNIZACIÓN_EC: EJECUCIÓN: Informe de operaciones estadísticas económicas oficiales	9-Entregables Formales	31/12/2029	31/12/2029			No	12.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	100% de actividades implementadas para la modernización de operaciones estadísticas económicas a diciembre del 2029	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
2	20.800 de empresas investigadas, de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidos, a diciembre de 2029.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
3	40 publicaciones de estadísticas de edificaciones y transporte, hasta diciembre 2029.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
4	48 publicaciones realizadas de estadísticas de precios, hasta diciembre 2029.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
5	12 publicaciones de las cuentas satélites y registros administrativos, hasta diciembre 2029.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	10,474,656.52 **
Costo Total:	10,474,656.52
Total Devengado:	120,585.32
% Costo Total Devengado:	1.15 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 1.15 %

Perfil Económico 2026

	Años Previos	Año Actual (2026)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	2,625,693.71	7,848,962.81	10,474,656.52
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	2,625,693.71	0.00	2,625,693.71
Ppto. Codificado	0.00	2,625,693.71	0.00	2,625,693.71
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2026)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	2,625,693.71	0.00	2,625,693.71
Ppto. Devengado	0.00	120,585.32	0.00	120,585.32
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	2,625,693.71	0.00	2,625,693.71
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	4.59 %	0.00 %	4.59 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2026



Presupuesto Mensual 2026

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	121,342.02	120,585.32	121,342.02	120,585.32	99.38 %	●	4.59 %

Presupuesto Mensual 2026							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	136,229.48		257,571.50				
Mar	144,486.01		402,057.51				
Abr	176,356.57		578,414.08				
May	182,813.47		761,227.55				
Jun	236,137.46		997,365.01				
Jul	414,878.22		1,412,243.23				
Ago	273,259.70		1,685,502.93				
Sep	271,827.78		1,957,330.71				
Oct	260,926.10		2,218,256.81				
Nov	193,630.46		2,411,887.27				
Dic	213,806.44		2,625,693.71				
Total	2,625,693.71	120,585.32					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	OO1_DECON: Incrementar la captación de fuentes de datos con potencial estadístico MEDIANTE la articulación con las instituciones generadoras de la información.
21	OO2_DECON: Incrementar los procesos de modernización, actualización y difusión de las estadísticas económicas MEDIANTE la implementación de actualizaciones metodológicas y la automatización de procesos.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)	
16	OO1_DICA : Incrementar la optimización en la generación de información cartográfica MEDIANTE el uso de fuentes administrativas con potencial cartográfico.
17	OO2_DICA: Incrementar los procesos de modernización y difusión de actualización cartográfica y operaciones estadísticas MEDIANTE la adopción de metodologías, espacios de socialización y herramientas tecnológicas innovadoras

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Actualización del Cronograma de Actividades Físico - Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador 2026	Expediente_Actualización_Cronograma_Fisico_2026.rar	21/01/2026
2	ASOCIACIÓN HITO 1.- MODERNIZACIÓN_EC_C4_INPP: EJECUCIÓN: Publicación de resultados del INPP en enero realizada.	A1_Hito_1.rar	04/02/2026
3	ASOCIACIÓN HITO 2.- MODERNIZACIÓN_EC_C5.1_CUEN_SATELITE: PLANEACIÓN: Plan de trabajo de las Cuentas Satélite de Educación 2025 aprobado.	A2_Hito_2.rar	04/02/2026
4	ASOCIACIÓN HITO 3.- MODERNIZACIÓN_EC_C3.1_ESTRA: CIERRE: Archivo de la documentación ESTRA 2024 en el repositorio ANDA realizado.	A3_Hito_3.rar	04/02/2026
5	Dictamen de Prioridad del Proyecto Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador 2026 - 2029	INEC-INEC-2025-0935-E_(Dictamen_prioridad).pdf	20/01/2026
6	Marco Lógico del Proyecto Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador 2026 - 2029	_Marco_Lógico_Modernización.rar	20/01/2026
7	Perfil del Proyecto Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador 2026 - 2029	Perfil_de__proyecto_Modernización2026-2029.rar	20/01/2026

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barco Véliz, Diana Carolina	Directora de Estadísticas Económicas	Directora de Estadísticas Económicas	diana_barco@inec.gob.ec	
Chaves Centeno, Stalin Roberto	Líder del Proyecto Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador	Jefe de Unidad	roberto_chaves@inec.gob.ec	
