

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K013 INEC: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU**

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.389651	TIR:	16.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	155,265.79
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,517,420.29
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	29/06/2025 - 31/07/2026
Fecha de última actualización:	06/03/2026	Fecha de Fin Base:	30/06/2026
Modificado por:	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Fecha del siguiente Hito:	26/09/2025

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

No disponer de datos que posibiliten la actualización de indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que se desarrollen en el país para tratar de prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. El 29 de mayo de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solicitó a la Secretaría Nacional de Planificación, la emisión del dictamen de prioridad e inclusión en el PAI 2025 del proyecto "Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU" con CUP 31210000.0000.389651, inicialmente se planificó recibir los recursos financieros en Junio de 2025, comenzar la ejecución de la Encuesta en Julio 2025 e iniciar el operativo de campo en noviembre 2025, considerando los tiempos operativos que implican cada uno de los procesos que involucran a la ENVIGMU. Sin embargo, al obtenerse el dictamen de prioridad el 29 de junio del 2025, fue necesario reprogramar todas las actividades en torno a la encuesta, es así que la ejecución del proyecto se replanteó desde septiembre de 2025, el inicio del operativo de campo a partir de enero 2026.

**Beneficios Cualitativos**

Contar con datos estadísticos sobre violencia de género contra las mujeres

**Tipo de Beneficiario**

Externos: Estudiantes, investigadores, Funcionarios Públicos, Mujeres de 15 años y más de edad.


**Restricciones**

El tiempo de ejecución del proyecto es de 12 meses, en el cual se debe incluir y considerar las fases de evaluación y cierre

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  **Ejecución**  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 64.07 %  
 Fecha de Inicio: 29/06/2025 Fecha de Fin: 31/07/2026

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

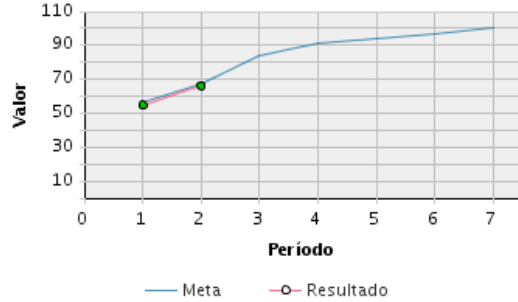

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	Avance programado acumulado											
	56 %	67 %	83 %	91 %	94 %	97 %	100 %	0 %				
	Avance real acumulado											
	55 %	66 %										
Estado												
	●	●										

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO</b></p> <p>1. El 28/02/2026, a partir de los datos cargados en el SIPE y la información que se encuentra subida en el módulo de reporte de cobertura, se elaboró el reporte de cobertura de recolección de datos del mes 1. (HITO 13 CUMPLIDO)</p> <p>2. El 28/02/2026, a partir de la documentación de la ENVIGMU-2019 y metodologías extras (como cálculo de quintiles, indicadores únicos, etc.), se finalizó la sintaxis de nuevas variables. (HITO 14 CUMPLIDO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/03/2026 - 02:23 PM
<p><b>ENERO 2026</b></p> <p>1.- Del 05 al 28/01/2026 se realizó la recolección de datos en las diferentes Coordinaciones Zonales , del cual se genera reporte de cobertura. (HITO 11 CUMPLIDO)</p> <p>2.-Al 30/01/2026 se obtiene el reporte de inconsistencias correspondientes al mes 1 (HITO 12 CUMPLIDO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/03/2026 - 02:22 PM
<p><b>DICIEMBRE 2025</b></p> <p>1. El 16/12/2025 se aprobó el Informe de la Prueba Piloto mediante correo electrónico (HITO 7 CUMPLIDO)</p> <p>2. El 22/12/2025 se aprobó el informe de la capacitación mediante correo electrónico (HITO 9 CUMPLIDO)</p> <p>3. El 31/12/2025 mediante acta entrega recepción se compromete a la entrega del Sistema de Captura el 05/01/2026 (HITO 10 CUMPLIDO)</p> <p>(El 30 de septiembre con el Oficio Nro. INEC-INEC-2025-0743-O de 30 se solicitó la reprogramación del cronograma del proyecto por un monto de USD1.843.638,90 para el período 2025-2026. Mediante Oficio Nro. PR-SSGDP-2025-0039-O de 30 de octubre de 2025, la Subsecretaría General de Planificación emite pronunciamiento de reprogramación del cronograma, es así que la ejecución del proyecto se replanteó desde septiembre de 2025 y el inicio del operativo de campo a partir de enero 2026.)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/02/2026 - 10:56 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2025</b></p> <p>1. El 25/11/2025 se aprobó el Plan de recolección mediante correo electrónico (HITO 8 CUMPLIDO)</p> <p>2. Informe de Prueba Piloto aprobado (HITO7 ASOCIADO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	23/12/2025 - 04:27 PM
<p><b>OCTUBRE 2025</b></p> <p>1. El 08/10/2025 Plan de Prueba Piloto aprobado (HITO 5 CUMPLIDO)</p> <p>2.El 24/10/2025 Plan de Capacitación aprobado (HITO 6 CUMPLIDO)</p>	Mendoza Moreira, Virginia Natali	25/11/2025 - 10:47 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>SEPTIEMBRE 2025</b> 1. El 16/09/2025 Formulario de recolección aprobado por parte de CGTPE según Resolución Nro. 030-DIREJ-DIJU-NI-2022 mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-2025-0923-M (HITO 1 CUMPLIDO) 2. El 18/09/2025 se aprobó el Listado de productos que se generan a partir de la encuesta (HITO 3 CUMPLIDO) 3. Ficha metodológica de la OE aprobada para el periodo 2021-2025 (HITO 4 ASOCIADO)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	05/11/2025 - 11:23 AM
<b>AGOSTO 2025</b> 1. El 08/08/2025 se mantuvo reunión de Comisión Especial de Estadísticas de Género y Grupos Vulnerables en la que se cerró el formulario de la ENVIGMU, misma que quedó registrada mediante Acta de Reunión. (HITO 1 ASOCIADO). 4. El 08 de agosto de 2025 mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0746-M se aprobó el Plan de Dirección de Proyecto para la ejecución de esta actividad en 2025, (HITO 2 CUMPLIDO).	Mendoza Moreira, Virginia Natali	29/09/2025 - 02:16 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Desactualización de la ficha metodológica de la OE que constaba en el PNE 2021-2025.	06/03/2026	Virginia Natali Mendoza Moreira	10	10	1	0/1

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Errores en la sintaxis de validación causaría retrasos en la validación de datos y por ende una sobrecarga de trabajo al personal	02/03/2026	Virginia Natali Mendoza Moreira	60 %	30	18	0/2

*Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Formulario de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	08/08/2025		16/09/2025		Sí	6.06
2	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	08/08/2025		08/08/2025		Sí	6.06
3	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Listado de	5-Entregables Intermedios	09/09/2025		18/09/2025		Sí	3.64

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	productos que se generarán a partir de la encuesta							
4	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la OE aprobada	5-Entregables Intermedios	26/09/2025	26/09/2025			No	1.21
5	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	14/10/2025		08/10/2025		Sí	2.42
6	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	24/10/2025		24/10/2025		Sí	2.42
7	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Informe de la prueba piloto aprobado	9-Entregables Formales	10/11/2025		16/12/2025		Sí	6.06
8	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Plan de recolección aprobado	5-Entregables Intermedios	24/11/2025		25/11/2025		Sí	2.43
9	ENVIGMU_C2. LEV_INFORMACIÓN: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aprobado	9-Entregables Formales	05/12/2025		26/12/2025		Sí	4.85
10	ENVIGMU_C1. CONS_INSTRUMENTOS: DEFINICIÓN: Sistema de captura de datos aprobado y recibido	9-Entregables Formales	19/12/2025		31/12/2025		Sí	4.85
11	ENVIGMU_C2: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de recolección de datos mes 1 elaborado	9-Entregables Formales	28/01/2026		28/01/2026		Sí	10.0
12	ENVIGMU_C3: EJECUCIÓN: Reporte de inconsistencias detectadas mes 1 elaborado	9-Entregables Formales	29/01/2026		29/01/2026		Sí	6.0
13	ENVIGMU_C2: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de recolección de datos mes 2 elaborado	9-Entregables Formales	28/02/2026		28/02/2026		Sí	10.0
14	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Sintaxis de nuevas variables finalizada	9-Entregables Formales	28/02/2026		28/02/2026		Sí	1.43
15	ENVIGMU_C3: EJECUCIÓN: Reporte de inconsistencias detectadas mes 2 elaborado	9-Entregables Formales	02/03/2026	02/03/2026			No	6.0
16	ENVIGMU_C2: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de recolección de datos mes 3 elaborado	9-Entregables Formales	29/03/2026	29/03/2026			No	10.0
17	ENVIGMU_C3: EJECUCIÓN: Reporte de inconsistencias detectadas mes 3 elaborado	9-Entregables Formales	02/04/2026	02/04/2026			No	4.0
18	ENVIGMU_C3: EJECUCIÓN: Reporte de inconsistencias detectadas final elaborado	9-Entregables Formales	30/04/2026	30/04/2026			No	4.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Sintaxis de cálculo de agregados finalizada	9-Entregables Formales	29/05/2026	29/05/2026			No	1.43
20	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Tabulados de principales resultados preliminares elaborados	9-Entregables Formales	29/05/2026	29/05/2026			No	1.43
21	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Productos de publicación en el RIBD aprobados	9-Entregables Formales	30/06/2026	30/06/2026			No	1.43
22	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación elaborados	9-Entregables Formales	30/06/2026	30/06/2026			No	1.43
23	ENVIGMU_C4: CIERRE: Informe del proceso de evaluación elaborado	9-Entregables Formales	31/07/2026	31/07/2026			No	1.42
24	ENVIGMU_C4: EJECUCIÓN: Productos en la página web publicados	9-Entregables Formales	31/07/2026	31/07/2026			No	1.43

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1: 4 manuales elaborados previo a la capacitación hasta el año 2025		100.00 %	0	0	15/10/2025	Abr-Jun
2	C2: 23.160 viviendas investigadas hasta el año 2026	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
3	C3: 23.160 viviendas investigadas, criticadas y codificadas antes de la publicación de resultados, hasta el año 2026	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2026	-
4	C4: 1 presentación de principales resultados publicada en la página web institucional hasta el año 2026	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/07/2026	-
5	C4: 1 tabulado de indicadores publicado en la página web institucional hasta el año 2026	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/07/2026	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,517,420.29 **
Costo Total:	1,843,638.90
Total Devengado:	417,748.96
% Costo Total Devengado:	22.66 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 22.66 %

**Perfil Económico 2026**

	Años Previos	Año Actual (2026)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,141,152.58	0.00	0.00	1,141,152.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,141,152.58	0.00	0.00	1,141,152.58
Ppto. Codificado	1,141,152.58	0.00	0.00	1,141,152.58
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2026)		0.00		
Programado a Devengar	430,735.59	1,412,903.30	0.00	1,843,638.89
Ppto. Devengado	104,516.99	313,231.97	0.00	417,748.96
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 104,516.99	0.00	0.00	104,516.99
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	326,218.60	1,412,903.30	0.00	1,739,121.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 24.26 %	22.17 %	0.00 %	22.66 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	47,832.16	0.00	0.00	47,832.16

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2026**

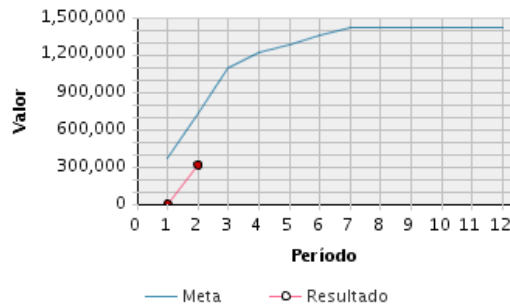

**Presupuesto Mensual 2026**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	372,167.08	0.00	372,167.08	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2026							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	363,986.24	313,231.97	736,153.32	313,231.97	42.55 %		22.17 %
Mar	362,336.56		1,098,489.88				
Abr	115,653.66		1,214,143.54				
May	68,808.66		1,282,952.20				
Jun	68,808.66		1,351,760.86				
Jul	61,142.44		1,412,903.30				
Ago	0.00		1,412,903.30				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>1,412,903.30</b>	<b>313,231.97</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

22	"OO1_DIES: Incrementar la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE procesos de modernización, actualización y difusión."
----	--

#### Objetivos Operativos Matriciales

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)

16	OO1_DICA : Incrementar la optimización en la generación de información cartográfica MEDIANTE el uso de fuentes administrativas con potencial cartográfico.
17	OO2_DICA: Incrementar los procesos de modernización y difusión de actualización cartográfica y operaciones estadísticas MEDIANTE la adopción de metodologías, espacios de socialización y herramientas tecnológicas innovadoras

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO N° 10: Sistema de captura de datos aprobado y recibido	B1_HITO_10-signed-signed.pdf	07/01/2026
2	ASOCIACIÓN HITO N° 13: Reporte de cobertura de recolección de datos mes 2 elaborado	B4_HITO_13.pdf	04/03/2026
3	ASOCIACIÓN HITO N° 14: Sintaxis de nuevas variables finalizada	B5_HITO_14.pdf	04/03/2026
4	ASOCIACIÓN HITO N° 1: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN APROBADO	A2_HITO1.pdf	06/10/2025
5	ASOCIACIÓN HITO N° 2: PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO APROBADO	A1_HITO2.pdf	26/11/2025
6	ASOCIACIÓN HITO N° 3: LISTADO DE PRODUCTOS QUE SE GENERARÁN A PARTIR DE LA ENCUESTA	A3_HITO3.pdf	06/10/2025
7	ASOCIACIÓN HITO N° 6: PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO	A6_HITO6.pdf	27/11/2025
8	ASOCIACIÓN HITO N° 7: Informe de la prueba piloto aprobado	A8_HITO_7-signed-signed.pdf	07/01/2026
9	ASOCIACIÓN HITO N° 8: Plan de recolección aprobado	A7_HITO_8-signed-signed.pdf	07/01/2026
10	ASOCIACIÓN HITO N° 9: Informe de capacitación aprobado	A9_HITO_9-signed-signed.pdf	05/01/2026
11	ASOCIACIÓN HITO N° 5: PLAN DE LA PRUEBA PILOTO APROBADO	A5_HITO5.pdf	27/11/2025
12	ASOCIACIÓN HITO N°11: Reporte de cobertura de recolección de datos mes 1 elaborado	B2_HITO11-signed-signed.pdf	06/02/2026

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACIÓN HITO N°12: Reporte de inconsistencias detectadas mes 1 elaborado	B3_HITO12-signed-signed.pdf	06/02/2026
14	Cronograma 2025 ENVIGMU	3.2._CRONOGRAMA_ACT2025_ENVIGMU.pdf	09/02/2026
15	Cronograma 2026 ENVIGMU	CRONOGRAMA_ACT2026_ENVIGMU.pdf	06/02/2026
16	GRISK001_PA002_Malla de validación actualizada	GRISK01_001.pdf	13/12/2025
17	GRISK03_PA001_Contratacion_servicio_transporte_ENVIGMU	GRISK03_001.pdf	11/02/2026
18	Plan de Dirección de Proyecto - ENVIGMU 2025	1._PERFIL_PROYECTO.rar	09/02/2026
19	Plan de Dirección de Proyecto - ENVIGMU 2026	PDP_2026_ENVIGMU_VF.rar	06/02/2026
20	Reprogramación de Indicadores	Reprogramación_de_Indicadores.rar	04/02/2026
21	Reestructuración de hitos Enero_Julio2026	Reestructuración_de_Hitos_Enero_Julio_2026.rar	04/02/2026
