

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES)
Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE)

PROYECTO: K003 INEC: Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas para reporte de la Agenda 2030

Líder del Proyecto:	Tapia, Karen (karen_tapia@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Benítez Malacatus, Ivonne Vanessa	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.390933	TIR:	37.40 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	976,751.33
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	475,899.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2026 - 31/12/2030
Fecha de última actualización:	02/04/2026	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Tapia Morales, Karen Irene	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2026

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

Desde el 2017 el INEC ha emprendido varias acciones con el objetivo de medir y reportar los indicadores de los ODS como son: el Plan de Desarrollo Estadístico y las Comisiones Especiales de Estadística. De los 185 indicadores de los ODS que el país no calcula actualmente, el INEC ha identificado que 26 cuentan con datos disponibles y se requiere la homologación de su metodología de cálculo para su reporte. Esta problemática debe ser abordada a través de la generación e implementación de instrumentos de planificación, estandarización y evaluación para garantizar una intervención integral de la producción estadística nacional que responda a las necesidades de información derivadas del reporte de los indicadores de los ODS.

*** Objetivo general:**

Formular e implementar planes, metodologías, normativas e instrumentos técnicos que coordinen, orienten, regulen, evalúen y retroalimenten la producción de información provista por el Sistema Estadístico Nacional para el reporte progresivo de indicadores de la Agenda 2030.

*** Objetivos específicos:**

1. Organizar la producción estadística nacional orientada al reporte de los indicadores de la Agenda 2030.
2. Implementar mecanismos que faculten el análisis y reporte de los indicadores de la Agenda 2030.
3. Consolidar estrategias de aseguramiento de calidad en el reporte de indicadores de la Agenda 2030.
4. Desarrollar aplicativos de caracterización, seguimiento y evaluación de las fuentes de información.

*** Productos al 2030:**

- * 85 indicadores del marco global de los ODS calculados y reportados a nivel nacional.
- * Instrumentos de planificación estadística e implementación de estrategias para fortalecer la producción estadística orientada al reporte de la Agenda 2030.
- * Instrumentos normativos generados para fortalecer las capacidades estadísticas de las fuentes orientada al reporte de la Agenda 2030.
- * Evaluaciones del MAC implementadas para fortalecer las capacidades estadísticas de las fuentes orientada al reporte de la Agenda 2030.

*** Línea base:**

Componente 1: presenta un 0% de avance en la implementación de los instrumentos de planificación estadística formulados por el INEC, así como, el desarrollo y aplicación de herramientas que permitan su monitoreo, en coordinación con las entidades del SEN.
 Componente 2: tiene una línea base del 26% en el análisis y homologación de indicadores de los ODS a nivel nacional en relación con el total de métricas que forman parte del marco global de la Agenda 2030.

DATOS GENERALES

Descripción

Componente 3: tiene avance del 0% en la implementación de las estrategias de aseguramiento de la calidad en las fuentes de datos e información, y la elaboración de normativa técnica, estándares estadísticos y formatos técnicos para la estandarización y homologación de sus procesos estadísticos.

Componente 4: tiene una línea base del 10% en la generación de aplicativos para la optimización de procesos que permitan la caracterización, seguimiento y evaluación de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional.

Beneficios Cualitativos

La ejecución del proyecto es fundamental para fortalecer las capacidades estadísticas de las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional, garantizando la mejora de fuentes de información y asegurando el reporte progresivo de los indicadores de la Agenda 2030. El proyecto lo ejecutará directamente el INEC con la contribución de gabinetes sectoriales, entidades transversales, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros, mediante la identificación, evaluación y retroalimentación de las fuentes de información empleadas en la estimación de los indicadores; el proyecto le permitirá al país medir sus avances en la implementación de este Plan de Acción Global.

Tipo de Beneficiario

Serán beneficiarios directos del proyecto las personas con empleo adecuado en el sector formal con nivel de instrucción superior (tercero y cuarto nivel universitario) que viven en el área urbana, en el rango de 35 a 59 años; es decir, la población demandante efectiva.

Los beneficiarios indirectos del proyecto son todos los usuarios que pertenecen a la PEA con empleo adecuado; es decir, la población demandante potencial.

Restricciones

***Tiempo:**

El proyecto tiene un horizonte de cinco años, desde el 2026 hasta el 2030.

*** Costo:**

El costo total del proyecto asciende a \$2.228.020,49.

2026: \$ 475.899,00

2027: \$ 443.183,75

2028: \$ 433.080,25

2029: \$ 442.136,75

2030: \$ 433.720,75

*** Alcance:**

El proyecto contempla una cobertura nacional, teniendo impacto en las personas vinculadas al diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, así como para la toma de decisiones desde su ámbito de acción, las cuales pertenecen a la PEA con empleo adecuado en el sector formal, grupo etario entre 35 a 59 años, con un nivel de instrucción superior (tercer o cuarto nivel universitario), y que residen en el área urbana.

*** Recursos:**

Humanos: el proyecto requiere la contratación de 21 perfiles para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Tecnológicos: el proyecto requiere la adquisición de 15 computadoras portátiles y 3 licencias de Power BI Pro para que el personal pueda llevar a cabo las diferentes actividades alineadas a sus componentes.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 5.42 %

Fecha de Inicio: 01/01/2026

Fecha de Fin: 31/12/2030

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

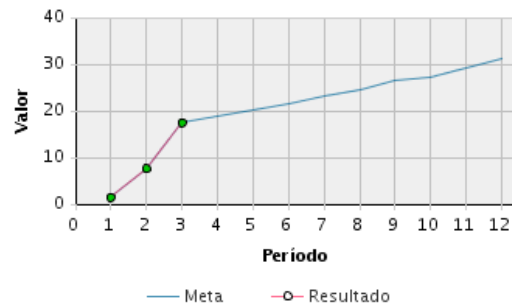

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	Avance programado acumulado											
	1 %	8 %	17 %	19 %	20 %	22 %	23 %	24 %	26 %	27 %	29 %	31 %
	Avance real acumulado											
	1 %	8 %	17 %									
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2026</p> <p>1. La Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE) actualizó el documento del requerimiento de automatización del Sistema de Certificación de la calidad estadística. (Hito 5: Cumplido)</p> <p>2. La Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN) revisó los metadatos globales provistos en el marco de la implementación de la Agenda 2030, a partir de los cuales se generaron los documentos metodológicos que detallan el procedimiento de cálculo de 9 indicadores ODS categorizados como TIER 1. (Hito 6: Cumplido)</p> <p>3. La Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE) revisó las recomendaciones recogidas en el informe de implementación del Plan de socialización y capacitación 2025; validó y analizó las propuestas recibidas por las áreas productoras respecto a sus temáticas de interés de capacitación; y elaboró el Plan de socializaciones y capacitaciones al SEN para el 2026. (Hito 7: Cumplido)</p> <p>FEBRERO 2026</p> <p>1. La Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN) revisó y actualizó la matriz de indicadores de los ODS a nivel nacional, insumo útil para avanzar con la homologación de estas métricas en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística. (Hito 3: Cumplido)</p> <p>2. La Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE) elaboró un reporte de resultados del método de Indicadores de Calidad aplicado a la operación estadística "Índice de Precios de la Construcción -IPCO". (Hito 4: Cumplido)</p> <p>ENERO 2026</p> <p>1. La Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN) elaboró y revisó la hoja de ruta para la formulación e implementación de los instrumentos de planificación de alcance nacional y territorial durante el año 2026. Este documento se construyó considerando los siguientes aspectos: i) actualización de la metodología establecida para la formulación e implementación del Plan Estadístico Territorial, ii) articular las fases, procesos y subprocesos para la formulación e implementación del Plan Estadístico Teritorial, y, iii) definición de acciones para la formulación o automatización de instrumentos de planificación de alcance nacional. (Hito 1: Cumplido)</p> <p>2. La Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN) actualizó el calendario de transferencia de información de los indicadores ODS Tier I homologados, para su reporte a la entidad encargada de la elaboración del reporte nacional voluntario sobre el avance del país ante los objetivos de la Agenda 2030. (Asociado al Hito 3)</p> <p>3. La Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE) elaboró el Plan de Normativas técnicas y estándares estadísticos 2026 en función de las reuniones de planificación internas, y de validación y priorización con las áreas técnicas. (Hito 2: Cumplido)</p>	<p>Tapia Morales, Karen Irene</p>	<p>02/04/2026 - 03:33 PM</p>
<p>El proyecto contempla una cobertura nacional, teniendo impacto en las personas vinculadas al diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, así como para la toma de decisiones desde su ámbito de acción, las cuales pertenecen a la PEA con empleo adecuado en el sector formal, grupo etario entre 35 a 59 años, con un nivel de instrucción superior (tercer o cuarto nivel universitario), y que residen en el área urbana.</p> <p>En 2026, se actualizará la metodología empleada para la formulación del Plan Estadístico Territorial (PET), con base en este documento se trabajará en la formulación e implementación de las estrategias contenidas en los PET para los GAD priorizados. De igual forma se realizarán socializaciones de la ENDE para visibilizar la importancia de este instrumento y por último se desarrollarán herramientas que permitan el monitoreo de su marco estratégico. Paralelamente, se dará continuidad al proceso de análisis, revisión y homologación de indicadores ODS en sus distintos niveles (Tier I, II y III), mediante reuniones técnicas y la actualización permanente</p>	<p>Tapia Morales, Karen Irene</p>	<p>19/01/2026 - 11:18 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de matrices e insumos para el diseño del visualizador nacional de ODS, avanzando hacia una propuesta consolidada de la plataforma.</p> <p>Asimismo, el proyecto impulsará el fortalecimiento de las capacidades y de la calidad estadística de las fuentes que aportan a los indicadores ODS, mediante la generación de normativa técnica, estándares y formatos; acompañados de procesos de socialización y capacitación al SEN que fomenten su cumplimiento; también se generará herramientas metodológicas, cronogramas de evaluación y reportes de los procesos del Marco de Aseguramiento de la Calidad que permitan la mejora de capacidades estadísticas. En el ámbito tecnológico, se actualizarán los requerimientos para la automatización del sistema de certificación y autoevaluación de calidad, además se definirá la estructura funcional del aplicativo para la caracterización de fuentes de datos.</p>		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. La falta de capacidades operativas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional CAUSARÍA retrasos en la homologación de indicadores de los ODS.</p>	06/03/2026	Karen Tapia	40 %	80	32	0/1
<p>5- PROYECTO. * General. Falta de apertura e interés de las entidades del Sistema Estadístico Nacional y GAD CAUSARÍA que no se implementen los instrumentos de planificación estadística.</p>	06/03/2026	Karen Tapia	40 %	80	32	0/1
<p>5- PROYECTO. * General. El desinterés del SEN en la homologación de sus procesos de producción CAUSARÍA la no implementación de los métodos de evaluación y mejora continua.</p>	06/03/2026	Karen Tapia	30 %	80	24	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Hoja de ruta para la formulación e implementación de instrumentos de planificación 2026, construida y aprobada por autoridades DIPSEN.	5-Entregables Intermedios	30/01/2026		30/01/2026		Sí	0.94
2	PLANEACIÓN: Informe de normativas y estándares para el año 2026, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2026		31/01/2026		Sí	0.41
3	EJECUCIÓN: Matriz de estado y seguimiento de los indicadores de los ODS, actualizada.	5-Entregables Intermedios	27/02/2026		27/02/2026		Sí	5.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Reporte de resultados de cada uno de los métodos de evaluación del MAC, generado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2026		28/02/2026		Sí	0.43
5	EJECUCIÓN: Documento del requerimiento de automatización del Sistema de Certificación de la calidad estadística, actualizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2026		31/03/2026		Sí	3.75
6	EJECUCIÓN: Documentos metodológicos de indicadores ODS_1er trimestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2026		31/03/2026		Sí	5.75
7	PLANEACIÓN: Plan de socializaciones y capacitaciones al Sistema Estadístico Nacional para el 2026, generado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2026		31/03/2026		Sí	0.41
8	EJECUCIÓN: Herramientas y/o documentos metodológicos actualizados de los procesos de evaluación del MAC, actualizados y/o generados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2026	30/04/2026			No	0.62
9	EJECUCIÓN: Metodología para la formulación del Plan Estadístico Territorial, actualizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2026	30/04/2026			No	0.94
10	EJECUCIÓN: Oficios de solicitud y entrega de datos y series de indicadores, actualizadas.	5-Entregables Intermedios	29/05/2026	29/05/2026			No	0.27
11	DEFINICIÓN: Requerimiento de actualización del módulo de indicadores de calidad del sistema MAC, generado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2026	31/05/2026			No	0.4
12	EJECUCIÓN: Invitaciones, agendas y presentaciones de las temáticas a socializar, realizados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2026	31/05/2026			No	0.63
13	DEFINICIÓN: Documento de la propuesta de diseño del aplicativo para la caracterización de las fuentes de datos (parte 1), elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2026	30/06/2026			No	0.85
14	EJECUCIÓN: Acuerdo/ compromisos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 1er semestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2026	30/06/2026			No	0.18
15	EJECUCIÓN: Documentos metodológicos de indicadores ODS_2do trimestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2026	30/06/2026			No	0.28
16	DEFINICIÓN: Normativa/s y/o estándar/es técnicos en versión preliminar, generadas.	5-Entregables Intermedios	31/07/2026	31/07/2026			No	0.63
17	EJECUCIÓN: Presentaciones y/o convocatorias de capacitación/socialización como parte de la	5-Entregables Intermedios	31/07/2026	31/07/2026			No	0.78

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	implementación del Plan Estadístico Territorial, realizadas.							
18	EJECUCIÓN: Matriz de brechas de información sobre las temáticas seleccionadas en el GAD priorizado, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/08/2026	31/08/2026			No	0.78
19	PLANEACIÓN: Cronogramas de procesos de evaluación del MAC 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2026	31/08/2026			No	0.62
20	DEFINICIÓN: Documento de la propuesta de diseño del aplicativo para la caracterización de las fuentes de datos (parte 2), elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2026	30/09/2026			No	1.25
21	EJECUCIÓN: Documentos metodológicos de indicadores ODS_3er trimestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2026	30/09/2026			No	0.83
22	DEFINICIÓN: Propuesta de diseño del visualizador de los indicadores, generada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2026	30/10/2026			No	0.16
23	EJECUCIÓN: Presentaciones de socialización de los métodos de evaluación, generada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2026	31/10/2026			No	0.41
24	EJECUCIÓN: Invitaciones, agendas y presentaciones de las temáticas a socializar, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2026	30/11/2026			No	0.43
25	EJECUCIÓN: Plan Estadístico Territorial en el GAD priorizado, construido.	5-Entregables Intermedios	30/11/2026	30/11/2026			No	1.56
26	EJECUCIÓN: Acuerdo/ compromisos sobre análisis y homologación de indicadores ODS en el marco de las Comisiones Especiales de Estadística - 2do semestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2026	31/12/2026			No	0.18
27	EJECUCIÓN: Documento del sistema del Marco de Aseguramiento de la Calidad para el Sistema de Certificación de la calidad estadística, desarrollado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2026	31/12/2026			No	1.25
28	EJECUCIÓN: Documentos metodológicos de indicadores ODS_4to trimestre 2026, generados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2026	31/12/2026			No	0.16
29	EJECUCIÓN: Reportes de resultados de los métodos de evaluación del MAC, generados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2026	31/12/2026			No	0.41
30	Macro Hito 2027	5-Entregables Intermedios	01/01/2027	31/12/2027			No	17.83
31	Macro Hito 2028	5-Entregables Intermedios	01/01/2028	31/12/2028			No	15.33
32	Macro Hito 2029	5-Entregables Intermedios	01/01/2029	31/12/2029			No	17.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	Macro Hito 2030	5-Entregables Intermedios	01/01/2030	31/12/2030		▼	No	17.95

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	60% de indicadores de los ODS homologados a nivel nacional, a diciembre de 2030.		-	-	-	01/01/2026	-
2	100% de avance en la implementación de las estrategias de aseguramiento de la calidad en las fuentes de información, a diciembre de 2030.		-	-	-	01/01/2026	-
3	100% de avance en el desarrollo de aplicativos de caracterización, seguimiento y evaluación de la calidad de fuentes de información asociadas a indicadores de la Agenda 2030, a diciembre de 2030.		-	-	-	01/01/2026	-
4	100% de avance en la implementación de los planes estadísticos de alcance nacional y territorial, a diciembre de 2030.		-	-	-	01/01/2026	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	475,899.00 **
Costo Total:	2,228,020.49
Total Devengado:	77,320.70
% Costo Total Devengado:	3.47 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 3.47 %

Perfil Económico 2026

	Años Previos	Año Actual (2026)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	475,899.00	0.00	475,899.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2026)		475,899.00		
Programado a Devengar	0.00	475,899.00	0.00	475,899.00
Ppto. Devengado	0.00	77,320.70	0.00	77,320.70
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	475,899.00	0.00	475,899.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	16.25 %	0.00 %	16.25 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2026

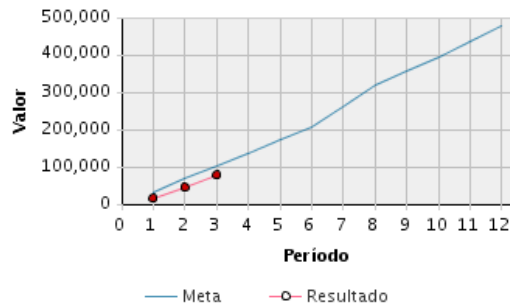

Presupuesto Mensual 2026

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	32,448.73	14,996.26	32,448.73	14,996.26	46.22 %		3.15 %

Presupuesto Mensual 2026							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	34,649.07	30,528.54	67,097.80	45,524.80	67.85 %		9.57 %
Mar	34,649.07	31,795.90	101,746.87	77,320.70	75.99 %		16.25 %
Abr	34,649.07		136,395.94				
May	34,649.07		171,045.01				
Jun	34,937.57		205,982.58				
Jul	52,708.67		258,691.25				
Ago	62,101.98		320,793.23				
Sep	34,649.07		355,442.30				
Oct	39,479.07		394,921.37				
Nov	39,479.07		434,400.44				
Dic	41,498.56		475,899.00				
Total	475,899.00	77,320.70					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	OO1_DINCE: Incrementar las capacidades estadísticas en el SEN MEDIANTE capacitaciones, socializaciones y talleres prácticos de normas técnicas, estándares estadísticos y de calidad.
21	OO2_DINCE: Reducir la brecha de capacidades estadísticas en el Sistema Estadístico Nacional (SEN) MEDIANTE la estandarización y calidad de los procesos estadísticos en las fuentes de datos del SEN

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES) >Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN)	
7	OO1_DIPSEN: Incrementar el potencial estadístico del SEN MEDIANTE la formulación e implementación de instrumentos de planificación estadística
8	OO2_DIPSEN: Incrementar las habilidades del SEN MEDIANTE la prestación del servicio de asistencia técnica en los procesos de producción estadística

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	01_Perfil proyecto	Perfil_proyecto_FORT_CAP_EST_(AJUST)_26DIC2025.pdf	19/01/2026
2	02_Dictamen prioridad	PR-SSDP-2025-0673-O.pdf	19/01/2026
3	03_Cronograma actividades PDP 2026	Cronograma_PDP2026_FORT_CAP_EST_aprobado.pdf	19/01/2026
4	04_Marco_logico	Marco_logico_FORT_CAP_EST.xls.zip	06/02/2026
5	ASOCIACIÓN HITO N° 1 - Hoja de ruta instrumentos planificación	A1_HITO1.zip	06/02/2026
6	ASOCIACIÓN HITO N° 2 - Informe de normativas y estándares 2026	A2_HITO2.rar	06/02/2026
7	ASOCIACIÓN HITO N° 3 - Matriz indicadores ODS actualizada	A3_HITO3.rar	04/03/2026
8	ASOCIACIÓN HITO N° 4 - Reporte indicadores de calidad IPCO	A4_HITO4.rar	05/03/2026
9	ASOCIACIÓN HITO N° 5 - Documento del requerimiento de automatización del Sistema de Certificación de la calidad estadística, actualizado	A5_HITO5.rar	02/04/2026
10	ASOCIACIÓN HITO N° 6 - Documentos metodológicos de indicadores ODS_1er trimestre 2026, generados	A6_HITO6.rar	02/04/2026
11	ASOCIACIÓN HITO N° 7 - Plan de socializaciones y capacitaciones al Sistema Estadístico Nacional para el 2026, generado	A7_HITO7.rar	02/04/2026

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lastra Moreano, Marcelo Alejandro	Miembro de equipo	Jefe de unidad	marcelo_lastra@inec.gob.ec	
Valdivieso León, Karla Lisset	Miembro de equipo	Jefe de Unidad	karla_valdivieso@inec.gob.ec	
