INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES)

Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN)

PROYECTO: K003 Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional

Líder del Proyecto:	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique (Mauricio_Benalcazar@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Romero Yonfá, Tania Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.387072	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	336,867.03
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	08/08/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	Fecha del siguiente Hito:	01/06/2022

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto que busca, en el mediano y largo plazo, alcanzar una producción estadística nacional que cumpla con criterios de calidad y estandarización, conforme lo establecido en los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística. Para ello, se propone la creación y consolidación de instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística, que den respuesta a la carencia de información estadística de calidad, requerida para la toma de decisiones de política pública, así como al diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos nacionales.
PRODUCTOS:
.Documento de la ENDE e informes de seguimiento de su implementación.
.Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS.
.Informes de implementación de la metodología para la formulación del Plan de Desarrollo Estadístico en 8 GAD priorizados.

OBJETIVO GENERAL: Alcanzar una producción estadística nacional a mediano y largo plazo, que cumpla con los criterios de calidad homologados y estandarizados, dentro de los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1: Formular e implementar instrumentos que orienten el quehacer estadístico nacional y territorial.
2: Desarrollar el anteproyecto de Ley Estadística, generación de estándares e implementación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad.
3: Automatizar los procesos y métodos de evaluación y desarrollo de una plataforma digital.

Beneficios Cualitativos

Entre los principales beneficios de la implementación de este proyecto están:
1. Fortalecimiento de la capacidad estadística del país, en especial de las entidades que conforman el sistema estadístico nacional;
2. Disponibilidad de información estadística generada bajo estándares de calidad;
3. Disponibilidad de datos de calidad para la toma de decisiones acertadas, tanto en el ámbito público como en el privado.

Tipo de Beneficiario

Los principales beneficiarios de los instrumentos normativos, de planificación y calidad estadística, son las entidades del sector público, los usuarios de información estadística, centros de conocimiento, sector privado, entre otros, pues emplean datos estadísticos para la toma de decisiones basada en evidencia, para el seguimiento y evaluación de las agendas de desarrollo, nacionales e internacionales.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años.

COSTO (2022): USD. 336 867,0432

ALCANCE: Fortalecimiento de las capacidades estadísticas del país, así como también, la construcción e implementación de instrumentos de coordinación y rectoría - planificación estadística, normativa, estandarización y aseguramiento de la calidad- que

Restricciones
apunten hacia el cierre de brechas de información y mejora en los procesos de producción para contar con información estadística de calidad. RECURSOS: para el desarrollo de las actividades previstas en este proyecto de inversión se requiere la contratación de 13 servidores públicos, equipos de computación, y, la contratación de servicios de consultoría.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 14.99 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 **Fecha de Fin:** 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

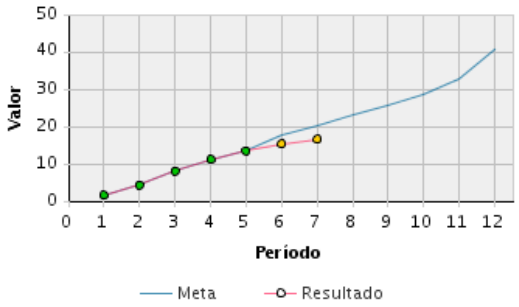

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2022	Avance programado acumulado											
	2 %	4 %	8 %	11 %	13 %	18 %	20 %	23 %	26 %	28 %	33 %	41 %
	Avance real acumulado											
	2 %	4 %	8 %	11 %	13 %	15 %	16 %					
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio de 2022: 1. En julio de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Series históricas de los indicadores Tier I, actualizadas; y, b) Normativa nacional relacionada con temas estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada. Junio de 2022: 1. En junio de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de tres hitos: a) Formulación de fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas; b) Definición de contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE; y, c) Definición de contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas. (Hitos 12, 14 y 15, cumplidos) Mayo de 2022: 1. En mayo de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Construcción de la metodología para seguimiento de los planes de trabajo que se definan para los indicadores Tier II; y, b)Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas. (Hitos 10 y 11, cumplidos) Abril de 2022: 1. En abril de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de dos hitos: a) Actualización de las herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad;	Benalcázar Jiménez, Mauricio Enrique	08/08/2022 - 08:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
y, b) Preparación del informe del proceso técnico implementado con la finalidad de seleccionar el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) que será priorizado en el 2022, para implementar el Plan Estadístico Territorial. (Hitos 8 y 9, cumplidos) Marzo de 2022: 1. En marzo de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de cuatro hitos: a) Definición y aprobación de la matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022; b) Análisis, construcción y definición del documento para priorizar los GAD en los que se implementará la metodología del Plan Estadístico territorial; y, c) Análisis de las posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa (hitos 5, 6 y 7, cumplidos). Febrero de 2022: 1. En febrero de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los dos hitos: a) Definición de la propuesta de estructura de la ENDE, a partir de la revisión de referentes internacionales; y, b) Definición del listado de operaciones estadísticas priorizadas para pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad (hitos 3 y 4, cumplidos). Enero de 2022: 1. En enero de 2022, el equipo técnico trabajó en el cumplimiento de los dos hitos: elaboró el reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, además construyó las hojas de rutas para la construcción de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico - ENDE, Plan Estadístico Territorial y Plan Estadístico para los ODS (hitos 1 y 2, cumplidos).		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Ajustes en la planificación inicial prevista para la ejecución de actividades del Proyecto de Inversión	08/08/2022	Mauricio Enrique Benalcázar Jiménez	10	10	1	0/8

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Falta de participación activa del SEN, en socialización y aplicación de métodos de evaluación de operaciones estadísticas y normativa, CAUSARIA dificultades para garantizar la calidad de la información estadística oficial amparada en normas y estándares.	31/01/2022		50 %	70	35	0/1
5- PROYECTO. * General. Falta de interés y participación activa en la planificación estadística por los miembros del SEN CAUSARIA dificultades para fortalecer las capacidades de los productores de información.	31/01/2022		50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Ejecución: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, generado.	4-Inicio de Trabajo	31/01/2022		31/01/2022		Sí	1.15
2	Planeación: Hoja de Ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.38
3	Ejecución: Propuesta de estructura de la ENDE, elaborada	5-Entregables Intermedios	20/02/2022		20/02/2022		Sí	1.15
4	Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	1.53
5	Definición: Matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022, elaborada	5-Entregables Intermedios	15/03/2022		15/03/2022		Sí	1.15
6	Ejecución: Metodología para la priorización de un GAD, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	1.15
7	Ejecución: Posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa, analizadas.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.53
8	Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		29/04/2022		Sí	1.53
9	Ejecución: Informe de selección de GAD para aplicación de la metodología, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		28/04/2022		Sí	1.53
10	Ejecución: Metodología para seguimiento de los planes de trabajo de indicadores Tier II, construida	5-Entregables Intermedios	30/05/2022		30/05/2022		Sí	1.15
11	Ejecución: Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.15
12	Ejecución: Fichas metodologícas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	01/06/2022	01/06/2022			No	1.53

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	Planeación: Consultor para desarrollo de la ENDE, contratado	5-Entregables Intermedios	01/06/2022	01/06/2022		▽	No	0.77
14	Definición: Contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE, identificadas	5-Entregables Intermedios	13/06/2022		13/06/2022	●	Sí	0.77
15	Ejecución: Contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas, definidas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022	●	Sí	1.15
16	Ejecución: Series históricas de los indicadores Tier I, actualizadas	5-Entregables Intermedios	10/07/2022	10/07/2022		▽	No	1.53
17	Ejecución: Normativa nacional relacionada con temas estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada	5-Entregables Intermedios	31/07/2022		31/07/2022	●	Sí	1.15
18	Ejecución: Informe de las entrevistas semiestructuradas con actores clave, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/08/2022	30/08/2022		●	No	1.15
19	Ejecución: Fases preparatorias de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la calidad, iniciadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022		●	No	1.53
20	Ejecución: Documento de verificación de brechas de información en el GAD priorizado, entregado	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022		●	No	1.53
21	Ejecución: Retroalimentación y procesamiento de observaciones de las áreas involucradas en el desarrollo de normativas y estándares técnicos planificados para el 2022, realizadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022		●	No	1.15
22	Ejecución: Diagnóstico de los planes de trabajo existentes para indicadoresTier II -largo plazo (Primer Borrador), elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2022	30/10/2022		●	No	1.15
23	Ejecución: Evidencia documental recolectada por la aplicación de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, analizada	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022		●	No	1.53
24	Ejecución: Documento con el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas del GAD, entregado	5-Entregables Intermedios	01/11/2022	01/11/2022		●	No	1.53
25	Ejecución: Líneas de acción definidas y generación de estrategias para el cierre de brechas de información, costeadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022		●	No	1.53
26	Ejecución: Taller relacionado a los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022		●	No	1.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	Ejecución: Fichas metodológicas y/o informes de seguimiento de indicadores Tier II- corto plazo, actualizadas y aprobadas	5-Entregables Intermedios	10/12/2022	10/12/2022			No	1.53
28	Ejecución: Informe sobre re categorización de indicadores, aprobado	5-Entregables Intermedios	10/12/2022	10/12/2022			No	1.53
29	Ejecución: Informe de finalización del proceso de implementación de la metodología del Plan Estadístico Territorial, entregado	5-Entregables Intermedios	28/12/2022	28/12/2022			No	1.53
30	Cierre: Tomo I de la ENDE (versión para revisión), elaborado y entregado	5-Entregables Intermedios	30/12/2022	30/12/2022			No	1.92
31	Ejecución: Propuesta técnica con investigación de leyes internacionales actuales, analizada y complementada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.53
32	Ejecución: Propuesta de estrategias para la implementación de instrumentos de planificación estadística, presentada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	12.0
33	Ejecución: Propuesta del Marco Legal actualizado desde una visión técnica y legal y documentos normativos, presentada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	13.0
34	Ejecución: Formulación del Plan de Desarrollo Estadístico para los ODS	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	9.7
35	Ejecución: Procesos automatizados de los métodos de evaluación del MAC y plataforma digital	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	9.71
36	Ejecución: Implementación de métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	7.0
37	Ejecución: Implementación de instrumentos de planificación estadística.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	8.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1: Porcentaje de avance en la construcción y parcial implementación de la ENDE por parte de las entidades del SEN		100.00 %	0.07	0.07	01/01/2022	Abr-Jun
2	C1: Porcentaje de avance en la implementación de la metodología para Planes de Desarrollo Estadístico: Territorial y ODS		100.00 %	0.06	0.06	01/01/2022	Abr-Jun
3	C2: Porcentaje de avance en la propuesta del Marco Legal actualizado		100.00 %	0.05	0.05	01/01/2022	Abr-Jun

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	desde una visión técnica y legal y normas técnicas y estándares estadísticos generados						
4	C2: Porcentaje de operaciones estadísticas con al menos un método de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad implementado		100.00 %	0.0035	0.0035	01/01/2022	Abr-Jun

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	336,867.03 **
Costo Total:	1,172,115.74
Total Devengado:	101,062.70
% Costo Total Devengado:	8.62 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 8.62 %

Perfil Económico 2022				
	Años Previos	**Año Actual (2022)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	336,867.03	0.00	**336,867.03**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	336,867.03	0.00	**336,867.03**
Ppto. Codificado	0.00	336,867.03	0.00	**336,867.03**
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	336,867.03	0.00	**336,867.03**
Ppto. Devengado	0.00	101,062.70	0.00	**101,062.70**
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	**0.00**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	336,867.03	0.00	**336,867.03**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	30.00 %	0.00 %	**30.00 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	2,012.82	2,012.82	2,012.82	2,012.82	100.00 %		0.60 %
Mar	19,344.90	19,344.90	21,357.72	21,357.72	100.00 %		6.34 %
Abr	19,328.94	19,328.94	40,686.66	40,686.66	100.00 %		12.08 %
May	19,769.68	19,768.56	60,456.34	60,455.22	100.00 %		17.95 %
Jun	20,334.00	20,334.00	80,790.34	80,789.22	100.00 %		23.98 %
Jul	20,273.48	20,273.48	101,063.82	101,062.70	100.00 %		30.00 %
Ago	27,719.34		128,783.16				
Sep	35,014.33		163,797.49				
Oct	70,802.28		234,599.77				
Nov	28,981.68		263,581.45				
Dic	73,285.58		336,867.03				
Total	**336,867.03**	**101,062.70**					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar las capacidades estadísticas de los productores de información mediante el diseño e implementación de instrumentos de planificación estadística.
6	Incrementar el número de operaciones estadísticas difundidas de manera puntual mediante la identificación de las fuentes que presentan retraso continuo por dificultades técnicas que puedan solventarse en las comisiones especiales de estadística.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES) >Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE)	
19	Incrementar la implementación del Plan de Fortalecimiento Estadístico para el SEN MEDIANTE la asesoría externa, talleres sobre normativa técnica, estándares estadísticos y el marco de aseguramiento de calidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de constitución - PDP - Consolidación e implementación de los instrumentos de rectoría y coordinación del Sistema Estadístico Nacional	Archivos_constitución.rar	07/03/2022
2	ASOCIACION HITO 01: Ejecución: Reporte de aplicación y conocimiento de la normativa técnica en 2021 para fortalecer la capacitaciones y socializaciones al Sistema Estadístico Nacional, generado.	A1_HITO1.rar	04/02/2022
3	ASOCIACION HITO 02: Planeación: Hoja de Ruta para el desarrollo del instrumento de planificación estadística aprobado	A2_HITO2.rar	04/02/2022
4	ASOCIACION HITO 03: Ejecución: Propuesta de estructura de la ENDE, elaborada	A3_HITO_3.rar	04/03/2022
5	ASOCIACION HITO 04: Ejecución: Matriz de priorización de operaciones estadísticas que van a pasar por los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, generada	A4_HITO4.rar	04/03/2022
6	ASOCIACION HITO 05: Definición: Matriz de indicadores ODS a analizarse durante el 2022, elaborada	A5_HITO_5.rar	04/04/2022
7	ASOCIACION HITO 06: Ejecución: Metodología para la priorización de un GAD, elaborada	A6_HITO_6.rar	04/04/2022
8	ASOCIACION HITO 07: Ejecución: Posibles actualizaciones que puedan darse a la normativa técnica	A7_HITO_7.rar	04/04/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	emitida a fin de que se ajusten a las nuevas necesidades del Sistema Estadístico Nacional y a la optimización normativa, analizadas.		
9	ASOCIACION HITO 09: Ejecución: Informe de selección de GAD para aplicación de la metodología, aprobado.	A9_HITO_9.rar	29/04/2022
10	ASOCIACION HITO 12: Ejecución: Fichas metodológicas de indicadores Tier I, actualizadas y aprobadas	B3_HITO12.rar	06/07/2022
11	ASOCIACION HITO 14: Definición: Contrapartes técnicas de las instituciones del SEN para el desarrollo de la ENDE, identificadas	B5_HITO14.rar	06/07/2022
12	ASOCIACION HITO 15: Ejecución: Contrapartes técnicas para la socialización de los métodos de evaluación y normas técnicas, definidas.	B6_HITO15.rar	06/07/2022
13	ASOCIACION HITO 17: Ejecución: Normativa nacional relacionada con temas estadísticos para actualizar la propuesta técnica, en caso de ser necesario, analizada	B8_HITO17.rar	03/08/2022
14	ASOCIACIÓN HITO 10: Ejecución: Metodología para seguimiento de los planes de trabajo de indicadores Tier II, construida.	B1_HITO_10.rar	01/06/2022
15	ASOCIACIÓN HITO 11: Ejecución: Investigación, en referentes internacionales, sobre la temática de la normativa y/o estándar técnicos a generar, actualizadas.	B2_HITO_11.rar	31/05/2022
16	ASOCIACIÓN HITO 8: Ejecución: Herramientas de los procesos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad, actualizadas.	A8_HITO_8.rar	06/05/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivadeneira Lozano, Gloria Aracely	Colaboración en el desarrollo de actividades planificadas.	Analista de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional	gloria_rivadeneira@inec.gob.ec	
Romero Yonfá, Tania Gabriela	Coordinación y ejecución de actividades planificadas.	Directora de Planificación Estadística del SEN	Tania_Romero@inec.gob.ec	3827000
Torres Rosero, Mónica Alexandra	Colaboración en el desarrollo de actividades planificadas.	Responsable de gestión de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	monica_torres@inec.gob .ec	
