INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K011 Prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad

Líder del Proyecto:	Tipán Espinosa, Nelson Vladimir (vladimir_tipan@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	5061 0000.0000.387285	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	780,244.11
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/07/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	07/07/2025	Fecha de Fin Base:	30/12/2022
Modificado por:	Tipán Espinosa, Nelson Vladimir	Fecha del siguiente Hito:	15/07/2025

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción: "La información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país permitirá la formulación de políticas, programas y proyectos que permitan la prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, ya que a través de esta información es posible obtener diagnósticos de la situación sociodemográfica y su estatus legal dentro de los centros de privación de la libertad; recabando datos sobre las condiciones sociales, el acceso a los programas de rehabilitación y la asistencia que les brindan las instituciones públicas a toda la población penitenciaria y en especial a la población LGBTI+.Esta información servirá como línea base para la consecución de los objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025.
Objetivo General: Obtener información estadística sobre la población LGBTI+ privada de libertad a nivel nacional, que contribuya para la política pública basada en evidencia. Objetivos específicos: 1. Identificar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad LGBTI+ al interno del centro de privación de libertad, a nivel nacional, 2. Medir el acceso a los ejes de tratamiento de las personas LGBTI + que se encuentran dentro de los centros de privación de libertad. 3. Generar una base de datos de la población privada de la libertad y LGBTI+ a nivel nacional con características sociodemográficas y su proceso judicial. Productos finales:'Base de datos, Presentación de los Principales Resultados, Tabulados de los principales resultados, Sintaxis de los principales resultados, Formulario, Nota técnica metodológica, Informe técnico del proceso estadístico
LEVANTAMIENTO EXPERIMENTAL DE INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTI+: Se levantará información experimental mediante un muestreo no probabilístico, el cual es conducido por el informante por cadena de referidos, siendo este, distinto del muestreo común en que los entrevistados están relacionados por una cadena de reclutamiento de forma que se mantenga un registro de quién reclutó a quién. Objetivo general: Obtener información estadística sociodemográfica sobre la población LGBTI+ mediante un muestreo no probabilístico conducido por un informante en una cadena de referidos en Ambato, Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas y Lago Agrio mediante la aplicación del formulario estructurado y consensuado con el ente rector en materia de derechos humanos. Objetivos específicos: 1. Levantar datos estadísticos de residencia, discriminación, exclusión y violencia, salud, educación, características. 2. Generar documentos técnicos y metodológicos para el levantamiento experimental objeto del proyecto, y entregar al MMDDHH la presentación de los resultados junto con el documento metodológico. Producto final: Presentación de los resultados del levantamiento experimental de información de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+, junto con el documento metodológico.

Beneficios Cualitativos

*La información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país permitirá la formulación de políticas, programas y proyectos que permitan la prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, ya que a través de esta información es posible obtener diagnósticos de la situación sociodemográfica y su estatus legal dentro de los centros de privación de la libertad; recabando datos sobre las condiciones sociales, el acceso a los programas de rehabilitación y la asistencia que les brindan las instituciones públicas a toda la población penitenciaria y en especial a la población LGBTI+.

LEVANTAMIENTO EXPERIMENTAL DE INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTI+

Beneficios Cualitativos

Permitirá obtener información relevante en cuanto a las condiciones de vida de esa población en específico, datos que serán entregados al ente rector en materia de derechos humanos como parte de los insumos necesarios para la consecución de los objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 al cual está alineada la operación estadística.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos:
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores
Secretaria de Derechos Humanos
Policía Nacional / Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial
Ministerio del Interior
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Ministerio de Trabajo
Ministerio del Deporte
Defensoría del Pueblo

Beneficiarios indirectos:
Instituciones Públicas
Academia
Organismos Internacionales
Personas Privadas de libertad a nivel nacional.

LEVANTAMIENTO EXPERIMENTAL DE INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTI+
Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos
Población LGBTI+

Restricciones

Tiempo: 01 de agosto al 31 de diciembre 2022

Costo: Encuesta Piloto de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+: USD 71.420,12 Levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país: USD 228.792,32. Calidad: La información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país permitirá la formulación de políticas, programas y proyectos que permitan la prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, ya que a través de esta información es posible obtener diagnósticos de la situación sociodemográfica y su estatus legal dentro de los centros de privación de la libertad; recabando datos sobre las condiciones sociales, el acceso a los programas de rehabilitación y la asistencia que les brindan las instituciones públicas a toda la población penitenciaria y en especial a la población LGBTI+. Alcance: "El levantamiento de la información se lo va a realizar en los 36 centros de privación de la libertad a nivel nacional, en este operativo van a intervenir Administración Central Campo y la Coordinación Zonal 6 Sur - CZ6S los cuales se van a movilizar a nivel nacional de acuerdo a la planificación establecida y por pedido de las autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos los cuales están financiando el proyecto, la población a ser censada según el último reporte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores ""SNAI"" a mayo del 2022 es de 33 041 PPL. La fase del levantamiento de información se llevara a cabo desde el 22 de agosto al 31 de octubre del 2022, el producto de esta operación estadística permitirá definir una línea base para la implementación de políticas, programas y proyectos de rehabilitación y reinserción social a las personas privadas de la libertad, priorizando a la población LGBTI+.

LEVANTAMIENTO EXPERIMENTAL DE INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTI+: Tiempo: 13/09/2023. Costo: USD 13.201,60. Calidad: obtener información relevante en cuanto a las condiciones de vida de esa población en específico, datos que serán entregados al ente rector en materia de derechos humanos como parte de los insumos necesarios para la consecución de los objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 al cual está alineada la operación estadística. Alcance: El levantamiento experimental se realizará mediante la aplicación del formulario en el cual se recolectará datos sociodemográficos de justicia y derechos humanos de la población LGBTI+ en las ciudades de Ambato, Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas y Lago Agrio.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 86.02 %
Fecha de Inicio: 15/07/2022 **Fecha de Fin:** 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

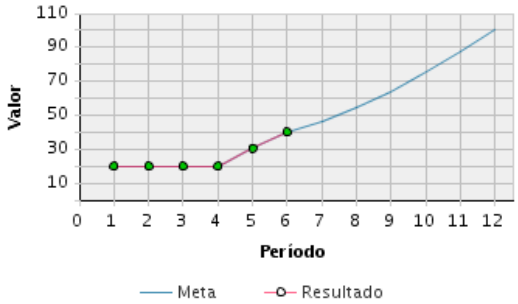

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2025	Avance programado acumulado											
	20 %	20 %	20 %	20 %	31 %	40 %	47 %	55 %	64 %	76 %	88 %	100 %
	Avance real acumulado											
	20 %	20 %	20 %	20 %	31 %	40 %						
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2025 1.- Formulario para la recolección de la ENCV-LGBTI aprobado, mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-2025-0570-M. (Hito 46 cumplido.) 2.-Solicitud de desarrollo del sistema enviada. (se a venido trabajando conjuntamente con DITIC) (Hito 47 cumplido.)	Tipán Espinosa, Nelson Vladimir	07/07/2025 - 07:46 AM
Mayo 2025 1.- Plan de dirección de proyecto aprobado, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0432-M. (Hito 44 cumplido.) 2.-Se realizó el Formulario de recolección preliminar diseñado. (Hito 45 cumplido.)	Tipán Espinosa, Nelson Vladimir	09/06/2025 - 12:13 PM
DICIEMBRE 2023 1.- Mediante correo electrónico se da a conocer la cobertura registrada del sistema de ingreso de la información levantada en la encuesta piloto del proyecto LGBTI+.(Hito 40 cumplido) 2.- Se realizó Informe técnico de cierre del operativo estadístico de la encuesta piloto. (Hito 41 cumplido). 3.- Se realizó el archivo de toda la documentación de la Encuesta Piloto del Proyecto LGBTI. (Hito 42 cumplido.) 4.- Se realizó la presentación de los resultados y el documento metodológico entregados al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos mediante oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0110-O. (Hito 43 cumplido) NOVIEMBRE 2023 1.- Mediante correo electrónico con fecha 9/11/2023 fue enviada la malla de validación. También se realizó el diccionario que contiene el detalle de las variables del proyecto, (Hito 36 cumplido). 2.- Con correo electrónico del 11 de noviembre se envía la última actualización del enlace del sistema de ingreso de la información . (Hito 37 cumplido). 3.- Se realizaron los informes de supervisión del personal involucrado, detallando las actividades cumplidas de acuerdo al cronograma establecido. (Hito 38 cumplido). 4.- Se envía mediante correo electrónico lo relacionado a PLGBTI_ELGBTI_C3.3: EJECUCIÓN: Información proveniente del levantamiento de campo, criticada y codificada. (Hito 39 cumplido) OCTUBRE 2023 1.- Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0882-M del 17/10/2023 la máxima autoridad aprueba el Plan de Dirección de	Tipán Espinosa, Nelson Vladimir	06/06/2025 - 03:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Proyecto "Levantamiento Experimental de Información de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+" (Hito 34 cumplido) 2.- Al 31/10/2023 se elaboró el documento metodológico con el marco conceptual y teórico (Hito 35 cumplido)		
JULIO 2023 Con memorando Nro. INEC-DIJU-2023-0287-M, 19 de mayo de 2023 la Dirección de Asesoría Jurídica, emite certificación legal sobre la inexistencia de procesos legales pendientes del proyecto. Con Memorando Nro. INEC-CGAF-2023-1424-M, de 28 de junio de 2023 la Coordinación General Administrativa emite las certificaciones internas sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes del proyecto. Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2023-0616-M, de 18 de julio de 2023, el Director Ejecutivo una vez que realizó el análisis del expediente remitido por la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, el mismo que cumple con los requerimientos técnicos, condiciones y documentos habilitantes necesarios aprobó el cierre del proyecto, en calidad de co ejecutor. Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2023-0537-O de 28 de julio de 2023, considerando el accionar y competencias del INEC en calidad de co-ejecutor, según lo señalado en el Acuerdo N° SNP-SNP-2021-0011-A, remite a la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos el expediente que contiene los insumos base para impulsar el proceso de cierre o baja del proyecto de inversión ante la Secretaría de Planificación.	Cuzco Quinatoa, Verónica Alexandra	01/08/2023 - 01:26 PM
MARZO 2023 32 Mediante correo electrónico, de fecha 30-03-2022, la directora de estadísticas sociodemográficas aprueba el Informe técnico y presupuestario del proyecto PLGBTI+_CPL. (Hito 32 cumplido).	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	05/05/2023 - 10:00 AM
FEBRERO 2023 30 Mediante correo electrónico, de fecha 10-02-2023, la directora de estadísticas sociodemográficas aprueba el plan de tabulados del proyecto PLGBTI+_CPL. (Hito 30 cumplido). 33 Mediante Oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0010-O, de 10 de febrero de 2023, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas, remite a la contraparte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos los productos establecidos en el convenio de cooperación interinstitucional; como parte del convenio se firma el acta entrega recepción de los productos acordados. (Hito 33 cumplido)	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	05/05/2023 - 10:00 AM
ENERO 2023 Mediante la malla de validación y el aplicativo Survey Solutions se realizo el proceso de validación de los datos generados en el levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de la libertad del país.	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	05/05/2023 - 09:59 AM
DICIEMBRE 2022 29 Mediante Oficio Nro. INEC-INEC-2022-0977-O se realizó la entrega formal de los productos al MMDH. (Hito 29 cumplido). 31 Mediante Oficio Nro. INEC-SUGEN-2022-0151-O de 13 de julio de 2022, el INEC remitió el presupuesto total para la ejecución de la Encuesta Piloto de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+. (Hito 31 cumplido).	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	05/05/2023 - 09:58 AM
NOVIEMBRE 2022 24 Mediante correo electrónico, de fecha 02-12-2022, la líder del proyecto aprueba y firma la ficha metodológica correspondiente al proyecto LGBTI+CPL. (Hito 24 cumplido). 25 La presentación del Análisis descriptivo, comparativo y evolutivo aprobado se la realizó dentro del plazo establecido, donde se tiene correos de respaldo. (Hito 25 cumplido). 26 Mediante correo electrónico, del 30-Nov-2022, Operación de Campo (DICA), envía el reporte de seguimiento de información "Operativo LGBTI+_CPL" del mes de Nov que se desarrollo en el CPL Guayas N.- 4. (Hito 26 cumplido). 27.Mediante correo electrónico, del 02-Dic-2022, la lider del proyecto aprueba el informe de cobertura consolidado del mes de Nov. (Hito 27 cumplido). 28 Los tabulados se concluyeron el día de hoy, y se sustenta mediante correo. (Hito 28 cumplido). 23. Con correo electrónico, de 28 de octubre de 2022, se remite a la líder del proyecto el documento de la propuesta de los tabulados con las actualizaciones respectivas. Por el mismo medio, el 02 de noviembre de 2022, se informa por parte de la líder del proyecto que el documento ha sido revisado y se encuentra aprobada la propuesta para el plan de tabulados (Hito 23 cumplido)	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	05/05/2023 - 09:57 AM
OCTUBRE 2022	Cuzco Quinatoa, Verónica Alexandra	20/03/2023 - 04:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
12. Se solicitó mediante correo electrónico al responsable Consultor del documento metodológico que indique en que estado está el porcentaje de avance de la metodología de la encuesta LGBTI + (Hito 12 cumplido) 13. Se realizó una reunión para socializar el formulario con las respectivas zonales a cargo del levantamiento de información y el oficio enviado con la aprobación del formulario a la Secretaría de Derechos Humanos fue el 27 de Septiembre de 2022. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 13 cumplido). 14. Mediante correo electrónico, de 05 de octubre de 2022, se remite el "Informe técnico crítica-codificación y validación de la encuesta Fase 1 y 2", para revisión y aprobación por parte de la Directora (DIES) . Y por el mismo medio se comunica que se aprueba el informe (Hito 14 cumplido). 15. La aprobación del Plan de tabulados se fijó para octubre, pero debido a la reunión mantenida el día 22 de septiembre del 2022 se acordó aprobar el plan de tabulados lo más pronto posible, el mismo que fue ejecutado el 30 de septiembre del 2022. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 15 cumplido). 16. Con correo electrónico, de 21 de octubre de 2022, la Coordinación Zonal Sur remite a la líder del proyecto el reporte de cobertura del mes de octubre. Y, a través de correo electrónico Operación de Campo (DICA), envía el reporte de cobertura del proyecto (Proyecto PLGBTI+ CPL) (Hito 16 cumplido). 17. Se realizó un informe de cobertura a la fecha 23 de octubre ya que la información fue levantada en tablets, contando con la información oportuna. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 17 cumplido). 18. Se realizó un informe de fin de operativo de campo de mnera consolidada. (Proyecto PLGBTI +) (Hito 18 cumplido). 19. Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-2022-0561-M, memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0710-M, en el que la Coordinación Técnica de Producción Estadística-CGTPE y la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica-DIPLA, solicitan la aprobación del PDP de la "Encuesta piloto de Condiciones de Vida de la población LGBTI+", la misma que se da mediante memorando Nro. INEC-INEC-2022-0761-M, por lo que se tiene realizada la gestión el 5 de septiembre de 2022. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 19 cumplido). 20. Se realizó la ficha metodológica de la operación estadística Encuesta Piloto de Condiciones de Vida de la Población LGBTI +. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 20 cumplido). 21. Se realizó una presentación en power point en donde se detalla el análisis de los resultados obtenidos de la operación estadística Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI + (Proyecto PLGBTI+) (Hito 21 cumplido). 22. Se consolidó los informes de las zonales Sur y Operaciones de Campo en uno solo. (Proyecto PLGBTI+) (Hito 22 cumplido).		
JULIO 2022 1. El 15/07/2022 se suscribió el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaria de Derechos Humanos - SDH y el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC. (Hito 1 e Hito 2 cumplido) AGOSTO 2022 3. El instrumento de recolección fue revisado en la reunión mantenida el 05 de agosto de 2022 con la SDH. A través de correo electrónico, de 29 de agosto de 2022, se informa que en reuniones mantenidas el 26 de agosto de 2022, con la Secretara Técnica del CNIG y la Secretaría de Derechos Humanos, se realizó una actualización sobre el contenido y redacción de las preguntas, cuya finalidad es identificar a la población por su género y orientación sexual; en este sentido, se remite a la SDH el formulario con los ajustes para la aprobación. Finalmente con oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2022-0079-O, de 02 de septiembre de 2022, se indica que "(...) se remite el formulario final que ha sido revisado y aprobado previamente por la Secretaría de Derechos Humanos, así como el acta de reunión de revisión y aprobación" (Hito 3 cumplido) 4. Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2022-0491-M, de 01 de agosto de 2022, se remite a CGTPE el Plan de Dirección de Proyecto "Levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país", a fin de que se sirva disponer a quien corresponda se proceda con el trámite pertinente para la aprobación del mismo. Y con memorando Nro. INEC-INEC-2022-0627-M, de fecha 03 de agosto de 2022 se informa que se procede a aprobar el Plan de Dirección de Proyecto "Levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país". (Hito 4 cumplido) 5. Se llevo a cabo la reunión entre la Secretaría de Desarrollo Humano y el INEC, donde acordaron la delimitación de cobertura, necesidades y posibilidades el 1ero de agosto del año en curso. (Hito 5 cumplido) 6. En reunión mantenida, el 05 agosto de 2022, entre el INEC y la Secretaria de Derechos Humanos (SDH) se realizó la revisión y aprobación del formulario para el Levantamiento de información de Población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país. Y con oficio Nro. INEC-CGTPE-DIES-2022-0079-O, 02 de septiembre de 2022, se indica que "(...	Cuzco Quinatoa, Verónica Alexandra	08/11/2022 - 10:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se remite el formulario final que ha sido revisado y aprobado previamente por la Secretaría de Derechos Humanos, así como el acta de reunión de revisión y aprobación" (Hito 6 cumplido) 7. Se realizó la revisión con del marco conceptual y marco metodológico a ser aplicada en la ENCUESTA PILOTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN LGBTI+. (Hito 7 cumplido) 8. Se suscribió el "Informe para paso a producción" del sistema PPL 2022. El sistema incluye los ajustes de acuerdo a la reunión mantenida, el 26 de agosto de 2022 con la Secretara Técnica del CNIG y la Secretaría de Derechos Humanos, en la que se realizó una actualización sobre el contenido y redacción de las preguntas, cuya finalidad es identificar a la población por su género y orientación sexual. (Hito 8 cumplido) 9. Se elaboró el Plan de Dirección de Proyecto el mismo que fue aprobado al igual que el Cronograma de actividades y Presupuesto. (Hito 9 cumplido) SEPTIEMBRE 2022 10. Mediante correo electrónico, de 30 de septiembre de 2022, se comunicó por parte de la líder del proyecto que el documento metodológico (fase planificación) se encuentra aprobado (Hito 10 cumplido). 11. Se solicitó la firma del documento suscrito del requerimiento a DIRAD, el mismo que fue firmado el 06 de octubre y la fecha de puesta en marcha del sistema fue el 12 de octubre de 2022. (Hito 11 cumplido)		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La negativa a entregar información por parte de las personas LGBTI+, CAUSARIA el retraso en el tiempo planificado para la ejecución de la operación estadística	10/06/2025	Nelson Vladimir Tipán Espinosa	40 %	90	36	0/2

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLGBTI+CPL_C3.1: PLANEACIÓN: Convenio de cooperación interinstucional suscrito	9-Entregables Formales	15/07/2022		15/07/2022		Sí	1.0
2	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: PLANEACIÓN: Convenio de cooperación interinstucional suscrito	9-Entregables Formales	15/07/2022		15/07/2022		Sí	1.0
3	PLGBTI+CPL_C3.1: DEFINICIÓN: Instrumento de recolección aprobado	9-Entregables Formales	29/07/2022		02/09/2022		Sí	0.8
4	PLGBTI+CPL_C3.1: PLANEACIÓN: Plan de	9-Entregables Formales	29/07/2022		03/08/2022		Sí	0.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Dirección de Proyecto aprobado							
5	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: PLANEACIÓN: Acta de la confirmación de necesidades INEC/SDH/GIZ elaborada	9-Entregables Formales	01/08/2022		01/08/2022		Sí	0.2
6	PLGBTI+CPL_C3.1: DEFINICIÓN: Acta de reunión de socialización a la SDH del instrumento de recolección aprobado	9-Entregables Formales	05/08/2022		05/08/2022		Sí	0.2
7	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: PLANEACIÓN: Marco conceptual (producto consultoría) aprobado	9-Entregables Formales	15/08/2022		15/08/2022		Sí	0.4
8	PLGBTI+CPL_C3.1: DEFINICIÓN: Documento de puesta en producción del sistema aprobado	9-Entregables Formales	18/08/2022		31/08/2022		Sí	0.4
9	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	9-Entregables Formales	26/08/2022		05/09/2022		Sí	0.6
10	PLGBTI+CPL_C3.1: PLANEACIÓN: Documento metodológico (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) aprobado	9-Entregables Formales	07/09/2022		30/09/2022		Sí	0.4
11	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: DEFINICIÓN: Acta de reunión de socialización a la SDH del instrumento de recolección aprobado	9-Entregables Formales	07/09/2022		27/09/2022		Sí	0.2
12	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: PLANEACIÓN: Documento metodológico (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) aprobado	9-Entregables Formales	09/09/2022		30/11/2022		Sí	0.4
13	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: DEFINICIÓN: Documento de puesta en producción del sistema aprobado	9-Entregables Formales	23/09/2022		12/10/2022		Sí	0.2
14	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Informe de crítica- codificación zonal consolidado	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		05/10/2022		Sí	0.4
15	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: DEFINICIÓN: Plan de tabulados aprobado	9-Entregables Formales	14/10/2022		30/09/2022		Sí	0.2
16	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Informe de cobertura semanal consolidado	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		24/10/2022		Sí	0.2
17	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Informe de cobertura consolidado	9-Entregables Formales	23/10/2022		23/10/2022		Sí	0.2
18	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Informe finalización del operativo de campo	9-Entregables Formales	23/10/2022		23/10/2022		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: DEFINICIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	9-Entregables Formales	24/10/2022		05/09/2022		Sí	0.2
20	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: DEFINICIÓN: Ficha metodológica aprobada	9-Entregables Formales	25/10/2022		25/10/2022		Sí	0.2
21	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Informe de análisis de los metadatos aprobado	9-Entregables Formales	25/10/2022		25/10/2022		Sí	0.2
22	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Informe de crítica- codificación zonal consolidado	9-Entregables Formales	25/10/2022		26/10/2022		Sí	0.2
23	PLGBTI+CPL_C3.1: DEFINICIÓN: Plan de tabulados aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		02/11/2022		Sí	0.2
24	PLGBTI+CPL_C3.1: DEFINICIÓN: Ficha metodológica aprobada	9-Entregables Formales	11/11/2022		02/12/2022		Sí	0.4
25	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Análisis descriptivo, comparativo y evolutivo aprobado	9-Entregables Formales	25/11/2022		25/11/2022		Sí	0.2
26	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Informe de cobertura semanal consolidado	5-Entregables Intermedios	27/11/2022		30/11/2022		Sí	0.2
27	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Informe de cobertura consolidado	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		02/12/2022		Sí	0.4
28	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Tabulados de principales resultados aprobado	9-Entregables Formales	30/11/2022		02/12/2022		Sí	0.2
29	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: EJECUCIÓN: Acta de Entrega a la SDH de productos acordados suscrita	9-Entregables Formales	07/12/2022		29/12/2022		Sí	0.4
30	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Tabulados de principales resultados aprobado	9-Entregables Formales	15/12/2022		30/12/2022		Sí	0.2
31	PLGBTI_ELGBTI_C3.2: CIERRE: Informe de gestión técnico -presupuestario aprobado	9-Entregables Formales	15/12/2022		29/12/2022		Sí	0.4
32	PLGBTI+CPL_C3.1: CIERRE: Informe de gestión técnico - presupuestario aprobado	9-Entregables Formales	30/12/2022		29/12/2022		Sí	0.4
33	PLGBTI+CPL_C3.1: EJECUCIÓN: Acta de Entrega a la SDH de productos acordados suscrita	9-Entregables Formales	30/12/2022		29/12/2022		Sí	0.4
34	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: DEFINICIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y el cronograma de actividades aprobado	9-Entregables Formales	12/10/2023		17/10/2023		Sí	1.0
35	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: DEFINICIÓN: Marco teórico,	9-Entregables Formales	31/10/2023		31/10/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	conceptual y metodológico elaborados							
36	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: DEFINICIÓN: Matriz de validación y diseño de las variables estadísticas elaborados	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.6
37	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: DEFINICIÓN: Sistema de ingreso de información actualizado	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	1.0
38	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: EJECUCIÓN: Informe de supervisión y de cobertura elaborados	9-Entregables Formales	26/11/2023		26/11/2023		Sí	1.0
39	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: EJECUCIÓN: Información proveniente del levantamiento de campo, criticada y codificada	9-Entregables Formales	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.8
40	PLGBTI_ELGBTI_C3.3: EJECUCIÓN: Información proveniente del levantamiento de campo, digitada.	9-Entregables Formales	01/12/2023		01/12/2023		Sí	0.8
41	PLGBTI_EXP_LGBTI_C3.3: EJECUCIÓN: Informe técnico de cierre del operativo estadístico elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.6
42	PLGBTI_EXP_LGBTI_C3.3: CIERRE: Documentación digital del proceso archivada	9-Entregables Formales	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.4
43	PLGBTI_EXP_LGBTI_C3.3: CIERRE: Presentación de los resultados y el documento metodológico entregados al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos	9-Entregables Formales	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.8
44	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: PLANEACIÓN: Plan de dirección de proyecto aprobado	9-Entregables Formales	22/05/2025		30/05/2025		Sí	5.33
45	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Formulario de recolección preliminar diseñado	9-Entregables Formales	30/05/2025		30/05/2025		Sí	5.33
46	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Formulario para la recolección de la ENCV-LGBTI aprobado	9-Entregables Formales	06/06/2025		06/06/2025		Sí	5.33
47	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Solicitud de desarrollo del sistema enviada	9-Entregables Formales	16/06/2025		16/06/2025		Sí	4.0
48	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Mallas de validación elaboradas	9-Entregables Formales	15/07/2025	15/07/2025			No	2.67
49	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Sintaxis de validación preliminar elaborada	9-Entregables Formales	31/07/2025	31/07/2025			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Manuales de encuestador y protocolos sensibilización aprobados	9-Entregables Formales	28/08/2025	28/08/2025			No	4.0
51	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: DEFINICIÓN: Prueba Piloto ejecutada	9-Entregables Formales	30/08/2025	30/08/2025			No	4.0
52	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Personal capacitado y seleccionado para el operativo de campo	9-Entregables Formales	29/09/2025	29/09/2025			No	4.0
53	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Operativo de avanzada iniciado mes previo	9-Entregables Formales	30/09/2025	30/09/2025			No	5.33
54	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Operativo de campo iniciado mes 1	9-Entregables Formales	31/10/2025	31/10/2025			No	6.67
55	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Validación de la información recolectada efectuada mes 1	9-Entregables Formales	31/10/2025	31/10/2025			No	5.33
56	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Operativo de campo iniciado mes 2	9-Entregables Formales	30/11/2025	30/11/2025			No	6.67
57	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Validación de la información recolectada efectuada mes 2	9-Entregables Formales	30/11/2025	30/11/2025			No	5.33
58	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: CIERRE: Informe de resultados preliminares elaborado y entregado al MMDH	9-Entregables Formales	29/12/2025	29/12/2025			No	6.68
59	ENCV-LGBTI+_C3: LEVANTAMIENTO_ENCV_LGBTI+: EJECUCIÓN: Sintaxis de principales indicadores elaborada	9-Entregables Formales	29/12/2025	29/12/2025			No	5.33

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes preliminares de resultados sobre la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ hasta diciembre de 2025		-	-	-	01/10/2025	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	780,244.11 **
Costo Total:	300,212.44
Total Devengado:	281,840.86
% Costo Total Devengado:	93.88 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 93.88 %

Perfil Económico 2025				
	Años Previos	**Año Actual (2025)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	313,414.04	530,021.70	0.00	**843,435.74**
Ppto. Externo Planeado	300,212.44	0.00	0.00	**300,212.44**
Ppto. Aprobado Inicial	313,414.04	0.00	0.00	**313,414.04**
Ppto. Codificado	313,414.04	530,021.70	0.00	**843,435.74**
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	311,669.74	530,021.70	0.00	**841,691.44**
Ppto. Devengado	250,222.41	31,618.45	0.00	**281,840.86**
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 250,222.41	0.00	0.00	**250,222.41**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	61,447.33	530,021.70	0.00	**591,469.03**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 80.28 %	5.97 %	0.00 %	**33.49 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	41,153.32	31,618.45	41,153.32	31,618.45	76.83 %		5.97 %
Jul	46,045.48		87,198.80				
Ago	66,984.48		154,183.28				
Sep	56,896.48		211,079.76				
Oct	67,662.08		278,741.84				
Nov	132,710.88		411,452.72				
Dic	118,568.98		530,021.70				
Total	**530,021.70**	**31,618.45**					

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO No 1- Convenio de cooperación interinstucional suscrito	A1_HITO_1.zip	08/09/2022
2	ASOCIACIÓN HITO No 10- Documento metodológico (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) aprobado	B1_HITO_10.zip	07/11/2022
3	ASOCIACIÓN HITO No 11- Acta de reunión de socialización a la SDH del instrumento de recolección aprobado	B2_HITO_11.zip	07/02/2023
4	ASOCIACIÓN HITO No 12 - Documento metodológico (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) aprobado	B3_HITO_12.zip	07/02/2023
5	ASOCIACIÓN HITO No 13 - Documento de puesta en producción del sistema aprobado	B4_HITO_13.rar	03/05/2023
6	ASOCIACIÓN HITO No 14 - Informe de crítica-codificación zonal consolidado.	B5_HITO_14.zip	07/11/2022
7	ASOCIACIÓN HITO No 15 - Plan de tabulados aprobado	B6_HITO_15.zip	09/11/2022
8	ASOCIACIÓN HITO No 16 - Informe de cobertura semanal consolidado	B7_Hito_16.zip	08/11/2022
9	ASOCIACIÓN HITO No 17 - Informe de cobertura consolidado	B8_HITO_17.zip	09/11/2022
10	ASOCIACIÓN HITO No 18- Informe finalización del operativo de campo	B9_HITO_18.zip	09/11/2022
11	ASOCIACIÓN HITO No 19- Plan de Dirección de Proyecto aprobado	C1_HITO_19.zip	09/11/2022
12	ASOCIACIÓN HITO No 2- Convenio de cooperación interinstucional suscrito	A2_HITO_2.zip	08/09/2022
13	ASOCIACIÓN HITO No 20 - Ficha metodológica aprobada	C2_HITO_20.zip	09/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ASOCIACIÓN HITO No 21 - Informe de análisis de los metadatos aprobado	C3_HITO_21.zip	03/05/2023
15	ASOCIACIÓN HITO No 22- Informe de crítica-codificación zonal consolidado	C4_HITO_22.zip	09/11/2022
16	ASOCIACIÓN HITO No 23 - Plan de tabulados aprobado	C5_Hito_23.zip	08/11/2022
17	ASOCIACIÓN HITO No 24 - Ficha metodológica aprobada	C6_HITO_24.rar	02/12/2022
18	ASOCIACIÓN HITO No 25 - Análisis descriptivo comparativo y evolutivo aprobado.	C7_HITO_25.zip	04/12/2022
19	ASOCIACIÓN HITO No 26- Informe de cobertura semanal consolidado	C8_HITO_26.rar	02/12/2022
20	ASOCIACIÓN HITO No 27- Informe de cobertura consolidado	C9_HITO_27.rar	02/12/2022
21	ASOCIACIÓN HITO No 28- Tabulados de principales resultados aprobado.	D1_HITO_28.zip	04/12/2022
22	ASOCIACIÓN HITO No 29 - Acta de Entrega a la SDH de productos acordados suscrita	D2_HITO_29.zip	16/01/2023
23	ASOCIACIÓN HITO No 3 - Instrumento de recolección aprobado	A3_HITO_3.zip	08/09/2022
24	ASOCIACIÓN HITO No 30 Tabulados de principales resultados aprobado	D3_HITO30.rar	20/03/2023
25	ASOCIACIÓN HITO No 31- Informe de gestión técnico - presupuestario aprobado	D4_HITO_31.zip	03/05/2023
26	ASOCIACIÓN HITO No 32 Informe de gestión técnico - presupuestario aprobado	D5_HITO32.rar	31/03/2023
27	ASOCIACIÓN HITO No 33 Acta de Entrega a la SDH de productos acordados suscrita	D6_HITO33.rar	22/03/2023
28	ASOCIACIÓN HITO No 34- Plan de Dirección de Proyecto y el cronograma de actividades aprobado	D7_HITO_34.rar	13/11/2023
29	ASOCIACIÓN HITO No 35- Marco teórico, conceptual y metodológico elaborados	D8_HITO_35.rar	13/11/2023
30	ASOCIACIÓN HITO No 36- Matriz de validación y diseño de las variables estadísticas elaboradas	D9_HITO_36.rar	05/12/2023
31	ASOCIACIÓN HITO No 37- Sistema de ingreso de información actualizado	E1_HITO_37.rar	05/12/2023
32	ASOCIACIÓN HITO No 38- Informe de supervisión y de cobertura elaborados.	E2_HITO_38.rar	14/12/2023
33	ASOCIACIÓN HITO No 39- Información proveniente del levantamiento de campo, criticada y codificada	E3_HITO_39.rar	05/12/2023
34	ASOCIACIÓN HITO No 4- Plan de Dirección de Proyecto aprobado	A4_HITO_4.zip	08/09/2022
35	ASOCIACIÓN HITO No 40- Información proveniente del levantamiento de campo, digitada.	E4_HITO_40.rar	05/12/2023
36	ASOCIACIÓN HITO No 41- Informe técnico de cierre del operativo estadístico elaborado.	E5_HITO_41.zip	21/12/2023
37	ASOCIACIÓN HITO No 42- CIERRE: Documentación digital del proceso archivada	E6_HITO_42.rar	04/01/2024
38	ASOCIACIÓN HITO No 43- CIERRE: Presentación de los resultados y el documento metodológico entregados al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos	E7_HITO_43.rar	04/01/2024
39	ASOCIACIÓN HITO No 44 - Plan de dirección de proyecto aprobado	E8_HITO44.zip	09/06/2025
40	ASOCIACIÓN HITO No 45 - Formulario de recolección preliminar diseñado	E9_HITO45.zip	09/06/2025
41	ASOCIACIÓN HITO No 46 - Formulario para la recolección de la ENCV-LGBTI aprobado	F1_HITO46.zip	07/07/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	ASOCIACIÓN HITO No 47 - Solicitud de desarrollo del sistema enviada	F2_HITO47.zip	07/07/2025
43	ASOCIACIÓN HITO No 5 - Acta de la confirmación de necesidades INEC/SDH/GIZ elaborada	A5_HITO_5.zip	08/09/2022
44	ASOCIACIÓN HITO No 6 - Acta de reunión de socialización a la SDH del instrumento de recolección aprobado	A6_HITO_6.zip	08/09/2022
45	ASOCIACIÓN HITO No 7 - Marco conceptual (producto consultoría) aprobado	A7_HITO7.zip	08/09/2022
46	ASOCIACIÓN HITO No 8 - Documento de puesta en producción del sistema aprobado	A8_HITO_8.zip	08/09/2022
47	ASOCIACIÓN HITO No 9 - Plan de Dirección de Proyecto aprobado	A9_HITO9.zip	08/09/2022
48	Expediente de cierre del proyecto " Prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad "	Expediente_de_cierre.rar	01/08/2023
49	GRISK002_PA001_01 Estrategia de sensibilización interna y externa "levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país".	GRISK02_001_1.rar	22/03/2023
50	GRISK002_PA001_Estrategia de sensibilización interna y externa "levantamiento de información de la población LGBTI+ recluida en los centros de privación de libertad del país".	GRISK02_001.zip	11/11/2022
51	GRISK_001_PA001_ Generar una estrategia de sensibilización interna y externa para la población LGBLTI+	GRISK001_001.zip	10/11/2022
52	GRISK_003_PA001_Implementar en conjunto con SNAI un protocolo de evacuación de los centros de privación de la libertad el cual permitirá garantizar la integridad del personal de campo.	GRISK003_001.rar	14/12/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cuzco Quinatoa, Verónica Alexandra		Analista de Estadísticas Sociodemograficas 2	veronica_cuzco@inec.gob.ec	
